FAC-S-2023-226944-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 21, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-226944-CI del 11 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESTEL-RAAYA

Señor Coronel
NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-1
Ciudad

Asunto: Informe Presunto Incumplimiento el Contrato No. 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1

Respetuosamente me permito informar al señor Coronel Ordenador del Gasto, las novedades presentadas con el Contrato No. 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1, las cuales conllevaron a la solicitud de apertura de un posible incumplimiento como a continuación se indica:

1. El 01 de noviembre inicio el desarrollo de mis funciones como supervisor tal como me fue designado acorde a notificación mediante documento No FAC-S-2023-011497-CR del 1 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-DECON, donde se evidencian los datos de contacto del contratista, valor y fecha de ejecución para el 10 de noviembre del 2023

   Contrato de compra venta No. 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023

   Objeto: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1.

   Contratista INGECON CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900.781.282-5

   Valor : CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 47'245.000,00), suma que debe ejecutar el contratista, entregando los productos en las cantidades, marcas y precios según oferta

   Aprobación de póliza: 01-noviembre-2023

   Fecha de ejecución del contrato: El CONTRATISTA deberá hacer una única entrega de los elementos al supervisor, teniendo como **plazo hasta el 10 de noviembre del 2023.**


2. El día 01 de noviembre del 2023 vía llamada se establece comunicación con el señor Oscar Orlando Castro Roa representante legal de la empresa &NGECON

CONSTRUCCIONES S.A.S para efectuar un primer acercamiento y manifestarle la posibilidad de adicionar mas recursos al presupuesto inicial, con el fin de incrementar las cantidades de algunos elementos, adicionalmente se puso a consideración la posibilidad realizar una prorroga a la fecha de entrega teniendo en cuenta la cercanía esta y así evitar posibles incumplimientos, siendo propuesta por el señor Oscar el día 30 de Noviembre del 2023.

3. El día 07 de noviembre se emite el oficio No FAC-S-2023-032953-CE del 7 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFACACOM-1-SECOM-GRUAL-ESTEL-RAAY, el cual trata de la adición de recursos al contrato, al cual se recibe respuesta vía correo SECOP II el día 08 de noviembre del 2023 donde el señor Oscar Orlando Castro Roa represéntate legal &NGECON S.A.S, manifiesta aceptar la adición al contrato.

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

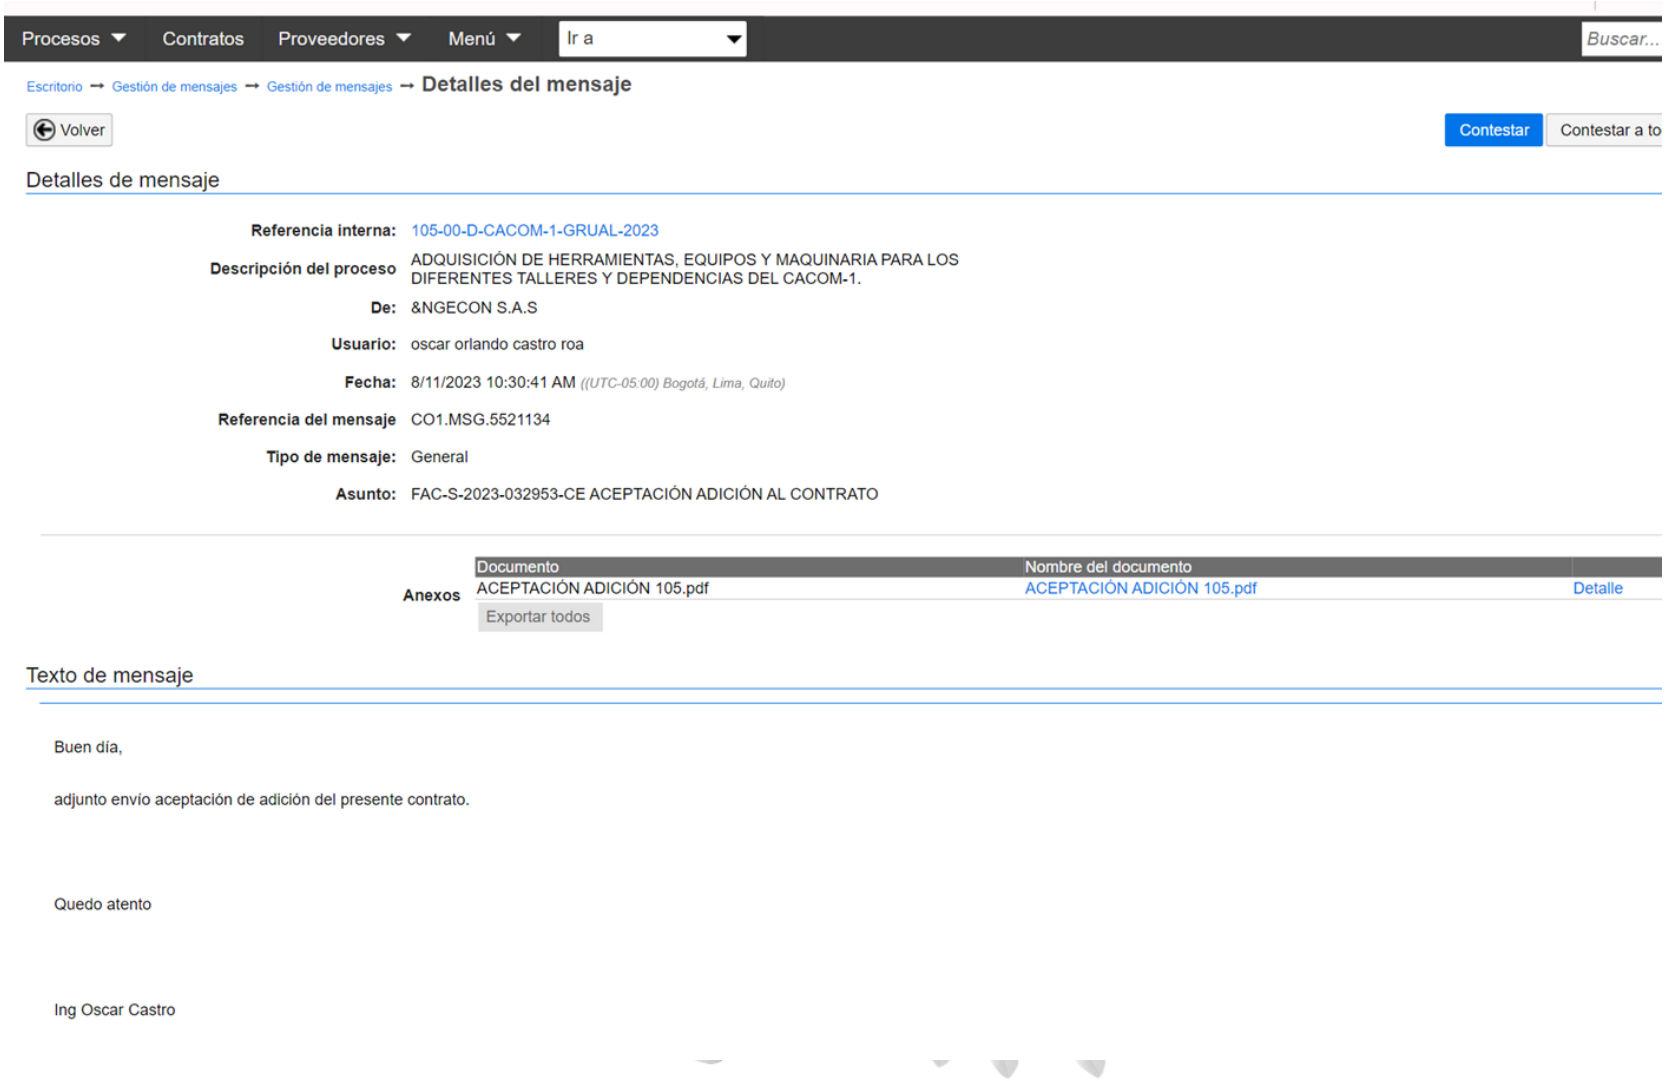

Procesos | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a | Buscar...

Escritorio → Gestión de mensajes → Gestión de mensajes → **Detalles del mensaje**

Volver | Contestar | Contestar a to

Detalles de mensaje

Referencia interna: 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023

Descripción del proceso ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1.

De: &NGECON S.A.S

Usuario: oscar orlando castro roa

Fecha: 8/11/2023 10:30:41 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Referencia del mensaje CO1.MSG.5521134

Tipo de mensaje: General

Asunto: FAC-S-2023-032953-CE ACEPTACIÓN ADICIÓN AL CONTRATO

Anexos

Documento	Nombre del documento	
ACEPTACIÓN ADICIÓN 105.pdf	ACEPTACIÓN ADICIÓN 105.pdf	Detalle

Exportar todos

Texto de mensaje

Buen día,

adjunto envío aceptación de adición del presente contrato.

Quedo atento

Ing Oscar Castro

&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT 900781282-5

Cálculos estructurales, diseños hidráulicos y sanitarios, consultoría, interventoría, diseño y construcción de Obras Civiles en General.

Facatativá Cundinamarca, noviembre 07/2023

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
Puerto Salgar-Cundinamarca
Técnico Tercero **JOHANNY ANTONIO QUINTERO YEPES**
Técnico Operario Radioayudas y Ayudas Aeroportuarias

No FAC-S-2023-032953-CE del 7 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESTEL-RAAYA

ASUNTO: Aceptación adición al contrato N. 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023

OBJETO: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1.

Oscar Orlando Castro Roa, identificado como aparece al pie de mi firma y obrando en calidad de Representante Legal de **&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S. Nit 900781282-5**, manifiesto que aceptamos la propuesta de aumento de los elementos adicionales dentro del contrato **No. 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023.** que tiene por objeto "**ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1**" tal y como se expone a continuación:

4. El día 09 de Noviembre del 2023 se emite el MODIFICATORIO No.1 en el cual se establecen los nuevos valores del contrato y la nueva fecha de entrega quedando como plazo el día 30 de noviembre del 2023

Cláusula 2 – Modifíquese parcialmente la cláusula 2 del contrato inicial

Sumados los recursos al contrato inicial, el nuevo valor del contrato es:


2.1 Nuevo valor del contrato: SESENTA MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($ 60'095.000,00), suma que debe ejecutar el contratista, entregando los productos en las cantidades iniciales más las adicionadas en las marcas y precios según oferta.

2.4. Plazo de ejecución:

Conforme a los No FAC-S-2023-032953-CE del 7 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFACACOM-1-SECOM-GRUAL-ESTEL-RAAYA informado al Contratista, y No FAC-S-2023-204970-CI del 8 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESTEL-RAAYA solicitud del supervisor al Ordenador, se amplía la fecha de entrega de todos los bienes, quedando de la siguiente manera:
El CONTRATISTA deberá hacer una única entrega de los elementos al supervisor, teniendo como plazo **hasta el 30 de noviembre del 2023.**

5. El día 14 de noviembre del 2023 vía correo electrónico, se envía un mensaje al señor representante lega &NGECON para recordarle las cantidades que se adicionaron el listado de elementos y manifestarle la necesidad de recibir las fichas técnicas de los elementos con fecha de 16 de noviembre del 2023 y de ser posible adelantar la entrega de los elementos a fecha 23 de noviembre con el fin de tener tiempo para el ingreso y a fecha 30 de noviembre tener todo listo.

ESPACIO EN BLANCO

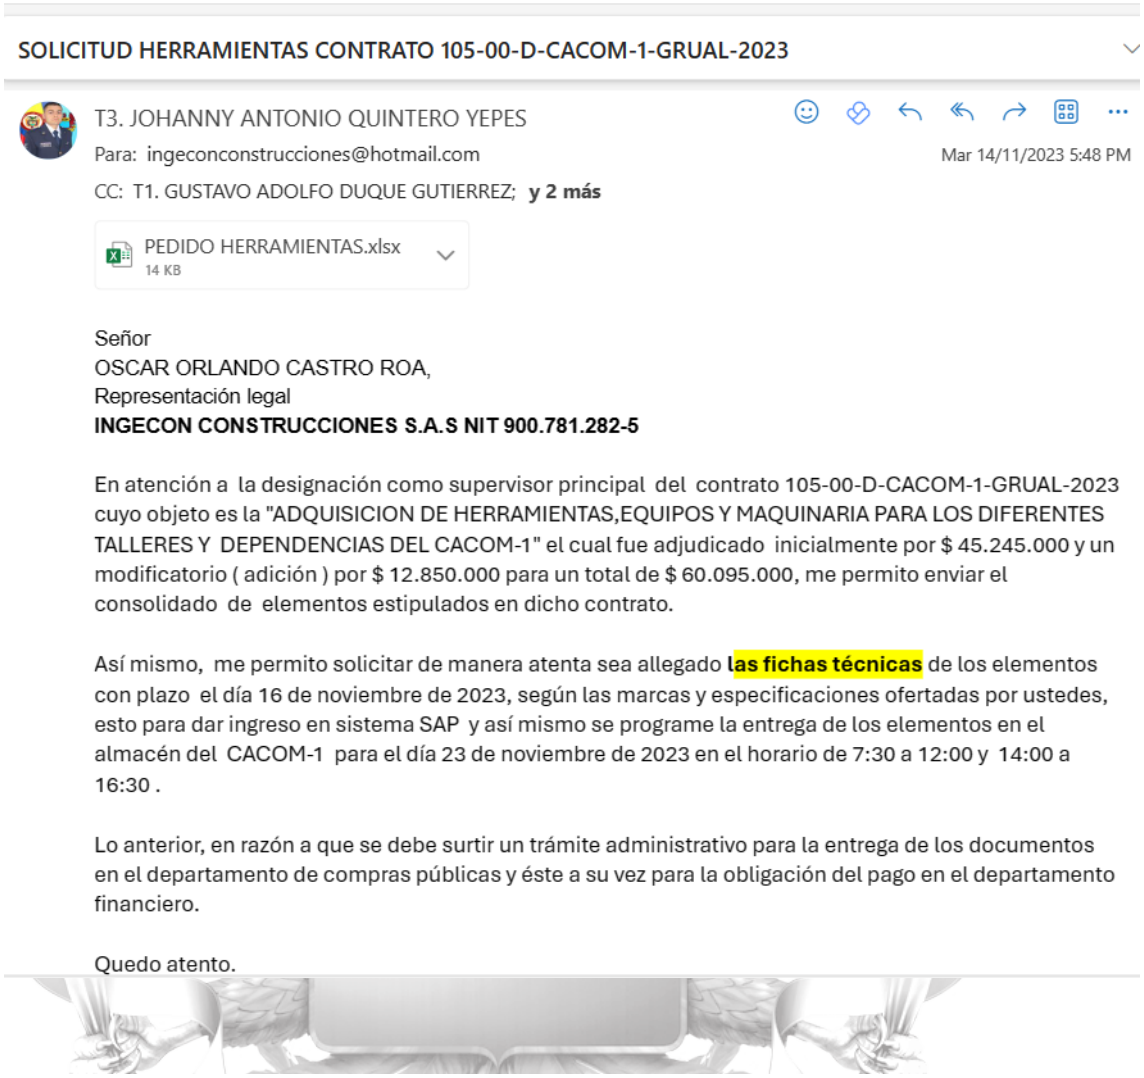

SOLICITUD HERRAMIENTAS CONTRATO 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023

T3. JOHANNY ANTONIO QUINTERO YEPES

Para: ingeconconstrucciones@hotmail.com

Mar 14/11/2023 5:48 PM

CC: T1. GUSTAVO ADOLFO DUQUE GUTIERREZ; **y 2 más**

PEDIDO HERRAMIENTAS.xlsx
14 KB

Señor
OSCAR ORLANDO CASTRO ROA,
Representación legal
INGECON CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900.781.282-5


En atención a la designación como supervisor principal del contrato 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 cuyo objeto es la "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS,EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1" el cual fue adjudicado inicialmente por $ 45.245.000 y un modificatorio (adición) por $ 12.850.000 para un total de $ 60.095.000, me permito enviar el consolidado de elementos estipulados en dicho contrato.

Así mismo, me permito solicitar de manera atenta sea allegado **las fichas técnicas** de los elementos con plazo el día 16 de noviembre de 2023, según las marcas y especificaciones ofertadas por ustedes, esto para dar ingreso en sistema SAP y así mismo se programe la entrega de los elementos en el almacén del CACOM-1 para el día 23 de noviembre de 2023 en el horario de 7:30 a 12:00 y 14:00 a 16:30 .

Lo anterior, en razón a que se debe surtir un trámite administrativo para la entrega de los documentos en el departamento de compras públicas y éste a su vez para la obligación del pago en el departamento financiero.

Quedo atento.

6. El día 16 de Noviembre el Señor Supervisor Suplente envía un mensaje vía Email, recordando el plazo de entrega de la fichas técnicas y solicitando la entrega de los elementos a fecha 23 de noviembre del 2023 con el fin de adelantar los tramites administrativos.

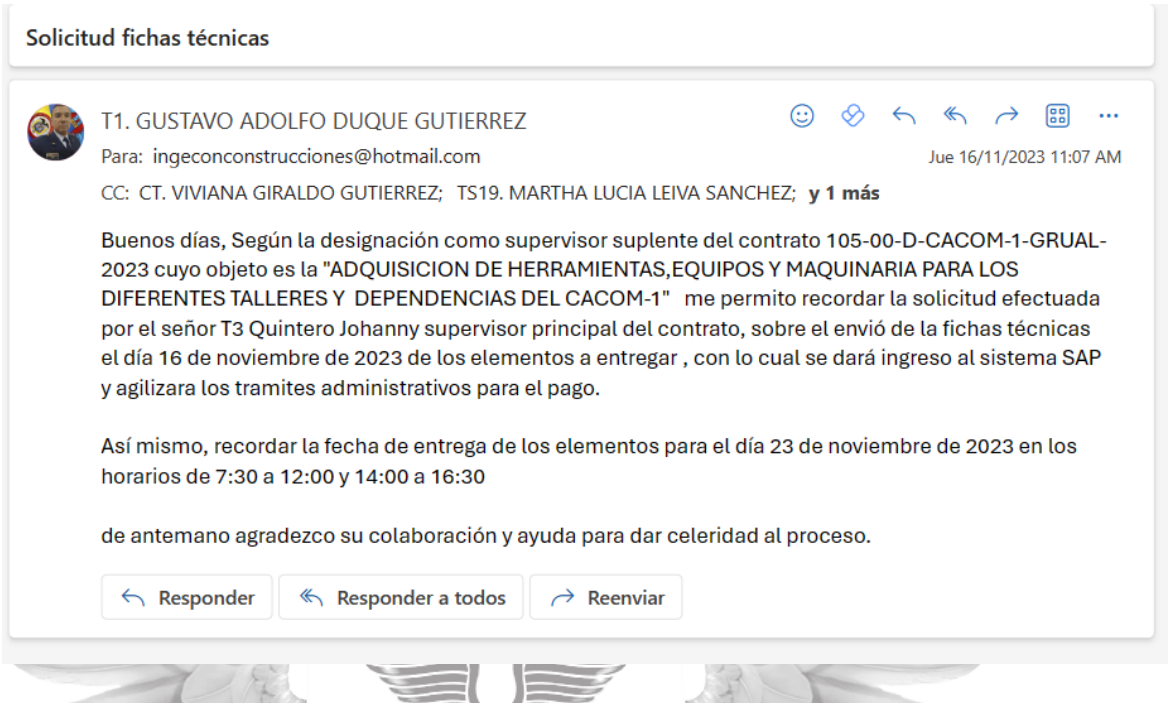

Solicitud fichas técnicas

T1. GUSTAVO ADOLFO DUQUE GUTIERREZ

Para: ingeconconstrucciones@hotmail.com

Jue 16/11/2023 11:07 AM

CC: CT. VIVIANA GIRALDO GUTIERREZ; TS19. MARTHA LUCIA LEIVA SANCHEZ; **y 1 más**

Buenos días, Según la designación como supervisor suplente del contrato 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 cuyo objeto es la "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS,EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1" me permito recordar la solicitud efectuada por el señor T3 Quintero Johanny supervisor principal del contrato, sobre el envió de la fichas técnicas el día 16 de noviembre de 2023 de los elementos a entregar , con lo cual se dará ingreso al sistema SAP y agilizara los tramites administrativos para el pago.

Así mismo, recordar la fecha de entrega de los elementos para el día 23 de noviembre de 2023 en los horarios de 7:30 a 12:00 y 14:00 a 16:30

de antemano agradezco su colaboración y ayuda para dar celeridad al proceso.

Responder | Responder a todos | Reenviar

7. El día 17 de noviembre vía WhatsApp se recibieron parcialmente las fichas técnicas, las fichas técnicas que quedaron pendientes ya que en la primera entrega no fueron entregadas completas, se recibieron 21 de noviembre del 2023.
8. El día 27 de noviembre del 2023 se recibe vía correo interno de la plataforma SECOP II una solicitud de adición de tiempo por parte del señor OSCAR ORLANDO CASTRO ROA, representante legal &INGECON, en la cual manifiesta que por aspectos técnicos de consecución solicita la ampliación del plazo de entrega de los elementos del contrato

ESPACIO EN BLANCO

&NGECON S.A.S construcciones

&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT 900781282-5

Cálculos estructurales, diseños hidráulicos y sanitarios, consultoría, interventoría, diseño y construcción de Obras Civiles en General.

Facatativá Cundinamarca, noviembre 27/2023

Señores
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1
Técnico Tercero **JOHANNY ANTONIO QUINTERO YEPES**
Técnico Operario Radioayudas y Ayudas Aeroportuarias

ASUNTO: solicitud Prorroga contrato No. 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023

OBJETO: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1.

Oscar Orlando Castro Roa, identificado como aparece al pie de mi firma y obrando en calidad de Representante Legal de **&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S. Nit 900781282-5**, solicito una prórroga del contrato **No. 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023.** que tiene por objeto **"ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1"** este lapso de tiempo es hasta el día doce (12) de diciembre del 2023. El motivo de esta solicitud es por aspectos técnicos de consecución de las herramientas en el mercado por las especificaciones y tipo de referencias que la Entidad está solicitando.

Cordialmente,

&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 900781282-5
OSCAR ORLANDO CASTRO ROA
C.C. No. 11.438.286 expedida en Facatativa Cundinamarca
Representante Legal

9. El 27 de noviembre del 2023 Se solicito al contratista el envío de soportes que permitan constatar lo manifestado por el señor Oscar Orlando Castro Roa representante legal &NGECON referente a la ampliación del plazo de entrega.

Aumentar el contraste

Procesos | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a

Escritorio → Gestión de mensajes → Gestión de mensajes → **Detalles del mensaje**

Volver

Detalles de mensaje

Referencia interna: 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023

Descripción del proceso ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1.

De: COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1

Usuario: MARTHA LUCIA LEIVA SANCHEZ

Fecha: 13 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 4:56:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Para: &NGECON S.A.S;

Referencia del mensaje CO1.MSG.5605958

Tipo de mensaje: General

Asunto: Sustentación de solicitud de adicion en tiempo corregida contrato 105


Texto de mensaje

buenas tardes, en atención a su solicitud, y siguiendo instrucciones del especialista juridico , que una vez revisadas las razones de solicitud de prorroga, se requiere allegue la sustentación -soportes

El motivo de esta solicitud es por aspectos técnicos de consecución de las herramientas en el mercado por las especificaciones y tipo de referencias que la Entidad está solicitando.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS
FAC-S-2023-226944-CI

10. El día 27 de noviembre del 2023 se recibe respuesta por parte del por el señor Oscar Orlando Castro Roa representante legal &NGECON, donde manifiesta inconvenientes para la adquisición de los elementos por sus características técnicas, pero no se evidencian los soportes solicitados.

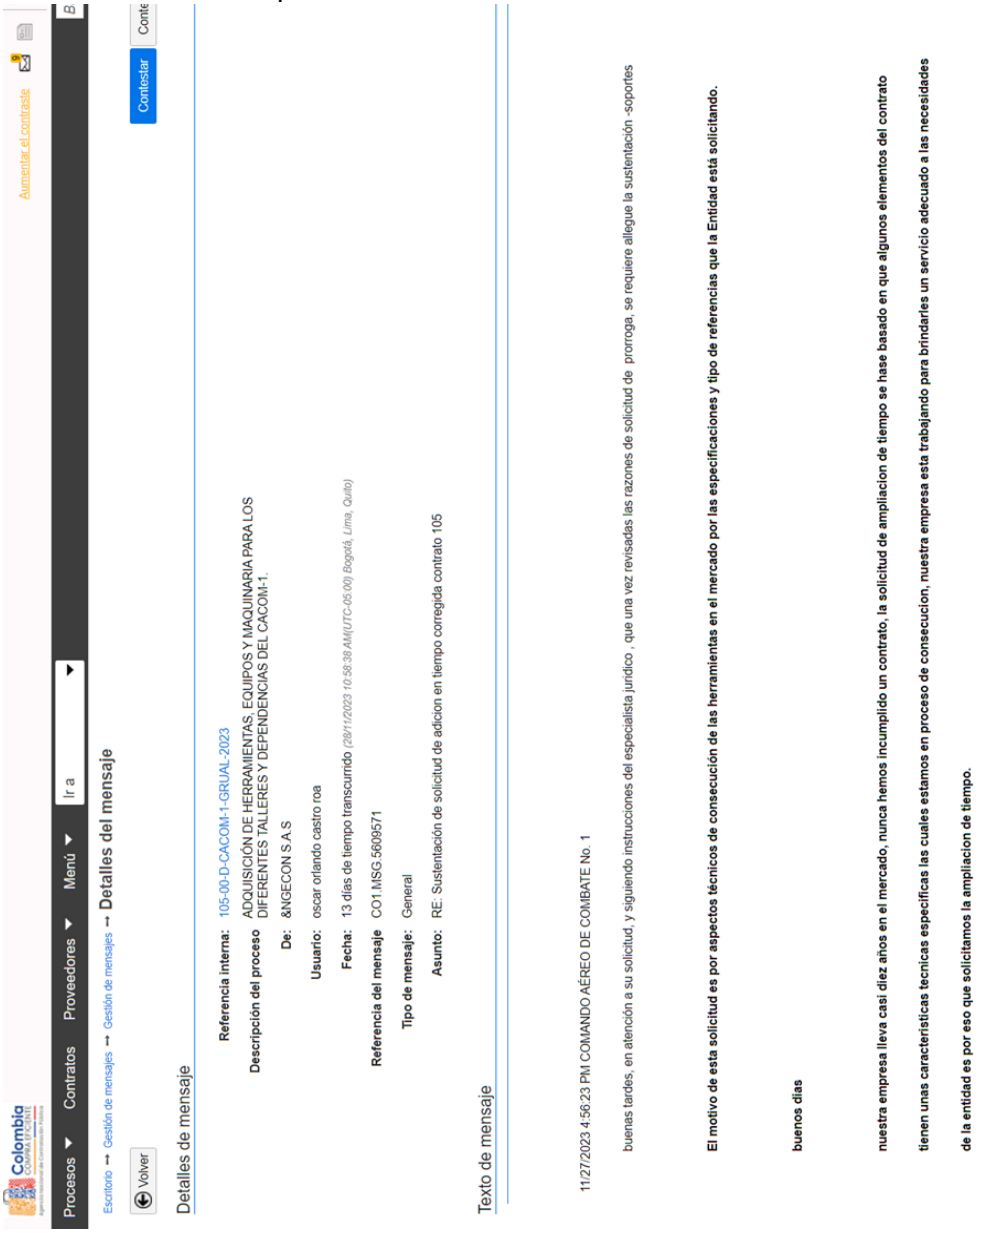

Procesos ▾ Contratos Proveedores ▾ Menú ▾ Ir a

Aumentar el contraste

Escritorio ↔ Gestión de mensajes ↔ Gestión de mensajes ↔ Detalles del mensaje

Volver

Contestar

Detalles de mensaje

Referencia interna: 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023

Descripción del proceso: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1.

De: &NGECON S.A.S

Usuario: oscar orlando castro roa

Fecha: 13 días de tiempo transcurrido (28/11/2023 10:58:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Referencia del mensaje: CO1.MSG.5609571

Tipo de mensaje: General

Asunto: RE: Sustentación de solicitud de adicion en tiempo corregida contrato 105

Texto de mensaje

11/27/2023 4:56:23 PM COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1

buenas tardes, en atención a su solicitud, y siguiendo instrucciones del especialista jurídico , que una vez revisadas las razones de solicitud de prorroga, se requiere allegue la sustentación -soportes

El motivo de esta solicitud es por aspectos técnicos de consecución de las herramientas en el mercado por las especificaciones y tipo de referencias que la Entidad está solicitando.

buenos días

nuestra empresa lleva casi diez años en el mercado, nunca hemos incumplido un contrato, la solicitud de ampliacion de tiempo se hase basado en que algunos elementos del contrato

tienen unas caracteristicas tecnicas especificas las cuales estamos en proceso de consecución, nuestra empresa esta trabajando para brindarles un servicio adecuado a las necesidades

de la entidad es por eso que solicitamos la ampliacion de tiempo.

11. El 28 de noviembre del 2023 mediante oficio No FAC-S-2023-035750-CE del 28 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESTEL-RAAYA, se le solicita al señor contratista la definición de una nueva fecha para la entrega de los elementos, teniendo en cuenta que, según lo manifestado vía telefónica, la fecha 30 de noviembre del 2023 que inicialmente había establecido para el primer modificatorio ya no lo era viable puesto que no disponía de los elementos para su entrega.
12. El día 29 de noviembre del 2023 se hace una aclaración mediante oficio No FAC-S-2023-035829-CE del 29 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM, que la fecha limite para la entrega de los elementos que se podría extender el proceso mediante un nuevo modificatorio sería el 06 de diciembre del 2023
13. El día 29 de noviembre se recibe mediante el SECOP II la respuesta por parte del contratista referente al oficio No FAC-S-2023-035750-CE

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT 900781282-5

Cálculos estructurales, diseños hidráulicos y sanitarios, consultoría, interventoría, diseño y construcción de Obras Civiles en General.

Facatativá Cundinamarca, noviembre 29/2023

Señores
FUERZA AROESPACIAL COLOMBIANA
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1
Técnico Tercero **JOHANNY ANTONIO QUINTERO YEPES**
Técnico Operario Radioayudas y Ayudas Aeroportuarias

ASUNTO: repuesta a oficio FAC-S-2023-035750-CE

OBJETO: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1.

Oscar Orlando Castro Roa, identificado como aparece al pie de mi firma y obrando en calidad de Representante Legal de **&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S. Nit 900781282-5**, muy respetuosamente se pide sea concedida la prórroga del contrato **No. 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023.** que tiene por objeto "**ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1**¨ en los tiempos solicitados por nuestra empresa, ya que como se explico en la solicitud de prorroga tenemos algunos inconvenientes técnicos que superar, por este motivo se pide nuevamente el favor sea considerada la fecha que solicitamos con el fin de no tener mas inconvenientes de tiempo al hacer la entrega.

&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 900781282-5
OSCAR ORLANDO CASTRO ROA
C.C. No. 11.438.286 expedida en Facatativa Cundinamarca
Representante Legal
Teléfono: 3125331075

14. El día 29 de noviembre se da respuesta mediante oficio No FAC-S-2023-035916-CE del 29 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESTEL-RAAYA, en el cual se indica que el plazo máximo que se propone para la entrega de los elementos será el día 07 de diciembre del 2023, para lo cual se solicito por escrito y con plazo 30 de noviembre del 2023 a las 11:00 la respuesta frente a la propuesta de prórroga.

15. El día 30 de noviembre del 2023 siendo las 13:32 se recibe respuesta por parte del contratista referente a la propuesta de prórroga:

&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S NIT **900781282-5**

Cálculos estructurales, diseños hidráulicos y sanitarios, consultoría, interventoría, diseño y construcción de Obras Civiles en General.

Facatativá Cundinamarca, noviembre 30/2023

Señores
FUERZA AROESPACIAL COLOMBIANA
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1
Técnico Tercero **JOHANNY ANTONIO QUINTERO YEPES**
Técnico Operario Radioayudas y Ayudas Aeroportuarias

OBJETO: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1.

Oscar Orlando Castro Roa, identificado como aparece al pie de mi firma y obrando en calidad de Representante Legal de **&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S. Nit 900781282-5**, muy respetuosamente se pide sea concedida la prórroga del contrato **No. 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023.** que tiene por objeto **"ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1"** me permito manifestar que no estamos de acuerdo, pero sin embargo aceptamos la adición en tiempo, cabe resaltar que los tiempos solicitados son necesarios para que podamos cumplir al 100 % con la entrega.

De otro lado no son necesarias las amenazas ya que nuestra empresa es una empresa seria y que quiere cumplir el objeto de la mejor manera.

&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 900781282-5
OSCAR ORLANDO CASTRO ROA
C.C. No. 11.438.286 expedida en Facatativa Cundinamarca
Representante Legal

16. El día 30 de noviembre mediante oficio No FAC-S-2023-220656-CI del 30 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESTEL-RAAYA, se solicita ante el señor ordenador del gasto sea tramitada la prorroga en la fecha de entrega de los elementos.

17. El día 30 de noviembre mediante oficio No FAC-S-2023-036036-CE del 30 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESTEL-RAAYA, se informa al señor contratista que fue recibida su aceptación a la propuesta de modificatorio y que se iniciaron los tramites para legalizar el modificatorio.

18. El día 01 de diciembre se logra constatar que el contratista firma atreves del SECOP II el modificatorio.

19. El día 04 de diciembre del 2023 y a solicitud del departamento de contratos se radica el documento No FAC-S-2023-036416-CE del 4 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESTEL-RAAYA, en el cual se le recuerda al contratista la necesidad de actualizar los amparos o pólizas, teniendo en cuenta la nueva fecha de entrega de los elementos.

20. El día 07 de diciembre el señor Oscar Representante Legal &ngecon hace presencia en la unidad militar, solicita hablar con el abogado de la unidad, se efectuar el desplazamiento inicialmente hacia el comando de la unidad y se efectúa una reunión en presencia de mi Teniente Gómez Oviedo Diana Carolina, con la participación de la Abogada (contratista) Jelly Sanchez Moreno, en mencionado encuentro el señor manifiesta no poder entregar la totalidad de los elementos, manifiesta que trae algunos de los elementos para ser entregados.

    Se le informa al Señor Oscar que no es posible efectuar una nueva modificación en el plazo de entrega, por lo cual es necesario iniciar el proceso para citación por presunto incumplimiento, el señor Oscar manifiesta que planea poder estar entregado los elementos faltantes con fecha miércoles 13 de diciembre del 2023.

    Posterior a la reunión se procede al almacén de misceláneos para dar buena disposición a los elementos. Posterior a la verificación de ficha técnica, oferta y marca, se recibieron los siguientes elementos (en color verde rubro inicial, color azul los elementos adicionados en el primer modificatorio):

    - Ítem 7 HIDROLAVADORA Presión máxima: 2.000 PSI Potencia: 1.600 W

ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Iva	Valor	Subtotal

C	RUBRO 02-01-01-004-003-09 OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS					
7	HIDROLAVADORA Presión máxima: 2.000 PSI Potencia: 1.600 W	1,00	UN	19%	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00

C	**RUBRO 02-01-01-004-003-09 OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS $ 1´500,000,00**					
7	HIDROLAVADORA Presión máxima: 2.000 PSI Potencia: 1.600 W	1	UN	19%	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00

Se recibieron 02 unidades por un **valor de ($3’000.000)**, cumpliendo con la totalidad de unidades de este ítem.

- Ítem 12 DESTORNILLADORES MAGNÉTICOS DE PRECISIÓN PARA PC

E	RUBRO 02 01 01 004 004 02 MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS					
12	DESTORNILLADORES MAGNÉTICOS DE PRECISIÓN PARA PC	2,00	JG	19%	$ 150.000,00	$ 300.000,00

12	DESTORNILLADORES MAGNÉTICOS DE PRECISIÓN PARA PC	2	JG	19%	$ 150.000,00	$ 300.000,00

Se recibieron 4 unidades por un **valor de ($300.000)**, cumpliendo con la totalidad de unidades de este ítem.

- Ítem 13 KIT DESTORNILLADORES Material: Acero aleado

E	RUBRO 02 01 01 004 004 02 MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS					
13	KIT DESTORNILLADORES Material: Acero aleado	1,00	JG	19%	$ 150.000,00	$ 150.000,00

13	KIT DESTORNILLADORES Material: Acero aleado	1	JG	19%	$ 150.000,00	$ 150.000,00

Se recibieron 02 unidades por un **valor de ($300.000)**, cumpliendo con la totalidad de este ítem.

- Ítem 19 PULIDORA 4 1/2 PULGADAS Voltaje 12 V Velocidad: 11000 RPM Potencia: 820 W

E	RUBRO 02 01 01 004 004 02 MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS					
19	PULIDORA 4 1/2 PULGADAS Voltaje 12 V Velocidad: 11000 RPM Potencia: 820 W	1,00	UN	19%	$ 165.000,00	$ 165.000,00

19	PULIDORA 4 1/2 PULGADAS Voltaje 12 V Velocidad: 11000 RPM Potencia: 820 W	1	UN	19%	$ 165.000,00	$ 165.000,00

Se recibieron 02 unidades por un **valor de ($330.000),** cumpliendo con la totalidad de este ítem.

- Ítem 20 PULIDORA DE 7 PULGADAS Velocidad: 8500 RPM Potencia: 2200 W

E	RUBRO 02 01 01 004 004 02 MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS					
20	PULIDORA DE 7 PULGADAS Velocidad: 8500 RPM • Potencia: 2200 W	2,00	UN	19%	$ 300.000,00	$ 600.000,00
20	PULIDORA DE 7 PULGADAS Velocidad: 8500 RPM • Potencia: 2200 W	2	UN	19%	$ 300.000,00	$ 600.000,00

Se recibieron 04 unidades por un **valor de ($600.000)**, cumpliendo con la totalidad de este ítem.

- Ítem 22 TALADRO DE 800 W Tipo: Taladro percutor

E	RUBRO 02 01 01 004 004 02 MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS					
22	TALADRO DE 800 W Tipo: Taladro percutor	1,00	UN	19%	$ 800.000,00	$ 800.000,00
22	TALADRO DE 800 W Tipo: Taladro percutor	1	UN	19%	$ 800.000,00	$ 800.000,00

Se recibieron 02 unidades por un **valor de ($1’600.000)**, cumpliendo con la totalidad de este ítem.

- Ítem 23 TALADRO DE 550W Tamaño del mandril: media pulgadas

E	RUBRO 02 01 01 004 004 02 MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS					
ítem	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Iva**	**Valor**	**Subtotal**
23	TALADRO DE 550W Tamaño del mandril: media pulgadas	1,00	UN	19%	$ 200.000,00	$ 200.000,00
23	TALADRO DE 550W Tamaño del mandril: media pulgadas	1	UN	19%	$ 200.000,00	$ 200.000,00

Se recibieron 02 unidades por un **valor de ($400.000)**, cumpliendo con la totalidad de este ítem.

- Ítem 33 AZADONES CON CABO DE MADERA Material: acero carbono con mango en madera

J	RUBRO 02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)					
33	AZADONES CON CABO DE MADERA Material: acero carbono con mango en madera	5,00	UN	5%	$ 35.000,00	$ 175.000,00

J	**RUBRO 02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) $ 665,000,00**					
33	AZADONES CON CABO DE MADERA Material: acero carbono con mango en madera	1	UN	5%	$ 35.000,00	$ 35.000,00

Se reciben 02 unidades por un **valor de ($70.000)**, quedan pendientes 04 unidades de este ítem.

- Ítem 36 MACHETES Material: Acero Inoxidable

J	RUBRO 02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)					
36	MACHETES Material: Acero Inoxidable	25,00	UN	5%	$ 25.000,00	$ 625.000,00

36	MACHETES Material: Acero Inoxidable	5	UN	5%	$ 25.000,00	$ 125.000,00

Se reciben 24 unidades por un **valor de ($600.000),** quedan pendientes 6 unidades de este item.

- Ítem 38 PELA CABLE para cortar o pelar cable de 0.5 a 4mm aproximadamente. Cuenta con un tornillo.

J	RUBRO 02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)					
38	PELA CABLE para cortar o pelar cable de 0.5 a 4mm aproximadamente. Cuenta con un tornillo	6,00	UN	19	$ 20.000,00	$ 120.000,00

38	PELA CABLE para cortar o pelar cable de 0.5 a 4mm aproximadamente. Cuenta con un tornillo	5	UN	19	$ 20.000,00	$ 100.000,00

Se recibe 01 unidad por un **valor de ($20.000)**, quedan pendientes 10 unidades de este ítem.

- Ítem 39 CARGADOR DE BATERIAS PARA PLANTAS ELECTRICAS Velocidad de carga continua 10 A carga rápida | 2 A carga lenta.

K	RUBRO 02-02-01-004-006-02 APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS					
39	CARGADOR DE BATERIAS PARA PLANTAS ELECTRICAS Velocidad de carga continua 10 A carga rápida | 2 A carga lenta	3,00	UN	19%	$ 320.000,00	$ 960.000,00

Se reciben 03 unidades por un **valor de ($960.000)**, cumpliendo con la totalidad de elementos de este ítem.

- Ítem 40 LAMPARA LED PARA MANTENIMIENTO 300 LM 1 batería ION Litio 2x más tiempo de vida y mayor velocidad de carga.

L	RUBRO 02-02-01-004-006-05 10 LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA					
40	LAMPARA LED PARA MANTENIMIENTO 300 LM 1 batería ION Litio 2x más tiempo de vida y mayor velocidad de carga.	1,00	UN	19%	$ 180.000,00	$ 180.000,00

Se recibe 01 unidad por un **valor de ($180.000)**, cumpliendo con la totalidad de elementos de este ítem.

ESPACIO EN BLANCO

En referencia con el CDP N. 5623

Imputación presupuestal CDP N. 5623	Concepto del rubro	Valor total comprometido
02-01-01-004-003-02	bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas	$2´350.000,00
02-01-01-004-003-05	equipo de elevación y manipulación y sus partes y piezas	$ 13´200.000,00
02-01-01-004-003-09	otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	$ 3´000.000.00
02-01-01-004-004-01	maquinaria agropecuaria o silvícola y sus partes y piezas	$ 6´000.000,00
02-01-01-004-004-02	máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	$ 23´945.000,00
02-01-01-004-008-02	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios	$ 5´115.000.00
02-01-01-004-008-03	instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes, piezas y accesorios –	$ 295.000.00
02-01-01-004-009-09-3	vehículos n. c. p. sin propulsión mecánica	$ 1´800.000.00
02-02-01-003-008-09	otros artículos manufacturados n. c. p.	240.000.00
02-02-01-004-002	productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	$ 2´455.000.00
02-02-01-004-006-02	aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	$ 960.000.00
02-02-01-004-006-05	lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas	$ 735.000.00
	TOTAL	$ 60´095.000,00

El presupuesto del contrato esta por un **valor de $60’095.000,00,** de los cuales a la fecha han sido ejecutados por el contratista un total de **$8’360.000,00** que corresponde un porcentaje del 13.91%, del presupuesto del contrato.

Razón por la cual como supervisor principal del contrato No.105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1, respetuosamente informo del incumplimiento teniendo en cuenta se encuentra pendiente la entrega del **86.08%** que corresponden a la suma de **$51’735.000** representado en los bienes objeto del contrato y que según el modificatorio N°2 debían ser entregados el día 07 de diciembre del 2023.

ANEXO CLAUSULADO ADICIONAL AL SEGUNDO MODIFICATORIO A LA ACEPTACION DE OFERTA No. 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MDN- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, NIT 800.141.624-2 e INGECON CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900.781.282-5

Entre los suscritos: El señor coronel NAILY AKID GANEM HERNANDEZ , identificado con CC No 94.528 227 expedida en Cali, mayor de edad, domiciliado en Puerto Salgar Cundinamarca Comando Aéreo de Combate No. 1, quien actúa en calidad de Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del Comando Aéreo de Combate No. 1, cargo para el cual fue nombrado mediante articulo No. 1 de la Resolución No. 204 del 25 de febrero de 2022, debidamente facultado mediante la Resolución Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022 , y por las que la modifiquen, adicionen o complementen, para adelantar procesos de contratación en cuantía de 0 a 5.000 S.M.L.M.V, quien representa a La Nación - Ministerio de Defensa Nacional –Fuerza Aeroespacial Colombiana**-COMANDO AÉREO DE COMBATE N.1, NIT 800.141.624-2**, por una parte; y por la otra, el señor OSCAR ORLANDO CASTRO ROA, identificado con CC No. 11.438.286 expedida en Facatativá-Cundinamarca, quien actúa en representación legal de **INGECON CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900.781.282-5**, firma con domicilio en calle 4 5-94 barrio resbalón – Facatativá - Cundinamarca , teléfonos fijo 601-8436995 móvil 3125331075, correo electrónico *ingeconconstrucciones@hotmail.com*, quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar una SEGUNDA MODIFICACIÓN al contrato, en los términos estipulados en las siguientes cláusulas:

Cláusula uno – Modifíquese el numeral 2.4 de la cláusula 2 del primer modificatorio

Conforme a los documentos No. FAC-S-2023-035916-CE del 29-nov-2023- con asunto - respuesta petición prorroga / Respuesta del representante legal de INGECON SAS/ No FAC-S-2023-220656-CI del 30 de noviembre de 2023-Solicitud Tramite Prorroga por parte del supervisor al Ordenador/ No FAC-S-2023-220769-CI del 30 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-DECON viabilidad jurídica, se amplía la fecha de entrega de todos los bienes, quedando de la siguiente manera:

2.4. Plazo de ejecución:

El CONTRATISTA deberá hacer una única entrega de los elementos al supervisor, teniendo como plazo **hasta el 07 de diciembre del 2023.**

Lo anterior son sustento en el contrato y más puntualmente en las cláusulas incumplidas:

Clausula No. 1- Segundo modificatorio (por medio del cual se modificó el numeral 2.4 de la cláusula 2 del primer modificatorio) plazo de ejecución “El CONTRATISTA deberá hacer una

única entrega de los elementos al supervisor, teniendo como plazo hasta el 07 de diciembre del 2023".

Clausula No. 2- Modificación a las coberturas de riesgos -Garantías.

Cordialmente.

Johanny Quintero

Técnico Tercero JOHANNY ANTONIO QUINTERO YEPES
Técnico Operario Radioayudas y Ayudas Aeroportuarias

Anexo: Número de folios (si los hay)
CT. GIRALDO / SEPLA; TE. MARULANDA / DECON; T1. DUQUE / MANIN; TE. GOMEZ / ESADM; TS19. LEIVA / DECON

Elaboró: T3. QUINTERO / RAAYA Revisó: Aprobó:T3. QUINTERO / RAAYA
