1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS.		
Número:	23000368-A-02-H3	**Fecha:**	02/12/2023
Objeto: 33400C0252 REALIZAR CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y/O TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS Y LA RESPECTIVA COMPENSACION FORESTAL POR LOTES AEROPUERTOS DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE - LOTE 2			
Contratista:	FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA – FUNAGUA		
Interventor y/o Supervisor:	SUPERVISOR: MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ APOYO A LA SUPERVISIÓN: JHON JAIRO SALAZAR CABRERA		
Valor inicial del contrato:	$ 118.028.771,36 IVA INCLUIDO M/CTE.		
Plazo inicial de ejecución del contrato:	HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.		
Fecha de inicio del contrato:	04 de octubre del 2023	**Fecha de terminación del contrato:**	Hasta 23 diciembre del 2023

PRÓRROGAS	
Número de Prórroga	**Plazo**
1. N/A	N/A
2.	
3.	
Fecha de terminación final del contrato de acuerdo con la(s) prórroga(s):	

ADICIONES	
Número de Adición	**Valor ($)**
1. N/A	N/A
2.	
3.	
Valor total del contrato:	

SUSPENSIONES	
Número del Acta de Suspensión	**Tiempo**
1. N/A	N/A.
2.	
3.	
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:	

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSÍ)		
Número de la Modificación	**Cláusula Nº**	**Descripción**
1. N/A	N/A	N/A
2.		
3.		

CESIONES	
Cedente	**Cesionario**
1. N/A	N/A
2.	
3.	

SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD		
Causal	**Acto Administrativo**	**(Clase de Sanción)**
1. N/A	N/A	N/A
2.		
3.		

GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	23000368-A-02-H3							
CONTRATISTA	FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA- NIT 805.029.261-2							
OBJETO	33400C0252 REALIZAR CONTROL DE VEGETACION MEDIANTE PODA Y/O TALA DE INDIVIDUOS ARBOREOS Y LA RESPECTIVA COMPENSACION FORESTAL POR LOTES AEROPUERTOS DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE.							
VALOR INICIAL	CIENTO DIECIOCHO MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($118.028.771.36) INCLUIDO IVA							
PLAZO INICIAL	HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INCIO.							
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA**	**NÚMERO** 430-47-994000062871		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**			**NÚMERO** 0	
ASEGURADOR	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT 860.524.654-6**							
AMPAROS	**VIGENCIAS**							
	DESDE			**HASTA**				
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
CUMPLIMIENTO	12	09	2023	23	04	2024	$23,605,754.20	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12	09	2023	23	12	2026	$23,605,754.20	
CALIDAD DEL SERVICIO	12	09	2023	23	06	2024	$23,605,754.20	
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**NÚMERO** 430-74-994000023211		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**			**NÚMERO** 0	
ASEGURADOR	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT 860.524.654-6**							
AMPAROS	**VIGENCIAS**							
	DESDE			**HASTA**				
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, DAÑO EMERGENTE, LUCRO CESANTE,PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES,VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS, AMPARO PATRONAL.	12	09	2023	23	04	2024	$232,000,000.00	

2. ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Se deja constancia del estado de ejecución contractual a la fecha de la presente Solicitud, como se relaciona a continuación:

2.1 ESTADO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato lleva una ejecución a corte del mes de noviembre un porcentaje correspondiente al 52,12 %

2.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL

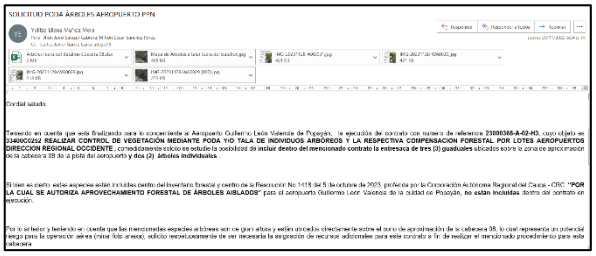
ACTAS PARCIALES OBRA								
No.	**VALOR ACTAS**	**VALOR ACUMULADO ACTAS PARCIALES**	**% EJECUCION**	**TOTAL A PAGAR**	**ACUMULADO**	**SALDO POR PAGAR**	**PERIDO DE FACTURACION**	
ACTA COBRO PARCIAL No.1	$ 61.517.050,00	$ 61.517.050,00	52,12%	$ 61.517.050,00	$ 61.517.050,00	$ 56.511.721,36	4 de octubre de 2023	11 de noviembre de 2(

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

En mi calidad de supervisor/interventor del contrato cuyos datos se han enunciado, con fundamento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, de acuerdo con el cual *"(…) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración*.", con el fin de garantizar la eficacia del contrato de la referencia, solicito:

TIPO DE MODIFICACIÓN	ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN
PRÓRROGA	26 de diciembre de 2023
ADICIÓN	**VALOR EN NÚMEROS:** $ 45.000.000 **VALOR EN SMMLV**: 38,79 **DESCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL ALCANCE TÉCNICO DEL CONTRATO:** Considerando que, la Ley 336 de 1996 el Capítulo IV - RESTRICCION Y ELIMINACION DE OBSTACULOS - del Anexo 14 del Convenio de Aviación Civil Internacional suscrito en la ciudad de Chicago, USA y aprobado por el Gobierno Colombiano mediante la Ley 12 de 1947, establece como finalidad "Definir el espacio aéreo que debe mantenerse libre de obstáculos alrededor de los aeródromos para que puedan llevarse a cabo con seguridad las operaciones de aviones previstas y evitar que los aeródromos queden inutilizados por la multiplicidad de obstáculos en sus a/rededores.

El día 30 de noviembre de 2023 la gerencia del aeropuerto Guillermo León Valencia de la cuidad de Popayán, mediante correo institucional manifestó la importancia de intervenir mediante trabajos de entresaca guaduales ubicados sobre la zona de aproximación de la cabecera 08 de la pista. Además, solicitó la intervención adicional dos (2) individuos arbóreos dicha cabecera, los cuales representan un potencial riesgo para la operación aérea.


SOLICITUD PODA ÁRBOLES AEROPUERTO PPN

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que está finalizando para la concesionaria Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, la ejecución del contrato con número de referencia **23000368-A-02-H3**, cuyo objeto es **23ARCO21U REALIZAR CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y/O TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS Y LA RESPECTIVA COMPENSACION FORESTAL POR LOTES AEROPUERTOS DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE**, comedidamente solicito se estudie la posibilidad de **incluir dentro del mencionado contrato la entresaca de tres (3) guaduales** ubicados sobre la zona de aproximación de la cabecera 08 de la pista del aeropuerto **y dos (2) Arboles individuales**.

El tipo en cuanto estas especies están incluidas dentro del inventario forestal y dentro de la Resolución No.1418 del 5 de octubre de 2023, proferida por la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC. **"POR LA CUAL SE AUTORIZA APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS"** para el aeropuerto Guillermo León Valencia de la cuidad de Popayán, **no están incluidas** dentro del contrato en ejecución.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que las mencionadas especies arbóreas son de gran altura y están ubicadas directamente sobre el cono de aproximación de la cabecera 08, lo cual representa un potencial riesgo para la operación aérea (vista foto aérea), solicito respetuosamente de ser necesaria la segregación de recursos adicionales para este contrato a fin de realizar el mencionado procedimiento para esta cabecera

Fuente: imagen extraída del correo institucional jhon.salazar@aerocivil.gov.co

El día 02 de diciembre de 2023, mediante correo electrónico institucional, se solicitó al contratista **FUNDACION AGUA VIVA "FUNAGUA**, cotización de actividades relacionadas en el documento nombrado "cotización Otrosí - Lote 2 - GPI -PPY", obteniendo como respuesta cotización con la respectiva firma del presentante legal.

Se resalta que las especies arbóreas correspondientes al aeropuerto Guillermo león valencia, se encuentras incluidas en la Resolución No.1418 del 5 de octubre de 2023, proferida por la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC. **"POR LA CUAL SE AUTORIZA APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS"** para el aeropuerto Guillermo León Valencia de la cuidad de Popayán.

Soportado lo anterior, en calidad de apoyo a la supervisión del contrato 23000368-A-02-H3, se emite concepto técnico favorable para llevar a cabo las actividades adicionales relacionadas a continuación de esa manera mitigar los riesgos para la operación aérea.

- **Aeropuerto Juan Casiano Solís de Guapi- Cauca**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	PODA Y/O TALA DE ARBOLES MADERABLES CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 2.0 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	47
4	RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL RESULTANTE DE LA PODA Y/O TALA DE ARBOLES	GBL	5

- **Aeropuerto Guillermo León Valencia De Popayán – Cauca**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	PODA Y/O TALA DE ARBOLES MADERABLES CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0.8 y 2.6 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	2
2	PODA Y/O TALA DE GUADUAL UBICADOS EN LA PARTE EXTERNA DEL AEROPUERTO	UNIDAD	95
3	RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL RESULTANTE DE LA PODA Y/O TALA	GBL	9

	OTRA	CLÁUSULA PARA MODIFICAR: ¿Cómo está? ¿Cómo se modificará?

EVIDENCIAS APORTADAS

Documento de solicitud de adición fechado el día 02 de diciembre 2023 donde se expresan los motivos de solicitud de adición No.1.

CONCEPTO INTERVENTOR O SUPERVISOR

Con el fin de mitigar los riesgos para la operación aérea, en calidad de supervisor se emite concepto técnico favorable para llevar a cabo Adición presupuestal al contrato 23000368-A-02-H3 de 2023 y ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el día 26 de diciembre de 2023 y a llevar a cabo la actividad referenciadas con anterioridad.

Firma: *Firmado el original*

Nombre: Jhon Jairo salazar cabrera

Cargo: Ingeniero contratista - Apoyo a la supervisión contrato 23000368-A-02-H3 de 2023
