	ACTA COMITÉ DE PROYECTO	Versión: 00
		Fecha: 20-09-2023
		Código: FO-SC25-01

ACTA No. 011			**FECHA:** 30 de noviembre de 2023
PROYECTO: SC25 – ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS INCLUYENTES Y DIVERSOS			**HORA DE INICIO**: 3:00 pm. **HORA DE FINALIZACIÓN:** 4:30 pm.
LUGAR: Bodega Asegest			
SISTEMA DE GESTIÓN:	**CALIDAD:** X	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:**	**MEDIO AMBIENTE:**
ELABORADA POR: Claudia Patricia Rincón Rodríguez			

ASISTENTES	
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**
Walter Steak Osorio Rodriguez	Profesional Subdirección de Cobertura DPI - MEN
Janneth Buitrago Parra	Profesional Subdirección de Calidad - MEN
Carmenza Botero Arango	Asesora Subdirección de Calidad - MEN
Juliana Silva Echeverri	Directora Ejecutiva - ASEGEST
Augusto Hernández Gracia	Coordinador - ASEGEST
Zoila Inés Tobón Cortes	Directora de interventoría – Interventoría CONSORCIO DOTACIÓN 2023
Claudia Patricia Rincón Rodríguez	Profesional de Gestión de Calidad - Interventoría
Juan Bautista Gutiérrez González	Profesional de Gestión de Calidad - Interventoría
Valerio Ferro Tovar	Profesional de Gestión de Calidad - Interventoría

Luego de elaborada el acta será enviada vía correo electrónico a los asistentes a la reunión, y en caso de comentarios a la misma serán incluidos, se dejará como soporte el envío y aceptación de la misma.

AGENDA:

1. **Seguimiento a bodega: Estado de ingreso, armado y despacho de kits**
2. **Compromisos y/o actividades adquiridas**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. **Seguimiento a bodega: Estado de ingreso, armado y despacho de kits**

A la fecha en cuanto al estado de ingreso de elementos, armado y despacho de los kits se tiene:

El contratista informa que tiene armado el 56% de los kits correspondientes al 50% a entregar en el 2023 (185 kits de la M2 y 210 kits de la M3)

El contratista informa que ha venido gestionando las concertaciones a través de Gonzalo (contacto brindado por el MEN) en Maicao para realizar las entregas entre el 4 y 6 de diciembre de 2023, y una vez tengan los ruteos en Uribia se compartirán también con él para determinar el acompañamiento de las entregas.

El día viernes 1 de diciembre se realizará despacho a Norte de Santander – Catatumbo y debido a la situación de seguridad de la zona el contratista se encuentra en busca acompañamiento de personas de la zona, ante lo que el MEN sugiere que se pueden apoyar también en la líder de la SED.

En cuanto a las novedades presentadas en los despachos, el contratista ha informado oportunamente vía correo electrónico las diferentes situaciones para acordar junto con la interventoría y el MEN.

Una de estas corresponde a los 15 municipios del cauca los cuales no es posible acceder debido a los enfrentamientos de fuerzas armadas en la zona, lo cual pone en riesgo la seguridad de los transportadores, esto fue notificado por el departamento de seguridad de la empresa transportadora; referente a esto el MEN informa que no es posible realizar las entregas en las secretarías debido al cambio de gobierno, se propone entonces que si bien no es posible acceder a las sedes rurales, se entreguen en las sedes principales ubicadas en el casco urbano, así mismo, y se sugiere hablar con los rectores para encontrar más posibilidades de realizar las entregas.

Se aclara por parte del MEN que al realizar la entregar de los kits en un sitio diferente a la sede focalizada, se debe contar con que el rector tenga la facilidad de transportar la dotación a la sede y así mismo ASEGEST debe asumir el costo de dicho traslado.

Desde la interventoría se recuerdan los plazos establecidos acorde al anexo técnico y que acorde a la solicitud de prórroga que se está gestionando, aplicaría para el 50% de los kits correspondientes a cada Macro región, con el fin de que el contratista realice las acciones pertinentes que permitan el cumplimiento de las fechas para cada uno de los hitos del anexo técnico, teniendo en cuenta que la prórroga no modificaría los plazos contractuales para el 50% de los kits a entregar en 2023.

- Armado y alistamiento de los kits:
    - MR2: 4 de diciembre de 2023 – 388 kits
    - MR3: 4 de diciembre de 2023 – 317 kits
- Distribución y entrega de los kits:
    - MR2: 11 de diciembre de 2023 – 388 kits
    - MR3: 11 de diciembre de 2023 – 317 kits

Se realiza un análisis de las cifras de armado y despacho a la fecha por la interventoría y se indica que según el promedio ejecutado, se establece como elemento crítico el tablero, dado que aun teniendo dos proveedores, estos tendrían que realizar entregas diarias sin devoluciones por calidad, es por esta razón el que contratista solicita al MEN aprobación para, de ser necesario, poder reemplazar el tablero imantado por un tablero acrílico


con las mismas dimensiones y adicionando 4 marcadores borrables y un borrador, propuesta que es aceptada por el MEN para un máximo de 100 unidades y sólo para los Kits a entregar en 2023, muestra que debe ser revisada y aprobada por parte de la interventoría.

Adicionalmente de sugiere desde el MEN reforzar el equipo que realiza las actividades de concertación y confirmación de las entregas para garantizar las entregas del 2023, las cuales deben ser concertadas y confirmadas, conforme los tiempos establecidos en el anexo técnico, antes del 7 de diciembre de 2023.

Se programa visita de seguimiento para la próxima semana, pendiente por confirmación fecha y hora.

2. Compromisos y/o actividades adquiridas en el presente comité:

ACTIVIDAD	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
Presentar muestra de tablero para aprobación de la interventoría	1/12/2023	ASEGEST

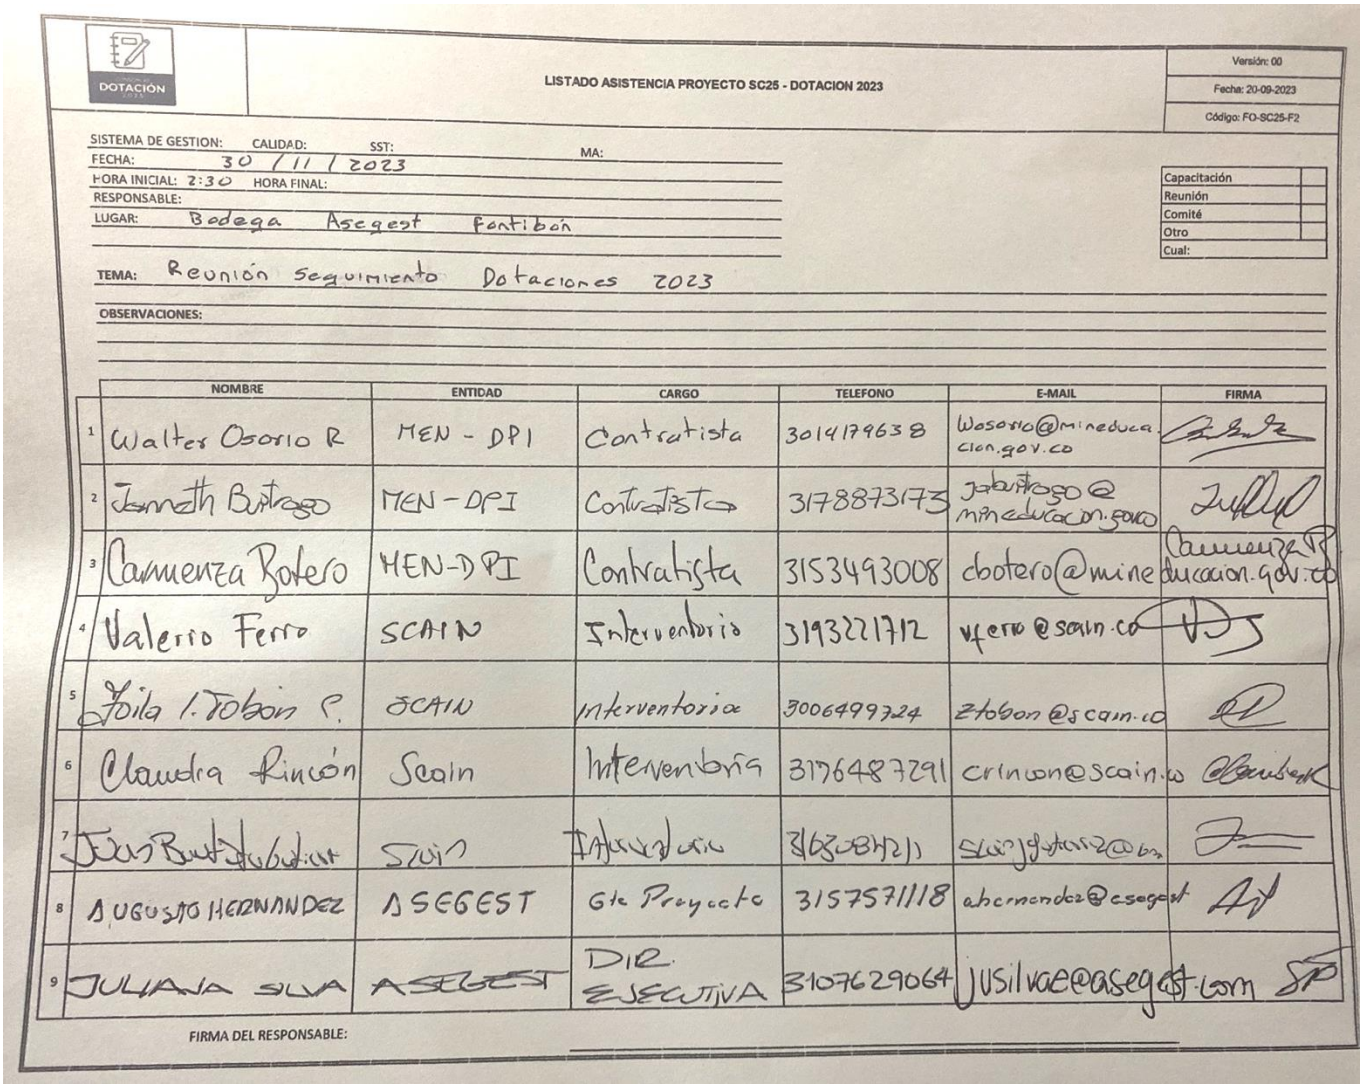

DOTACIÓN

LISTADO ASISTENCIA PROYECTO SC25 - DOTACION 2023

Versión: 00
Fecha: 20-09-2023
Código: FO-SC25-F2

SISTEMA DE GESTION: CALIDAD: SST: MA:
FECHA: 30 / 11 / 2023
HORA INICIAL: 2:30 HORA FINAL:
RESPONSABLE:
LUGAR: Bodega Asegest Fontibón

Capacitación	
Reunión	
Comité	
Otro	
Cual:	

TEMA: Reunión Seguimiento Dotaciones 2023

OBSERVACIONES:

	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
1	Walter Osorio R	MEN - DPI	Contratista	3014179638	Wosorio@mineducacion.gov.co	
2	Jaimeth Buitrago	MEN - DPI	Contratista	3178873173	jabuitrago@mineducacion.gov.co	
3	Carmenza Botero	MEN-DPI	Contratista	3153493008	cbotero@mineducacion.gov.co	
4	Valerio Ferro	SCAIN	Interventoria	3193221712	vferro@scain.co	
5	Zoila I. Tobon P.	SCAIN	interventoria	3006499724	ztobon@scain.co	
6	Claudia Rincón	Scain	Interventoría	3176487291	crincon@scain.co	
7	[illegible]	SCAIN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8	AUGUSTO HERNANDEZ	ASEGEST	Gte Proyecto	3157571118	ahernandez@asegest	
9	JULIANA SILVA	ASEGEST	DIR. EJECUTIVA	3107629064	JUsilvae@asegest.com	

FIRMA DEL RESPONSABLE:
