SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001
CONTRATO DE OBRA No. 021 DE 2023

SUPERVISOR: VANESSA KATHERINE RINCÓN GAVIRIA

APOYO A LA SUPERVISIÒN: JUAN JOSÉ ARIAS AGUIRRE
JULIAN ANDRES DIAZ AFANADOR

CONTRATISTA: HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 901.282.482

OBJETO: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL AREA PRODUCTIVA DE POSTCOSECHA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE GENOVA (ASOCIACIONES: ASOCORDILLERA, ASOCHAPOGEN, ASDEGEQUIN, ASOMERGEN, PORCIGENOVA Y ASSOCAFES), CENTRO LOGÌSTICO AGROINDUSTRIAL DE LA COOPERATIVA TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE CÒRDOBA Y DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INSTITUTO GÈNOVA, INSTITUCIÒN EDUCATIVA BAUDILIO MONTOYA, INSTITUTO BUENAVISTA, INSTITUCIÒN EDUCATIVA LUIS GRANADA MEJÌA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÌO"

1. DATOS GENERALES	
Modalidad de Contratación	Selección abreviada de menor cuantía
No. Proceso	040 de 2023
Tipo de Contrato	Obra pública
Secretaría que genera la necesidad y responsable de la elaboración del estudio previo.	Secretaría de Agricultura
Dependencia que genera el proceso	Secretaría de Agricultura
No. Del contrato	021 de 2023
Fecha de suscripción del contrato	01 de noviembre de 2023
Contratista	HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT / CC	901.282.482
Valor Inicial del Contrato	OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE ($81.213.170,18).
Forma de pago	El Departamento del Quindío cancelará al contratista el valor total del contrato, a precios unitarios y sin formula de

	de reajuste, mediante pagos parciales hasta llegar al cien por ciento (100%), así: La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales mensuales en Pesos Colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato. NOTA GENERAL: Todos los pagos quedan condicionados adicionalmente a que el contratista acredite el cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscal, a los que haya lugar en los términos de ley. Las actas de obra deberán ser suscritas por 8 el contratista y refrendadas por el supervisor del contrato, debiendo además ir acompañadas por los siguientes documentos: - Memorias de cálculo de cantidades. Balance de la ejecución de actividades. - Copia de bitácora del periodo a cancelar. - Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Laborales, Parafiscales, si hay lugar a ello), del respectivo periodo. - Factura de venta cumpliendo con las normas generales establecidas. - Certificado expedido por la persona encargada de la vigilancia y control del contrato que se suscriba, avalando el pago del respectivo periodo. - Copia de la pactación de precios (En caso de suscribirse). - Certificados de calidad de los materiales y equipos utilizados en los procesos constructivos, los que considere pertinentes el supervisor. - Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse). - Para el pago de la última acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de las obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes. - Notas aclaratorias: La Entidad no se hace

	responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. NOTA 1: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato
Plazo Inicial del contrato	El plazo de ejecución del contrato será de Cuarenta y Cinco (45) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. En todo caso no podrá exceder la vigencia 2023.
Fecha de inicio:	01 de noviembre de 2023
Fecha de suspensión:	N/P
Fecha de reinicio:	N/P
Fecha de terminación:	15 de diciembre de 2023
Modificación No. 001	N/P
Supervisor por parte del Departamento	VANESSA KATHERINE RINCÓN GAVIRIA

2. DATOS FINANCIEROS	
No. y valor del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	4486 del 13 de junio del 2023 por un valor de $ 85.000.000
No. y valor Registro Presupuestal	10346 de 26 de octubre de 2023 por un valor de $ 81.213.170,18

3. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA:

Inicialmente, se realiza una visita preliminar los espacios vinculados al contrato con el fin de conocer el estado de ellos, el proceso se lleva a cabo de manera continua y sin ningún contratiempo ejecutando así todas las actividades pactadas en el presupuesto contratado.

Se realizaron comités de obra para la verificación del avance y estado del proceso contractual los días 16 de noviembre, 23 de noviembre, 30 noviembre y 7 de diciembre

Se hicieron 6 frentes de trabajo para abordar todas las edificaciones a mejorar, donde estos realizaron actividades de rasqueteo y pintura, revoque, cambio de cubierta, pintura de pisos, instalación de cerramiento

Los frentes de trabajo que se abordaron, fueron:

I.E BAUDILIO MONTOYA

I.E INSTITUTO GENOVA

I.E INSTITUTO BUENA VISTA


CENTRO LOGISTICO AGROPECUARIO
COOPERATIVA TERRITORIO NUESTRO

AREA PRODUCTIVA DE POSCOCECHA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE GENOVA


I.E LUIS GRANADA MEJIA

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Visita técnica 3 de noviembre de 2023

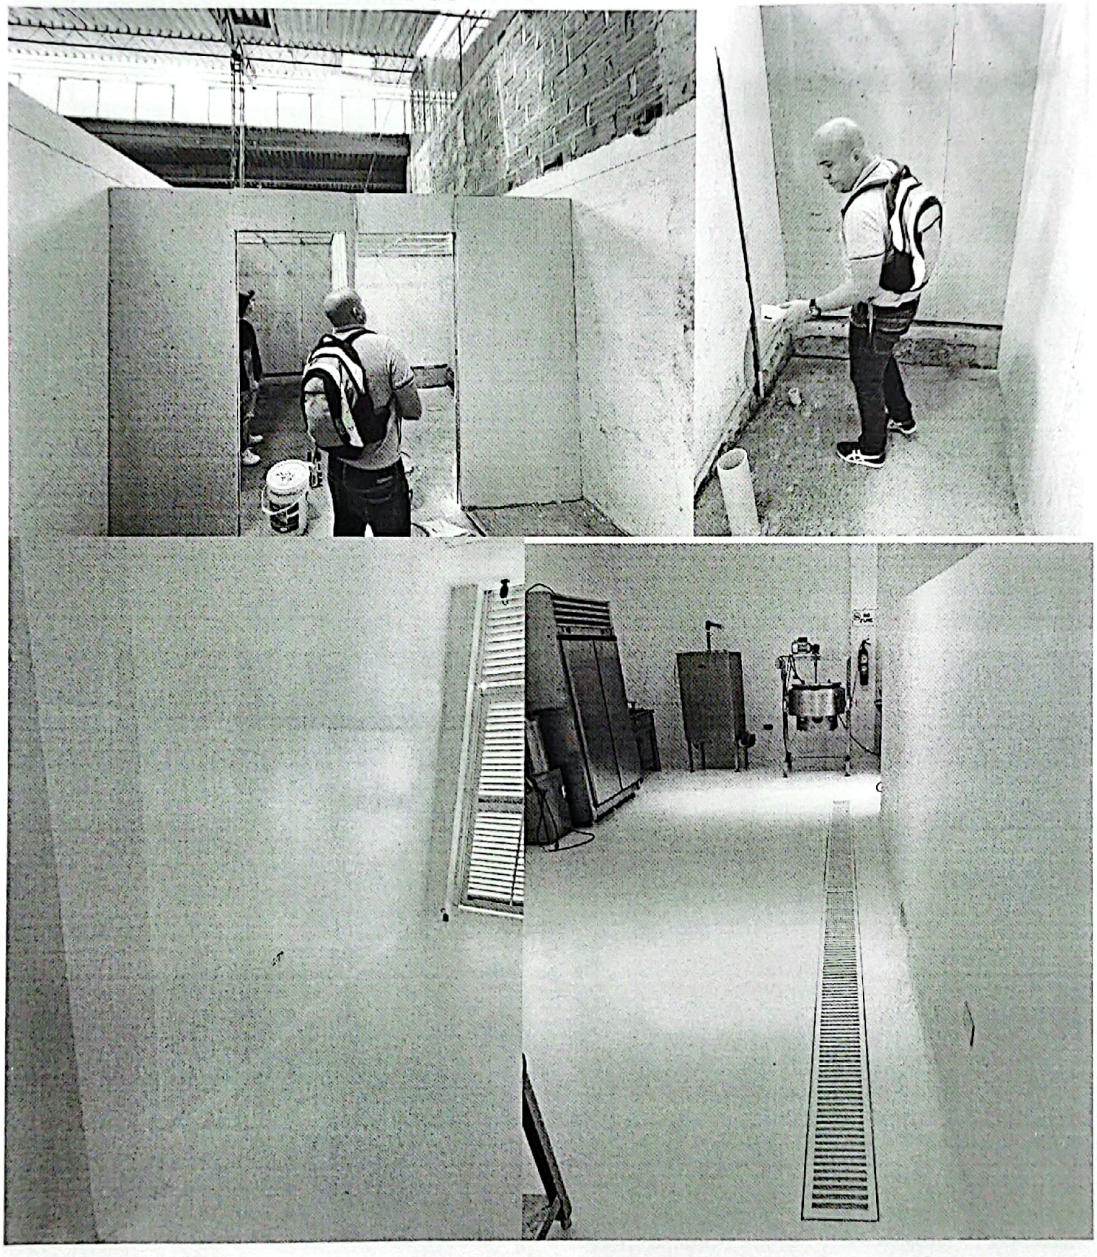


Visita técnica 16 de noviembre de 2023

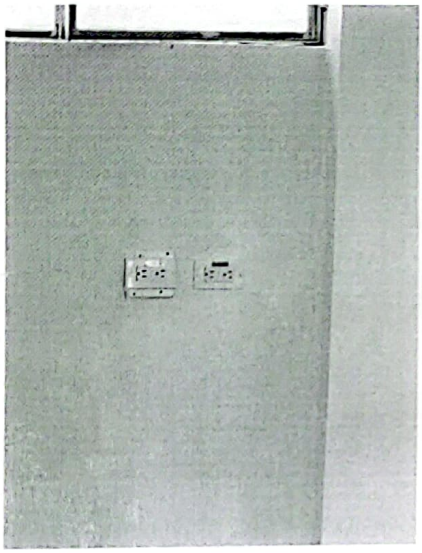





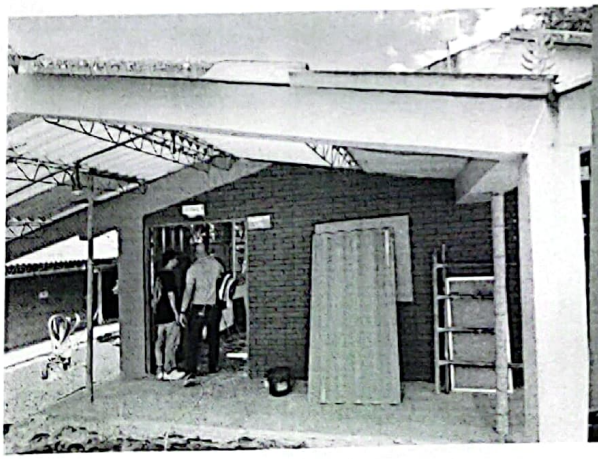

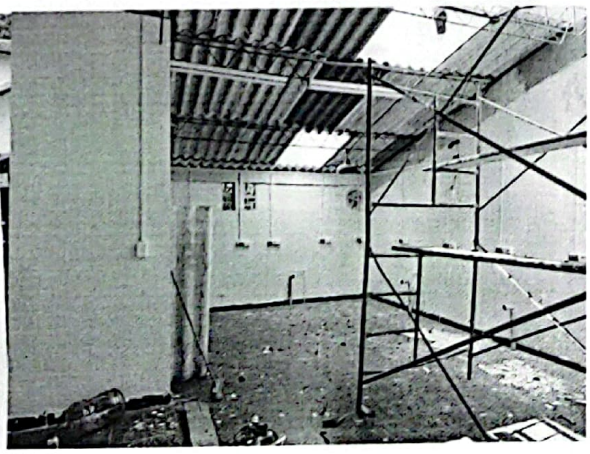


Visita técnica 23 de noviembre de 2023

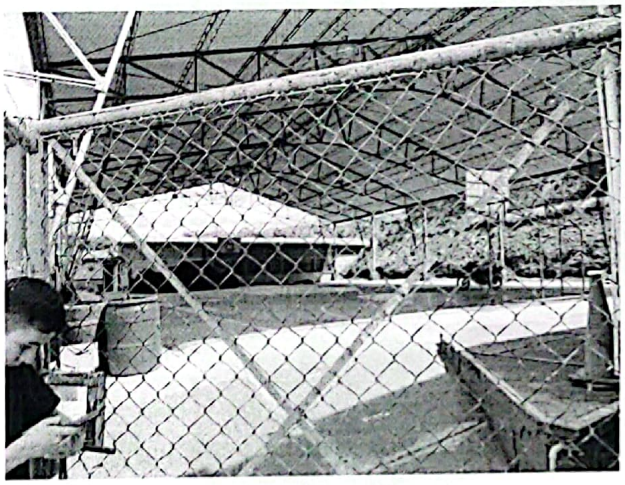


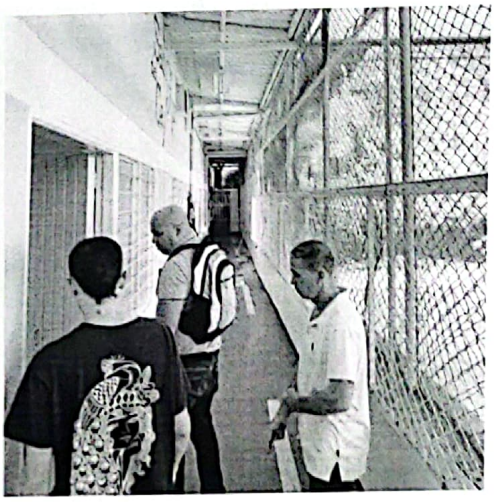


Visita técnica 30 de noviembre de 2023

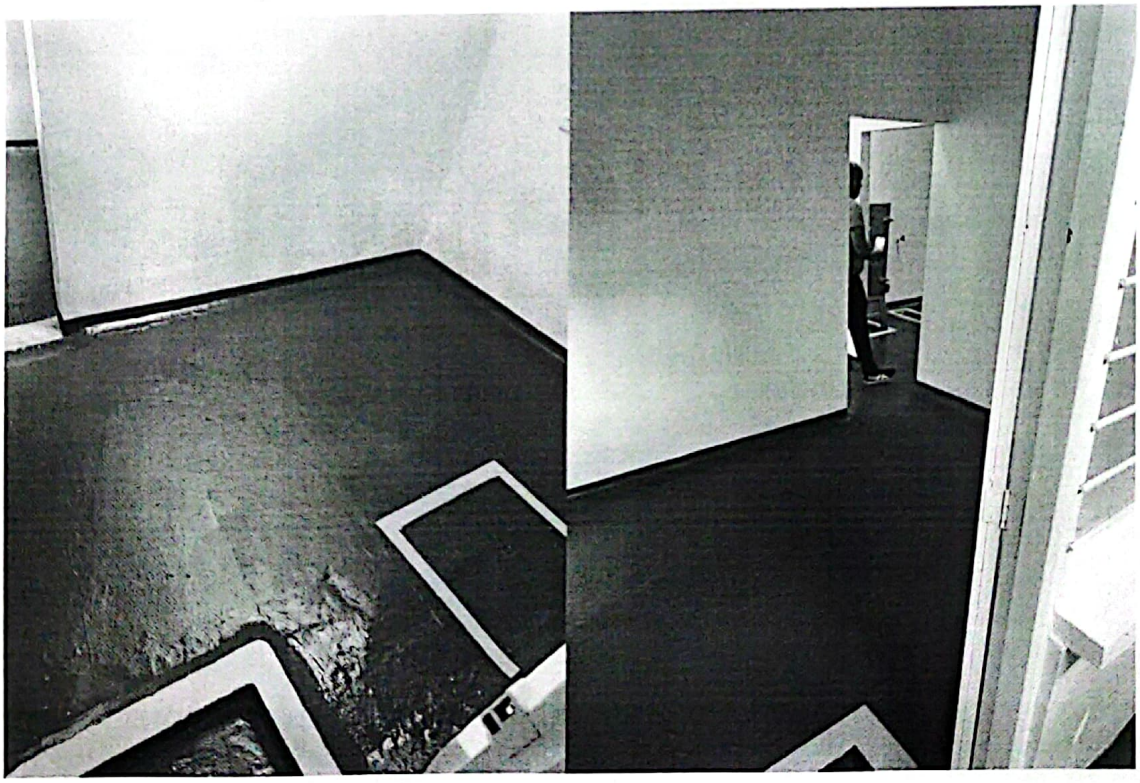


Visita técnica 07 de diciembre de 2023

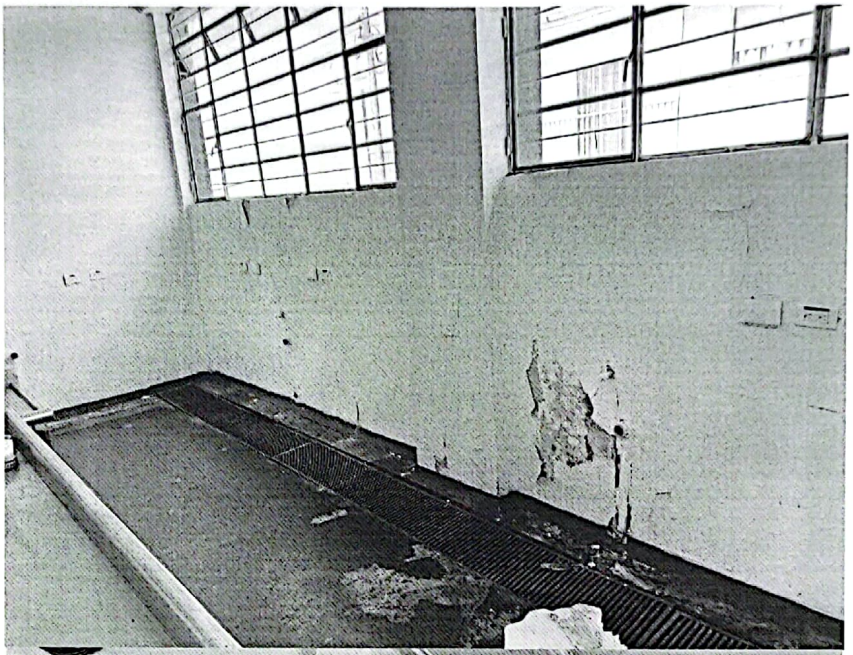

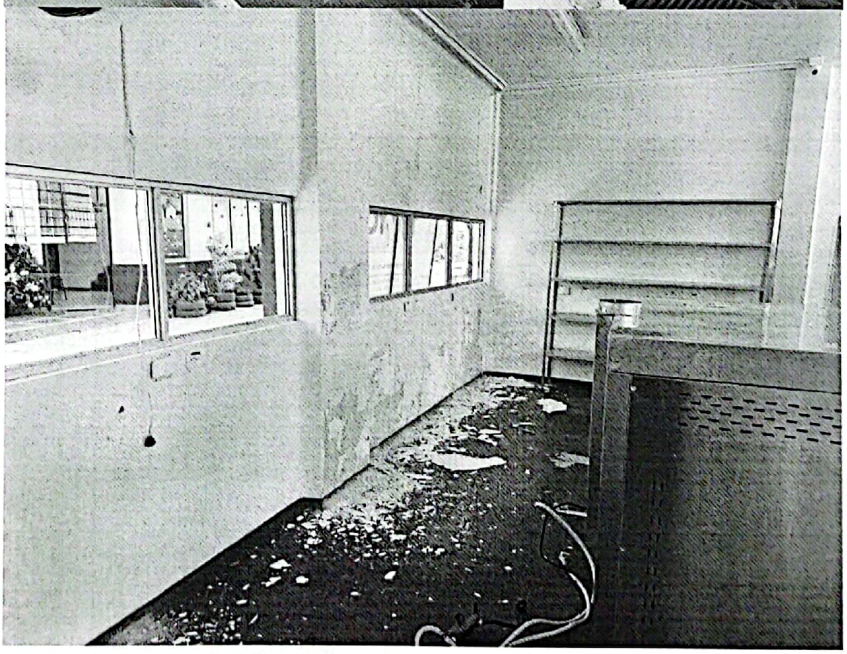

5. RESUMEN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

A continuación, se observa cada una de las actividades ejecutadas, según el presupuesto oficial y los ítems contratados:

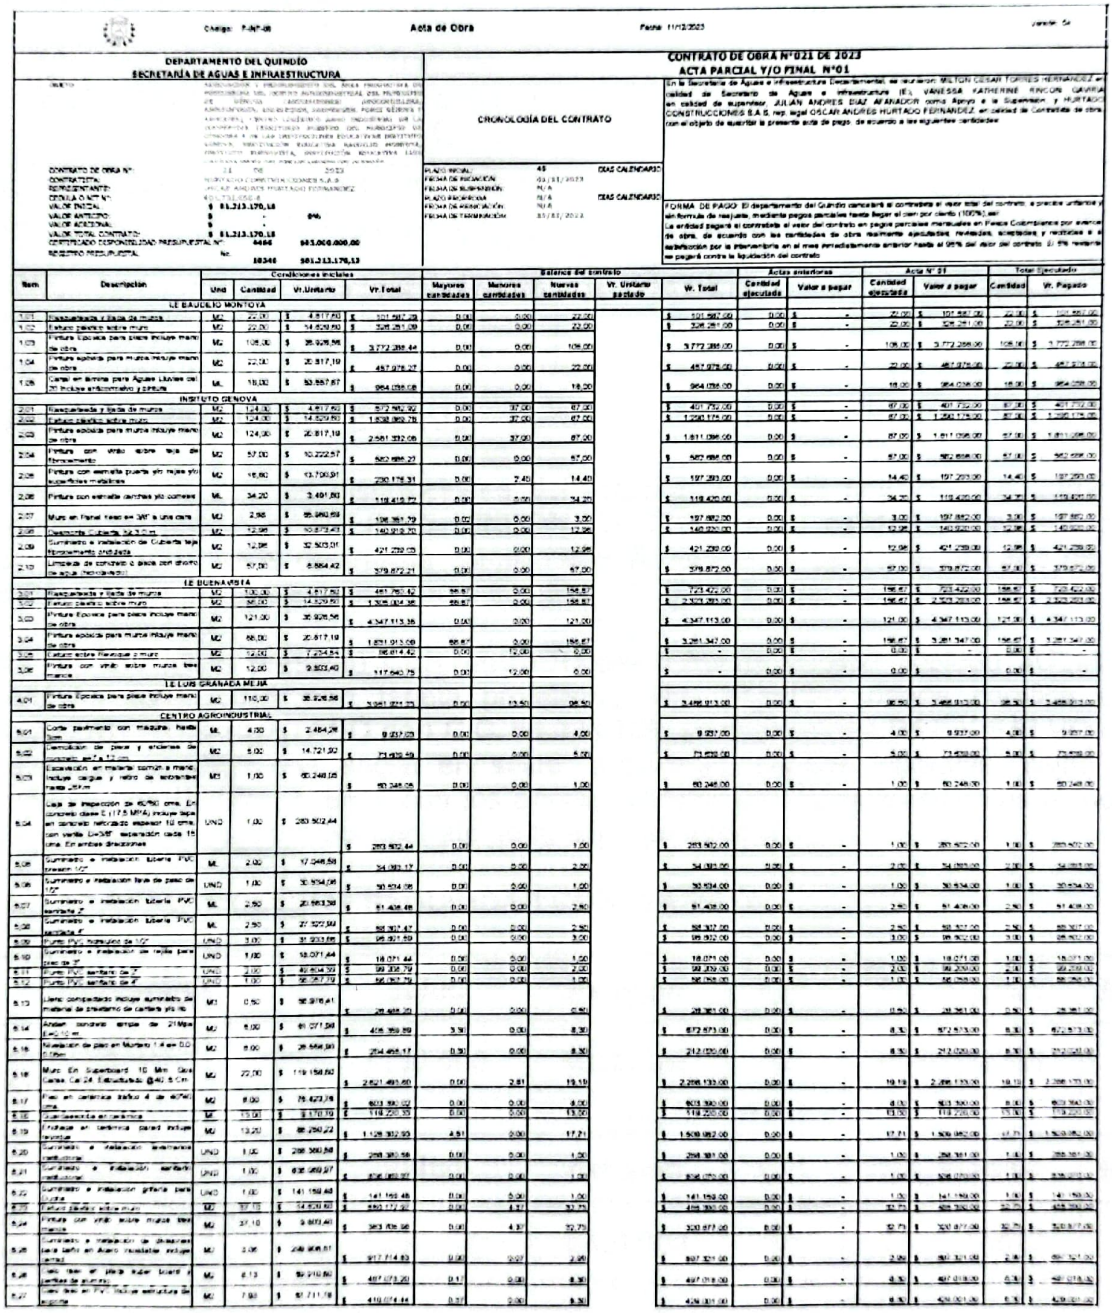

Código: F-INF-08 — Acta de Obra — Fecha: 11/12/2023 — Versión: 04

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N°021 DE 2023
ACTA PARCIAL Y/O FINAL N°01

OBJETO: [illegible]

CONTRATO DE OBRA N°: 021 DE 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES S.A.S.
REPRESENTANTE: OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
CEDULA O NIT N°: 901.[illegible]-4
VALOR INICIAL: $ 81.313.170,13
VALOR ANTICIPO: $ - 0%
VALOR ADICIONAL: $ -
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 81.313.170,13
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 4464 DE 2023 $81.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 10346 DE 2023 $81.313.170,13

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL: 45 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN: 03/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
PLAZO ADICIONAL: N/A DIAS CALENDARIO
FECHA DE PRORROGACIÓN: N/A
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/01/2024

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: MILTON CESAR TORRES HERNANDEZ en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura (E), VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA en calidad de supervisor, JULIAN ANDRES DIAZ ARANGUREN como Apoyo a la Supervisión y HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S. rep. legal OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ en calidad de Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago de acuerdo a las siguientes cantidades:

FORMA DE PAGO: El departamento del Quindío cancelará al contratista el valor total del contrato, o precios unitarios y sin formula de reajuste, mediante pagos parciales hasta llegar al cien por ciento (100%) así:
La entidad pagará al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales en Pesos Colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante se pagará contra la liquidación del contrato.

Item	Descripción	Condiciones iniciales: Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Balance del contrato: Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario ajustado	Vr. Total	Actas anteriores: Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Acta N° 01: Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Total Ejecutado: Cantidad	Vr. Pagado
	I.E BAUDILIO MONTOYA															
1.01	Descapotada y tala de maleza	M2	22,00	$ 4.617,62	$ 101.587,28	0,00	0,00	22,00		$ 101.587,00	0,00	$ -	22,00	$ 101.587,00	22,00	$ 101.587,00
1.02	Retiro plastico sobre muro	M2	22,00	$ 14.529,60	$ 324.251,09	0,00	0,00	22,00		$ 324.251,00	0,00	$ -	22,00	$ 324.251,00	22,00	$ 324.251,00
1.03	Pintura Epoxica para piscs incluye mano de obra	M2	106,00	$ 35.926,56	$ 3.772.286,44	0,00	0,00	106,00		$ 3.772.286,00	0,00	$ -	106,00	$ 3.772.286,00	106,00	$ 3.772.286,00
1.04	Pintura epoxica para muros incluye mano de obra	M2	22,00	$ 20.817,19	$ 457.978,27	0,00	0,00	22,00		$ 457.978,00	0,00	$ -	22,00	$ 457.978,00	22,00	$ 457.978,00
1.05	Canal en lamina para Aguas Lluvias cal 20 incluye enllantado y pintura	ML	16,00	$ 60.887,67	$ 964.058,08	0,00	0,00	16,00		$ 964.058,00	0,00	$ -	16,00	$ 964.058,00	16,00	$ 964.058,00
	INSTITUTO GENOVA															
2.01	Descapotada y tala de maleza	M2	124,00	$ 4.617,62	$ 572.562,92	0,00	37,00	87,00		$ 401.752,00	0,00	$ -	87,00	$ 401.752,00	87,00	$ 401.752,00
2.02	Retiro plastico sobre muro	M2	124,00	$ 14.529,60	$ 1.800.960,78	0,00	37,00	87,00		$ 1.260.174,00	0,00	$ -	87,00	$ 1.260.174,00	87,00	$ 1.260.174,00
2.03	Pintura epoxica para muros incluye mano de obra	M2	124,00	$ 20.817,19	$ 2.581.332,06	0,00	37,00	87,00		$ 1.811.096,00	0,00	$ -	87,00	$ 1.811.096,00	87,00	$ 1.811.096,00
2.04	Pintura con vinilo sobre teja de fibrocemento	M2	57,00	$ 10.222,57	$ 582.686,27	0,00	0,00	57,00		$ 582.686,00	0,00	$ -	57,00	$ 582.686,00	57,00	$ 582.686,00
2.05	Pintura con esmalte puerta sin rejas y/o superficies metalicas	M2	16,80	$ 13.709,91	$ 230.176,31	0,00	2,40	14,40		$ 197.293,00	0,00	$ -	14,40	$ 197.293,00	14,40	$ 197.293,00
2.06	Pintura con esmalte canchas y/o cornisa	ML	34,20	$ 3.491,80	$ 119.418,73	0,00	0,00	34,20		$ 119.430,00	0,00	$ -	34,20	$ 119.430,00	34,20	$ 119.430,00
2.07	Muro en Panel Yeso en 3/8" a una cara	MJ	2,96	$ 65.980,59	$ 195.381,79	0,00	0,00	3,00		$ 197.882,00	0,00	$ -	3,00	$ 197.882,00	3,00	$ 197.882,00
2.08	Demolición Cubierta 34,3 m	M2	12,96	$ 10.873,43	$ 140.910,70	0,00	0,00	12,96		$ 140.920,00	0,00	$ -	12,96	$ 140.920,00	12,96	$ 140.920,00
2.09	Suministro e instalación de Cubierta teja fibrocemento 2mt/2ancha	M2	12,96	$ 32.503,01	$ 421.259,05	0,00	0,00	12,96		$ 421.259,00	0,00	$ -	12,96	$ 421.259,00	12,96	$ 421.259,00
2.10	Limpieza de concreto o pisos con disco de agua (hidrolavado)	M2	67,00	$ 8.864,42	$ 379.872,21	0,00	0,00	67,00		$ 379.872,00	0,00	$ -	67,00	$ 379.872,00	67,00	$ 379.872,00
	I.E BUENAVISTA															
3.01	Descapotada y tala de maleza	M2	156,00	$ 4.617,62	$ 461.760,42	66,67	0,00	156,67		$ 723.422,00	0,00	$ -	156,67	$ 723.422,00	156,67	$ 723.422,00
3.02	Retiro plastico sobre muro	M2	66,00	$ 14.529,60	$ 1.909.934,36	66,67	0,00	156,67		$ 2.329.293,00	0,00	$ -	156,67	$ 2.329.293,00	156,67	$ 2.329.293,00
3.03	Pintura Epoxica para piscs incluye mano de obra	M2	121,00	$ 35.926,56	$ 4.347.113,38	0,00	0,00	121,00		$ 4.347.113,00	0,00	$ -	121,00	$ 4.347.113,00	121,00	$ 4.347.113,00
3.04	Pintura epoxica para muros incluye mano de obra	M2	66,00	$ 20.817,19	$ 1.871.913,08	66,67	0,00	156,67		$ 3.261.347,00	0,00	$ -	156,67	$ 3.261.347,00	156,67	$ 3.261.347,00
3.05	Retiro sobre Revoque z muro	M2	12,00	$ 7.254,54	$ 86.814,42	0,00	12,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.06	Pintura con vinil sobre muros tipo marcia	M2	12,00	$ 9.803,40	$ 117.640,75	0,00	12,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	I.E LUIS GRANADA MEJIA															
4.01	Pintura Epoxica para piscs incluye mano de obra	M2	110,00	$ 35.926,56	$ 3.951.921,73	0,00	13,50	96,50		$ 3.466.313,00	0,00	$ -	96,50	$ 3.466.313,00	96,50	$ 3.466.313,00
	CENTRO AGROINDUSTRIAL															
5.01	Corte pavimento con maquina, hasta 5cm	ML	4,00	$ 2.484,26	$ 9.937,03	0,00	0,00	4,00		$ 9.937,00	0,00	$ -	4,00	$ 9.937,00	4,00	$ 9.937,00
5.02	Demolición de piscs y enlaces de concreto, e=0,15 cm	M2	5,00	$ 14.721,92	$ 73.609,59	0,00	0,00	5,00		$ 73.609,00	0,00	$ -	5,00	$ 73.609,00	5,00	$ 73.609,00
5.03	Excavación, en material comun a mano, incluye cargue y retiro de sobrantes hasta 1,50 m	M3	1,00	$ 60.248,05	$ 60.248,05	0,00	0,00	1,00		$ 60.248,00	0,00	$ -	1,00	$ 60.248,00	1,00	$ 60.248,00
5.04	Losa de reposición de 45/50 cms. En concreto clase E (17,5 MPA) incluye lajas en concreto reforzado espesor 10 cms, con varilla D=3/8" separación cada 15 cms. En ambas direcciones	UND	1,00	$ 280.502,44	$ 280.502,44	0,00	0,00	1,00		$ 280.502,00	0,00	$ -	1,00	$ 280.502,00	1,00	$ 280.502,00
5.05	Suministro e instalación tuberia PVC presion 1/2"	ML	2,00	$ 17.048,58	$ 34.083,17	0,00	0,00	2,00		$ 34.083,00	0,00	$ -	2,00	$ 34.083,00	2,00	$ 34.083,00
5.06	Suministro e instalación llave de paso de 1/2"	UND	1,00	$ 30.934,08	$ 30.934,08	0,00	0,00	1,00		$ 30.934,00	0,00	$ -	1,00	$ 30.934,00	1,00	$ 30.934,00
5.07	Suministro e instalación tuberia PVC sanitaria 3"	ML	2,50	$ 20.663,36	$ 51.408,40	0,00	0,00	2,50		$ 51.408,00	0,00	$ -	2,50	$ 51.408,00	2,50	$ 51.408,00
5.08	Suministro e instalación tuberia PVC sanitaria 4"	ML	2,50	$ 27.122,94	$ 67.807,47	0,00	0,00	2,50		$ 67.807,00	0,00	$ -	2,50	$ 67.807,00	2,50	$ 67.807,00
5.09	Punto PVC hidraulico de 1/2"	UND	3,00	$ 31.953,86	$ 95.861,59	0,00	0,00	3,00		$ 95.862,00	0,00	$ -	3,00	$ 95.862,00	3,00	$ 95.862,00
5.10	Suministro e instalación de rejilla para piso de 3"	UND	1,00	$ 18.071,44	$ 18.071,44	0,00	0,00	1,00		$ 18.071,00	0,00	$ -	1,00	$ 18.071,00	1,00	$ 18.071,00
5.11	Punto PVC sanitario de 2"	UND	2,00	$ 49.634,50	$ 99.236,79	0,00	0,00	2,00		$ 99.239,00	0,00	$ -	2,00	$ 99.239,00	2,00	$ 99.239,00
5.12	Punto PVC sanitario de 3"	UND	1,00	$ 56.267,79	$ 56.267,79	0,00	0,00	1,00		$ 56.268,00	0,00	$ -	1,00	$ 56.268,00	1,00	$ 56.268,00
5.13	Llenc compactado incluye suministro de material de mejoramiento de carretera y/o rio	M3	0,50	$ 56.976,41	$ 28.488,20	0,00	0,00	0,50		$ 28.381,00	0,00	$ -	0,50	$ 28.381,00	0,50	$ 28.381,00
5.14	Anden concreto simple de 21Mpa Esp.10 cm	M2	8,00	$ 81.271,58	$ 406.359,89	3,50	0,00	8,50		$ 672.573,00	0,00	$ -	8,50	$ 672.573,00	8,50	$ 672.573,00
5.15	Nivelación de piso en Mortero 1:4 esp 0,0 cm	M2	8,00	$ 26.556,90	$ 254.455,17	0,50	0,00	8,50		$ 212.000,00	0,00	$ -	8,50	$ 212.000,00	8,50	$ 212.000,00
5.16	Muro En Superboard 10 Mm Gkb Lamina Cal 24 Estructura @40 X 0 m	M2	22,00	$ 119.158,62	$ 2.621.493,60	0,00	2,81	19,19		$ 2.286.133,00	0,00	$ -	19,19	$ 2.286.133,00	19,19	$ 2.286.133,00
5.17	Piso en ceramica 30x30 d de e/Mc cera	M2	8,00	$ 76.423,78	$ 603.390,02	0,00	0,00	8,00		$ 603.390,00	0,00	$ -	8,00	$ 603.390,00	8,00	$ 603.390,00
5.18	Guardaescoba en ceramica	M	15,00	$ 9.170,70	$ 118.220,35	0,00	0,00	15,00		$ 118.220,00	0,00	$ -	15,00	$ 118.220,00	15,00	$ 118.220,00
5.19	Enchape en ceramica pared incluye mortero	MJ	13,20	$ 86.250,22	$ 1.128.302,90	4,51	0,00	17,71		$ 1.509.952,00	0,00	$ -	17,71	$ 1.509.952,00	17,71	$ 1.509.952,00
5.20	Suministro e instalación lavamanos semiempotrar	UND	1,00	$ 298.380,58	$ 298.380,58	0,00	0,00	1,00		$ 298.381,00	0,00	$ -	1,00	$ 298.381,00	1,00	$ 298.381,00
5.21	Suministro e instalación sanitario semiempotrar	UND	1,00	$ 836.469,97	$ 836.469,97	0,00	0,00	1,00		$ 836.470,00	0,00	$ -	1,00	$ 836.470,00	1,00	$ 836.470,00
5.22	Suministro e instalación griferia para lavamanos	UND	1,00	$ 141.158,48	$ 141.158,48	0,00	0,00	1,00		$ 141.159,00	0,00	$ -	1,00	$ 141.159,00	1,00	$ 141.159,00
5.23	Friso (Bullet) sobre muro	M2	37,15	$ 14.830,60	$ 550.777,37	0,00	4,37	32,78		$ 485.393,00	0,00	$ -	32,78	$ 485.393,00	32,78	$ 485.393,00
5.24	Pintura con vinil sobre muros tipo marcia	M2	37,15	$ 9.803,40	$ 363.709,96	0,00	4,37	32,78		$ 320.977,00	0,00	$ -	32,78	$ 320.977,00	32,78	$ 320.977,00
5.25	Suministro e instalación de divisiones tipo baño en Aluro resistex incluye anclaje	M2	2,00	$ 458.955,51	$ 917.714,83	0,00	0,07	2,06		$ 907.321,00	0,00	$ -	2,06	$ 907.321,00	2,06	$ 907.321,00
5.26	Cielo raso en yeso sobre board y perfiles de aluminio	M2	8,13	$ 59.210,80	$ 481.073,20	0,17	0,00	8,30		$ 491.018,00	0,00	$ -	8,30	$ 491.018,00	8,30	$ 491.018,00
5.27	Cielo raso en PVC incluye estructura de soporte	M2	7,93	$ 51.711,78	$ 410.074,44	0,37	0,00	8,30		$ 429.301,00	0,00	$ -	8,30	$ 429.301,00	8,30	$ 429.301,00

El contratista Fernando Arturo Ángel Peláez expone que ha ejecutado el 95% del valor total del contrato, y presenta acta N°1 por valor de $77.152.512,00 M/cte.

6. BALANCE FINANCIERO:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
VALOR INICIAL	$81.213.170,18	$0,00	$81.213.170,18
ACTA No. 01	$81.213.170,18	$77.152.512	$4.060.658,18
TOTAL	**$81.213.170,18**	**$77.152.512**	**$4.060.658,18**

7. APORTES SEGURIDAD SOCIAL.

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ingeniera VANESSA KATHERINE RINCÓN GAVIRIA, en su calidad de supervisora, deja constancia que el contratista cumplió con las obligaciones frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.

Nota: El contratista presentó CERTIFICADO del contador público Titulado **JULIANA GIRALDO CARDONA con** tarjeta profesional No. 262313-T donde certifica que **OSCAR ANDRES HURTADO con C.C. 89.008.186**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, ICBF y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo. **(si aplica)**

VALOR PAGADO SISTEMA SEGURIDAD CONTRATISTA:

Nombre(s)	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
OSCAR ANDRES HURTADO	$250.000	$320.000	$0	9460239181	11

Nombre(s)	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ	$250.000	$320.000	$0	9460414016	12

VALOR PAGADO SISTEMA SEGURIDAD RESIDENTE:

Nombre(s)	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
ALVARO AGUIRRE MARIN	$ 1.087.500	$0	$ 45.500	9459916253	11

Nombre(s)	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
ALVARO AGUIRRE MARIN	$ 1.250.000	$0	$ 52.200	9460472498	12

VALOR PAGADO SISTEMA SEGURIDAD SISO:

Nombre(s)	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
LUZ DURANGO	$ 46.400	$185.600	$ 80.800	9460394832	11

Nombre(s)	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
LUZ DURANGO	$ 46.400	$185.600	$ 80.800	9460394901	12

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

Nombre (s) - cargo	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
Diosa fabian	$ 26.300	$ 105.200	$ 45.800	9460394832	11

Nombre (s) - cargo	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
Carlos Garzón	$ 26.300	$ 105.200	$ 45.800	9460394832	11
Victor sierra	$ 26.300	$ 105.200	$ 45.800	9460394832	11

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

Nombre (s) - cargo	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
Diosa fabian	$ 23.200	$ 92.800	$ 40.400	94603944901	12

Nombre (s) - cargo	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
Carlos Garzón	$ 23.200	$ 92.800	$ 40.400	94603944901	12
Víctor sierra	$ 23.200	$ 92.800	$ 40.400	94603944901	12
Jose González	$68.100	$17.100	$29.7000	94603944901	12

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	86500014181	HURTADO CONSTRUCCION SOMAC S.A.S

Nota: para el pago de cuentas con recursos nacionales, la forma de pago no puede efectuarse mediante cheque.

Para constancia, se firma en el Municipio de Armenia Departamento del Quindío, a los once (11) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023)

VANESSA KATHERINE RINCÓN GAVIRIA
Jefe de Oficina de Infraestructura Social
Secretaria de Aguas e Infraestructura
Departamento del Quindío
Supervisor

OSCAR ANDRES HURTADO
CC: 89.008.168 DE ARMENIA
Hurtado construcciones s.a.s

Elaboró/Proyectó: Juan José Arias Aguirre – Contratista SAID
Julián Andrés Díaz – Contratista SAID
VoBo: Milton César Torres Hernández – Secretario de Aguas e Infraestructura (E)
