INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO



CONTRATO DE OBRA N° 163 DE 2023, POR MEDIO DE EL CUAL SE ESTABLECE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL "MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO".

INFORME DE OBRA
21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2023
CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO
ARMENIA QUINDÍO, DICIEMBRE DE 2023

INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION 3

1. ASPECTOS GENERALES 3

1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 3

1.1.1 LOCALIZACION SATELITAL DEL PROYECTO 5

1.2 DESCRIPCION GENERAL DE LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION. 5

1.3 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO. 6

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 10

2.1 LEGALIZACION DEL CONTRATO Y ACTA DE INICIO 10

2.2 DECISIONES TOMADAS EN OBRA. 10

2.3 CONDICIONES CLIMATICAS. 12

2.4 REGISTRO FOTOGRAFICO 12

2.5 ACTIVIDADES EJECUTADAS 43

3. REALIZACION DEL INFORME CONTRACTUAL DE OBRA 45

INFORME DE OBRA

INTRODUCCION

En cumplimiento del contrato de obra celebrado entre el **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO** y la arquitecta contratista **CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO** con el objeto de realizar la ejecución del contrato de obra **No. 163 DE 2023** que tiene como objeto el **"MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO"**, de conformidad con las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones, se presenta el informe de las labores ejecutadas entre el 21 de noviembre del 2023 hasta el 22 de diciembre de 2023.

En este informe se utilizarán las siguientes expresiones para denominar las firmas que intervienen en la obra:

- **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO**, Entidad Contratante.
- **JAIRO ALONSO ESCANDÓN GONZÁLEZ**, El Director General por parte del **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO**
- Arquitecta **CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO**, Contratista.

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Las obras del presente proyecto se localizan en la jurisdicción del **MUNICIPIO DE CIRCASIA**, en el **DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO**, en el **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO**.

Límites del municipio:

Oriente: Municipio de Salento
Occidente: Municipio de Quimbaya
Norte: Municipio de Filandia
Sur: Municipio de Armenia.

Extensión total: 91,37 km²

INFORME DE OBRA

Extensión área urbana: 25 Has

Latitud: 4.617
Longitud: -75.633
Latitud: 4° 37' 1" Norte
Longitud: 75° 37' 59" Oeste

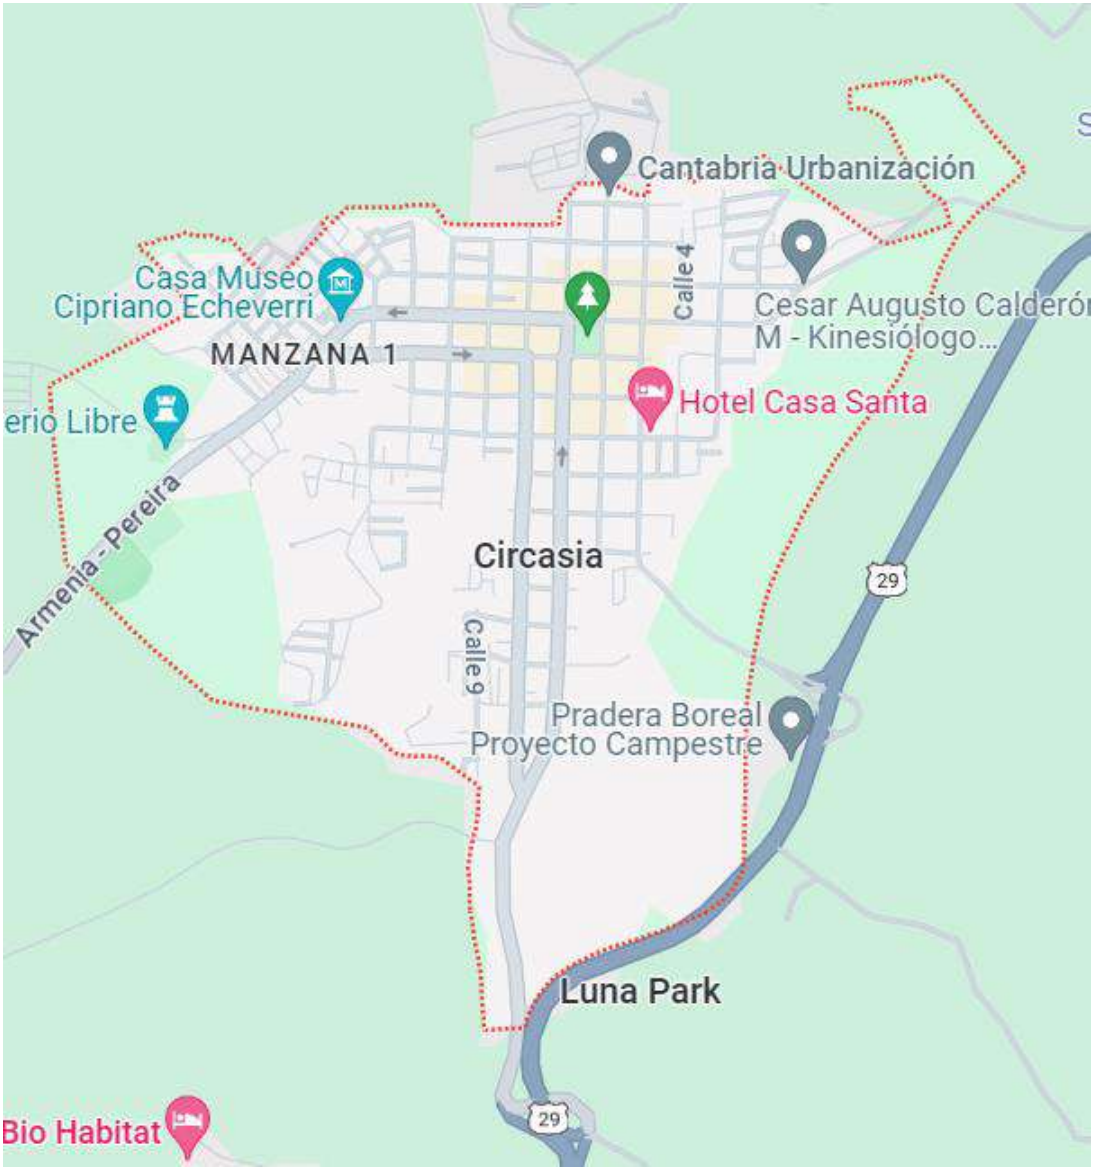


Figura 1. Municipio de Circasia
Fuente www.google.com/maps

1.1.1 LOCALIZACION SATELITAL DEL PROYECTO

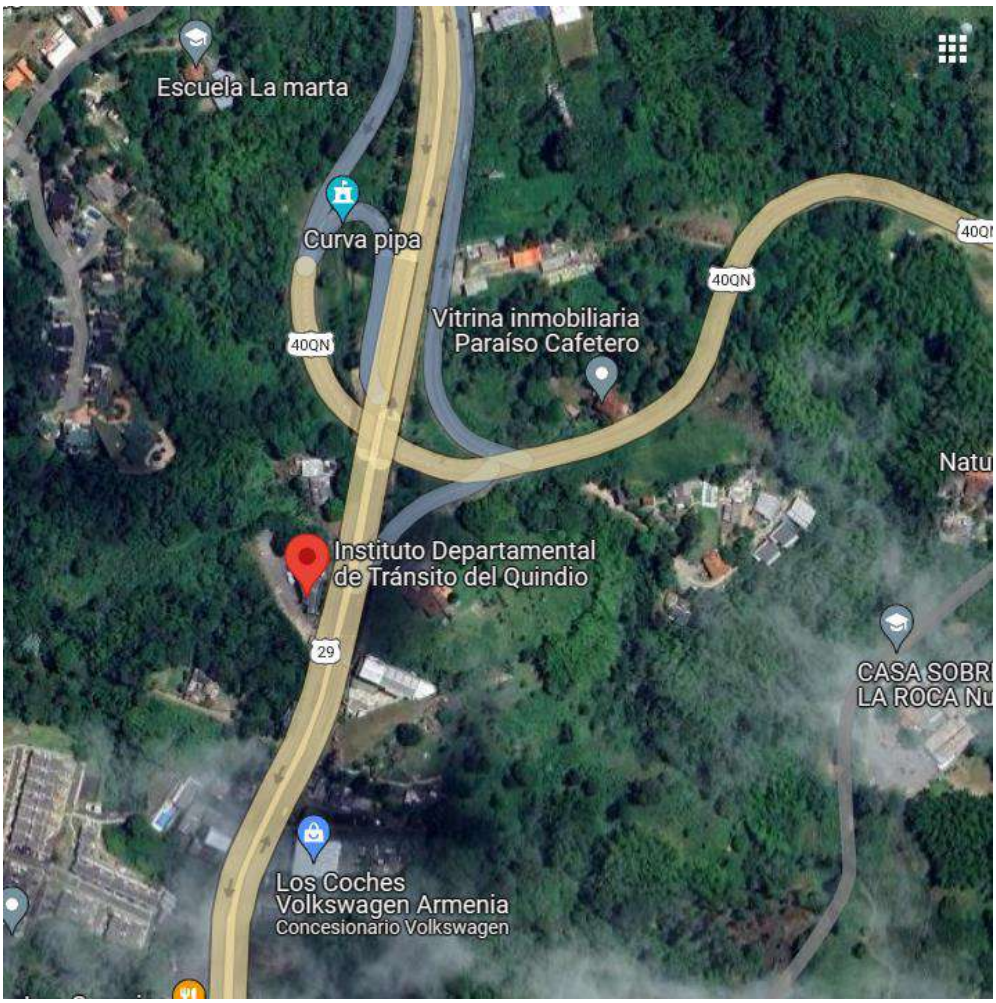


Figura 2. Instituto departamental de tránsito del Quindío
Fuente Propia

1.2 DESCRIPCION GENERAL DE LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION.

Los principales términos contractuales y el estado final, del contrato de Construcción, se relacionan a continuación. Donde se consigna claramente la información acerca del alcance de los contratos, costo, plazo, etc.

INFORME DE OBRA

ITEM	CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA	**CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO**
CONTRATO	Contrato de obra N° 163 de 2023
OBJETO	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
VALOR INICIAL CONTRATO INCLUIDO IVA	$ 80.974.495
VALOR DE LA ADICIÓN INCLUIDO IVA	$ 40.345.368
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	36 DÍAS
FECHA DE INICIACION	21 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	27 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO TRANSCURRIDO	TREINTA (30) DÍAS
% DE EJECUCIÓN	100 %
INVERSIÓN TOTAL	$ 121.319.863

1.3 RELACION EQUIPO DE TRABAJO

PERSONAL MINIMO CONTRATISTA DE OBRA		
NOMBRE	**CARGO**	**IDENTIFICACION**
JAIME ALBERTO ANGEL LONDOÑO	RESIDENTE DE OBRA	7.557.013
ANGELA GRISALES RODRÍGUEZ	PROFESIONAL SISO	1.096.032.586

1.4 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO.

El proyecto **"MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO"** tiene como objetivo principal realizar mantenimiento y reparación de muros, cielos rasos, redes eléctricas, sanitarias, etc.

INFORME DE OBRA

Los capítulos y actividades más representativas e importantes que hacen parte de este proyecto son los siguientes:

ACTIVIDADES GENERALES

Item	Descripción
1	**PRELIMINARES**
1.01	Localización replanteo obra existente
1.02	Desmonte de cielo raso, Incluye estructura
1.03	Desmonte de aparatos sanitarios incluye grifería
1.04	Desmonte Marco y Puerta en Madera
1.05	Desmonte de lámpara existente
1.06	Recorrido de cubierta
2	**CUBIERTA Y CIELO RASO**
2.01	Cielo Raso en Panel Yeso incluye estructura de soporte
2.02	Impermeabilizacion viga canal Sika 1 mortero
2.03	Suministro e instalación de Cubierta teja fibrocemento ondulada
2.04	Pintura con vinilo bajo Placa o Cielo raso
2.05	Estuco Cielos Plastico
2.06	Impermeabilización de placa de concreto, mediante mortero impermeabilizado y manto asfáltico. Incluye pintura.
2.07	Limpieza de canales, incluye reacomedación de soportes
2.08	Suministro e instalación de espuma expansiva
3	**MUROS Y ACABADOS**
3.01	Rasqueteada y lijada de muros
3.02	Pintura con vinilo bajo Placa o Cielo raso

3.03	Estuco plástico sobre muro
3.04	Pintura con vinilo sobre muros tres manos
3.05	Muro en Panel Yeso e= 1/2" a dos caras
3.06	Estructura para muro en placa Liviana (Canal - Paral)
3.07	Suministro e instal. De puerta en doble lámina llena Cal. 16 con refuerzo interno, incluye marco y bisagras antivandálicas
4	**REDES ELÉCTRICAS - ILUMINACIÓN**
4.01	Luminaria Tipo Panel Led 15 W
4.02	Punto eléctrico iluminación
4.03	Punto eléctrico salida para toma y/o interruptores
4.04	Desmonte Y Retiro De Red Electrica Existente En Placa, Incluye Accesorios. (Area Aproximada De Desmonte 80 Mt²) Y Traslado Sitio Interno De Disposicion De Desmontes Y De Mas Elementos Necesarios Para La Ejecucion Del Item
4.05	Suministro e instalación de toma GFCI
5	**REDES HIDROSANITARIAS**
5.01	Revisión de Punto Hidráulico existente
5.02	Revisión aparato sanitario
5.03	Suministro e instalación orinal de pared
5.04	Suministro e instalación sanitario institucional
5.05	Desmonte de aparatos sanitarios incluye grifería
5.06	Suministro e instalación lavamanos institucional
6	**LIMPIEZA DE OBRA**
6.01	Cargue y retiro de material sobrante hasta 25Km
6.02	Limpieza general de espacios construidos
7	**OBRAS ADICIONALES**
7.01	SELLO CON SIKAFLEX

7.02	IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS
7.03	RESANE EN CIELO PLACA ARCHIVO
7.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TRASLUCIDA
7.06	TRATAMIENTO DE VIGA CANALES EN CONCRETO
7.07	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA CIELO FALSO
7.08	CONSTRUCCION DE CANALES RECOLECTORAS DE AGUA LLUVIA
7.09	LIMPIEZA DE BAJANTES DE AGUA LLUVIAS
7.10	LIMPIEZA DE LUCETAS
7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA ORINAL
7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS, INCLUYE ACCESORIOS DE DESAGUES
7.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA 18W LED DE INCRUSTAR
7.14	SUMINISTRO E INSTACIÓN PUERTA LAMINA CAL. 20 (0,65-1,3 *2) ANTI.+PINTURA+CHAPA+PASADOR+MARCO

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$80,974,495.00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$40,345,368.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$121,319,863.00**

SECTORES A INTERVENIR

- Baños
- Oficinas y archivo en donde haya presencia de daños en muros, cielo raso e instalaciones eléctricas

MOMENTOS IMPORTANTES DE LA OBRA

- Inicio de las obras según legalización y suscripción del Acta de inicio
- Entrega de Análisis de Precios Unitarios y Seguridad social del personal de obra
- Reparación y pintura en muros dañados
- Reparación de cubierta y cielo raso.

- Reparaciones eléctricas.
- Instalación de accesorios y urinales en baños.

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1 LEGALIZACION DEL CONTRATO Y ACTA DE INICIO

Para la legalización del contrato se hace necesario la aprobación por parte del **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO** de los documentos establecidos en los pliegos de condiciones y en el contrato.

A los veintiún (21) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023), se reunieron las siguientes personas: **JAIRO ALONSO ESCANDÓN GONZÁLEZ**, en calidad de **DIRECTOR GENERAL** y la **CONTRATISTA,** la arquitecta **CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.094.907.299 de Armenia Q, para la consolidación del **ACTA DE INICIO** de la obra.

Atendiendo la ejecución de obras por parte del contratista vs la programación presentada y aprobada por el supervisor, se evidencia el cumplimiento en su totalidad de las actividades que se habían dispuesto para este periodo.

Además, se encuentra un registro fotográfico en cada uno de estos, permitiendo la observación relacionada con el desarrollo de las tareas programadas.

2.2 DECISIONES TOMADAS EN OBRA.

Las modificaciones y en general, los aspectos técnicos y administrativos más relevantes en cuanto al desarrollo de las obras son anotados en la bitácora de la obra, por el Contratista y el supervisor de la obra.

2.3 ADENDA PRESUPUESTAL.

SOLICITUD ADENDA PRESUPUESTAL

El objeto de esta adenda presupuestal al contrato de obra número 163 de 2023 cuyo objeto es el "**MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO**" tiene como propósito principal la modificación y ajuste del presupuesto

inicialmente establecido para la ejecución de las labores de mejora y adecuación de las instalaciones del IDTQ.

Las razones fundamentales para esta adenda presupuestal se encuentran en la necesidad de contemplar gastos adicionales y ajustes derivados de situaciones imprevistas durante la ejecución de la obra, así como la inclusión de nuevas especificaciones técnicas o requerimientos que han surgido para asegurar la calidad y completitud del proyecto.

Este ajuste presupuestal se lleva a cabo con el objetivo de garantizar la adecuada finalización de las labores de mejora y adecuación de la escuela, asegurando un entorno seguro, funcional y propicio para el desarrollo educativo de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Los cambios y modificaciones incluidos en esta adenda presupuestal están detallados en la siguiente lista adjunta, la cual describe de manera precisa las partidas presupuestarias añadidas:

7	OBRAS ADICIONALES	UND	VR. UNITARIO
7.01	SELLO CON SIKAFLEX	ML	4,770.00
7.02	IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS	M2	28,639.00
7.03	RESANE EN CIELO PLACA ARCHIVO	M2	32,630.00
7.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE	ML	57,139.00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TRASLUCIDA	M2	80,024.00
7.06	TRATAMIENTO DE VIGA CANALES EN CONCRETO	ML	46,601.00
7.07	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA CIELO FALSO	M2	31,108.00
7.08	CONSTRUCCION DE CANALES RECOLECTORAS DE AGUA LLUVIA	ML	101,238.00
7.09	LIMPIEZA DE BAJANTES DE AGUA LLUVIAS	ML	35,126.00
7.10	LIMPIEZA DE LUCETAS	UND	12,706.00
7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA ORINAL	UND	272,486.46
7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS, INCLUYE ACCESORIOS DE DESAGUES	UND	111,350.63
7.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA 18W LED DE INCRUSTAR	UND	55,221.66

7.14	SUMINISTRO E INSTACIÓN PUERTA LAMINA CAL. 20 (0,65-1,3 *2) ANTI.+PINTURA+CHAPA+PASADOR+MARCO	UND	966,489.54

Estas actividades expuestas en la solicitud de adenda presupuestal son fundamentales para la ejecución adecuada y exitosa del proyecto, asegurando la calidad, seguridad y cumplimiento de los estándares técnicos requeridos.

2.4 VERIFICACION DE GARANTIAS

A la fecha el contratista cuenta con todas las garantías vigentes, como se muestra en el siguiente cuadro:

POLIZAS CONTRATISTA SEGÚN CONTRATO DE OBRA			
TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	FECHA INICIAL	FECHA DE VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	$ 16.194.899	20/11/2023	27/06/2024
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 12.146.174.25	20/11/2023	27/12/2026
ESTABILIDAD DE OBRA	$ 16.194.899	27/12/2023	27/12/2028
R.C EXTRACONTRACTUAL	$ 232.000.000	20/11/2023	27/12/2023

POLIZAS CONTRATISTA SEGÚN ADENDA PRESUPUESTAL			
TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	FECHA INICIAL	FECHA DE VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	$ 24.263.972.60	20/11/2023	27/06/2024
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 18.197.979.45	20/11/2023	27/12/2026
ESTABILIDAD DE OBRA	$ 24.263.272.60	27/12/2023	27/12/2028

2.5 CONDICIONES CLIMÁTICAS.

Favorables dentro de lo general, considerando que ocasionalmente hubo lluvia.

2.6 REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIZACIÓN REPLANTEO OBRA EXISTENTE

INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta






INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta

DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE ESTRUCTURA

Se deben cambiar todas las partes del cielo raso en láminas de panel yeso afectadas por la humedad, presentadas por el paso del agua a través de la cubierta.

Este problema se presenta en un gran porcentaje de afectación en el cielo raso de la institución.

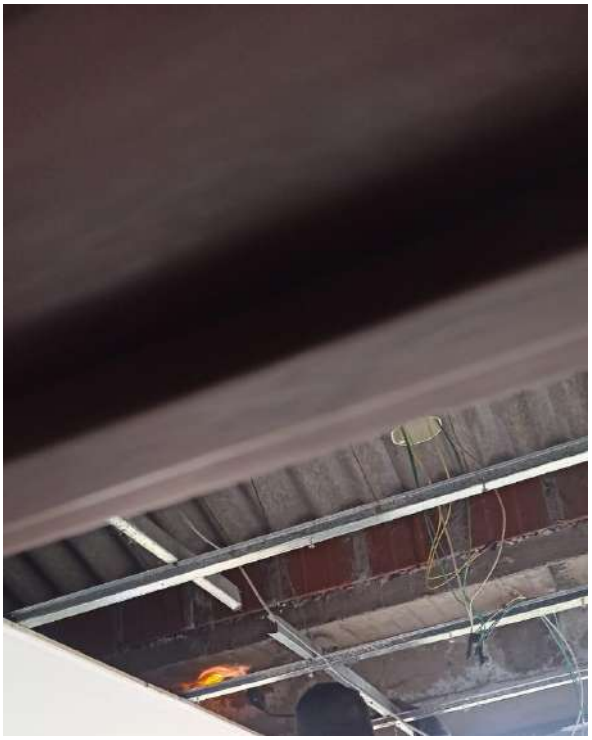



INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta



DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS INCLUYE GRIFERÍA

Se desmontan los aparatos sanitarios tipo sanitario, orinal y lavamanos que actualmente no funcionan tanto en baños de hombres y mujeres de primer y segundo piso.






INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta

DESMONTE DE LÁMPARA EXISTENTE

Se cambian alrededor de 42 lámparas que no funcionan y se remplazan por lámparas tipo led nuevas de 18w.

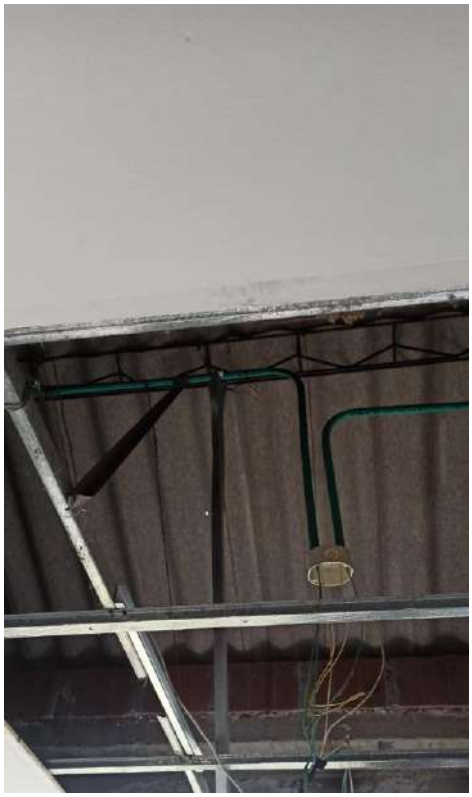

RECORRIDO DE CUBIERTA

Se realiza el recorrido de toda la cubierta, identificando todos los problemas de ingreso de agua, por tejas partidas y/o dilatadas, por tejas traslucidas dañadas, fisuradas y tostadas por el sol. Sello con sikaflex en todas las amarras que presentan problemas. Cambio de caballetes deteriorados.

INFORME DE OBRA


Claudia Díaz
arquitecta





CIELO RASO EN PANEL YESO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE
Al desmontar todas las láminas en panel yeso deterioradas se procese a suministrar e instalar las láminas, se instalan 89,3m2. Se refuerza la estructura que soporta dicho cielo raso.



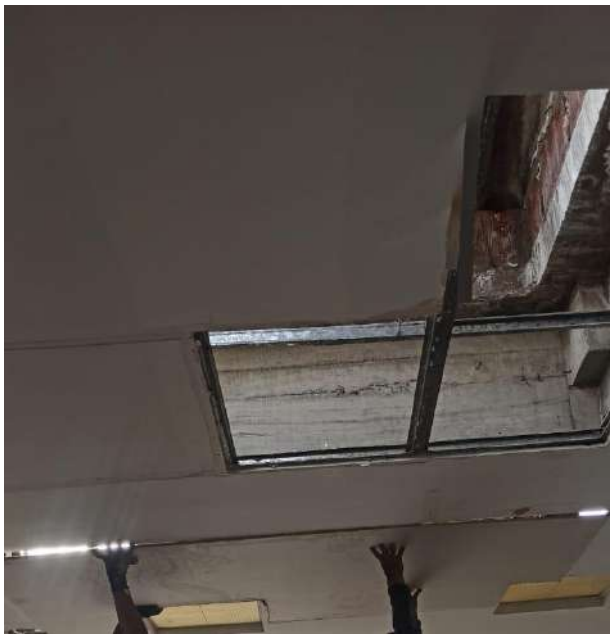


INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TEJA FIBROCEMENTO ONDULADA

Se suministran y se instalan 90,59m2 de teja en fibrocemento que se encontraban deterioradas y ocasionaban el ingreso del agua.

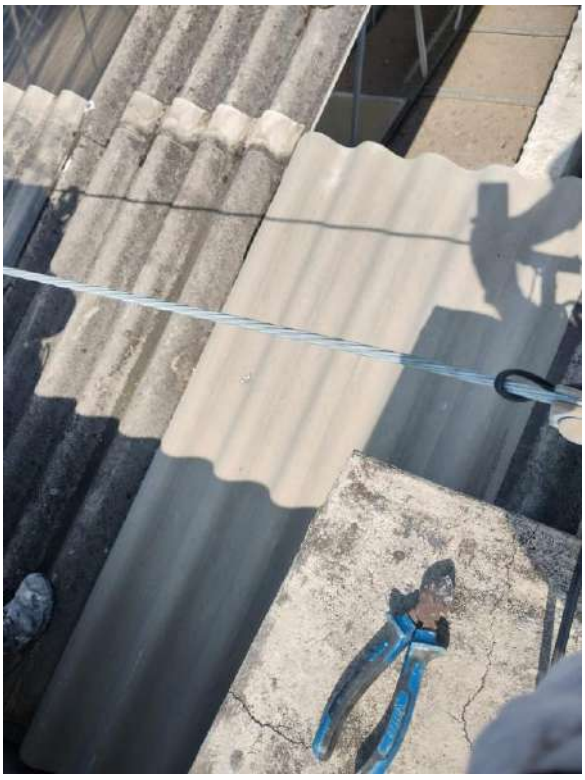



INFORME DE OBRA


Claudia Díaz
arquitecta



PINTURA CON VINILO BAJO PLACA O CIELO RASO

Se realiza la aplicación de pintura bajo las placas de panel yeso para todo el cielo raso, alcanzando 552,51m2 de intervención.



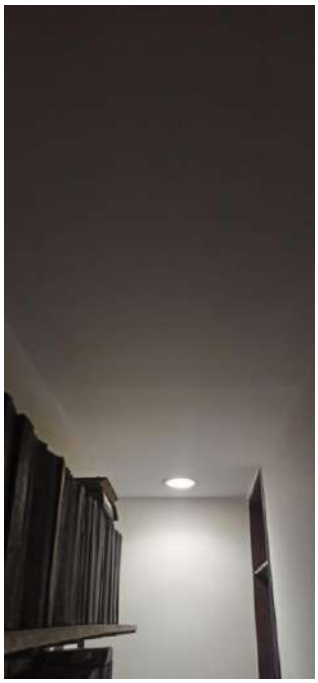

INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta





INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta

ESTUCO CIELOS PLÁSTICO

Todas láminas de panel yeso reemplazadas y reparadas se alistaron con estuco para poder dar el acabado final, se estucan 89,30m2.







INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta

IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA DE CONCRETO, MEDIANTE MORTERO IMPERMEABILIZADO Y MANTO ASFÁLTICO. INCLUYE PINTURA.





INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta

LIMPIEZA DE CANALES, INCLUYE REACOMEDACIÓN DE SOPORTES

Las canales se encontraban con lama, con hojas y con presencia de lodo acumulado, se procede a limpiarlas.






INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta

RASQUETEADA Y LIJADA DE MUROS

En un gran porcentaje los muros se encontraban con humedad por el ingreso de agua a través de las vigas canales y muros contiguo a fachadas, una vez reparada la cubierta se procedió a retirar todo el material afectado por dicha humedad.

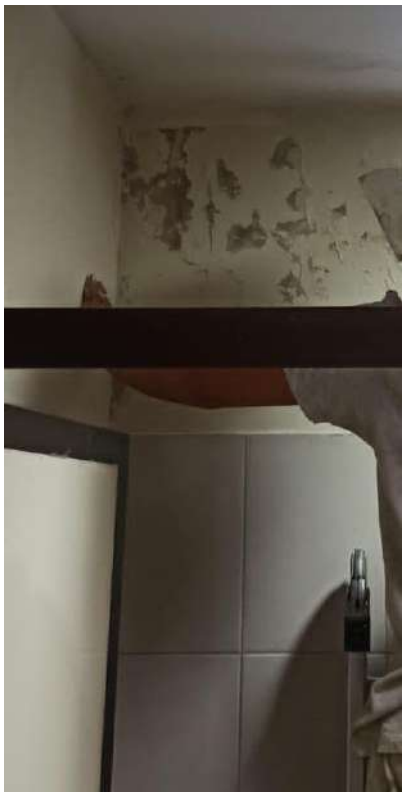



INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta

ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MURO

Todos los muros afectados por humedad y que fueron rasqueteados se les dió acabado con estuco plástico.





INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta

PINTURA CON VINILO SOBRE MUROS TRES MANOS


Todos los muros de la institución que fueron intervenidos se les dió acabado en pintura tipo 1 con una aplicación de hasta 3 manos para alcanzar un acabado óptimo.





INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta

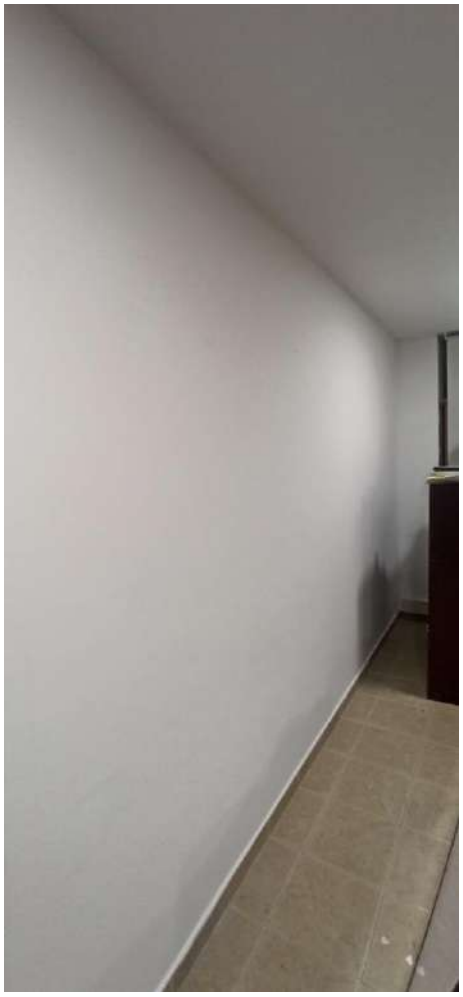




INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta

MURO EN PANEL YESO E= 1/2" A DOS CARAS

Se construye un muro nuevo en lámina de panel yeso, que conforma un módulo adicional para atención al usuario.

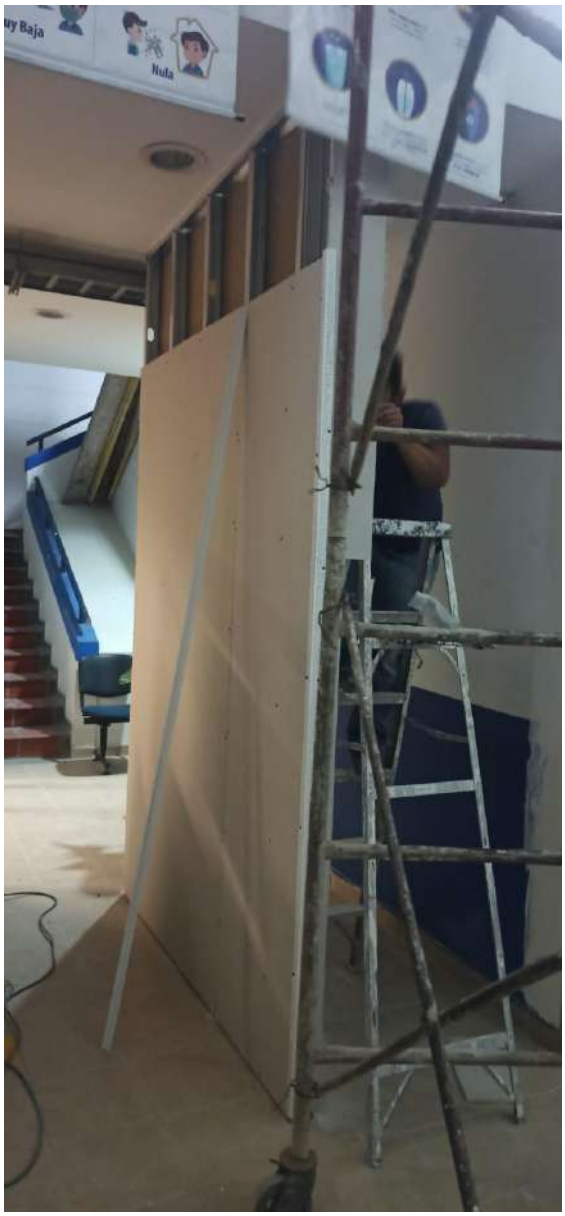




INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta

PUNTO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN


Se revisaron los puntos eléctricos incluyendo el cambio de cableado afectado.

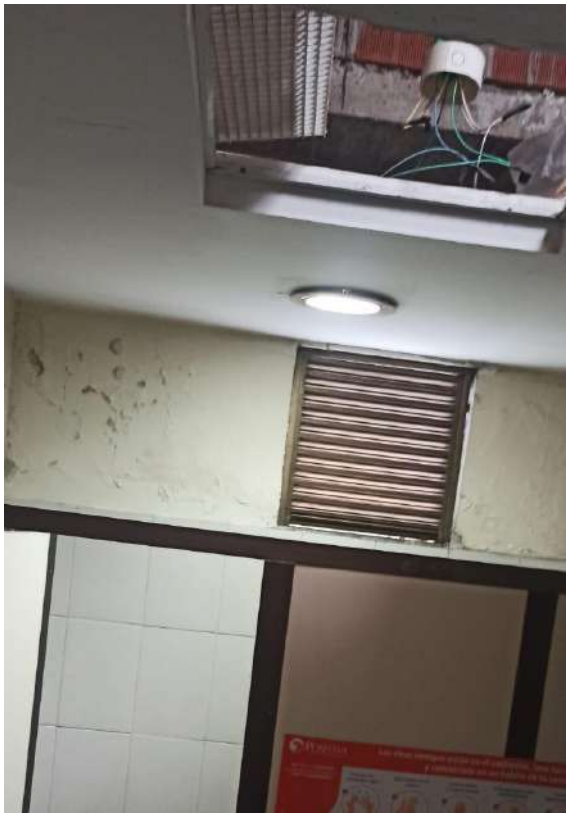




INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta

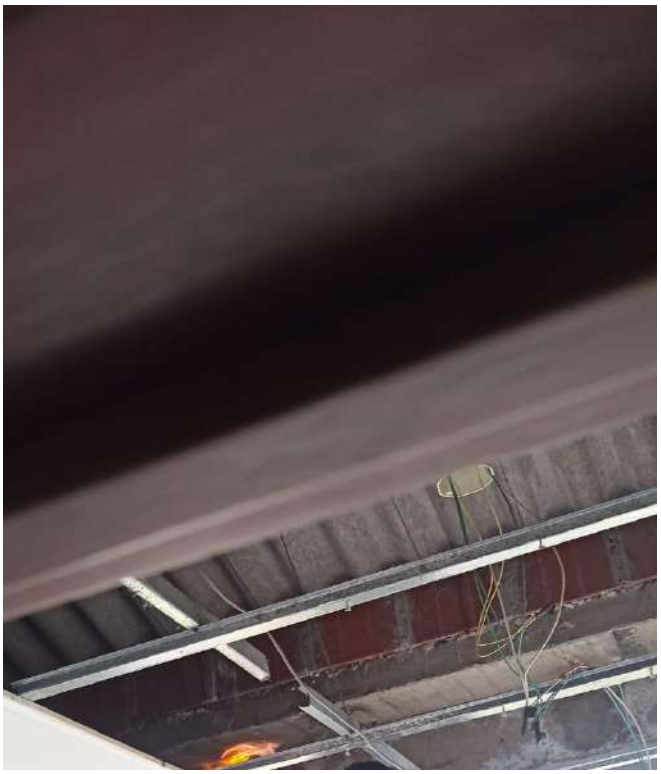

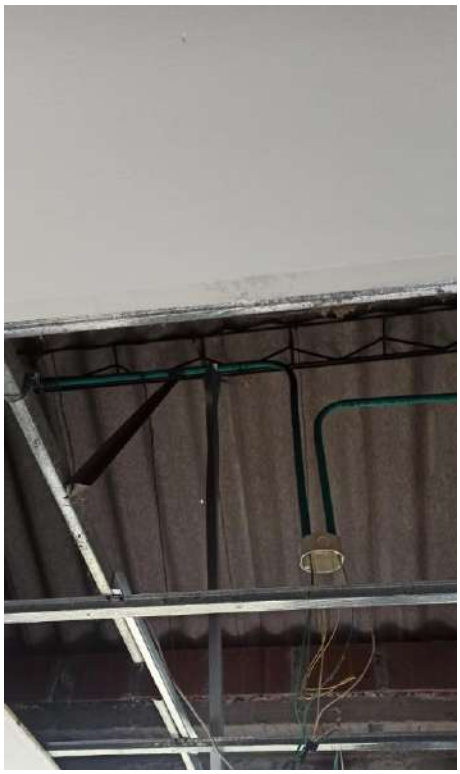

REVISIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO EXISTENTE

Todos los puntos hidráulicos poseían problemas tanto en sanitarios, como lavamanos y orinales de los baños de hombre y mujeres del primer y segundo piso, se procedió a recuperarlos y ponerlos en funcionamiento.



INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta



INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE PARED

Los orinales ubicados en baños de hombres tanto del primer piso como del segundo piso se encontraban dañados, se desinstalaron y se suministraron e instalaron los nuevos.





SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS INSTITUCIONAL

Se realizó el desmonte y se instaló el lavamanos en el baño que se usan para el público.



INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta



SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE

Se desmontaron todos los caballetes deteriorados y se instalaron todos nuevos para un total de 50,40 ml



INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta








INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TRASLUCIDA


Todas las tejas traslucidas fueron reemplazadas, ya que las existentes se encontraban tostadas por el sol, deterioradas y fisuradas.

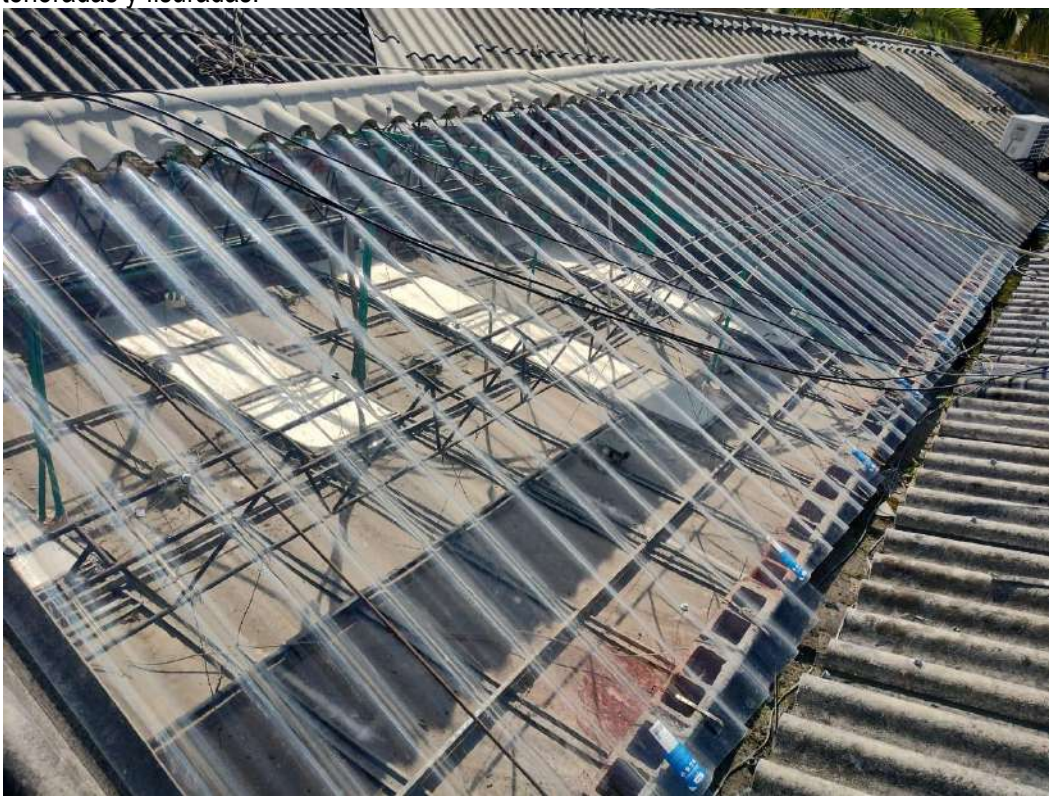

INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta



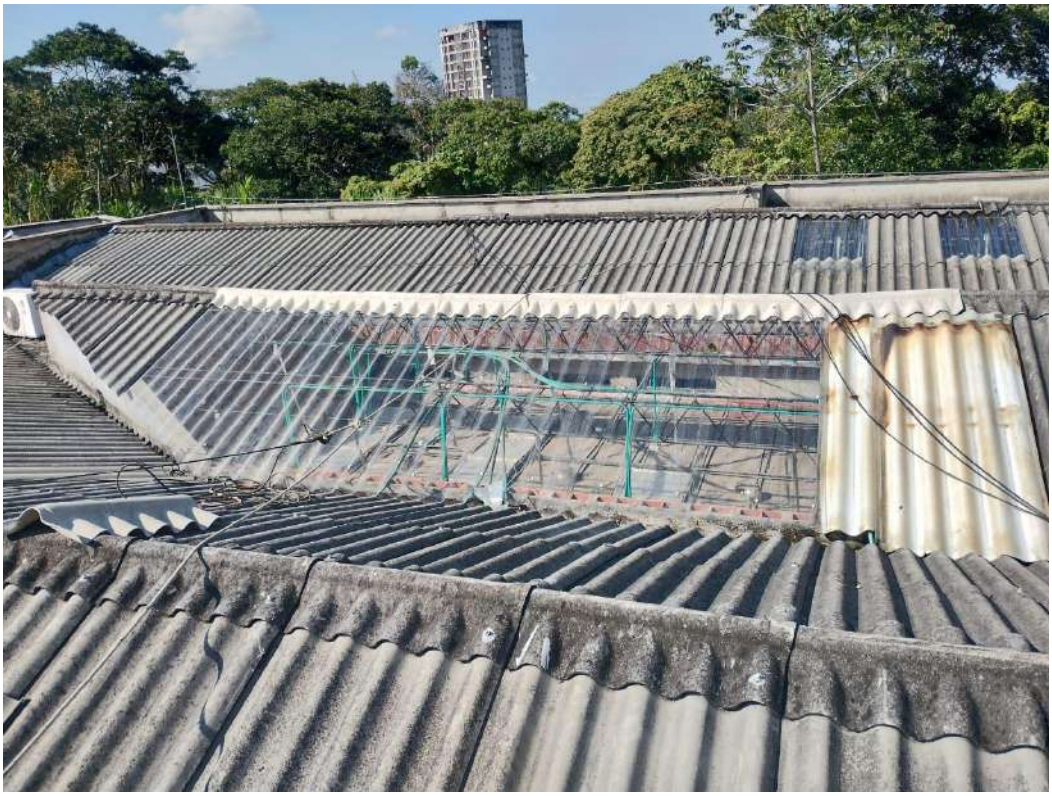

INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta

SELLO CON SIKAFLEX

Una de las principales causas del ingreso del agua a los muros de la institución, radicaba en el ingreso del agua entre la ventana y el muro donde esta instalada la perfilería, se procedió a aplicar un cordón en Sika Flex por todo el contorno de la ventana por su parte externa, así garantizar el no ingreso de agua por estos espacios.





INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta

RESANE EN CIELO PLACA ARCHIVO

La placa de cielo raso de la zona de archivo se encontraba a punto de desprenderse por la humedad que presentaba, después de ser reemplazado la placa por la hoja de fibrocemento se resana y se estuca.







INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta

IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS


Todos los muros afectados por humedad, tuvieron un tratamiento de impermeabilización para garantizar que no vuelva a surgir la humedad y garantizar la estabilidad de la pintura.





LIMPIEZA DE LUCETAS

Las lucetas ubicadas en el cielo raso se encontraban sucias y esto impedía el ingreso de luz natural.

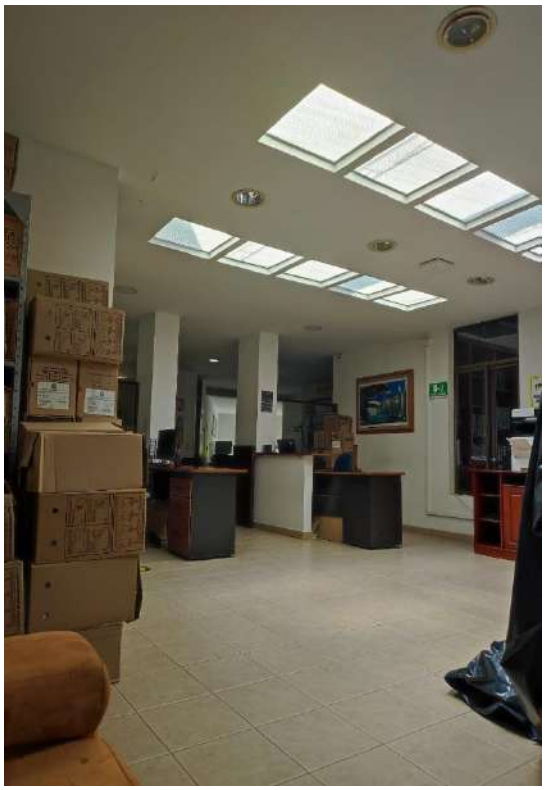



INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA ORINAL

Se instaló la grifería para el funcionamiento de los orinales nuevos, ya que este ítem no lo incluía.





SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS, INCLUYE ACCESORIOS DE DESAGUES

Se cambiaron todas las llaves y accesorios para el desagüe de lavamanos que se encontraban con fugas.






INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA 18W LED DE INCRUSTAR

Se suministraron e instalaron 42 de 18w lámparas que no funcionaban, ubicadas en oficinas y halls ubicados en primer y segundo piso.

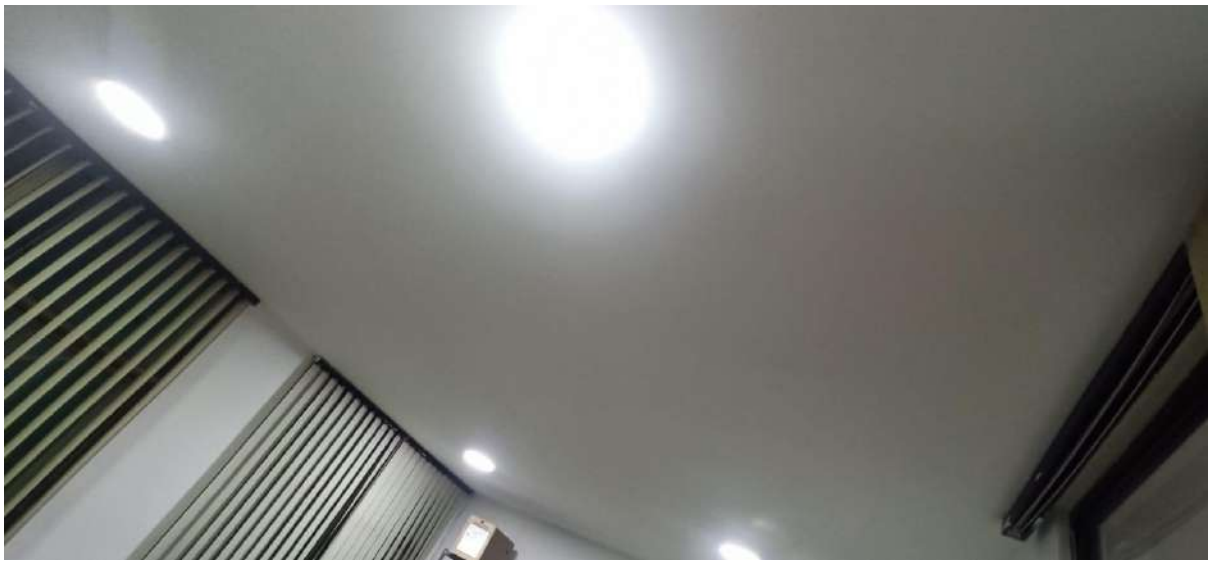



INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta





2.7 ACTIVIDADES EJECUTADAS

Item	Descripción	Condiciones Iniciales	ACTA	
		Und	Cantidad	Vr. Pagado
1	**PRELIMINARES**			
1.01	Localización replanteo obra existente	M2	393.89	$ 1,221,059.00
1.02	Desmonte de cielo raso, Incluye estructura	M2	89.30	$ 580,476.00
1.03	Desmonte de aparatos sanitarios incluye grifería	UND	4.00	$ 120,976.00
1.04	Desmonte Marco y Puerta en Madera	UND	1.00	$ 19,736.00
1.05	Desmonte de lámpara existente	UND	35.00	$ 1,137,675.00
1.06	Recorrido de cubierta	M2	393.89	$ 2,560,285.00
2	**CUBIERTA Y CIELO RASO**			
2.01	Cielo Raso en Panel Yeso incluye estructura de soporte	M2	89.30	$ 5,626,152.00
2.02	Impermeabilizacion viga canal Sika 1 mortero	ML	124.51	$ 2,552,455.00
2.03	Suministro e instalación de Cubierta teja fibrocemento ondulada	M2	90.59	$ 3,170,475.00
2.04	Pintura con vinilo bajo Placa o Cielo raso	M2	552.51	$ 5,967,108.00
2.05	Estuco Cielos Plastico	M2	89.30	$ 821,596.80
2.06	Impermeabilización de placa de concreto, mediante mortero impermeabilizado y manto asfáltico. Incluye pintura.	M2	23.23	$ 5,806,500.00
2.07	Limpieza de canales, incluye reacomedación de soportes	ML	124.51	$ 1,506,571.00
2.08	Suministro e instalación de espuma expansiva	ML	20.00	$ 264,000.00
3	**MUROS Y ACABADOS**			
3.01	Rasqueteada y lijada de muros	M2	256.08	$ 1,152,359.55
3.02	Pintura con vinilo bajo Placa o Cielo raso	M2	69.20	$ 657,400.00
3.03	Estuco plástico sobre muro	M2	256.08	$ 3,841,198.50
3.04	Pintura con vinilo sobre muros tres manos	M2	904.10	$ 9,493,069.95
3.05	Muro en Panel Yeso e= 1/2" a dos caras	M2	10.97	$ 909,360.51
3.06	Estructura para muro en placa Liviana (Canal - Paral)	M2	5.49	$ 302,865.94
3.07	Suministro e instal. De puerta en doble lámina llena Cal. 16 con refuerzo interno, incluye marco y bisagras antivandálicas	M2	0.00	$ -
4	**REDES ELÉCTRICAS - ILUMINACIÓN**			
4.01	Luminaria Tipo Panel Led 15 W	UND	0.00	$ -
4.02	Punto eléctrico iluminación	UND	35.00	$ 2,257,500.00

INFORME DE OBRA

Claudia Díaz
arquitecta

4.03	Punto eléctrico salida para toma y/o interruptores	UND	6.00	$	279,000.00
4.04	Desmonte Y Retiro De Red Electrica Existente En Placa, Incluye Accesorios. (Area Aproximada De Desmonte 80 Mt²) Y Traslado Sitio Interno De Disposicion De Desmontes Y De Mas Elementos Necesarios Para La Ejecucion Del Item	GLB	1.00	$	400,000.00
4.05	Suministro e instalación de toma GFCI	UND	5.00	$	475,000.00
5	**REDES HIDROSANITARIAS**				
5.01	Revisión de Punto Hidráulico existente	UND	10.00	$	66,000.00
5.02	Revisión aparato sanitario	UND	10.00	$	423,000.00
5.03	Suministro e instalación orinal de pared	UND	3.00	$	1,155,000.00
5.04	Suministro e instalación sanitario institucional	UND	1.00	$	580,000.00
5.05	Desmonte de aparatos sanitarios incluye grifería	UND	2.00	$	60,488.00
5.06	Suministro e instalación lavamanos institucional	UND	1.00	$	298,000.00
6	**LIMPIEZA DE OBRA**				
6.01	Cargue y retiro de material sobrante hasta 25Km	M3	14.00	$	715,834.00
6.02	Limpieza general de espacios construidos	M2	400.00	$	1,200,000.00
7	**OBRAS ADICIONALES**				
7.01	SELLO CON SIKAFLEX	ML	122.98	$	586,614.60
7.02	IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS	M2	225.50	$	6,458,148.91
7.03	RESANE EN CIELO PLACA ARCHIVO	M2	69.20	$	2,257,996.00
7.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE	ML	50.40	$	2,879,805.60
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TRASLUCIDA	M2	108.00	$	8,642,592.00
7.06	TRATAMIENTO DE VIGA CANALES EN CONCRETO	ML	124.51	$	5,802,290.51
7.07	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA CIELO FALSO	M2	89.30	$	2,778,068.83
7.08	CONSTRUCCION DE CANALES RECOLECTORAS DE AGUA LLUVIA	ML	30.00	$	3,037,140.00
7.09	LIMPIEZA DE BAJANTES DE AGUA LLUVIAS	ML	45.10	$	1,584,182.60
7.10	LIMPIEZA DE LUCETAS	UND	41.00	$	520,946.00
7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA ORINAL	UND	2.00	$	544,972.93
7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS, INCLUYE ACCESORIOS DE DESAGUES	UND	9.00	$	1,002,155.65
7.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA 18W LED DE INCRUSTAR	UND	42.00	$	2,319,309.80
7.14	SUMINISTRO E INSTACIÓN PUERTA LAMINA CAL. 20 (0,65-1,3 *2) ANTI.+PINTURA+CHAPA+PASADOR+MARCO	UND	1.00	$	966,489.54


COSTO DIRECTO:			**$**	**95,001,854.23**
ADMINISTRACIÓN:	23.68%		$	22,496,439.00
IMPREVISTOS:	1%		$	950,019.00
UTILIDAD:	3%		$	2,850,056.00

COSTO TOTAL:			**$ 121,298,368.23**

3. REALIZACION DEL INFORME CONTRACTUAL DE OBRA

Este informe se ejecutó mediante las evidencias recolectadas por el personal de obra, y con el respectivo análisis de la documentación entregada por el contratista durante el tiempo de ejecución del proyecto, en el cual se desarrolló el presente informe.

De esta manera **LA CONTRATISTA**, se hace responsable de la buena ejecución de este mismo, y procede a firmar el informe en su totalidad.



CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO INFORME SST

CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO

INFORME DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2023

ÁREA SST

OBJETO DEL CONTRATO:

“MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO”

CONTRATO DE OBRA No 163 DE 2023

DIRIGIDO A:

SUPERVISIÓN

INTERVENTORÍA:

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO

INTRODUCCIÓN

Se realiza informe del proyecto **“MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO”** EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA, Es fundamental la realización mensual del Sistema de Gestión, con el enfoque fundamental en la práctica de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, buscando siempre mes a mes el mejoramiento continuo en el comportamiento de los empleados, y las condiciones de trabajo y el medio ambiente laboral, con un control eficaz de los peligros y riesgos propios de la realización de las tareas diarias en cada puesto de trabajo, Contando con el apoyo, liderazgo e implementación del contratista, con la participación de los trabajadores garantizando la seguridad de cada trabajador.

OBJETIVO

Este informe tiene como objetivo presentar el desarrollo de las actividades diarias del proyecto, **“MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO”** en el municipio de Circasia. en este, se relacionan las actividades que se realizaron durante el mes, según lo previsto en el sistema de Gestión con el fin de generar y promover el trabajo sano y seguro, así como buenos ambientes de trabajo; el bienestar físico, mental y social de los trabajadores.

1. LISTADO DE PERSONAL

En el proyecto se contó con colaboradores altamente calificados y certificados con la documentación solicitada por nuestro cliente (afiliaciones, certificación para trabajo en alturas) divididos en todos los cargos.

2. INVESTIGACIONES DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Durante todo el proyecto no se presentó ningún accidente de trabajo. Por lo tanto, en cada evento de accidente, se realiza la investigación en el tiempo establecido, lección aprendida realizada por la persona accidentada, versión de los testigos si se requiere, socialización e implementación del plan de acción respectivo de acuerdo con el accidente.

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Durante la ejecución del proyecto se lleva a cabo un registro fotográfico para tener una trazabilidad de las actividades del área SST, donde se puede evidenciar la gestión como pausas activas o calistenia, charlas y capacitaciones de seguridad, proceso de señalización y demarcación, uso de elementos de protección personal.

4. INSPECCIONES

Durante el periodo se realizaron las inspecciones de seguridad conforme a los programas de inspección pertenecientes en el mes, las cuales van como anexos a este informe.

5. ASISTENCIA A CHARLAS Y/O CAPACITACIONES

Enfocados en el cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo, y de los compromisos planteados en el proyecto para mejorar nuestra calidad laboral; se realizaron en el mes **las** capacitaciones programadas en el periodo, las cuales van adjuntas a este informe.

6. LLAMADOS DE ATENCIÓN

Durante el periodo no se emitieron llamados de atención escritos, sin embargo, se ha reforzado en las charlas de seguridad diaria los temas de cumplimiento de normas establecidas.

7. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

La ejecución del proyecto implica la realización de actividades de alto riesgo, principalmente trabajo en alturas, por lo tanto, se hace necesario verificar y controlar constantemente los aspectos de seguridad para los trabajos especiales por medio de los permisos de trabajo, Entre las responsabilidades están, Garantizar y asegurar que los aprobadores, solicitantes y ejecutores han recibido adiestramiento en la identificación y valoración de los riesgos

Ver anexo. Permisos de trabajo

8. SEGURIDAD SOCIAL

La seguridad social, una de las principales responsabilidades corporativas que mes a mes se ve reflejado en el pago de aportes a cada entidad prestadora del servicio. Para la empresa Héctor Mario soto la seguridad es lo más importante.

Ver anexo. Seguridad social

9. ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN

El personal que ingresa al contrato es dotado completamente con sus elementos de protección personal. (Mono gafas, guantes de vaqueta, y plástico, casco), entre otros de acuerdo con las actividades a realizar.

Una vez deteriorados los elementos de protección son reemplazados por el área de SST.

Ver anexo. Soportes de entrega de elementos de protección personal y reposición

10. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

Enfocados en el cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo, y de los compromisos planteados en el proyecto para mejorar nuestra calidad laboral; se realiza el cronograma de capacitaciones y se da estricto cumplimiento.

Angela Gusales R.

PROFESIONAL SST
CC.1096032586
Resolución No 63-
3601 DEL 31 DE MAYO
DEL 2019

Contrato N°	163 DE 2023
OBJETO	**MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO**
Interventor:	Instituto Departamental de tránsito del Quindío
Contratista:	Claudia Ximena Díaz Arévalo
Periodo reportado:	**Informe del 22 de noviembre al 22 de diciembre 2023**
Elaborado por	**Ángela Grisales rodríguez. Profesional SST**

Abreviaturas utilizadas:

ATS: Análisis de Trabajo Seguro.
EPP: Elementos de protección personal
SST: Seguridad y Salud en el trabajo.
SG-SST: Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo

 SEÑALIZACON EN AREA DE TRABAJO	 SEÑALIZACIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO
 ORDEN Y ASEO EN OBRA	 ORDEN Y ASEO EN OBRA

 USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	 USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	
ENTREGA DE EPP	ENTREGA DE EPP

INDUCCION POLITICAS SST 	CAPACITACIÓN USO Y CUIDADO DE EPP 
CAPACITACIÓN SOBRE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 	CHARLAS DE SEGURIDAD DIARIAS DE 5 MIN 

	
PAUSAS ACTIVAS	PAUSAS ACTIVAS
	
PAUSAS ACTIVAS	PRIMEROS AUXILIOS

SUPERVISION Y CONTROL DE TAREAS DE ALTO RIESGO 	
CONCIENTIZACIÓN Y EXPLICACIÓN SOBRE DILIGENCIAMIENTO DE PERMISOS EN ALTURAS 	

Anexos

- Registro Fotográfico
- Permisos de alturas
- CERTIFICACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS
- Asistencias a charlas y capacitaciones
- Entrega de epp
- Planilla

CENTRO DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO EN PROTECCION CONTRA CAIDAS PARA TRABAJO EN ALTURAS
LICENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No 478 de septiembre de 2014
BUREAU VERITAS REGISTRO - CO20.00640 – 2020 Marzo 02
Acreditado ONAC 08-CPR-009
Autorizado MINTRABAJO 08SE2019220000000021554 de Junio 06 de 2019



CERTIFICA QUE:

JUAN DANIEL MOTATO CASTRILLON

CC. No 18493227

RAZÓN SOCIAL: CLAUDIA XIMENA DIAZAREVALO **NIT**: 1094907299
ARL DEL TRABAJADOR: POSITIVA
SECTOR DE LA CONSTRUCCION

CURSO Y APROBÓ LA FORMACIÓN:

TRABAJO EN ALTURAS

REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272

Intensidad de Horas 12

Dando cumplimiento a la Resolución 4272 de Diciembre 27 de 2021 del Ministerio de Trabajo
En constancia se valida con la firma Digital del Certificador, dado en Armenia Q., a los **29 días del mes de Noviembre de 2023.**

No CERTIFICADO 0683

CERTIFICADO DIGITAL
Verifique en
www.corporacionhseq.com

JAIRO ANTONIO LADINO LADINO
Representante Legal

CERTIFICADO DIGITAL
Verifique en
www.corporacionhseq.com

JAIRO ANTONIO LADINO LADINO
Entrenador Trabajo Seguro en Alturas SENA
CC. No 7.554.761
Licencia Salud Ocupacional No 63 - 2104 - 2020 - SDSQ

Para VERIFICAR la autenticidad de este Certificado se puede consultar en el correo electrónico: **certificadosta@corporacionhseq.com / Cel. 316 478 0648**
DESCARGAR CERTIFICADO DIGITAL – www.corporacionhseq.com/certificados

CENTRO DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO EN PROTECCION CONTRA CAIDAS PARA TRABAJO EN ALTURAS
LICENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No 478 de septiembre de 2014
BUREAU VERITAS REGISTRO - CO20.00640 – 2020 Marzo 02
Acreditado ONAC 08-CPR-009
Autorizado MINTRABAJO 08SE2019220000000021554 de Junio 06 de 2019



CERTIFICA QUE:

JOHAN SEBASTIAN MORENO LONDOÑO

CC. No 1115193241

RAZÓN SOCIAL: CLAUDIA XIMENA DIAZ AREVALO **NIT**: 1094907299
ARL DEL TRABAJADOR: POSITIVA
SECTOR DE LA CONSTRUCCION

CURSO Y APROBÓ LA FORMACIÓN:

TRABAJO EN ALTURAS

TRABAJADOR AUTORIZADO

Intensidad de Horas 32

Dando cumplimiento a la Resolución 4272 de Diciembre 27 de 2021 del Ministerio de Trabajo
En constancia se valida con la firma Digital del Certificador, dado en Armenia Q., a los **29 días del mes de Noviembre de 2023.**

No CERTIFICADO 0511

CERTIFICADO DIGITAL
Verifique en
www.corporacionhseq.com

JAIRO ANTONIO LADINO LADINO
Representante Legal

CERTIFICADO DIGITAL
Verifique en
www.corporacionhseq.com

JAIRO ANTONIO LADINO LADINO
Entrenador Trabajo Seguro en Alturas SENA
CC. No 7.554.761
Licencia Salud Ocupacional No 63 - 2104 - 2020 - SDSQ

Para VERIFICAR la autenticidad de este Certificado se puede consultar en el correo electrónico: **certificadosta@corporacionhseq.com / Cel. 316 478 0648**
DESCARGAR CERTIFICADO DIGITAL – www.corporacionhseq.com/certificados

CENTRO DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO EN PROTECCION CONTRA CAIDAS PARA TRABAJO EN ALTURAS
LICENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No 478 de septiembre de 2014
BUREAU VERITAS REGISTRO - CO20.00640 – 2020 Marzo 02
Acreditado ONAC 08-CPR-009
Autorizado MINTRABAJO 08SE2019220000000021554 de Junio 06 de 2019



CERTIFICA QUE:

JEINER ANDRES SANCHEZ GONZALEZ

CC. No 1094974696

RAZÓN SOCIAL: CLAUDIA XIMENA DIAZ AREVALO **NIT**: 1094907299
ARL DEL TRABAJADOR: POSITIVA
SECTOR DE LA CONSTRUCCION

CURSO Y APROBÓ LA FORMACIÓN:

TRABAJO EN ALTURAS

TRABAJADOR AUTORIZADO

Intensidad de Horas 32

Dando cumplimiento a la Resolución 4272 de Diciembre 27 de 2021 del Ministerio de Trabajo
En constancia se valida con la firma Digital del Certificador, dado en Armenia Q., a los **29 días del mes de Noviembre de 2023.**

No CERTIFICADO 0512

CERTIFICADO DIGITAL
Verifique en
www.corporacionhseq.com

JAIRO ANTONIO LADINO LADINO
Representante Legal

CERTIFICADO DIGITAL
Verifique en
www.corporacionhseq.com

JAIRO ANTONIO LADINO LADINO
Entrenador Trabajo Seguro en Alturas SENA
CC. No 7.554.761
Licencia Salud Ocupacional No 63 - 2104 - 2020 - SDSQ

Para VERIFICAR la autenticidad de este Certificado se puede consultar en el correo electrónico: **certificadosta@corporacionhseq.com / Cel. 316 478 0648**
DESCARGAR CERTIFICADO DIGITAL – www.corporacionhseq.com/certificados

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1096032586		GRISALES RODRIGUEZ ANGELA JENNIFER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 12 N 45 12	ARMENIA-QUINDIO	7359106	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	43853279	9459858251	I	2023/12/21	2023/12/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$330,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1096032586	GRISALES RODRIGUEZ ANGELA JENNIFER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$330,600**	**$0**	**$0**	**$330,600**

2023/12/21 04:58 PM

ANEXO PLANILLAS TRABAJADORES

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-13, 04:19:04 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 67614331

Periodo Cotización: noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** diciembre de 2023

PAGADO 13/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CLAUDIA XIMENA DIAZ AREVALO		
Documento	NI1094907299	**Dirección**	Barrio Accion Comunal Cra 10 No. 14A-02
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3137462613
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA TEBAIDA	**Departamento**	QUINDIO
Representante Legal	DIAZ AREVALO CLAUDIA XIMENA	**Identificación**	CC 1094907299
Total Afiliados	11	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1097038025	HECTOR FABIO ARREDONDO BEDOYA	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1094959673	CRISTIAN ANDRES BOISON VITONCO	01	00	X																0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 386.667	$ 61.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 386.667	$ 15.500	6,960	$ 386.667	$ 27.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 386.667	$ 15.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.900
CC 1098313261	ANGIE KATERINE ESTRADA ANTIVAR	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1090272230	ALEJANDRO FUELANTALA SANDOVAL	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 18469118	JHON FREDY MORALES PEREZ	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1115193241	JHOAN SEBASTIAN MORENO LONDOÑO	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 348.000	$ 55.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 348.000	$ 14.000	6,960	$ 348.000	$ 24.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
CC 18493227	JUAN DANIEL MOTATO CASTRILLON	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 348.000	$ 55.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 348.000	$ 14.000	6,960	$ 348.000	$ 24.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
CC 1094958829	DIEGO ALEXANDER MOTATO GRISALES	01	00	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 232.000	$ 37.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 232.000	$ 9.300	6,960	$ 232.000	$ 16.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 18497722	DAGOBERTO MOTATO MOTATO	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 18418527	JIMMY VLADIMIR PIEDRAHITA RUIZ	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1094974696	JEINER ANDRES SANCHEZ GONZALEZ	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 348.000	$ 55.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 348.000	$ 14.000	6,960	$ 348.000	$ 24.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.016.002	$ 3.016.002	$ 3.016.002	$ 3.016.002	$ 482.800	$ 121.200	$ 210.400	$ 121.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 935.600	$ 0	$ 935.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-12-26, 03:42:21 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2024
Empresa	CLAUDIA XIMENA DIAZ AREVALO
NIT	NI 1094907299
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	67800279
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	361622612
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 2.206.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	18	$ 742.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	4	$ 130.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	$ 260.000	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 6.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	8	$ 108.500	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	4	$ 38.900	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 1.600	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	3	$ 12.500	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	6	$ 77.600	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 3.100	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	3	$ 43.400	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	26	$ 496.100	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	26	$ 285.600	$ 0
		SubTotales:		$ 2.206.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 2.206.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-26, 03:45:06 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 67800279

Periodo Cotización: diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** enero de 2024

PAGADO 26/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CLAUDIA XIMENA DIAZ AREVALO		
Documento	NI1094907299	**Dirección**	Barrio Accion Comunal Cra 10 No. 14A-02
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3137462613
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA TEBAIDA	**Departamento**	QUINDIO
Representante Legal	DIAZ AREVALO CLAUDIA XIMENA	**Identificación**	CC 1094907299
Total Afiliados	26	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096040035	KELLY YURANY ACOSTA HENAO	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1097729307	BRAYAN ESTEVEN ALEGRIA RIOS	01	00	X	X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 386.667	$ 61.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 386.667	$ 15.500	6,960	$ 386.667	$ 27.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 386.667	$ 15.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.900
CC 7556267	JULIO CESAR ALZATE CORTES	01	00	X	X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 386.667	$ 61.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 386.667	$ 15.500	6,960	$ 386.667	$ 27.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 386.667	$ 15.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.900
CC 1097038025	HECTOR FABIO ARREDONDO BEDOYA	01	00		X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 77.334	$ 12.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 77.334	$ 3.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 1094959673	CRISTIAN ANDRES BOISON VITONCO	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1098313261	ANGIE KATERINE ESTRADA ANTIVAR	01	00		X															0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 309.334	$ 49.500	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 309.334	$ 12.400	6,960	$ 309.334	$ 21.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 18469768	MAURICIO FLOREZ PEREZ	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1090272230	ALEJANDRO FUELANTALA SANDOVAL	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 89006906	JORGE IVAN GIRALDO DELGADO	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 77.334	$ 12.400	(EPS010) EPS SURA	$ 77.334	$ 3.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 18415731	YONI OBDULIO GUTIERREZ OROZCO	01	00	X	X															0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 580.000	$ 92.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 580.000	$ 23.200	6,960	$ 580.000	$ 40.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.600
CC 1094946291	HECTOR FABIO GUTIERREZ RIAÑO	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 7531948	LUIS ALFONSO JIMENEZ VENEGAS	01	00	X	X															0	18	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	$ 696.000	$ 111.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 696.000	$ 27.900	6,960	$ 696.000	$ 48.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700
CC 1005279029	JOHAN ANDRES MARTINEZ GAÑAN	01	00	X	X															0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 116.000	$ 18.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 116.000	$ 4.700	6,960	$ 116.000	$ 8.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.100
CC 18469118	JHON FREDY MORALES PEREZ	01	00		X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 77.334	$ 12.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 77.334	$ 3.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 1115193241	JHOAN SEBASTIAN MORENO LONDOÑO	01	00		X															0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 850.667	$ 136.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 850.667	$ 34.100	6,960	$ 850.667	$ 59.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 850.667	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.700
CC 4408801	JORGE ELIECER MOTATO CASTRILLON	01	00	X	X															0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 850.667	$ 136.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 850.667	$ 34.100	6,960	$ 850.667	$ 59.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 850.667	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.700
CC 18493227	JUAN DANIEL MOTATO CASTRILLON	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1094958829	DIEGO ALEXANDER MOTATO GRISALES	01	00		X															0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 116.000	$ 18.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 116.000	$ 4.700	6,960	$ 116.000	$ 8.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.100
CC 18497722	DAGOBERTO MOTATO MOTATO	01	00		X															0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 580.000	$ 23.200	6,960	$ 580.000	$ 40.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 26/12/2023 | **Empresa NI1094907299 CLAUDIA XIMENA DIAZ AREVALO** | **Planilla Nro: 67800279** | **Periodo Cotización: diciembre de 2023** | **Periodo Servicio: enero de 2024**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1120867660	FABIAN PARRA COLORADO	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 18418527	JIMMY VLADIMIR PIEDRAHITA RUIZ	01	00		X															0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 773.334	$ 31.000	6,960	$ 773.334	$ 53.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1094964484	JULIAN DAVID PINEDA VELEZ	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1193645406	JOHN ALEXANDER RAMIREZ GALVIS	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 77.334	$ 12.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 77.334	$ 3.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 1094964846	GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ CASTRO	01	00	X	X															0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 193.334	$ 31.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 193.334	$ 7.800	6,960	$ 193.334	$ 13.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 193.334	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.100
CC 1094974696	JEINER ANDRES SANCHEZ GONZALEZ	01	00		X															0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 580.000	$ 23.200	6,960	$ 580.000	$ 40.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.600
CC 4824807	EUSEBIO VALENCIA MORENO	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 77.334	$ 12.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 77.334	$ 3.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.114.676	$ 7.114.676	$ 7.114.676	$ 7.114.676	$ 1.139.100	$ 285.600	$ 496.100	$ 285.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.206.400	$ 0	$ 2.206.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-12-13, 04:13:45 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2023
Empresa	CLAUDIA XIMENA DIAZ AREVALO
NIT	NI 1094907299
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	67614331
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	335502038
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 935.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	11	$ 482.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	4	$ 38.900	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 14.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	$ 3.200	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	$ 61.900	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	2	$ 3.200	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	11	$ 210.400	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	11	$ 121.200	$ 0
		SubTotales:		$ 935.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 935.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO PLANILLAS CONTRATISTA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1094907299	CLAUDIA XIMENA DIAZ AREVALO	CRA 10 NO 14A - 11 BRR ACCION COMUNAL	3137462613	arq.cxda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		QUINDIO	ARMENIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
73537347	26/12/2023				EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-12	2023-12	N	26/12/2023	73543820	$1.216.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	428.800	0		0		0	0	0	0	428.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	548.800	0	0	0	0	0	0		548.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	238.700				238.700	0	0	238.700			2.387	238.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	428.800	428.800
Pensión	1	548.800	548.800
Riesgos Laborales	1	238.700	238.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.216.300	1.216.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1094907299	CLAUDIA XIMENA DIAZ AREVALO	CRA 10 NO 14A - 11 BRR ACCION COMUNAL	3137462613	arq.cxda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			QUINDIO	ARMENIA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
73537347	26/12/2023	N	26/12/2023	73543820	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-12				$1.216.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1094907299	DIAZ AREVALO CLAUDIA XIMENA	57	0			N																	230301	4.630.000	740.800	0	0	0	0	EPS005	4.630.000	578.800	14-23	4.630.000	5	322.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CLAUDIA XIMENA DIAZ AREVALO**, identificada con **CC** número **1094907299**, aportó por el empleado **CLAUDIA XIMENA DIAZ AREVALO**, identificado(a) con **CC** número **1094907299** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **I** número **73186830** para el periodo de salud **2023-11** y pensiones **2023-11** de la siguiente forma.

TIPO	CODIGO	NOMBRE	NIT	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	INDICA TARIFA PENSIÓN	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
Pensiones	230301	Porvenir	800224808	57	0															0		30	$1.160.000	0,16000			$185.600	$0	$0	Noviembre - 2023	73186830	11/12/2023	N
Riesgos Laborales	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	860011153	57	0															0		30	$1.160.000	0,06960	5		$80.800	$0	$0	Noviembre - 2023	73186830	11/12/2023	N
Salud	EPS005	Sanitas EPS	800251440	57	0															0		30	$1.160.000	0,12500			$145.000	$0	$0	Noviembre - 2023	73186830	11/12/2023	N

PAGADA

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Diciembre de 2023

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CLAUDIA XIMENA DIAZ AREVALO	**NIT:**	1094907299
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2023
Número de Radicación:	73186830	**Total a pagar:**	$411,400
Fecha de vencimiento:	26/12/2023	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	11/12/2023	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	331001534
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$80,800
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$185,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$145,000
						$411,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1094907299	CLAUDIA XIMENA DIAZ AREVALO	CRA 10 NO 14A - 11 BRR ACCION COMUNAL	3137462613	arq.cxda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			QUINDIO	ARMENIA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	11/12/2023	73186830	$411.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	80.800				80.800	0	0	80.800			808	80.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	80.800	80.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	411.400	411.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1094907299	CLAUDIA XIMENA DIAZ AREVALO		CRA 10 NO 14A - 11 BRR ACCION COMUNAL	3137462613	arq.cxda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			QUINDIO	ARMENIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	11/12/2023	73186830	$411.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1094907299	DIAZ AREVALO CLAUDIA XIMENA	57	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CLAUDIA XIMENA DIAZ AREVALO	**NIT:**	1094907299
Tipo Planilla:	N	**Periodo liquidación Pensiones:**	diciembre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2023
Número de Radicación:	73543820	**Total a pagar:**	$1,216,300
Fecha de vencimiento:	24/01/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	26/12/2023	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	361444544
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$238,700
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$548,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$428,800
						$1,216,300

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CLAUDIA XIMENA DIAZ AREVALO**, identificada con **CC** número **1094907299**, aportó por el empleado **CLAUDIA XIMENA DIAZ AREVALO**, identificado(a) con **CC** número **1094907299** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **N** número **73543820** para el periodo de salud **2023-12** y pensiones **2023-12** de la siguiente forma.

TIPO	CODIGO	NOMBRE	NIT	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	INDICA TARIFA PENSIÓN	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
Pensiones	230301	Porvenir	800224808	57	0															0	A	30	($1.200.000)	(0,16000)			($192.000)	$0	$0	Diciembre - 2023	73543820	26/12/2023	N
Pensiones	230301	Porvenir	800224808	57	0															0	C	30	$4.630.000	0,16000			$740.800	$0	$0	Diciembre - 2023	73543820	26/12/2023	N
Riesgos Laborales	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	860011153	57	0															0	A	30	($1.200.000)	(0,06960)	5		($83.600)	$0	$0	Diciembre - 2023	73543820	26/12/2023	N
Riesgos Laborales	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	860011153	57	0															0	C	30	$4.630.000	0,06960	5		$322.300	$0	$0	Diciembre - 2023	73543820	26/12/2023	N
Salud	EPS005	Sanitas EPS	800251440	57	0															0	A	30	($1.200.000)	(0,12500)			($150.000)	$0	$0	Diciembre - 2023	73543820	26/12/2023	N
Salud	EPS005	Sanitas EPS	800251440	57	0															0	C	30	$4.630.000	0,12500			$578.800	$0	$0	Diciembre - 2023	73543820	26/12/2023	N

PAGADA

El presente certificado se expide a los 26 días del mes Diciembre de 2023

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.
