	FORMATO	Código: F-INF-13
	Informe de Supervisión y/o Interventoría de obra	Versión: 05 Fecha: 19/03/2019
		Página 1 de 12

SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001
CONTRATO DE OBRA No. 021 DE 2023

SUPERVISOR: VANESSA KATHERINE RINCÓN GAVIRIA

APOYO A LA SUPERVISIÒN: JUAN JOSÉ ARIAS AGUIRRE
JULIAN ANDRES DIAZ AFANADOR

CONTRATISTA: HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 901.282.482

OBJETO: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL AREA PRODUCTIVA DE POSTCOSECHA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE GENOVA (ASOCIACIONES: ASOCORDILLERA, ASOCHAPOGEN, ASDEGEQUIN, ASOMERGEN, PORCIGENOVA Y ASSOCAFES), CENTRO LOGÌSTICO AGROINDUSTRIAL DE LA COOPERATIVA TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE CÒRDOBA Y DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INSTITUTO GÈNOVA, INSTITUCIÒN EDUCATIVA BAUDILIO MONTOYA, INSTITUTO BUENAVISTA, INSTITUCIÒN EDUCATIVA LUIS GRANADA MEJÌA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÌO"

1. DATOS GENERALES	
Modalidad de Contratación	Selección abreviada de menor cuantía
No. Proceso	040 de 2023
Tipo de Contrato	Obra pública
Secretaría que genera la necesidad y responsable de la elaboración del estudio previo.	Secretaría de Agricultura
Dependencia que genera el proceso	Secretaría de Agricultura
No. Del contrato	021 de 2023
Fecha de suscripción del contrato	01 de noviembre de 2023
Contratista	HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT / CC	901.282.482
Valor Inicial del Contrato	OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE ($81.213.170,18).
Forma de pago	VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato asciende a la suma de OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE

Powered by CamScanner

	de reajuste, mediante pagos parciales hasta llegar al cien por ciento (100%), así: La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales mensuales en Pesos Colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato. NOTA GENERAL: Todos los pagos quedan condicionados adicionalmente a que el contratista acredite el cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscal, a los que haya lugar en los términos de ley. Las actas de obra deberán ser suscritas por 8 el contratista y refrendadas por el supervisor del contrato, debiendo además ir acompañadas por los siguientes documentos: - Memorias de cálculo de cantidades. Balance de la ejecución de actividades. - Copia de bitácora del periodo a cancelar. - Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Laborales, Parafiscales, si hay lugar a ello), del respectivo periodo. - Factura de venta cumpliendo con las normas generales establecidas. - Certificado expedido por la persona encargada de la vigilancia y control del contrato que se suscriba, avalando el pago del respectivo periodo. - Copia de la pactación de precios (En caso de suscribirse). - Certificados de calidad de los materiales y equipos utilizados en los procesos constructivos, los que considere pertinentes el supervisor. - Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse). - Para el pago de la última acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de las obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes. - Notas aclaratorias: La Entidad no se hace

Powered by CamScanner

	responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. NOTA 1: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato
Plazo Inicial del contrato	El plazo de ejecución del contrato será de Cuarenta y Cinco (45) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. En todo caso no podrá exceder la vigencia 2023.
Fecha de inicio:	01 de noviembre de 2023
Fecha de suspensión:	N/P
Fecha de reinicio:	N/P
Fecha de terminación:	15 de diciembre de 2023
Modificación No. 001	N/P
Supervisor por parte del Departamento	VANESSA KATHERINE RINCÓN GAVIRIA

2. DATOS FINANCIEROS	
No. y valor del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	4486 del 13 de junio del 2023 por un valor de $ 85.000.000
No. y valor Registro Presupuestal	10346 de 26 de octubre de 2023 por un valor de $ 81.213.170,18

Powered by CamScanner

3. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA:

Inicialmente, se realiza una visita preliminar los espacios vinculados al contrato con el fin de conocer el estado de ellos, el proceso se lleva a cabo de manera continua y sin ningún contratiempo ejecutando así todas las actividades pactadas en el presupuesto contratado.

Se realizaron comités de obra para la verificación del avance y estado del proceso contractual los días 16 de noviembre, 23 de noviembre, 30 noviembre y 7 de diciembre

Se hicieron 6 frentes de trabajo para abordar todas las edificaciones a mejorar, donde estos realizaron actividades de rasqueteo y pintura, revoque, cambio de cubierta, pintura de pisos, instalación de cerramiento .

Los frentes de trabajo que se abordaron, fueron:

I.E BAUDILIO MONTOYA

I.E INSTITUTO GENOVA

I.E INSTITUTO BUENA VISTA

CENTRO LOGISTICO AGROPECUARIO
COOPERATIVA TERRITORIO NUESTRO


AREA PRODUCTIVA DE POSCOCECHA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE GENOVA

I.E LUIS GRANADA MEJIA

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Powered by CamScanner

Visita técnica 3 de noviembre de 2023

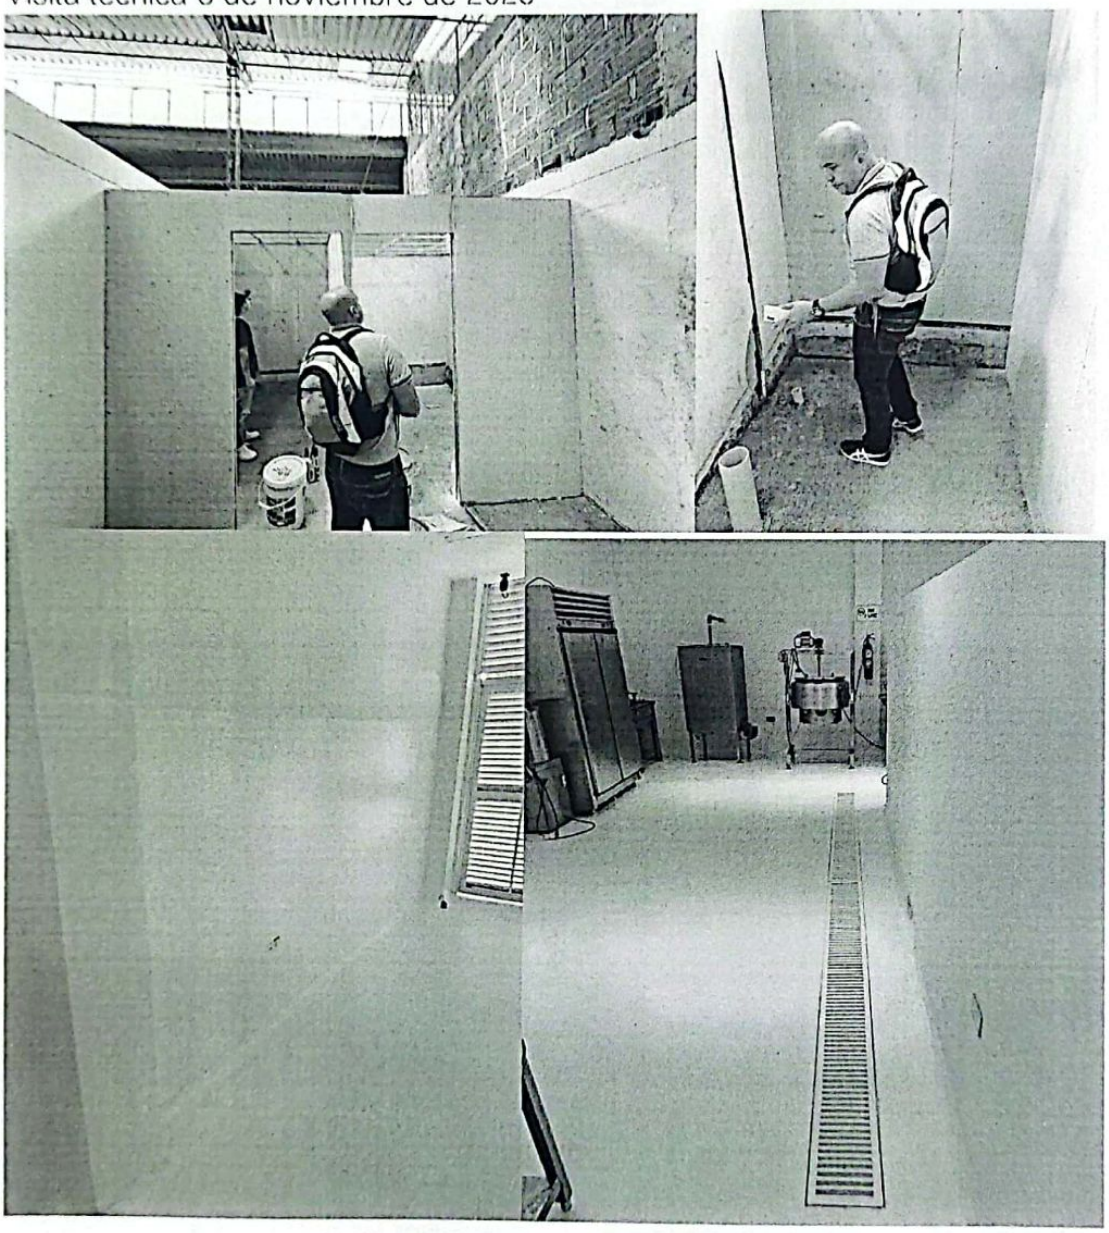



Powered by CamScanner

Visita técnica 16 de noviembre de 2023

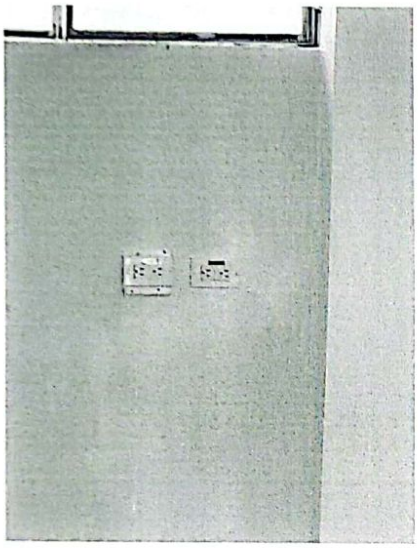




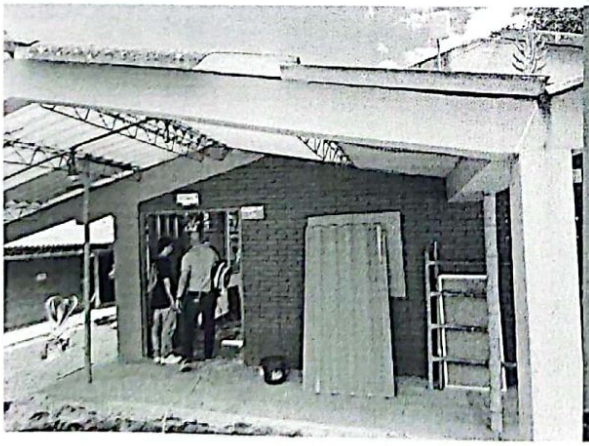


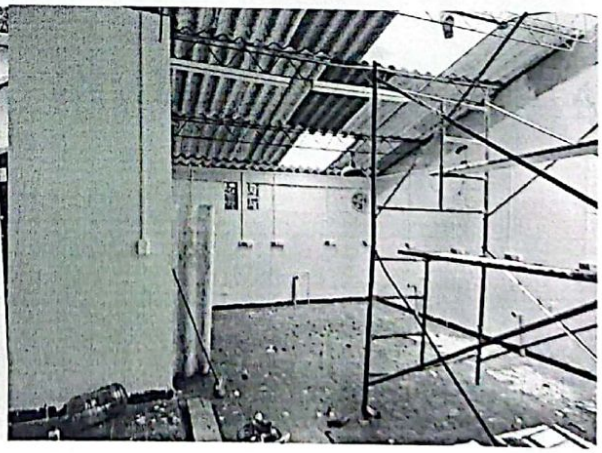


Powered by CamScanner

Visita técnica 23 de noviembre de 2023

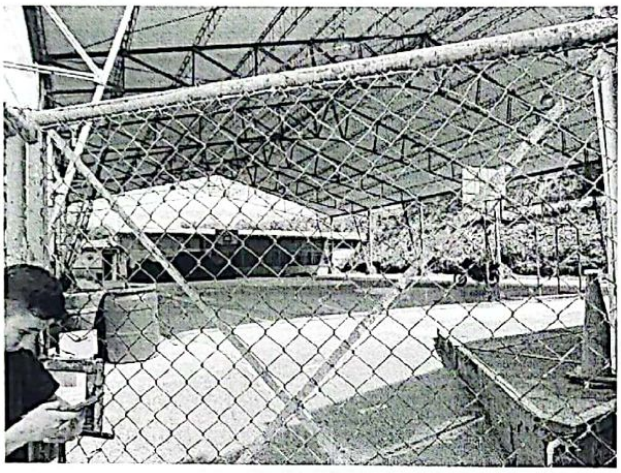

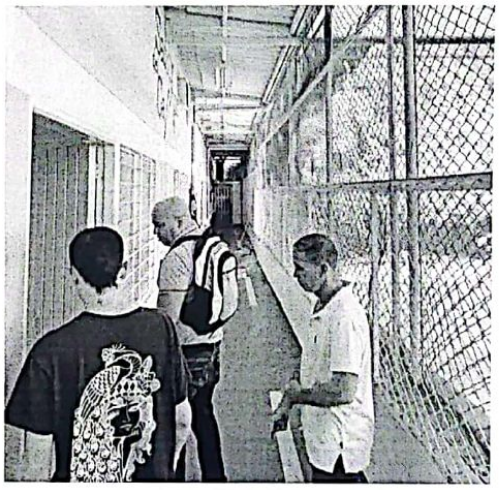


Visita técnica 30 de noviembre de 2023

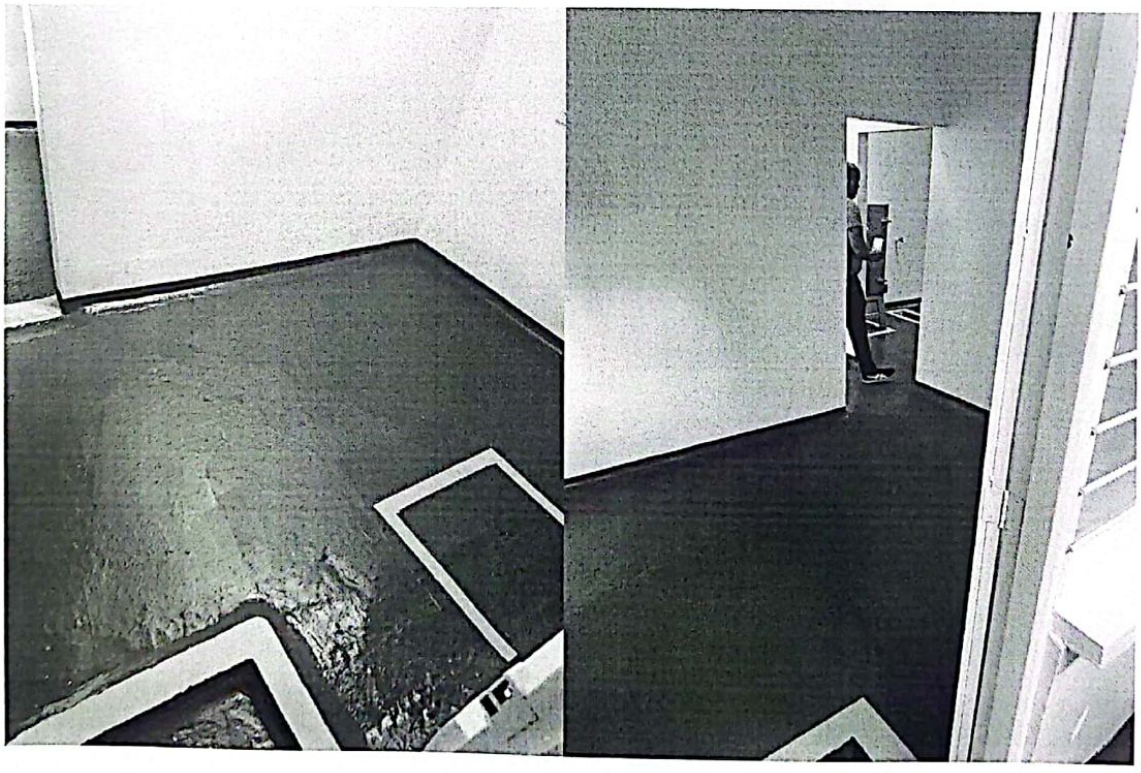

Powered by CamScanner


Visita técnica 07 de diciembre de 2023

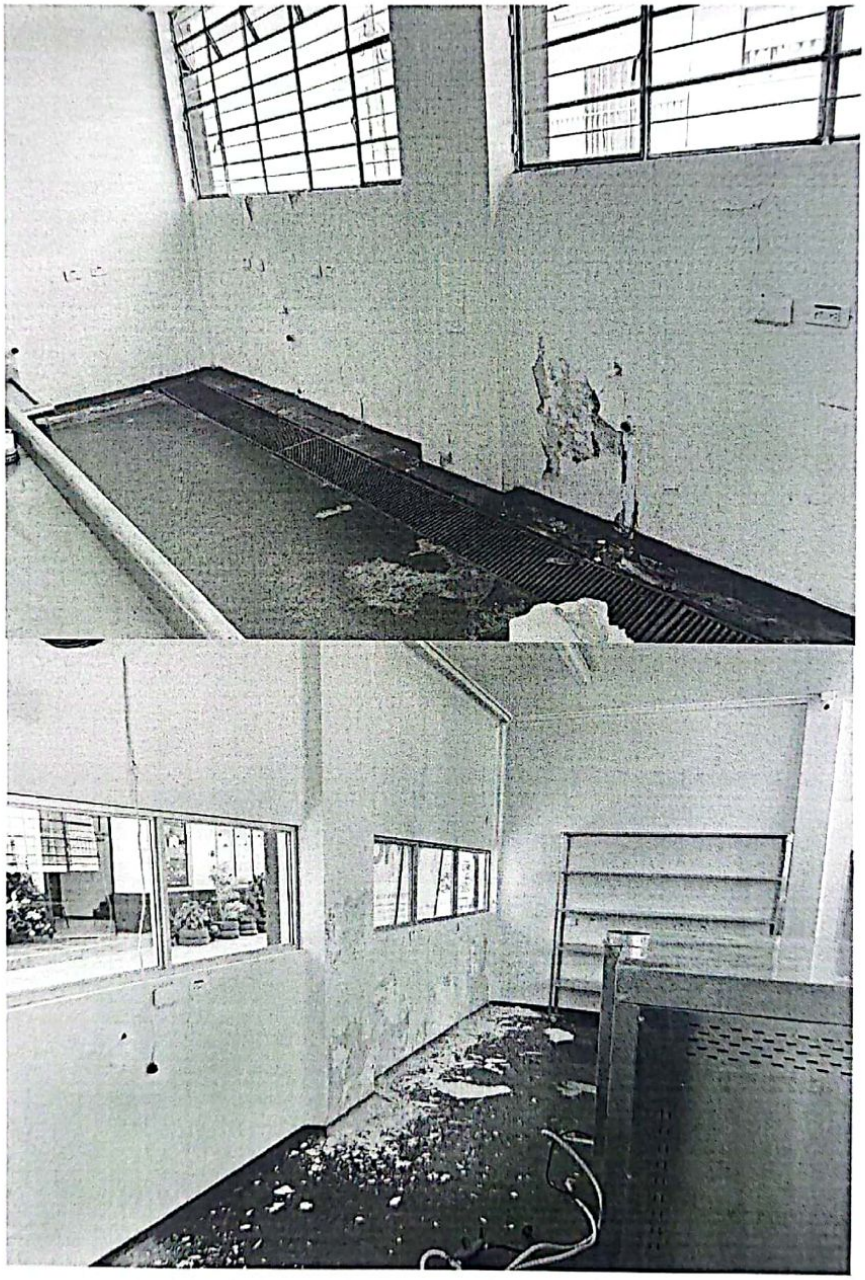

Powered by CamScanner

5. RESUMEN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

A continuación, se observa cada una de las actividades ejecutadas, según el presupuesto oficial y los ítems contratados:

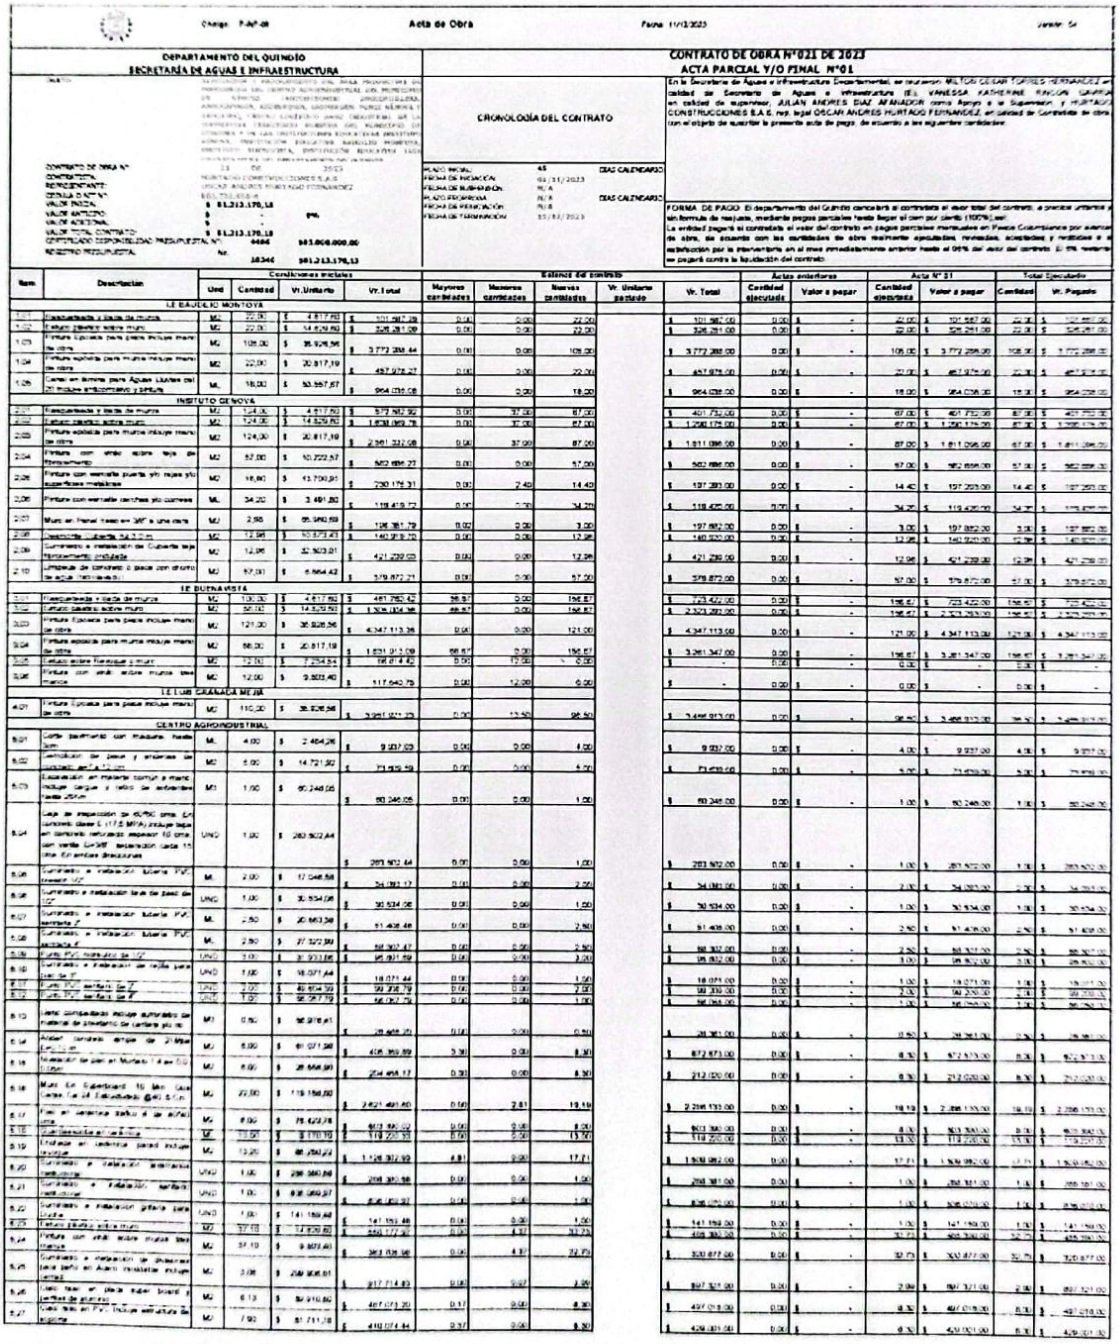

Acta de Obra

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N°021 DE 2023
ACTA PARCIAL Y/O FINAL N°01

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

Item	Descripción	Condiciones iniciales				Balance del contrato				Actas anteriores		Acta N° 01		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
	LE BAJEJO MONTOYA															
1.01	Desplantillado y lleche de mortero	M2	22,00	$ 4.617,82	$ 101.587,08	0,00	0,00	22,00		$ 101.587,00	0,00	$ -	22,00	$ 101.587,00	22,00	$ 101.587,00
1.02	Enlace (pañete) sobre muro	M2	22,00	$ 14.829,82	$ 326.261,08	0,00	0,00	22,00		$ 326.261,00	0,00	$ -	22,00	$ 326.261,00	22,00	$ 326.261,00
1.03	Pintura Epóxica (vía) para incluye mano de obra	M2	106,00	$ 35.626,56	$ 3.772.289,44	0,00	0,00	106,00		$ 3.772.289,00	0,00	$ -	106,00	$ 3.772.289,00	106,00	$ 3.772.289,00
1.04	Pintura epóxida para muros incluye mano de obra	M2	22,00	$ 20.817,19	$ 457.978,27	0,00	0,00	22,00		$ 457.979,00	0,00	$ -	22,00	$ 457.979,00	22,00	$ 457.979,00
1.05	Canal en lámina para Aguas Lluvias del 20 incluye suministro y pinta	ML	18,00	$ 53.557,67	$ 964.038,06	0,00	0,00	18,00		$ 964.038,00	0,00	$ -	18,00	$ 964.038,00	18,00	$ 964.038,00
	INSTITUTO GENOVA															
2.01	Desplantillado y lleche de mortero	M2	124,00	$ 4.617,82	$ 572.582,92	0,00	37,00	87,00		$ 401.752,00	0,00	$ -	87,00	$ 401.752,00	87,00	$ 401.752,00
2.02	Enlace (pañete) sobre muro	M2	124,00	$ 14.829,82	$ 1.838.969,78	0,00	37,00	87,00		$ 1.290.174,00	0,00	$ -	87,00	$ 1.290.174,00	87,00	$ 1.290.174,00
2.03	Pintura epóxida para muros incluye mano de obra	M2	124,00	$ 20.817,19	$ 2.581.332,08	0,00	37,00	87,00		$ 1.811.096,00	0,00	$ -	87,00	$ 1.811.096,00	87,00	$ 1.811.096,00
2.04	Pintura con vinilo sobre teja de fibrocemento	M2	57,00	$ 10.222,57	$ 582.686,27	0,00	0,00	57,00		$ 582.686,00	0,00	$ -	57,00	$ 582.686,00	57,00	$ 582.686,00
2.05	Pintura con esmalte puerta y/o rejas y/o superficies metálicas	M2	16,80	$ 13.700,91	$ 230.175,31	0,00	2,40	14,40		$ 197.293,00	0,00	$ -	14,40	$ 197.293,00	14,40	$ 197.293,00
2.06	Pintura con esmalte cerchas y/o correas	ML	34,20	$ 3.491,80	$ 119.439,72	0,00	0,00	34,20		$ 119.439,00	0,00	$ -	34,20	$ 119.439,00	34,20	$ 119.439,00
2.07	Muro en Panel Yeso en 3/8" a una cara	M2	2,96	$ 66.960,69	$ 198.361,79	0,00	0,00	3,00		$ 197.882,00	0,00	$ -	3,00	$ 197.882,00	3,00	$ 197.882,00
2.08	Desnivelle cubierta 54 3.0 m	M2	12,96	$ 10.873,47	$ 140.919,72	0,00	0,00	12,96		$ 140.920,00	0,00	$ -	12,96	$ 140.920,00	12,96	$ 140.920,00
2.09	Suministro e instalación de Cubierta teja fibrocemento ondulada	M2	12,96	$ 32.503,01	$ 421.239,03	0,00	0,00	12,96		$ 421.239,00	0,00	$ -	12,96	$ 421.239,00	12,96	$ 421.239,00
2.10	Limpieza de concreto o pega con chorro de agua (enfriamiento)	M2	57,00	$ 6.664,42	$ 379.872,21	0,00	0,00	57,00		$ 379.872,00	0,00	$ -	57,00	$ 379.872,00	57,00	$ 379.872,00
	LE BUENAVISTA															
3.01	Desplantillado + lleche de mortero	M2	130,30	$ 4.617,82	$ 601.760,42	56,87	0,00	196,87		$ 723.422,00	0,00	$ -	196,87	$ 723.422,00	196,87	$ 723.422,00
3.02	Enlace (pañete) sobre muro	M2	52,00	$ 14.829,82	$ 1.926.154,38	88,87	0,00	196,87		$ 2.321.260,00	0,00	$ -	196,87	$ 2.321.260,00	196,87	$ 2.321.260,00
3.03	Pintura Epóxica (vía) para incluye mano de obra	M2	121,00	$ 35.626,56	$ 4.347.113,36	0,00	0,00	121,00		$ 4.347.113,00	0,00	$ -	121,00	$ 4.347.113,00	121,00	$ 4.347.113,00
3.04	Pintura epóxida para muros incluye mano de obra	M2	56,00	$ 20.817,19	$ 1.651.913,08	88,87	0,00	196,87		$ 3.281.347,00	0,00	$ -	196,87	$ 3.281.347,00	196,87	$ 3.281.347,00
3.05	Pintura sobre fibrolupa y muro	M2	12,00	$ 7.254,84	$ 87.014,42	0,00	12,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.06	Pintura con vinilo sobre muros sin marca	M2	12,00	$ 9.803,40	$ 117.640,79	0,00	12,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	LE LUIS GRANADA MEJIA															
4.01	Pintura Epóxica para pisos incluye mano de obra	M2	110,00	$ 35.626,56	$ 3.991.971,75	0,00	13,50	96,50		$ 3.496.913,00	0,00	$ -	96,50	$ 3.496.913,00	96,50	$ 3.496.913,00
	CENTRO AGROINDUSTRIAL															
5.01	Corte pavimento con maquina, hasta 10cm	ML	4,00	$ 2.464,26	$ 9.857,03	0,00	0,00	4,00		$ 9.857,00	0,00	$ -	4,00	$ 9.857,00	4,00	$ 9.857,00
5.02	Demolición de pisos y enlaces de concreto, hasta 10 cm	M2	5,00	$ 14.721,92	$ 73.609,59	0,00	0,00	5,00		$ 73.609,00	0,00	$ -	5,00	$ 73.609,00	5,00	$ 73.609,00
5.03	Excavación en material común a mano, incluye cargue y retiro de sobrantes hasta 20Km	M3	1,00	$ 80.246,05	$ 80.246,05	0,00	0,00	1,00		$ 80.246,00	0,00	$ -	1,00	$ 80.246,00	1,00	$ 80.246,00
5.04	Caja de inspección de 45*60 cms En concreto clase E (17,5 MPA) incluye tapa en concreto reforzado espesor 10 cms con vanta Cm3/8" tolerancia hasta 15 cms En anclas estructura	UNO	1,00	$ 283.902,44	$ 283.902,44	0,00	0,00	1,00		$ 283.902,00	0,00	$ -	1,00	$ 283.902,00	1,00	$ 283.902,00
5.05	Suministro e instalación tubería PVC presión 1/2"	M.	2,00	$ 17.048,58	$ 34.097,17	0,00	0,00	2,00		$ 34.097,00	0,00	$ -	2,00	$ 34.097,00	2,00	$ 34.097,00
5.06	Suministro e instalación tee de pvc de 1/2"	UNO	1,00	$ 30.534,08	$ 30.534,08	0,00	0,00	1,00		$ 30.534,00	0,00	$ -	1,00	$ 30.534,00	1,00	$ 30.534,00
5.07	Suministro e instalación tubería PVC sanitaria 2"	M.	2,50	$ 20.963,39	$ 51.408,48	0,00	0,00	2,50		$ 51.408,00	0,00	$ -	2,50	$ 51.408,00	2,50	$ 51.408,00
5.08	Suministro e instalación tubería PVC sanitaria 4"	M.	2,50	$ 37.322,39	$ 93.307,47	0,00	0,00	2,50		$ 93.307,00	0,00	$ -	2,50	$ 93.307,00	2,50	$ 93.307,00
5.09	Codo PVC sanitario de 90°	UNO	3,00	$ 31.973,66	$ 95.921,59	0,00	0,00	3,00		$ 95.922,00	0,00	$ -	3,00	$ 95.922,00	3,00	$ 95.922,00
5.10	Suministro e instalación de rejilla para piso de 6"	UNO	1,00	$ 18.071,44	$ 18.071,44	0,00	0,00	1,00		$ 18.071,00	0,00	$ -	1,00	$ 18.071,00	1,00	$ 18.071,00
5.11	Codo PVC sanitario de 2"	UNO	2,00	$ 49.954,39	$ 99.908,79	0,00	0,00	2,00		$ 99.910,00	0,00	$ -	2,00	$ 99.910,00	2,00	$ 99.910,00
5.12	Codo PVC sanitario de 4"	UNO	1,00	$ 58.267,79	$ 58.267,79	0,00	0,00	1,00		$ 58.268,00	0,00	$ -	1,00	$ 58.268,00	1,00	$ 58.268,00
5.13	Tanque contenedor incluye suministro de material de prestamo de cantera y/o de	M1	0,50	$ 56.978,61	$ 28.489,31	0,00	0,00	0,50		$ 28.361,00	0,00	$ -	0,50	$ 28.361,00	0,50	$ 28.361,00
5.14	Andén concreto espesor de 2.00cm	M2	8,00	$ 81.021,98	$ 648.359,89	0,30	0,00	8,30		$ 672.573,00	0,00	$ -	8,30	$ 672.573,00	8,30	$ 672.573,00
5.15	Instalación de piso en Mortero 1:4 en 0.05	M2	8,00	$ 25.564,90	$ 204.494,17	0,30	0,00	8,30		$ 212.020,00	0,00	$ -	8,30	$ 212.020,00	8,30	$ 212.020,00
5.16	Muro En Superboard 10 Mm Con Perfiles Tipo U Galvanizado @40 C.M.	M2	22,00	$ 119.156,00	$ 2.621.431,60	0,00	2,81	19,19		$ 2.286.133,00	0,00	$ -	19,19	$ 2.286.133,00	19,19	$ 2.286.133,00
5.17	Piso en ventana bahia 4 de altura	M2	8,00	$ 75.623,74	$ 603.390,00	0,00	0,00	8,00		$ 603.390,00	0,00	$ -	8,00	$ 603.390,00	8,00	$ 603.390,00
5.18	Cubierta en policarbonato	M2	13,00	$ 8.170,19	$ 118.220,00	0,00	2,00	11,00		$ 118.220,00	0,00	$ -	11,00	$ 118.220,00	11,00	$ 118.220,00
5.19	Enchape en cerámica pared incluye enchape	M2	13,20	$ 96.250,24	$ 1.126.362,80	4,81	0,00	17,71		$ 1.536.982,00	0,00	$ -	17,71	$ 1.536.982,00	17,71	$ 1.536.982,00
5.20	Suministro e instalación electrico completo	UNO	1,00	$ 256.380,88	$ 256.381,00	0,00	0,00	1,00		$ 256.381,00	0,00	$ -	1,00	$ 256.381,00	1,00	$ 256.381,00
5.21	Suministro e instalación sanitario completo	UNO	1,00	$ 836.069,97	$ 836.070,00	0,00	0,00	1,00		$ 836.070,00	0,00	$ -	1,00	$ 836.070,00	1,00	$ 836.070,00
5.22	Suministro e instalación grifería para cocina	UNO	1,00	$ 141.159,48	$ 141.159,48	0,00	0,00	1,00		$ 141.159,00	0,00	$ -	1,00	$ 141.159,00	1,00	$ 141.159,00
5.23	Tanque elevado sobre muro	M2	37,19	$ 12.830,80	$ 468.177,20	0,00	4,81	32,73		$ 420.330,00	0,00	$ -	32,73	$ 420.330,00	32,73	$ 420.330,00
5.24	Pintura con vinilo sobre muros sin marca	M2	37,19	$ 9.803,40	$ 364.609,98	0,00	4,81	32,73		$ 320.877,00	0,00	$ -	32,73	$ 320.877,00	32,73	$ 320.877,00
5.25	Suministro e instalación de Divisiones para baño en Acero inoxidable incluye anclaje	M2	3,08	$ 258.906,81	$ 817.714,83	0,08	0,97	2,09		$ 897.321,00	0,00	$ -	2,09	$ 897.321,00	2,09	$ 897.321,00
5.26	Cielo raso en dilock sobre bloque y perfiles de aluminio	M2	6,13	$ 80.910,80	$ 497.073,20	0,17	0,00	6,30		$ 497.019,00	0,00	$ -	6,30	$ 497.019,00	6,30	$ 497.019,00
5.27	Cielo raso en PVC incluye estructura de soporte	M2	7,90	$ 81.731,78	$ 410.074,84	0,37	0,00	8,30		$ 429.001,00	0,00	$ -	8,30	$ 429.001,00	8,30	$ 429.001,00

Powered by CamScanner

El contratista Fernando Arturo Ángel Peláez expone que ha ejecutado el 95**%** del valor total del contrato, y presenta acta N°1 por valor de $249.630.421,84 M/cte.

6. BALANCE FINANCIERO:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
VALOR INICIAL	$81.213.170,18	$0,00	$81.213.170,18
ACTA No. 01	$0,00	$77.152.512	$4.060.658,18
TOTAL	**$81.213.170,18**	**$77.152.512**	**$4.060.658,18**

7. APORTES SEGURIDAD SOCIAL.

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ingeniera VANESSA KATHERINE RINCÓN GAVIRIA, en su calidad de supervisora, deja constancia que el contratista cumplió con las obligaciones frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.

Nota: El contratista presentó CERTIFICADO del contador público Titulado **JULIANA GIRALDO CARDONA con** tarjeta profesional No. 262313-T donde certifica que **OSCAR ANDRES HURTADO con C.C. 89.008.186**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, ICBF y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo. **(si aplica)**

VALOR PAGADO SISTEMA SEGURIDAD CONTRATISTA:

Nombre(s)	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
OSCAR ANDRES HURTADO	$250.000	$320.000	$0	9460239181	11

Nombre(s)	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ	$250.000	$320.000	$0	9460414016	12

Powered by CamScanner

VALOR PAGADO SISTEMA SEGURIDAD RESIDENTE:

Nombre(s)	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
ALVARO AGUIRRE MARIN	$ 1.087.500	$0	$ 45.500	9459916253	11

Nombre(s)	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
ALVARO AGUIRRE MARIN	$ 1.250.000	$0	$ 52.200	9460472498	12

VALOR PAGADO SISTEMA SEGURIDAD SISO:

Nombre(s)	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
LUZ DURANGO	$ 46.400	$185.600	$ 80.800	9460394832	11

Nombre(s)	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
LUZ DURANGO	$ 46.400	$185.600	$ 80.800	9460394901	12

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

Nombre (s) - cargo	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
Diosa fabian	$ 26.300	$ 105.200	$ 45.800	9460394832	11

Nombre (s) - cargo	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
Carlos Garzón	$ 26.300	$ 105.200	$ 45.800	9460394832	11
Victor sierra	$ 26.300	$ 105.200	$ 45.800	9460394832	11

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

Nombre (s) - cargo	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
Diosa fabian	$ 23.200	$ 92.800	$ 40.400	94603944901	12

Powered by CamScanner

Nombre (s) - cargo	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
Carlos Garzón	$ 23.200	$ 92.800	$ 40.400	94603944901	12
Víctor sierra	$ 23.200	$ 92.800	$ 40.400	94603944901	12
Jose González	$68.100	$17.100	$29.7000	94603944901	12

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	86500014181	HURTADO CONSTRUCCION SOMAC S.A.S

Nota: para el pago de cuentas con recursos nacionales, la forma de pago no puede efectuarse mediante cheque.

Para constancia, se firma en el Municipio de Armenia Departamento del Quindío, a los once (11) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023)

VANESSA KATHERINE RINCÓN GAVIRIA
Jefe de Oficina de Infraestructura Social
Secretaria de Aguas e Infraestructura
Departamento del Quindío
Supervisor

OSCAR ANDRES HURTADO
CC: 89.008.168 DE ARMENIA
Hurtado construcciones s.a.s

Elaboró/Proyectó: Juan José Arias Aguirre – Contratista SAID
Julián Andrés Díaz – Contratista SAID
VoBo: Milton César Torres Hernández – Secretario de Aguas e Infraestructura (E)

Powered by CamScanner
