Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: OFIFLA-012-2023
Fecha: 19/12/2023

Santiago de Cali, diciembre 19 de 2023

Ingeniero
FRANCISCO JAVIER BONILLA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4182.010.26.1.491-2023 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (UAESP) L.C

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4182.010.26.1.491-2023

Asunto: SOLICITUD SUSPENSIÓN CONTRATO No. 4182.010.26.1.491-2023.

Cordial saludo,


Por medio de la presente, se solicita la aprobación de la UAESP para la suspensión del contrato 4182.010.26.1.491-2023 que adelanta la interventoría del contrato de obra No. 4182.010.26.1.473-2023 que tiene por objeto "REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO ACUEDUCTO FLAMENCO - CORREGIMIENTO EL HORMIGUERO"

La solicitud se fundamenta en el oficio del 19 de diciembre de 2023 emitido por el contratista de obra, que posteriormente se validó por la interventoría y se notificó a la UAESP mediante oficio OFIFLA-011-2023, a través del cual se solicitó la suspensión en consideración a lo siguiente:

1. **ASPECTOS TÉCNICOS**: Durante el levantamiento de las actas de vecindad se identificaron algunos predios con 2 y hasta 3 acometidas, identificando en sitio un total de 120; el contrato de obra tiene estipuladas 90 acometidas. Aunado a lo anterior, la junta administradora del acueducto JAA Flamenco, no entregó oportunamente el listado real de suscriptores, toda vez que, los propietarios como dueños de las acometidas adicionales, deben tramitar la reposición de las faltantes. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se están realizando acercamientos con los dueños de los predios y la JAA para que lleguen a un acuerdo para que suministren los materiales para las acometidas que no están contempladas en el contrato.

2. **ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS:** La vereda Flamenco, corregimiento El Hormiguero, se encuentra ubicada en la zona sur del Distrito de Santiago de Cali. Esta zona en particular se ha visto afectada por episodios de lluvias torrenciales, documentadas en los informes técnicos diarios del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (**IDEAM**[1]) los días 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16 y 17 de diciembre que han causado retraso en el desarrollo normal de las actividades programadas durante las dos últimas semanas. También, el **IDEAM**

emitió alertas amarillas por la *"probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Lilí, Meléndez y Cañaveralejo, afluentes al Alto Cauca en el departamento de Valle del Cauca Se recomienda especial atención en la ciudad de Cali*".

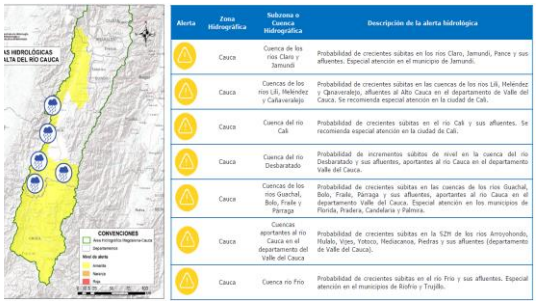

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Cauca	Cuenca de los ríos Claro y Jamundí	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Claro, Jamundí, Párce y sus afluentes. Especial atención en el municipio de Jamundí.
	Cauca	Cuencas de los ríos Lilí, Meléndez y Cañaveralejo	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Lilí, Meléndez y Cañaveralejo, afluentes al Alto Cauca en el departamento de Valle del Cauca. Se recomienda especial atención en la ciudad de Cali.
	Cauca	Cuenca del río Cali	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Cali y sus afluentes. Se recomienda especial atención en la ciudad de Cali.
	Cauca	Cuenca del río Desbaratado	Probabilidad de incrementos súbitos de nivel en la cuenca del río Desbaratado y sus afluentes, aportantes al río Cauca en el departamento Valle del Cauca.
	Cauca	Cuencas de los ríos Guachal, Bolo, Fraile y Párraga	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Guachal, Bolo, Fraile, Párraga y sus afluentes, aportantes al río Cauca en el departamento Valle del Cauca. Especial atención en los municipios de Florida, Pradera, Candelaria y Palmira.
	Cauca	Cuencas aportantes al río Cauca en el departamento del Valle del Cauca	Probabilidad de crecientes súbitas en la SZH de los ríos Amoyohondo, Hubalá, Vijes, Yotoco, Mediacanoa, Piedras y sus afluentes (departamento de Valle del Cauca).
	Cauca	Cuenca río Frío	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Frío y sus afluentes. Especial atención en el municipios de Riofrío y Trujillo.

Imagen 1. Alertas Hidrológicas cuenca alta del rio Cauca. Fuente IDEAM

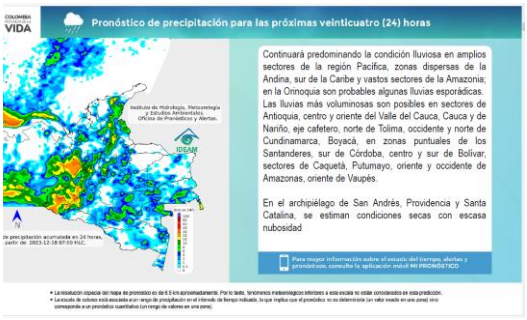


Imagen 2. Pronósticos de precipitación. Fuente IDEAM

Por los motivos explicados anteriormente y considerando que la presente interventoría avaló y recomendó la suspensión del contrato de obra 4182.010.26.1.473-2023, se reitera la necesidad de suspender por TREINTA (30) días calendario el contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.491-2023 que tiene por objeto "REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO ACUEDUCTO FLAMENCO - CORREGIMIENTO EL HORMIGUERO".

Atentamente.

JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
INTERVENTOR
