CONSORCIO COLEGIO ERU 2022	**INFORME SEMANAL**	**FT 300** **VERSIÓN: 00** **23/05/2022**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	Contrato de obra no. 133 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.**				
SEMANA No.	83	**DEL**	**18 de diciembre de 2023**	**AL**	**24 de diciembre de 2023**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	581	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ		

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO COLEGIO ERU 2022**	**INTERVENTOR:**	**GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS**
Contrato No.	**133 de 2022**	**Contrato No.**	**134 DE 2022**
Fecha de suscripción del contrato	23/05/2022	**Fecha de suscripción del contrato**	5/05/2022
Valor Inicial	$ 43,322,137,680.00	**Valor Inicial**	$ 1,570,157,939.00
Valor Adicion No.01	$ 9,372,533,448.00	**Valor Adicion No.01**	$ 608,308,421.00
Valor Total	$ 52,694,671,128.00	**Valor Total**	$ 2,178,466,360.00
Plazo Inicial	17 MESES	**Plazo Inicial**	17 MESES
Prorroga No.01	7 MESES	**Prorroga No.01**	7 MESES
Plazo Actualizado	24 MESES	**Plazo Actualizado**	24 MESES
Fecha de Iniciación	23 de mayo de 2022	**Fecha de Iniciación**	23/05/2022
Fecha de Terminación*	22 de mayo de 2024	**Fecha de Terminación**	22/05/2024
No póliza contrato de obra	CBC-100035966	**No póliza contrato de interventoría**	15-45-101142718
Fecha aprobación	23 MAYO DE 2022	**Fecha aprobación**	12/05/2022

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA

AMPARO	VIGENCIA (Desde- hasta)	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DE OBRA	11/10/2023 hasta 23/11/2024	$ 10,538,934,255.60	A la fecha no presenta ninguna novedad
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	11/10/2023 hasta 23/05/2027	$ 5,269,467,112.80	A la fecha no presenta ninguna novedad
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	23/05/2024 hasta 23/05/2029	$ 13,173,667,782.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	11/10/2023 hasta 23/07/2024	$ 8,664,427,536.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL	05/05/2022 hasta 23/05/2024	$ 2,634,733,556.00	A la fecha no presenta ninguna novedad

III. ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA

No	Ubicación de la actividad	ESTADO	Valor Programado a la fecha	Valor total actividad costo directo	Valor ejecutado acumulado	%AVANCE	Descripción de la Actividad
1.2.1	Demolición de estructuras en concreto existentes - muros - adoquines - losetas - estructuras asfalticas (Incluye cargue y retiro)	EJEUCIÓN	$ -	$ 17,229,506.14	$ 2,248,160	13.05%	CORRESPONDIENTES A SARDINELES Y ADOQUINES DE LAS ENTRADAS PROVISIONALES AL PROYECTO SOBRE LA CARRERA 94 Y LA CALLE 8C
2.1.2	Suministro y colocacion Concreto limpieza 1,500 PSI (10.5 Mpa)	EJEUCIÓN	$ -	$ 279,519,248.38	$ 244,631,788	87.52%	MODULO P - LIMPIEZA PARA CIMENTACION
2.3.1	Suministro e instlación de Acero de refuerzo figurado fy= 420 Mpa	EJEUCIÓN	$ 6,346,643	$ 2,193,172,276.96	$ 1,796,859,178	81.93%	MODULO J - ACERO DE REFUERZO PARA COLECTORES DESAGUES AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS DEL PROYECTO (SOBRE PISO COCINA)
4.1.1	Suministro y colocacion de Concreto a la vista para columnas de 4,000 PSI (28 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 619,436,979	$ 870,056,615.83	$ 648,726,352	74.56%	MODULO J - ARRANQUE DE COLUMNAS DE LA CIMENTACION (PARTE I AJUSTE)
4.3.2	Construccion de Poyo para lockers en concreto reforzado de 3000 PSI	EJEUCIÓN	$ 2,064,035	$ 7,330,400.00	$ 7,330,400	100.00%	MODULO G y H - NIVEL 2 EN SALONES
4.4.1	Estructura metálica (suministro e instalación incluye anticorrosivo y acabado final esmalte sintético exteriores)	EJEUCIÓN	$ 6,059,547	$ 3,948,097,736.16	$ 3,253,440,095	82.41%	MODULO A y B - SUPER ESTRUCTURA MARQUESINA PARA TEJA TRASLUCIDA
5.1.1	Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a dos caras. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo.	EJEUCIÓN	$ 3,916,834	$ 1,709,972,228.90	$ 930,084,966	54.39%	MODULO G y H - NIVEL 2 EN SALONES, DUCTOS, LOKERS
5.1.3	Construccion de Anclaje para reforzamiento en concreto y epóxico para ø 3/8" . de profundidad estándar (perforación - limpieza - epóxico)	EJEUCIÓN	$ 2,867,179	$ 927,803,448.00	$ 602,624,649	64.95%	MODULO G y H - NIVEL 2 EN SALONES, DUCTOS, LOKERS
11.1.1	Pañete impermeabilizado con sika o similar sobre muros 1:3 e = 0,03m (incluye filos y dilataciones)	EJEUCIÓN	$ -	$ 105,556,761.45	$ 49,299,730	46.70%	MODULO L y M - BATERIA DE BANOS PISO 1
12.1.1	Suministro e instalacion Piso en baldosa de granito 30 x 30 cm, incluye adhesivo en polvo de altas prestaciones tipo pegacor o similar y boquilla, , incluye destronque pulida y brillado	EJEUCIÓN	$ -	$ 1,059,112,760.45	$ 540,833,034	51.06%	DEL MODULO A AL MODULO E - BRILLADA NIVEL 2 DEL BLANCO HUILA
12.1.10	Construcción de Piso concreto (rayado o escobeado) en concreto de 3000 PSI e=0.10M	EJEUCIÓN	$ 3,113,656	$ 49,354,417.87	$ 30,400,568	61.60%	MODULO L NIVEL 2 (TERRAZA)
13.3.1	Afinado, pendientado e impermeabilizado de cubiertas planas en mortero 1:4 e=5 cm (incluye media caña)	EJEUCIÓN	$ 28,313,688	$ 390,958,072.32	$ 105,237,192	26.92%	MODULO N NIVEL 2 (TERRAZA)
15.2.2	Suministro e instalacion Muros cara sencilla en drywall 10 mm	EJEUCIÓN	$ -	$ 85,564,778.39	$ 85,564,778	100.00%	DEL MODULO A AL MODULO E - CUCHILLAS DE LOS SALONES DE ULTIMO NIVEL
15.2.4	Suministro e instalacion Aislamientos frescasa o similar (cielo rasos)	EJEUCIÓN	$ -	$ 21,238,575.18	$ 18,600,920	87.58%	DEL MODULO A AL MODULO E - CUCHILLAS DE LOS SALONES DE ULTIMO NIVEL

CONSORCIO COLEGIO ERU 2022	INFORME SEMANAL	FT 300
		VERSIÓN: 00
		23/05/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	Contrato de obra no. 133 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.**				
SEMANA No.	83	**DEL**	**18 de diciembre de 2023**	**AL**	**24 de diciembre de 2023**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	581	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**		ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ	

18.1.6	Puerta ventana PYV06 en aluminio – vidrio laminado templado 3+3 y 4+4mm incoloro – cerradura tipo júpiter– perfilería en aluminio anodizado natural línea superior serie 35 de alumina o similar – tope de seguridad – marco de hoja de perfil tubular – con ventanas fijas, corredizas y proyectantes, incluye cerigrafía.	EJEUCIÓN	$ -	$ 751,039,302.37	$ 364,585,235	48.54%	MODULO A - NIVEL 3
18.1.18	Puerta metálica PYV18 con marco en lámina de acero cold rolled cal 18 y cargado en concreto acabo pintura electrostática, hoja en lámina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura elctrostática, cerradura cilíndrica de manija jupiter cromada mate de schlage, rejilla en lamina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura electrostática (Ver cartilla de colores).	EJEUCIÓN	$ -	$ 61,944,368.65	$ 21,401,289	34.55%	DEL MODULO A AL MODULO E - NIVEL 3
18.1.22	Puerta metálica PYV22 con marco en lámina de acero cold rolled cal 18 y cargado en concreto acabo pintura electrostática color, hoja en lámina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura elctrostática color, cerradura cilíndrica de manija jupiter cromada mate de schlage, rejilla en lamina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura electrostática color (Ver cartilla de colores)	EJEUCIÓN	$ -	$ 18,203,054.10	$ 14,042,356	77.14%	DEL MODULO A AL MODULO E - NIVEL 3
18.1.23	Puerta metálica PYV23 con marco en lámina de acero cold rolled cal 18 y cargado en concreto acabo pintura electrostática color (ver catilla de color), hoja en lámina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura elctrostática color (ver catilla de color), cerradura cilíndrica de manija jupiter cromada mate de schlage, rejilla en lamina de acero cold rolled cal 18 acabado pintura electrostática color (ver catilla de color)	EJEUCIÓN	$ -	$ 319,423,651.44	$ 62,138,325	19.45%	DEL MODULO A AL MODULO E - NIVEL 3
20.1.1	Recubrimiento de control solar para fachada Quadrobrise XLS de seccion 95 x 345 mm Tipo Hunter Douglas distancia perpendicular.	EJEUCIÓN	$ 30,478,269	$ 1,057,834,730.76	$ 461,199,348	43.60%	DEL MODULO A AL MODULO D - FACHADA CARRERA 94
21.1.10	Suminstro e instalacion de Sardinel prefabricado en concreto de 3000 PSI	EJEUCIÓN	$ 64,810,729	$ 16,037,359.45	$ 1,616,427	10.08%	MODULO E - PLAZOLETA DE ACCESO A PROYECTO
21.1.11	Suminstro e instalacion de Bordillo fundido en sitúo ó prefabricado 0.20x0.50xl (incluye refuerzo)	EJEUCIÓN	$ -	$ 112,056,008.79	$ 29,497,271	26.32%	MODULO E - PLAZOLETA DE ACCESO A PROYECTO
21.1.13	Cerramiento exterior tipo sed en malla eslabonada altura 2.4 (parales en tubo estructural 100x40x2 empotrado en dados de concreto cuerpos en ángulos de 2 1/2" - 1 1/4" x 3/16 -3/4 x 1/8", malla ondulada 2x2" 4mm, terminada con base imprimante epóxica y esmalte	EJEUCIÓN	$ -	$ 523,648,697.18	$ 127,173,912	24.29%	COSTADO ORIENTAL DEL PROYECTO - SOBRE CARRERA 94 CERRMAIENTO DEFINITIVO DEL PROYECTO
21.1.14	Suministro e instalacion de Adoquines trafico peatonal 20x10x8 cm, incluye capa de arena suministro e instalacion	EJEUCIÓN	$ -	$ 75,282,515.55	$ 31,608,062	41.99%	COSTADO SUR DEL PROYECTO - REPARACION DE ANDENES DONDE FUERON VIAS DE ACCESO PRINCIPAL A LA OBRA
21.3.11	taludes y zonas verdes ornamentales - pasto kikuyo (penisetum clnadestinum h= 10 a 15 cm (incluye suministro, siembra, tierra negra y abono)	EJEUCIÓN	$ -	$ 7,246,284.65	$ 7,246,285	100.00%	COSTADO ORIENTAL DEL PROYECTO - SOBRE CARRERA 94 CERRMAIENTO DEFINITIVO DEL PROYECTO
26.1	Aseo Permanente en Obra	EJEUCIÓN	$ 61,082,013	$ 69,027,840.00	$ 49,996,800	72.43%	DEL MODULO A AL MODULO E - NIVEL 2
26.3	Retiro de Escombros y Sobrantes	EJEUCIÓN	$ 115,600,621	$ 167,628,000.00	$ 88,387,451	52.73%	MATERIAL PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES EN PLAZOLETA DE ACCESO PRINCIPAL Y DE REPOSICION DE ACCESOS PROVISIONALES AL PROYECTO
28.6	Elemento de concreto reforzado dentro de mamposteria (Dovela en grouting)	EJEUCIÓN	$ -	$ 439,360,678.80	$ 237,076,938	53.96%	MODULO G y H - NIVEL 2 EN SALONES, DUCTOS, LOKERS
28.11	Chapa en ladrillo prensado instalación tradicional - (incluye, safarreo y escarificación)	EJEUCIÓN	$ 368,940	$ 27,543,962.90	$ 16,042,012	58.24%	MODULO G y H - NIVEL 2 EN SALONES, DUCTOS, LOKERS
28.12	Guardaescobas baldosa vibroprensada biselado grano de marmol. Dim.: h= 10 x L= 30 cm Ref: Perlato claro grano 3 fondo crema.	EJEUCIÓN	$ 74,851,818	$ 74,551,522.00	$ 30,434,654	40.82%	DEL MODULO A AL MODULO E - NIVEL 3
28.17	Alistados de pisos en mortero 1:4 e=5 cm	EJEUCIÓN	$ 8,927,768	$ 624,358,986.00	$ 256,935,967	41.15%	MODULOS L, H y G - NIVEL 1
28.20	Remate de muros con hilada parada con ladrillos prensados de 0,245x0,12x0,06 m color coral	EJEUCIÓN	$ 49,035,958	$ 127,562,083.74	$ 104,425,849	81.86%	MODULO G y H - NIVEL 2 EN SALONES, DUCTOS, LOKERS
28.21	Chapa en ladrillo prensado instalación tradicional - (incluye, safarreo y escarificación) ancho menor e igual a 60cm.	EJEUCIÓN	$ 455,911	$ 114,481,036.98	$ 74,280,524	64.88%	MODULO G y H - NIVEL 2 EN SALONES, DUCTOS, LOKERS
28.25	Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M , menor o igual a 60 cm de longitud . Incluye mortero de pega	EJEUCIÓN	$ 19,695,652	$ 641,250,880.88	$ 445,425,070	69.46%	MODULO G y H - NIVEL 2 EN SALONES, DUCTOS, LOKERS
28.29	Suministro e instalacion de breaker industrial 3x150A incluye barraje	EJEUCIÓN	$ 43,809,962	$ 1,589,622.00	$ 794,811	50.00%	MODULO I - CUARTO ELECRICO PISO 1
28.41	Suministro e instalacion de cubierta traslucida en poliester reforzado con fibra de vidrio trapezoidal, incluye accesoios de instalacion (fijacion y sellos)	EJEUCIÓN	$ 13,975,952	$ 332,431,736.13	$ 251,674,573	75.71%	MODULO I - CUARTO ELECRICO PISO 1
28.42	Suministro e instalacion tuberia conduit PVC 3¨sobre cama de arena de peña, no incluye excavacion	EJEUCIÓN	$ -	$ 4,401,855.00	$ 4,401,855	100.00%	MODULO I - CUARTO ELECRICO PISO 1
28.43	Suministro e instalacion de acometida 2(3X1/0F) + 2X1X1/0N + 2T, en alumino	EJEUCIÓN	$ 13,291,615	$ 13,810,691.30	$ 13,810,691	100.00%	MODULO I - CUARTO ELECRICO PISO 1
28.44	SUMIINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X4F + 1X6N, EN ALUMINIO	EJEUCIÓN	$ 55,110,577	$ 2,681,392.00	$ 2,681,392	100.00%	MODULO I - CUARTO ELECRICO PISO 1


CONSORCIO COLEGIO ERU 2022	**INFORME SEMANAL**	**FT 300** **VERSIÓN: 00** **23/05/2022**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	Contrato de obra no. 133 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.**				
SEMANA No.	83	**DEL**	**18 de diciembre de 2023**	**AL**	**24 de diciembre de 2023**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	581	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ		

28.45	SUMIINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3x2f + 1x4n + 6t, EN ALUMINIO	EJEUCIÓN	$ 2,744,079	$ 7,247,478.00	$ 7,247,478	100.00%	MODULO I - CUARTO ELECRICO PISO 1	
28.51	Bordillo arranque de ventaneria en concreto reforzado de 3000 PSI a la vista biselado, en situ - (Dimensiones 0,2 x 0,12) Diseño y especificaciones técnicas según diseño estructural. .	EJEUCIÓN	$ 1,615,669	$ 81,035,798.76	$ 54,546,290	67.31%	MODULO G y H - NIVEL 2 EN SALONES	
28.54	suministro e instalacion de pasamanos	EJEUCIÓN	$ 23,212,481	$ 316,957,472.00	$ 143,073,298	45.14%	DEL MODULO A AL MODULO E - NIVEL 3	

VALOR PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	**SEMANAL**	**ACUMULADO PROGRAMADO**	**VALOR EJECUTADO SEMANA ANTERIOR**	**SEMANAL**	**ACUMULADO EJE.**	**AVANCE**
$ 22,623,325,678.29	$ 457,925,600.86	$ 23,081,251,279.14	$ 23,155,617,784.70	$ 447,617,793.35	$ 23,603,235,578.05	$ 521,984,298.91
52.80%	**1.07%**	**53.87%**	**54.04%**	**1.04%**	**55.09%**	**1.22%**

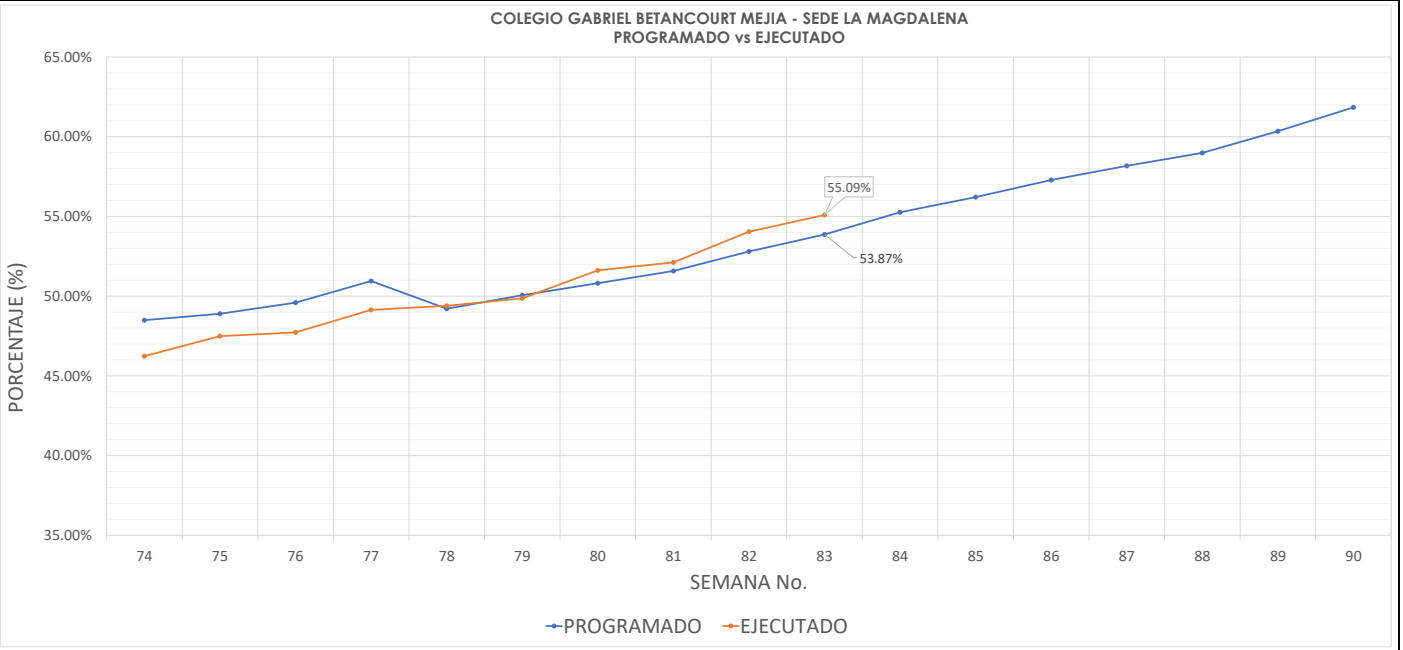

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASOS

Item	Actividad	Valor atrasos	Atraso con respecto al presupuesto total	OBSERVACIONES
1.3	MOVIMIENTO DE TIERRAS	-$ 968,826,424	**-2.26%**	Las áreas que no se han ejecutado corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio para realizar las intervenciones., se hace necesario la entrega de las zonas para cumplir con la programacion.
2.1	CIMENTACION	-$ 261,495,496	**-0.61%**	Las areas que no se han podido ejecutar corresponden a las zonas estan pendiente por definir el piso de acabado en zona de primera infancia (por ende su conformacion y confinamiento) y zonas de cubiertas o exteriores que no puedieron ser ejecutadas por temas de lluvias
5.1	MAMPOSTERIA	-$ 706,953,108	**-1.65%**	Las areas que no se han podido ejecutar corresponden a las zonas que no se han entregado al consorcio, que corresponden a los modulo k, t y zonas de exteriores, se hace necesario la entrega de dichas areas o espacion para cumplir con la programacion, y se aclara que se neceta area en el proyecto para los talleres de ornamentacion, pintura, ventaneria de las diferentes actividades que no se pueden realziar a la interperie y no se cuenta con el suficiente espacion para adelantar labores

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

Durante la semana 83 comprendidos entre los días 18 de diciembre al 24 de diciembre del 2023, se radicó los siguientes oficio:
1. El dia 18 de diciembre del 2023 se radica los certificados de ladrillo en le oficio CCERU-22-1157. Se radica lanhoja de vida del inspector SST en el oficio CCERU-22-1159
2. El dia 19 de diciembre del 2023 se da respuesta al oficio de renobo 29-11-2023 con asunto de requerimiento de entrega de actualizacion de la sgarantias en el oficio CCERU-22-1160. Se radica a renobo el counicado del 07-12-2023 con asunto de resultado de la visita adelantda por renobo en el oficio CCERU-22-1161.
3. El dia 20 de diciembre del 2023 se da repsuesta al oficio GNGSERV_BTA_ERU_13_2021_817 en el oficio CCERU-22-1162
4. El dia 21 de diciembre del 2023 se radica la trazabilidad de domiciliarias en le oficio CCERU-22-.1163.
5. El dia 22 de diciembre del 2023 se da respuesta al comunicado GNGSERV_BTA_ERU_13_2021_8120 en el oficio CCERU-22-1165

Aspecto Financiero

No se presento ninguna actividad en la semana

Aspecto Tecnico

Se observan atrasos con respecto a la programación vigente, toda vez que parte de las actividades programadas se encuentran dentro de las áreas que actualmente tiene el Colegio, razón por la que este Consorcio requiere la entrega inmediata del Colegio, en aras de recuperar los atrasos.

Tambien se aclara que desde la semana pasada se han presentado lloviznas, lluvias fuertes, tormentas eléctricas leves que por temas de seguridad y salud en el trabajo se deben detener actividades para salvaguardar o proteger la integridad de cada trabajador retrasando el normal desarrollo de algunas actividades constructivas del proyecto. Es de aclarar que para todo el tema de las actividades que se adelantan en exteriores, especialmente en urbanismo como lo es el movimiento de tierras y llenos, no solo afecta el tiempo de la precipitación sino el tiempo en que se sequen los materiales y se re construya o este adecuado lo que se había avanzado para poder continuar con dichas labores y garantizar la estabilidad y calidad de ello.

Es de anotar que las areas solicitadas que se encuentran en uso tambien se requieren para poder adecuar talles de ornamentacion (estructura metalica, de cerramiento, de barandas, de pasamanos), talleres de pintura, talleres de ventaneria y demas actividades que requieran espacios cerrados, ya que con el avance de las actividades poco a poco aumentan los espacios de trabajo y terminados disminuyennndo las areas para acopio de materiales y ejecucion de actividades ya mencionadas, que son adelanto para el proyecto.

Se informa que con los recursos actuales existe una imposibilidad de desarrollar las obras al 100%, razón por la que se debe definir el alcance real de las obras. Es de anotar que el atraso no es tan representativo pero se debe a que el contratista ha buscado la forma de ejecutar actividades que se permitan a medida del avance de la obra y los espacios entregados, sin importar o no que esten en la programacion con el fin de no reflejar incumpliminetos ni retrasos mayores.

CONSORCIO COLEGIO ERU 2022	INFORME SEMANAL	FT 300
		VERSIÓN: 00
		23/05/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	Contrato de obra no. 133 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.**				
SEMANA No.	83	**DEL**	**18 de diciembre de 2023**	**AL**	**24 de diciembre de 2023**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	581	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ		

Aspecto SST-Ambiental

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto Ambiental:
1. El dia 21 de diciembre del 2023 se realiza inspección ambiental del proyecto por parte del contratista, capacitación del componente ambiental frente al manejo adecuado de residuos, mantenimiento de individuos arbóreos y sumideros, se radica a la interventoría comunicado CCERU-AMB-2023-047 en donde se entregan las certificaciones pendientes de octubre.

Lunes, miércoles y viernes: se realiza la disposición de residuos sólidos convencionales generados en obra a través del operador de aseo del sector de acuerdo con las microrutas de recolección establecidas, todos los días se realiza limpieza de vías, adicionalmente todos los días se realiza jornada de orden y aseo a las áreas intervenidas

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto SST:
1. El dia 18 de diciembre del 2023 se realiza Charla de seguridad, validacion permisos personal propio, Hidraulicos ,Pisos, Fenergy,Damerko. Instalacion cortasoles recorridos en obra verificando actividades, inspeccion EPP
2. El dia 19 de diciembre del 2023 se realiza Charla de seguridad, pausas activas, verificacion de ats,permisos de trabajo,inspecciones)entrega de EPP , Supervision de actividades propias del consorcio, suprevicion actividades de los contratistas activos en este momento . verificacion de planillas para ingreso de vehiculos, capacitaciones sst,señalizacion de areas, supervicion de actividades
3. El dia 20 de diciembre del 2023 se realiza Charla de seguridad, pausas activas, verificacion de ats,permisos de trabajo,inspecciones)entrega de EPP , Supervision de actividades propias del consorcio, supervicion actividades de los contratistas. verificacion de planillas para ingreso de vehiculos,radicación personal nuevo,
4. El dia 22 de diciembre del 2023 se realiza Charla de seguridad, verificacion de ats,permisos de trabajo,inspecciones)entrega de EPP , Supervision de actividades propias del consorcio, supervicion de actividades del personal de urbanismo y suprevicion actividades de los contratistas. verificacion de planillas para ingreso de vehiculos,radicación personal nuevo, capacitaciones sst.
5. El dia 23 de diciembre del 2023 se realiza pausas activas, verificacion de ats,permisos de trabajo,inspecciones)entrega de EPP , Supervision de actividades propias del consorcio, supervición actividades de los contratistas. verificación de planillas para ingreso de vehiculos,radicación personal nuevo.

Aspecto Social

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:
1. El dia 18 de diciembre del 2023 se realiza acuerdo a instrucción de la supervisión del proyecto, se realizó convocatoria a través de correo electrónico y telefónicamente a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y demás líderes de la comunidad, invitándolos a la entrega de la Fase 1 del proyecto, programada para el día 21 de diciembre de 2023 a las 7:30 am.
2. El dia 19 de diciembre del 2023 de acuerdo a instrucción de la supervisión del proyecto, se realizó ajuste a la hora de convocatoria a través de correo electrónico y telefónicamente a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y demás líderes de la comunidad, invitándolos a la entrega de la Fase 1 del proyecto, programada para el día 21 de diciembre de 2023 a las 11:30 am.
3. El dia 20 de diciembre del 2023 se realiza asistencia y participación Comité de Seguimiento Social (campamento de obra
4. El dia 21 de diciembre del 2023 se realiza acompañamiento y apoyo al ingreso de invitados para la entrega de la Fase 1 el proyecto, inauguración efectuada por la Alcaldesa de Bogotá, escenario en el cual además se rindió homenaje a Teresa Martínez de Varela. Se radica ante interventoría oficio CCERU-SOC-266 en el cual se solicita certificado de las PQRSD recibidas a la fecha en el contrato.
5. El dia 22 de diciembre del 2023 se radica ante la Alcaldía Local de Kennedy, oficio CCERU-SOC-267 en el cual se entrega certificación de las PQRSD recibidas a la fecha en el contrato expedida por interventoría a través de oficio GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_821.


Entre el 18 al 23 de diciembre de 2023: Se garantizó la atención a la ciudadanía, conforme a los mecanismos de atención al ciudadano dispuestos (línea de atención telefónica, correo electrónico), así mismo, se efectuó atención en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) en el horario presencial establecido los días jueves entre la 1:00 pm y las 5:00 pm.

Aspecto PMT

No se presenta ninguna actividad esta semana.

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
25315 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
25316 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
35147 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			
35148 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			
35149 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE OBRA
Con respecto a las polizas de adicion y prorroga, a la fecha aun se encuentran en tramite	
	Firma
