En donde, el % de avance hasta la fecha del componente de Redes secas es las de la siguiente tabla:

Tabla 45. % Avance Redes Secas

Descripción de actividades	Porcentaje de avance [%]
LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, DISEÑOS, MEMORIAS ESTRUCTURALES PRESENTAR DOCUMENTACIÓN LEGAL, DISEÑO Y MEMORIAS DE CALCULO ANTE LA ENTIDAD PARA LA RECEPCION DE CONCEPTOS Y APROBACION DE AVALES	70
LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, DISEÑOS, MEMORIAS ESTRUCTURALES. PRESENTAR DOCUMENTACION LEGAL, DISEÑO Y MEMORIAS DE CALCULO ANTE LA ENTIDAD PARA LA RECEPCION DE CONCEPTOS Y APROBACION DE AVALES	65
DISEÑO ELECTRICO SENALIZACION. LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FACTIBILIDAD DE CONDICIONES DE SERVICIO ANTE CODENSA, PRESENTACION DE DISEÑO ANTE SECRETARIA DE MOVILIDAD.	0
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ANTE EMPRESAS DE COMUNICACIONES, DOCUMENTACIÓN LEGAL, DISEÑO (SI APLICA) PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTRUCTURAS A MONTE ANTE LOS DISTINTOS OPERADORES DE COMUNICACIONES.	65

Fuente. Diseños Geotécnicos.

5. INFORME FINANCIERO CONSULTORIA

Tabla 46. Acta parcial Corte No.4 Consultoría.

A	COSTOS DE PERSONAL	Salario/mes	Dedicación Hombres/Me	Factor Multiplicador	Vr mes	TIEMPO (MESES)	TOTAL
1	PERSONAL PROFESIONAL						
	DIRECTOR/COORDINACIÓN						
9110	Director de Consultoría	$7,236,770	0 25	2 4	$4,343,262 00	1	$4,343,262 00
9112	Coordinador de la Consultoría	$5,821,480	0 25	2 4	$3,492,888 00	1	$3,492,888 00
	ESPECIALISTAS Y/O PROFESIONALES						
	TRANSITO						
9110	Especialista en Tránsito y Transporte	$7,900,000	0 20	2 4	$3,792,000 00	0	$0 00
9455	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE SIN PRESTACIONES	$2,500,000	0 10	2 4	$600,000 00	0	$0 00
	ESPACIO PUBLICO						
9110	Especialista en urbanismo y espacio publico	$7,900,000	0 25	2 4	$4,740,000 00	1	$4,740,000 00
9112	Arquitecto Diseño Urbano de apoyo	$5,821,480	0 10	2 4	$1,397,155 20	1	$1,397,155 20
	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS						
9110	Especialista en Pavimentos	$7,236,770	0 00	2 4	$0 00	1	$0 00
	REDES HIDROSANITARIAS						
9110	Especialista en redes Hidrosanitarios	$7,236,770	0 10	2 4	$1,737,304 80	1	$1,737,304 80
9455	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE SIN PRESTACIONES	$2,500,000	0 05	2 4	$300,000 00	1	$300,000 00
	REDES SECAS						
9110	Especialista en redes electrica, gas, telefono, fibra optica	$7,236,770	0 10	2 4	$1,737,304 80	1	$1,737,304 80
9455	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE SIN PRESTACIONES	$2,500,000	0 05	2 4	$300,000 00	1	$300,000 00
	PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION						
9110	Ingeniero y/o Arquitecto (Costos, Presupuestos y programacion)	$4,600,000	0 20	2 4	$2,304,000 00	1	$2,304,000 00
	GESTION AMBIENTAL						
9112	Especialista Ambiental	$7,900,000	0 10	2 4	$1,896,000 00	1	$1,896,000 00
9112	Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo	$7,900,000	0 05	2 4	$1,137,600 00	1	$1,137,600 00
9112	Especialista Forestal	$4,400,000	0 00	2 4	$0 00	0	$0 00
9113	Biologo	$4,400,620	0 00	2 4	$0 00	0	$0 00
	ARQUEOLOGIA						
9113	Arqueologo	$4,400,620	0 00	2 4	$0 00	0	$0 00
9455	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE SIN PRESTACIONES	$2,500,000	0 00	2 4	$0 00	0	$0 00
	GESTION SOCIAL						
9112	Residente Social	$5,821,480	0 15	2 4	$2,095,732 80	1	$2,095,732 80
9455	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE SIN PRESTACIONES	$929,678	0 05	2 4	$111,561 36	1	$111,561 36
	COMISION TOPOGRAFÍA						
9112	INGENIERO CATASTRAL O TOPOGRAFICO	$5,821,480	0 05	2 4	$698,577 60	0	$0 00
9089	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR NO NCL PRESTACIONES	$2,839,150	0 05	2 4	$340,578 00	0	$0 00
9089	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1	$1,760,010	0 10	2 4	$422,402 40	0	$0 00
9089	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2	$1,532,720	0 10	2 4	$367,852 80	0	$0 00
9089	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1	$2,510,900	0 10	2 4	$602,616 00	0	$0 00
	PERSONAL AUXILIAR TECNICO						
9095	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA	$2,394,280	0 10	2 4	$574,627 20	1	$574,627 20
9089	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR NO INCLUYE PRESTACIONES	$2,515,660	0 10	2 4	$603,758 40	1	$603,758 40
9105	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 - NO INCLUYE PRESTACIONES	$1,278,670	0 10	2 4	$306,448 80	1	$306,448 80
	OTRO PERSONAL						
9100	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - SECRETARIA - CONDUCTOR O MOTORISTA	$1,278,670	0 20	2 4	$612,897 60	1	$612,897 60
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON F.M.						$27,660,540 00

B	COSTOS DIRECTOS	UNIDAD	VR UNITARIO	FACTOR MULTIPLICADOR / DEDICACION	Vr mes	Tiempo en meses	TOTAL
	ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS						
1	TOPOGRAFIA						
9125	ALQUILER MES - DISTANCIOMETRO (Incluyendo trípode y Estación Total) - Capacidad de Lectura hasta 1500m	MZ/MS	7,380,150.00	0.28	$ 2,000,842.00	0	$ 0.00
9123	ALQUILER MES - PLOTTER	MES	945,148.00	0.50	$ 472,574.00	0	$ 0.00
9640	TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA Incluye 4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios	MES	169,000.00	0.70	$ 118,300.00	1	$ 118,300.00
9456	ALQUILER MES - CAMPERO PICK-UP, CAMIONETA DE 1300-2000cc - MODELO 2010 - 2007 - INCIDENCIA 75%	MZ/MS	4,039,500.00	0.00	$ -	1	$ 0.00
	GESTIÓN SOCIAL						
7896	IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GR	UN	75.00	4000.00	$ 300,000.00	0	$ 0.00
7897	AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR	UN	250,000.00	1.00	$ 250,000.00	0	$ 0.00
7901	VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR	UN	100.00	110.00	$ 11,000.00	0	$ 0.00
7870	VIDEO BEAM - ALQUILER POR DÍA	DIA	58,824.00	0.55	$ 32,353.20	0	$ 0.00
	OTROS INSUMOS						
9456	ALQUILER MES - CAMPERO PICK-UP, CAMIONETA DE 1300-2000cc - MODELO 2010 - 2007 - INCIDENCIA 75%	MES	3,394,536.00	0.15	$ 509,180.70	1	$ 509,180.70
9117	ALQUILER MES - LABORATORIO - Estudios (Equipo completo)	MES	4,149,580.00	0.10	$ 414,958.00	1	$ 414,958.00
9123	ALQUILER MES - PLOTTER	MES	784,242.00	0.29	$ 227,480.97	0	$ 0.00
6318	ALQUILER DE PORTATIL CARACTERISTICAS: Procesador intel, Core i3 4005U, celoron o similar, Memoria RAM de 4 GB (2 x 2048 MB)Disco duro de 500gb a 7200 rpmPantalla LED HP BrightView widescreen de alta definición con 35,6 cm (14") o similar, HD INTEL GRAPHIC HD4400UNIDAD DE DVD QUEMADORBLUETOOTH	UN	252,506.00	1.00	$ 252,506.00	0	$ 0.00
9640	TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA Incluye 4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios	UN/MES	185,900.00	1.00	$ 185,900.00	1	$ 185,900.00
9578	TARIFA GLOBAL - GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS)	GLB/MS	187,112.00	1.00	$ 187,112.00	1	$ 187,112.00
	TOTAL COSTOS ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS						1,415,491.00

C	COSTOS DIRECTOS	UNIDAD	CANTIDAD	Costo unitario sin AIU	Factor Multiplicador	Tiempo en meses	TOTAL
	Ensayos de Laboratorio						
9575	Apique manual hasta 2 m de 1.5 m x 1.5 m - relleno y adecuación del sitio - Incluye transporte	UN	7.00	$ 367,000	1	1	$ 2,569,000.00
7737	Análisis granulometrico de los agregados grueso y fino	UN	40.00	$ 68,000	1	1	$ 2,720,000.00
7520	Relaciones humedad - peso unitario seco en los suelos (Ensayo normal de compactación)	UN	0.00	$ 102,000	1	1	$ 0.00
8012	CBR sobre muestra inalterada (Suelos cohesivos)	UN	5.00	$ 119,000	1	1	$ 595,000.00
7497	Determinación del contenido orgánico de un suelo mediante el ensayo de pérdida por ignición	UN	7.00	$ 51,000	1	1	$ 357,000.00
	Perforación manual hasta 6 metros	ML	29.50	$ 128,520	1	1	$ 3,791,340.00
	Límites de Atterberg - límites de consistencia	UN	40.00	$ 48,980	1	1	$ 1,959,200.00
	Humedad Natural	UN	40.00	$ 11,662	1	1	$ 466,480.00
	Peso unitario	UN	28.00	$ 27,370	1	1	$ 766,360.00
	Corte directo en condición no drenada	UN	0.00	$ 416,500	1	1	$ 0.00
	Consolidación rapida	UN	1.00	$ 218,003	1	1	$ 218,003.00
	Compresión inconfinada	UN	0.00	$ 63,503	1	1	$ 0.00
	TOTAL ENSAYOS DE LABORATORIO						$ 13,443,043.00

TOTAL (A + B + C + D)		$ 42,548,034
IVA 19 %		$ 8,084,316
TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS DE PERSONAL POR GRUPO		$ 50,633,350

Fuente. Diseños Geotécnicos

Como se puede evidenciar en la siguiente tabla el informe financiero del proyecto hasta la fecha.


Tabla 47. Informe financiero 4to corte.

ACTAS	VALOR	ACUMULADO	INDICADOR %
1ER	$ 67,630,292.00	$ 67,630,292.00	20.000%
2DO	$ 67,630,090.00	$ 135,260,382.00	20.000%
3RO	$ 67,613,419.00	$ 202,873,801.00	19.995%
4TO	$ 50,633,350.00	$ 253,507,151.00	14.974%

Fuente: Propia

6. INFORME FINANCIERO INTERVENTORIA

Tabla 48. Acta parcial Corte No.4 Interventoría.

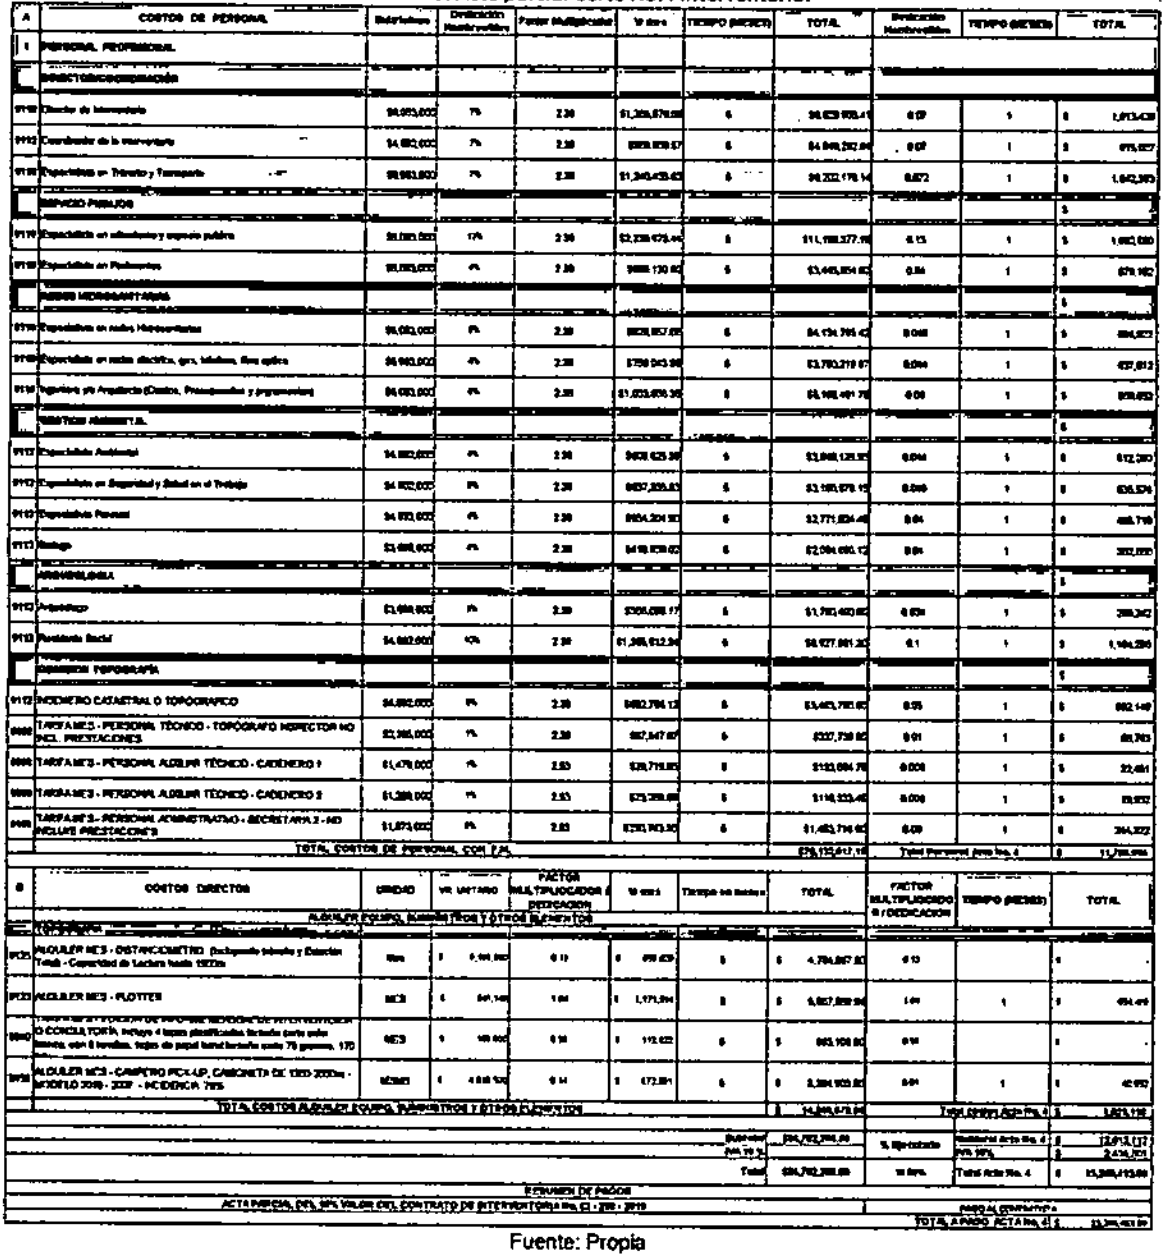

Fuente: Propia

Como se puede evidenciar en la siguiente tabla el informe financiero del proyecto hasta la fecha.

Tabla 49. Informe financiero 4to corte interventoría.

ACTAS	VALOR	ACUMULADO	PORCENTAJE
1ER	$ 15,516,113.00	$ 15,536,113.00	18.46%
2DO	$ 15,836,113.00	$ 31,272,226.00	18.46%
3RO	$ 14,464,013.00	$ 45,736,239.00	17.05%
4TO	$ 15,246,413.00	$ 60,982,652.00	18.00%

Fuente: Propia

ANEXOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CI-313-2018

FECHA DE INICIO : 15 de Enero de 2018 | FECHA DE TERMINACION No.1: 14 de Junio de 2018

SUSPENSION No. 1 | 01 de abril de 2018 a 31 de mayo de 2018

FECHA DE TERMINACION ACTUAL SUSPENSION: 14 de Agosto de 2018

PERIODO DE ACTA No.4 | 01 JUNIO AL 14 JULIO DE 2018

Objeto "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SIG AL CONTRATO QUE TENDRÁ POR OBJETO ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIO PÚBLICOS PRIORIZADOS EN EL PROYECTO ARAÑA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"

A	COSTOS DE PERSONAL	Salario/mes	Dedicación Mantenimiento	Factor Multiplicador	Vr mes	TIEMPO (MESES)	TOTAL	Dedicación Mantenimiento	TIEMPO (MESES)	TOTAL
1	PERSONAL PROFESIONAL									
	DIRECTOR/COORDINADOR									
0110	Director de Interventoria	$6,000,000	7%	2.30	$1,200,979.00	6	$6,829,695.41	0.07	1	$ 1,013,429
0112	Coordinador de la Interventoria	$4,000,000	7%	2.30	$800,652.67	6	$4,549,292.94	0.07	1	$ 675,620
0116	Especialista en Tránsito y Transporte	$6,000,000	7%	2.30	$1,200,435.63	6	$6,822,175.14	0.072	1	$ 1,042,383
	ESPACIO PUBLICO									$ -
0118	Especialista en urbanismo y espacio público	$6,000,000	13%	2.30	$2,200,878.84	6	$11,198,977.19	0.13	1	$ 1,882,080
0119	Especialista en Pavimentos	$6,000,000	8%	2.30	$480,130.90	6	$2,445,664.57	0.04	1	$ 370,162
	REDES HIDROSANITARIAS									$ -
0130	Especialista en redes Hidrosanitarias	$6,000,000	8%	2.30	$826,957.69	6	$4,134,785.47	0.048	1	$ 684,822
0199	Especialista en redes eléctrica, gas, telefonia, fibra optica	$6,000,000	4%	2.30	$760,843.88	6	$3,780,219.57	0.044	1	$ 637,812
0139	Ingeniero y/o Arquitecto (Costos, Presupuestos y programación)	$6,000,000	6%	2.30	$1,035,888.36	6	$5,198,481.79	0.06	1	$ 888,882
	GESTION AMBIENTAL									$ -
0111	Especialista Ambiental	$4,000,000	4%	2.30	$658,825.39	6	$3,848,130.83	0.044	1	$ 612,280
0112	Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo	$4,000,000	3%	2.30	$637,336.63	6	$3,188,679.15	0.040	1	$ 536,576
0117	Especialista Forestal	$4,000,000	4%	2.30	$684,254.80	6	$3,771,624.40	0.04	1	$ 488,718
0173	Biologo	$3,000,000	4%	2.30	$418,938.62	6	$2,094,693.12	0.04	1	$ 352,680
	ARQUEOLOGIA									$ -
0177	Arqueologo	$3,000,000	3%	2.30	$368,099.17	6	$1,790,495.86	0.034	1	$ 298,342
0112	Topografo Oficial	$4,000,000	10%	2.30	$1,200,812.34	6	$6,627,841.35	0.1	1	$ 1,104,284
	Coordinador TOPOGRAFIA									$ -
0117	INGENIERO CATASTRAL O TOPOGRAFICO	$4,000,000	8%	2.30	$492,788.13	6	$3,485,780.60	0.05	1	$ 662,148
0000	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR NO INCL. PRESTACIONES	$2,000,000	1%	2.30	$67,547.67	6	$337,738.00	0.01	1	$ 60,793
0000	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1	$1,470,000	1%	2.63	$28,718.95	6	$133,884.70	0.009	1	$ 22,481
0000	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2	$1,200,000	1%	2.63	$23,300.00	6	$114,303.45	0.009	1	$ 19,553
0105	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 - NO INCLUYE PRESTACIONES	$1,875,000	3%	2.63	$290,743.50	6	$1,485,716.00	0.09	1	$ 344,522
	TOTAL COSTOS DE Personal CON FAC						$78,132,617.10	Total Personal Acta No. 4		$ 11,708,995

B	COSTOS DIRECTOS	UNIDAD	VR UNITARIO	FACTOR MULTIPLICADOR / DEDICACION	Vr mes	Tiempo en meses	TOTAL	FACTOR MULTIPLICADOR / DEDICACION	TIEMPO (MESES)	TOTAL
	ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS									
	EQUIPOS									
0129	ALQUILER MES - ESTACION DE TOTAL (Incluyendo trípode y Estación Total) - Capacidad de Lectura hasta 1500m	Mes	$ 5,100,000	0.13	$ 664,839	6	$ 4,784,887.80	0.13		$ -
0123	ALQUILER MES - PLOTTER	MES	$ 946,140	1.04	$ 1,171,614	6	$ 8,057,869.04	1.04	1	$ 985,466
0000	TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 4 copias plastificadas, tamaño carta color interna, con 6 carpetas, hojas de oficio, tamaño carta 75 gramos, 170 hojas.	MES	$ 141,000	0.66	$ 112,833	6	$ 843,109.80	0.06		$ -
0000	ALQUILER MES - CAMPERO PICK-UP, CAMIONETA DE 1300-2000cm - MODELO 2010 - 2007 - INCIDENCIA 20%	HORAS	$ 4,000,000	0.14	$ 572,991	6	$ 3,304,903.80	0.01	1	$ 40,002
	TOTAL COSTOS ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS						$ 21,885,873.04	Total Equipos Acta No. 4		$ 1,025,118
						Subtotal	$94,792,290.00	% Ejecutado	Personal Acta No. 4	$ 12,813,113
						IVA 19 %		13.51%		$ 2,434,981
						Total	$94,792,290.00	15.51%	Total Acta No. 4	$ 15,248,412.09

RESUMEN DE PAGOS

ACTA PARCIAL DEL 13% VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI - 313 - 2018 | VALOR CONTRATO | $ 94,792,290.00

TOTAL A PAGO ACTA No. 4 | $ 15,248,412.09

ING. OSCAR JULIAN MORENO CARRAZCO
REPRESENTATE LEGAL
FOID CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S

ING. JOHN ESTEVAN ARIZA CORREA
SUPERVISOR FDLSC

87

ICOD

Construcciones y proyectos S.A.S

Nit. 901.172.605 - 1

Calle 18 No. 4 - 91 Of. 307 Tel.: (+57 1) 2431159 Cel.: 3125861487
jmoreno.icodsas@gmail.com - WWW.ICOD.COM

ACTIVIDAD ECONOMICA 4290
I.V.A RÉGIMEN COMÚN
RESOLUCIÓN DIAN
18762008093556
AUTORIZADA DEL 1 HASTA 999
FECHA: 2018/05/04
VIGENCIA 2019/11/04

FACTURA DE VENTA
N° 10

Nombre: DISTRITO CAPITAL-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	C.C./NIT: 8999999061-9	FECHA			VENCIMIENTO		
Dirección: AV 1RA DE MAYO No. 1-40sur	Tel:	Ciudad: BOGOTÁ D.C	24	07	2019	23	08	2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1	Correspondiente al pago del ACTA No. 4. DEL CONTRATO CI-288 de 2018 cuyo Objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE TENDRÁ POR OBJETO ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIO PÚBLICOS PRIORIZADOS EN EL PROYECTO ARAÑA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"	$ 12'812.112
	CUENTA DE AHORROS No. 178379475 BANCO BBVA A NOMBRE DE ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S	
SON:	QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE	
	Nota. Fecha de corte del 15 de junio al 14 de julio del 2019	

SON:	OBSERVACIONES:		
		SUBTOTAL	$ 12'812.112
Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio según Art. 774 del Cód. Comercio, modificado por la ley 1231 de julio de 2008		I.V.A.	$ 2'434.301
FIRMA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA AUTORIZADA	T O T A L	$ 15'246.413

Imp. Tipo LATA NIT. 52783946-7

INFORME EJECUCION CONTRATO DE CONSULTORIA FDLSC 288-2018


OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE TENDRÁ POR OBJETO ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIO PÚBLICOS PRIORIZADOS EN EL PROYECTO ARAÑA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"


Valor Contractual	$ 99,702,296.00
Adición 1	$ -
	$ -
Total	$ 99,702,296.00

FECHA DE INICIO	15/01/2019
FECHA DE TERMINACION	14/06/2019
SUSPENSION 1	01/06/2019 A 31/05/2019
FECHA DE TERMINACION + SUSPENSION	14/06/2019

INFORME FINANCIERO

ACTAS	VALOR	ACUMULADO	INDICADOR %
1ER	$ 15,636,113.00	$ 15,636,113.00	16.66%
2DO	$ 15,636,113.00	$ 31,272,226.00	16.66%
3RO	$ 14,667,813.00	$ 45,939,039.00	17.05%
4TO	$ 15,346,413.00	$ 60,985,452.00	18.80%
ACUMULADO	$	60,985,452.00	72.00%
SALDO PENDIENTE	$		23,716,844.00
PAGO ACTA DE LIQUIDACION	$		8,470,229.80
PAGOS ACTAS PENDIENTES	$		15,246,614.20



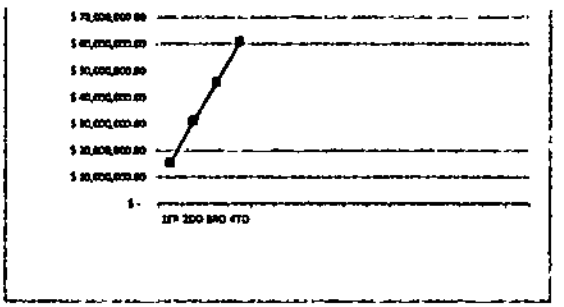

		POLIZA 18-40-101029658	POLIZA 18-44-101029476	
AMPAROS	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO	15/01/2019	14/12/2019	$ 25,410,688.80	
CALIDAD DEL SERVICIO	15/01/2019	14/04/2019	$ 165,673,200.00	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15/01/2019	14/12/2019	$ 4,235,134.80	

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DEL APOYO A LA SUPERVISION

a) Se realizará el cuarto pago correspondiente al 18.66% para un acumulado del 72% del valor total del contrato por cinco (5) meses, y el 14.874% del acta parcial de consultoria No. 279 de 2018 se pagaron con los soportes que lo documentan del periodo comprendido entre el mes de 15 junio de 2019 al 14 de julio de 2019.

Requisitos Para Cada Pago:

DOCUMENTOS	CORTE 4	OBSERVACIONES
Factura a nombre del Fondo de Desarrollo Local de San Cristobal en original	Se adjunta factura No.10	
Acta mensual de obra, suscrita por el contratista y el interventor para los pagos relacionados en el numeral 8.	Se adjunta mediante radicado No.	
Certificado de cumplimiento y acta de recibo a satisfacción expedido por el interventor supervisor del contrato.	se realiza certificacion de cumplimiento	
Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya cuando se trate de personas jurídicas	Se adjunta mediante radicado No.	

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
No. DE OBLIGACIÓN	CORTE 4	OBSERVACIONES
1. Tener conocimiento completo y detallado de los pliegos de condiciones , propuesta, contrato, cronograma de ejecución, metodologías de trabajo propuestas y cualquier otro documento que haga parte del contrato.	CUMPLE	
2. Revisar, detallar y aprobar a nombre del Fondo de Desarrollo Local de San Cristobal el cronograma presentado por el ejecutor para la ejecución de los trabajos y la metodología para el desarrollo de los mismos.	CUMPLE	
3. Garrantizar que el ejecutor cumpla con la metodología propuesta y utilice la plantilla mínima exigida en los pliegos de condiciones para el desarrollo de los trabajos.	CUMPLE	
4.Rechazar parcial o totalmente los trabajos que no se ajusten a las especificaciones técnicas o no reunan las condiciones de calidad requeridas por la Entidad , formulando por escrito sus observaciones , las cuales deben ser acojidas por el ejecutor, con miras en dar aprobación a los trabajos realizados.	CUMPLE	
5. Verificar la participación permanente de los profesionales del equipo de trabajo mínimo ofrecido.	CUMPLE	
6.verificar y aprobar los informes producto de la ejecución del contrato de obra, incluidos dentro del pliego de condiciones.	CUMPLE	
7. Elaborar, suscribir y sustentar las actas que requiera la ejecución del contrato, en las fechas en que realmente se produzcan tales hechos.	CUMPLE	
8.Deberá velar por que el ejecutor cumpla con los plazos establecidos en los pliegos de condiciones	CUMPLE	
9. Servir de interlocutor permanente entre la Entidad y el consultor, entregando la información oportuna	CUMPLE	
10. Representar a la Entidad contratante ante el contratista.	CUMPLE	
11. Asegurar el cumplimiento del objeto contractual logrando el adecuado desarrollo del contrato origen de la interventoría, dentro del tiempo y presupuesto previsto.	CUMPLE	
12. Revisar, aprobar o rechazar los informes y productos que debe entregar el ejecutor.	CUMPLE	
13. Verificar y aprobar los materiales, productos, actividades, elaborados por los ejecutores del contrato de obra publica.	CUMPLE	
14. Presentar los informes mensuales y final, además de cualquier otro que solicite la Entidad contratante sobre el desarrollo de los trabajos, problemas presnetados, soluciones, determinaciones, avances y actividades desarrolladas por la interventoría, en forma tal que permita una visión clara y completa del estado de los trabajos.	CUMPLE	
15. Comunicar a la Entidad contratante, en forma inmediata, las determinaciones tomadas sobre los cambios en el desarrollo de los trabajos realizados y enviar copia a la Entidad contratante de todas las comunicaciones u órdenes dirigidas al consultor. La Entidad contratante podrá impugnar o modificar las determinaciones que crea convenientes.	CUMPLE	
16. Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por los consultores, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a la Entidad contratante en forma inmediata de las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.	CUMPLE	
17. Evaluar y presentar con su correspondiente justificación ante la Entidad contratante cualquier modificación que afecta el desarrollo del contrato de obra pública	N/A	
18. Verificar el cumplimiento del programa y la metodología de trabajos aprobados,solicitar al ejecutor las modificaciones que sean necesarias al mismo dentro de los plazos acordados.	CUMPLE	
19. Requerir y ordenar al ejecutor la intensificación de las actividades que no esten desarrolandosen de conformidad con lo previsto en el contrato, cuando las necesidades de la Entidad contratante así lo requieran, con la finalidad de cumplir las respectivas metas contractuales.	CUMPLE	
20. Ordenar la suspensión de actividades no contempladas en el desarrollo del contrato o inconducentes para el cumplimiento del objeto del mismo.	CUMPLE	
21. Programar, cada vez que se estime conveniente, reuniones con la participación del ejecutor, director de Interventoría y el Supervisor de la Entidad contratante, con el fin de analizar los aspectos técnicos, administrativos y jurídicos relacionados con el contrato, sin perjuicio de la participación de otros funcionarios de diferentes áreas.	CUMPLE	
22. Establecer y cumplir los requisitos para creación de ítems no previstos en caso de ser necesarios	CUMPLE	
23. Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se desarrolle el contrato origen de la interventoría, dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos	CUMPLE	

ING JOHN AGUIRRE CORREA - PROFESIONAL DE APOYO FDSC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: **18762006093556**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901172605	1				

11. Razón social: ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAS

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección: CL 18 4 91 OF 307

25. País	26. Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 18 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

2018-05-04 / 05:49:53 PM
Fecha Acuse de Recibo

1001. Apellidos y nombres: MORENO CARRAZCO OSCAR JULIAN
1002. Tipo doc.: Cédula 1003. No. Identif.: 1032472777 1004. DV: 6
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAS

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
986. Dependencia: Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

AUTORIZADO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762008093556

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901172605	1				

11. Razón social

ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
1	ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAS CL 18 4 91 OF 307	PAPEL	1		1	999	AUTORIZACIÓN	1
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto: 01 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14465493491

(415)7707212489984(8020) 000001446549349 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 7 2 6 0 5	1	Impuestos de Bogotá 32	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAS

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal
CL 18 4 91 OF 307

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
jmoreno.icodsas@gmail.com		3125861487	2382518

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4290	2018 03 07	4112	2018 03 07		4210			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	5	7	9	1	1	1	4																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha: 2018 04 17

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 15 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: GARZON CASALLAS MARLLY ANDREA
985. Cargo: Gestor I

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

Fecha generación documento PDF: 09-10-2018 12:36:00PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

MUISCA

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14465493491

(415)7707212489984(8020) 000001446549349 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 7 2 6 0 5	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizadas	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase:	0 4	
72. Número:		
73. Fecha:	2 0 1 8 0 3 0 7	
74. Número de Notaría:		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro:	2 0 1 8 0 4 0 9	
77. No. Matrícula mercantil:	0 2 9 4 3 9 6 3	
78. Departamento:	1 1	
79. Ciudad/Municipio:	4	

Vigencia:

80. Desde:		
81. Hasta:		

Composición del Capital

82. Nacional:	1 0 0 %
83. Nacional público:	0 %
84. Nacional privado:	1 0 0 %
85. Extranjero:	0 %
86. Extranjero público:	0 %
87. Extranjero privado:	0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:
Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1			
2			
3			
4			
5			

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País:	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Página 3 de 3 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14465493491

(415)7707212489984(8020) 000001446549349 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 7 2 6 0 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 3 0 7

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
Cédula de ciudadaní 1 3	1 0 3 2 4 7 2 7 7 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MORENO	CARRAZCO	OSCAR	JULIAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

2

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 8 0 3 0 7

100. Tipo de documento:	101. Número de Identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
Cédula de ciudadan 1 3	1 0 1 8 4 7 6 0 7 2	-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FAJARDO	CASTAÑEDA	DANIEL	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

3

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
		-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

4

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
		-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

5

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
		-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO CORTO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQU .CION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901172605-1	ICDO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAS	CALLE 18 4 91	6362318	m.afiliaciones2020@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OPERATIVA	OPERATIVA	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-07	2019-06	E	11/07/2019	35869218	$258.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	33.200	0		0		0	6	200	0	33.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Porvenir	800234808-6	132.500	0	0	0	0	6	800	0	133.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	830603795-6	57.700				57.700	6	400	58.100			577	58.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	33.200	6	200	33.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, RIP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	33.200	33.400
Pensión	1	132.500	133.300
Riesgos Laborales	1	57.700	58.100
CCF	1	33.200	33.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES		256.800	258.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQU\ .CION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901172605-1	ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAS		CALLE 18 4 81	6382518	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OPERATIVA	OPERATIVA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTA, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-07	2019-08	E	11/07/2019	35859216	8758.200	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario A Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1032472777	MONTAÑO CARRAZCO OSCAR JULIAN	1	0			0														230301	828 116	132 509	0	0	0	0	EPS002	828 116	33 258	14 11	828 116	5	27 750	CCF50	828 116	33 209	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, Oscar Julian Moreno Carrazco, identificado con C.c. 1.032.472.777 de Bogotá D.C, en mi condición de Representante Legal de (ICOD SAS) identificada con Nit 901.172.605-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, ***N/A***, identificado con ***N/A***, y con Tarjeta Profesional No. ***N/A*** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ***N/A*** , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ***N/A***, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota 1: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social y en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en Decreto 1670 de 2007.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS.

Dada en Bogotá D.C, a los (24) Veinticuatro días del mes de julio de 2019.

FIRMA _____

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

OSCAR JULIAN MORENO CARRAZCO
R/L ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S
