

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **ADQUIRIR Y/O REPARAR MÓDULOS DE LA MARCA SELEX PARA LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL (VIGENCIA FUTURA)** | **176 días** | **mié 27/12/23** | **mié 28/08/24** | |
| 2 | | ACTA DE INICIO | 1 día | mié 27/12/23 | mié 27/12/23 | |
| 3 | | DESEMBOLSO DE ANTICIPO | 22 días | jue 28/12/23 | vie 26/01/24 | 2 |
| 4 | | ORDEN DE FABRICACIÓN MODULOS Y TARJETAS NUEVAS | 1 día | lun 29/01/24 | lun 29/01/24 | 3;2 |
| 5 | | FABRICACIÓN DE MODULOS Y TARJETAS | 65 días | mar 30/01/24 | lun 29/04/24 | 4 |
| 6 | | PRUEBAS A LOS MODULOS Y TARJETAS EN FABRICA | 10 días | mar 30/04/24 | lun 13/05/24 | 5 |
| 7 | | DESPACHO MODULOS Y TARJETAS AL PAIS | 1 día | mar 14/05/24 | mar 14/05/24 | 6 |
| 8 | | TRANSPORTE Y NACIONALIZACIÓN | 22 días | mié 15/05/24 | jue 13/06/24 | 7 |
| 9 | | PRUEBAS EN SITIO | 50 días | vie 14/06/24 | jue 22/08/24 | 8 |
| 10 | | ENTREGA DE EQUIPOS A REPARAR CON SU RESPECTIVA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN Y REPORTE DE FALLA | 32 días | jue 28/12/23 | vie 9/02/24 | 2 |
| 11 | | ENVIO DE EQUIPOS A FABRICA | 30 días | lun 12/02/24 | vie 22/03/24 | 10 |
| 12 | | REPARACIÓN DE EQUIPOS EN FABRICA | 70 días | lun 25/03/24 | vie 28/06/24 | 11 |

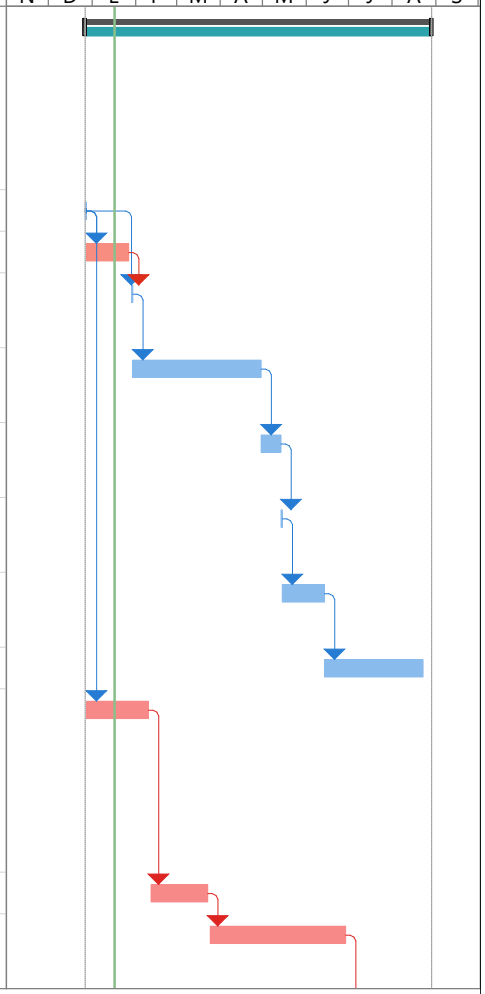


Proyecto: CRONOGRAMA ACTI
Fecha: mié 17/01/24

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Tareas críticas | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | División crítica | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | Progreso | |
| Hito inactivo | | solo fin | | Progreso manual | |

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | PRUEBAS EN FABRICA A LOS MODULOS REPARADOS | 10 días | lun 1/07/24 | vie 12/07/24 | 12 |
| 14 | | DESPACHO DE MODULOS AL PAIS | 2 días | lun 15/07/24 | mar 16/07/24 | 13 |
| 15 | | RETORNO EQUIPOS A SITIO | 20 días | mié 17/07/24 | mar 13/08/24 | 14 |
| 16 | | PRUEBAS EN SITIO | 9 días | mié 14/08/24 | lun 26/08/24 | 15 |
| 17 | | ACTA RECIBO FINAL | 2 días | mar 27/08/24 | mié 28/08/24 | 16 |

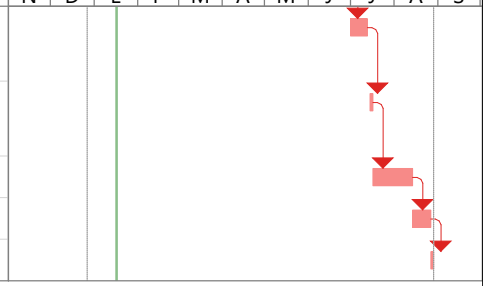


Proyecto: CRONOGRAMA ACTI
Fecha: mié 17/01/24

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Tareas críticas | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | División crítica | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | Progreso | |
| Hito inactivo | | solo fin | | Progreso manual | |
