IDRD

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3131 DE 2023
SOLIUN INGENIERÍA SAS
DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55
TELÉFONO: 76530168 – 3013942384

"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

INFORME MENSUAL No 5 – COMPONENTE TÉCNICO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

TOMO __1___ DE _____




TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	X	COPIA CONTROLADA NO	
	Nombre	**Cargo**	**Firma**
ELABORÓ	Luis Alberto Medrano Bermúdez	Residente de Interventoría	
APROBÓ	Edna Constanza Cepeda Sánchez	Directora de interventoría	

ENERO DE 2024 / BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2024.02.16 11:57:44 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

Fecha: 13 de Enero 2024
Parque: Cayetano Cañizares
Personal: 2 electricos, 1 ayudante, 2 instaladores de fachada Verde.
Equipo: 1 manlift
Actividades: Se continue con actividades de fachada Verde, Se realiza revisión del equipo manlift ya que no estaba funcionando. Se deja revisado y funcionando.




Fecha: 15 de Enero 2024
Parque: Cayetano Cañizares
Personal: 3 electricos, 1 ayudante.
Equipo: Manlift
Actividades: Se realiza instalacion de Acometida en el punto de la viga que da corriente a la fase (1) poste 1 entrada a la cancha. Se instala caja electrica para del

Powered by CamScanner


la puesta tiene de poste numero 16 (poste Nuevo). Se deja funcionando las luminarias. Se realiza prueba fotometrica y ajustes de luminar apuntamiento o direccionamiento.

Luz Cantera



Fecha: 16 de Enero (2023) 2024
Parque: Cayetano Cañizares
Actividades: Se realiza pd la noche pruebas fotometricas de lumin. y apuntamiento de luminarias en la Zona de la concha Sinteticas.
horas de la noche:


Luz



Fecha: 17 de Enero 2024
Parque: Cayetano Cañizares
Clima: Calido

Powered by CamScanner

Personal: 2 instaladores de Fachada Verde.
Actividades: Se continúa con los anclajes de fachada verde en los muros exteriores.



Fecha: 22 de Enero 2024
Porque: Caytano Cañizares
Clima: Calido
Personal: 2 instaladores de muro verde
Actividades: Se continúa con instalación de guayos en los muros de la parte interna en fachada vidriada.



Fecha: 23 de Enero 2024
Porque: Caytano Cañizares
Clima: Calido.
Personal: 2 instaladores.
Herramienta Menor:

Powered by CamScanner

Actividades: Se continuo con la instalacion de grafos en los muros de Fachada Verde que quedan en la parte anterior

Fecha: 30 Enero 2024
Parque: Caytano Carizares
Cmo: Cabo
Actividad: Se realizo la puesta en Servicio de la Fachada Verde en los Muros Interiores y Exteriores. Esto se realizo con la presencia de Ambiental del IDRD, Administradora del parque el interventor y Contratista.

Luz O.

Bitacora de obra Parque Villa de Los Alpes.

Codigo del parque. 04-075

Contrato N° 3099 del 2023

Objetivo: Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, adecuacion, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parque que integran el sistema distrital de parque administrados por el IDRD.

Contratista: Consorcio Parque Bogotá
Director obra: Arq. Luis Alfredo Brunados
Residente obra: Ing. Rodney Brunados

Interventoria
Contrato 3031 de 2023
Director de Interventoría
Residente de interventoría Fernando Pondesson.

2 Enero 2024

Se solicita a la interventoría realizar recorrido y dar recibido a la pista de patinaje o en el caso presentar observaciones al terminado para proceder a corregir o dar acta de entrega en el administrador se notifica que durante la primera semana del mes de enero se realizan trabajos de compras para retomar labores el día 9 de Enero 2023.

y recibido.

FIDUPREVISORA
RES INTERV

Se informa a la interventoría que durante la semana del 3 enero 2024 hasta el día 9 de enero del 2024. se realizan trabajos administrativos; gestion de compras e insumos para continuar labores el día 9 de enero 2024. en obra.

y recibido obra.

FIDUPREVISORA
RES INTERV

9 Enero
Personal
residente
soldador
clima: so
Actividades
Se realizo
se debe
ordaje y
atadura
Se fabric
ser instal

10 Enero
Personal
residente
y 1 oy
Clima:
Actividad
Se cont

(14)

realizar
pista de
or. Observaciones
orregir o
dministrador
ien Semana
trabajo de
l día 9 de
FIRMA Y SELLO
DES/INTERV.
e durante la
el día 9
o bajos
- insumos
de enero 2024.
FIRMA Y SELLO
ES/INTERV.

(13)

9 Enero 2024

Personal en obra: 1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 inspector, 1 soldador, 1 ayudante

Clima: soleado

Actividades realizadas

Se realizo inspección del flanche en colsro se debe realizar un soporte para punto de anclaje ya que no se evidencia donde puedan ser atados los trabajadores en una línea de vida.

Se fabrican los laminas del flanche para ser instalados.

FIRMA Y SELLO DES/INTERV.

y metal de obra.

10 Enero 2024

Personal en obra: 1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 inspector, 1 soldador y 1 ayudante

Clima: soleado

Actividades realizadas

Se continua fabricando laminas calibre 20

doblado para instalar en florche del coliseo

FDO MONDRAGON
RES INTERV

y maestro de obra.

dota 31 15 Enero 2024

Personal en obra: 1 inspector, 1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 soldador y 1 ayudante.

Herramientas y equipos: Andamios certificados, Herramienta menor

Clima soleado

Actividades realizadas:

- Se realiza desmonte de bisolo dobles los cuales son trasladados a taller para su mantenimiento que consiste en desmonte, reposición de pernos, Pintura e instalación nuevamente.

y maestro de obra

FDO MONDRAGON
RES INTERV

dota 32 16 enero 2024

Personal en obra: 1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 inspector, 1 oficial de Antrum y

(17)

1 ayudante, 1 maestro y 1 ayudante de obra civil
1 inspector SST y 1 operador de manlift
Herramientas y equipos: Manlift, Andamios
certificados, equipo de soldadura y Herramenta
menor
Actividades realizadas
- Se realize el montaje de andamios para
atender la reparación del planchon del colizeo
- Se ingresa con manlift para enderezar la
cercha y hacer los puntos de soldadura
- Se realiza izado de viga IPE

FDO MIGUEL DIAGON
Dpto INTEGRO


Inspector
y jefe de obra.

Viernes 17 Enero 2024
Personal en obra: 1 residente de obra, 1 residente
de inventario, 1 inspector, 1 pintor, 1 pintor,
1 soldador, 1 ayudante, 1 maestro y 1 ayudante de
obra civil, 1 inspector sst, 1 operador de manlift
climatizado
Herramientas y equipos Andamios certificados,
Manlift, equipo de soldadura y Herramienta menor

Firma

Actividades realizadas

- Se continua con la atencion del flanche del coliseo se realiza la instalacion del flanche se remacha y se aplica producto sika para sellar juntas de traslapo.
- Se continua con el mantenimiento de basculantes en taller; se realiza mantenimiento a los rodamientos de las maquinas.



18 y 19 Enero 2024.

Se informa a la interventoria que el dia de hoy se realizo atencion de la dilatacion y desnivel de bordillo de confinamiento a la pista de patinaje nivelando con mortero la placa al bordillo. y se espera visita de interventoria para recibir la pista la cual implica la pulida de granito.

Se realizaron trabajos de lijado de pegos M-5 y se instalo un tornillo que hacia falta a uno de ellos; se continua realizando

(18)

de
del flanche
instalacion de
nica producto Sika
o.
to de biosoluciables
imiento a los
nos.
Supervisor
Responsable de obra

ri el dia de
o dilatacion
imiento a la
ostro la
isita de
la la cual
to.
o de juegos
. que hacia
nos realizando

(19)

trabajos de mantenimiento de biosolubles en taller.

Supervisor
FDO MONDRAGON
Dpto INTERV
y resp de obra.

Obra 35

20 Enero 2024

Personal en obra: 1 oficial y 1 ayudante de metalmecánica

Clima: Soleado

Herramienta y equipo: 1 compresor y equipo de soldadura y Herramienta menor

Actividades realizadas:

Se continua realizando el mantenimiento de lijado en juego N-S, ruta de la uda; Se espera confirmación y aprobación de inventario para intervenir la bajanda pista de patinaje

Se continua realizando mantenimiento de biosolubles en taller

FDO MONDRAGON
DPTO INTERV

Firma

21 enero 2024 Domingo
No se realizan trabajos

Nota 36

22 enero 2024
Personal en obra: 1 residente de obra
1 residente Interventoría, 1 inspector
1 oficial y 1 ayudante metalmecánica
Clima: Soleado
Herramienta y equipo: Equipo de soldadura y
Pintura: Herramienta menor
Se continua realizando mantenimiento
de bloque de bolas que consiste en el
desmonte, reposición de piezas, lijado y
Pintura la actividad se realiza en
taller.
Se avanza con lijado en ruta de
la cada

Nota 37

23 Enero 2024
Personal en obra: 1 inspector de obra

dante de obra
1 inspector
metalmecanica
o de soldadura
mantenimiento
le en el
es. Ujuda y
realiza en
en ruta de
tor de obra

1 Residente de interventoria, 1 residente de obra, 1 inspector de interventoria 1 oficial y 1 ayudante metalmecánica.
Clima: Soleado.
Actividades realizadas
- Se avanza con la aplicación de anticorrosivo en ruta de la vida y juegos m-5.
- Se continua realizando mantenimiento de las maquinas biosaludables en taller.

NOM 36

24 Enero 2024
- Personal en obra: 1 oficial y ayudante de metalmecanica.
- Clima soleado
- Actividades realizadas
Se avanza con la aplicación de anticorrosivo en juegos m-5 y ruta de la vida.
Se continua realizando mantenimiento de biosaludables en taller.

25 Enero 2024

Personal en obra: 1 Residente de interventoría
1 Residente de obra, 1 inspector, 1 oficial y
1 ayudante metalmecánica

Clima soleado

Actividades realizadas

- Se aplica Pintura color rojo y gris a juegos n=5 y 1 nota de la vida
- Se continúa realizando mantenimiento de basculadores en taller
- Se obtuvo respuesta de aprobación por parte de interventoría de intervenir la bahía de pista de patinaje realizando mantenimiento de lijado y pintura en verde.

FDO MONDRAGON
RDS INTERV

NOTA 39

26 Enero 2024

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 residente interventoría, 1 inspector, 1 oficial y 1 ayudante de metalmecánica

Clima: Soleado

NOTA 40

Pers
Insp
metal
Cl
Actuic
- Se
Pista
por la
aplicac
Pintura
Se

(22)

nt de intenantonà
rector, 1 Oficial y

rojo y gris
ra de louida.
mantenimiento
ñller
bación por parte
rnir. La
brop realizando
y pintura

t de obra, 1
bor, 1 Oficial y
a.

(23)

Actividades realizadas
- Se finaliza la aplicación de pintura esmalte rojo y gris en juegos n-5 y ruta de louida.
- Se continua realizando mantenimiento en tolbi de biosaludables
- Se inicia lijado de baranda cementado pista de patinaje

TODO INCIDENCIA
DIAS INTERN

Lunes 40

27 Enero 2024
Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 Inspector de obra, 1 Oficial y 1 ayudante de metalmecánica
Clima: Soleado
Actividades realizadas
- Se inicia Aplicación de pintura en baranda Pista de patinaje previamente aprobada por la interventoría se realizo aplicacion de anticorrosivo antes de la pintura
- Se continua realizando mantenimiento

de bioseludobles en taller
- Se realiza acta de entrega de juegos mecanicos, actividad de pulida pista de patinaje y actividad de reparacion del frente del coliseo con la administración como consta en el acta de entrega.

FIDEL MONTOYA DRAGON
RES/INTERV

NOTA 41

29 Enero 2024

Personal en obra: 1 residente de obra, 1 residente de interventoria, 1 oficial y 1 ayudante de metalmecanica

Clima soleado

Actividades realizadas:

- Se continua realizando mantenimiento de bioseludobles en taller.
- Se avanza en la aplicacion de pintura esmalte verde en baranda pista de patinaje.

FIDEL MONTOYA DRAGON
RES/INTERV

BITACORA DE OBRA

PARQUE CIUDAD MONTES

CONTRATO 3099 DE 2023

OBJETIVO: Contrato mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, dotación, reparación y Recuperación de la Infraestructura de los parques que integran el Sistema Distrital de Parques administrados por el IDRD.

CONTRATISTA: Consorcio Parques Bog
Directa de Obra: Luis Alfredo Granados
Residente obra: Luz Stella Quintero.

Interventoria: Solun Sas
Contrato: 3031 De 2023
Residente: -ERRADA(DOCPROPERTY(Director)

NOTA: los profesionales adjuntos a este Contrato Pueden realizar anotaciones.

Fecha: 02 de Enero de 2024
Parque: Ciudad Montes
Clima: Calido
Personal: 1 oficial y 2 ayudantes.
Nota 53 Actividades: Se continua con el armado de acero para viga y pilotines del cerramiento en malla eslabonada en zona de la huerta.

FDO Fernandez Des Inter

Luz Cortes

Fecha: 03 de Enero de 2024
Parque: Ciudad Montes
Personal: 1 Oficial y 2 ayudantes
Nota 54 Actividades: Se continua con armado de acero y formaleta para la viga y pilotins de la viga de cerramiento en malla eslabonada en zona de la huerta.

Luz Cortes

FDO Fernandez Des Inter

Fecha: 04 c
Parque: Ciuda
Personal: 1
Nota 55 Actividades:
acero de vi
en malla es

Luz Co

Fecha: 05
Parque: Ciud
Personal: 2
Nota 56 Actividades:
de formaleta
cerramiento
eslabonada

Luz Cort

Fecha: 06
Parque: Ciu
Personal: 1

Fecha: 04 de enero de 2024
Parque: Ciudad Montes
Personal: 1 oficial y 2 ayudantes
Nota 55 Actividades: Se continúa con armado de acero de viga y pilotines del cerramiento en malla eslabonada en Zona de la huerta.

Luz Quintero. FDO MONDRAGON DES INTERV

Fecha: 05 de Enero 2024
Parque: Ciudad Montes
Nota Personal: 2 ayudantes y un oficial.
56 Actividades: Se continúa con la armada de formaleta y acero para la viga del cerramiento Contra incendio en malla eslabonada en Zona de la huerta.

Luz Quintero FDO MONDRAGON DES INTERV

Fecha: 06 de Enero 2024
Parque: Ciudad Montes
Personal: 1 oficial y 2 ayudantes

(32)

Nota (57)

Actividades: Se continua con armado de formaleta para la Viga del cerramiento contemplado en malla eslabonada en zona de la huerta.

Fdo Ramon Rosero Rey / Interventor

Fdo Luz Cantor

Fecha: 09 de Enero 2024

Parque: Ciudad Montes

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 soldados y un residente de Obra.

Nota (58)

Actividades: Se continua con armado de formaleta para la Viga del Cerramiento, en zona de la huerta, se retira polisombra en zona de los Bloq y se da apertura de esta Zona para Servicio al público. Se prima puesta de Servicio con el administrador. Se libera la actividad de aseo y cafeteria Fdo Ramon Rosero Rey / Interventor Fdo Luz Cantor

Fecha: 10 de Enero 2024

Parque: Ciudad Montes

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 soldados y un residente de Obra.

Nota (59)

Actividades: Se continua con armado de formaleta para la Viga del Cerramiento, en zona de la huerta, se retira polisombra en zona de los Bloq y se da apertura de esta Zona para Servicio al público. Se prima puesta de Servicio con el administrador. Se libera la actividad de aseo y cafeteria

Fdo Ramon Rosero Rey / Interventor

Fdo Luz Cantor

Fecha: 11 de Enero 2024

Parque: Ciudad Montes

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 soldados y un residente de Obra.

Nota (60)

Actividades: Se continua con armado de formaleta para la Viga del Cerramiento, en zona de la huerta, se retira polisombra en zona de los Bloq y se da apertura de esta Zona para Servicio al público. Se prima puesta de Servicio con el administrador. Se libera la actividad de aseo y cafeteria

Fdo Ramon Rosero Rey / Interventor

Fdo Luz Cantor

Fecha: 12 de Enero 2024

Parque: Ciudad Montes

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 soldados y un residente de Obra.

Nota (61)

Actividades: Se continua con armado de formaleta para la Viga del Cerramiento, en zona de la huerta, se retira polisombra en zona de los Bloq y se da apertura de esta Zona para Servicio al público. Se prima puesta de Servicio con el administrador. Se libera la actividad de aseo y cafeteria

Fdo Ramon Rosero Rey / Interventor

Fdo Luz Cantor

Fecha: 13 de Enero 2024

Parque: Ciudad Montes

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 soldados y un residente de Obra.

Nota (62)

Actividades: Se continua con armado de formaleta para la Viga del Cerramiento, en zona de la huerta, se retira polisombra en zona de los Bloq y se da apertura de esta Zona para Servicio al público. Se prima puesta de Servicio con el administrador. Se libera la actividad de aseo y cafeteria

Fdo Ramon Rosero Rey / Interventor

Fdo Luz Cantor

Fecha: 14 de Enero 2024

Parque: Ciudad Montes

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 soldados y un residente de Obra.

Nota (63)

Actividades: Se continua con armado de formaleta para la Viga del Cerramiento, en zona de la huerta, se retira polisombra en zona de los Bloq y se da apertura de esta Zona para Servicio al público. Se prima puesta de Servicio con el administrador. Se libera la actividad de aseo y cafeteria

Fdo Ramon Rosero Rey / Interventor

Fdo Luz Cantor

Fecha: 15 de Enero 2024

Parque: Ciudad Montes

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 soldados y un residente de Obra.

Nota (64)

Actividades: Se continua con armado de formaleta para la Viga del Cerramiento, en zona de la huerta, se retira polisombra en zona de los Bloq y se da apertura de esta Zona para Servicio al público. Se prima puesta de Servicio con el administrador. Se libera la actividad de aseo y cafeteria

Fdo Ramon Rosero Rey / Interventor

Fdo Luz Cantor

Fecha: 16 de Enero 2024

Parque: Ciudad Montes

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 soldados y un residente de Obra.

Nota (65)

Actividades: Se continua con armado de formaleta para la Viga del Cerramiento, en zona de la huerta, se retira polisombra en zona de los Bloq y se da apertura de esta Zona para Servicio al público. Se prima puesta de Servicio con el administrador. Se libera la actividad de aseo y cafeteria

Fdo Ramon Rosero Rey / Interventor

Fdo Luz Cantor

Fecha: 17 de Enero 2024

Parque: Ciudad Montes

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 soldados y un residente de Obra.

Nota (66)

Actividades: Se continua con armado de formaleta para la Viga del Cerramiento, en zona de la huerta, se retira polisombra en zona de los Bloq y se da apertura de esta Zona para Servicio al público. Se prima puesta de Servicio con el administrador. Se libera la actividad de aseo y cafeteria

Fdo Ramon Rosero Rey / Interventor

Fdo Luz Cantor

Fecha: 18 de Enero 2024

Parque: Ciudad Montes

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 soldados y un residente de Obra.

Nota (67)

Actividades: Se continua con armado de formaleta para la Viga del Cerramiento, en zona de la huerta, se retira polisombra en zona de los Bloq y se da apertura de esta Zona para Servicio al público. Se prima puesta de Servicio con el administrador. Se libera la actividad de aseo y cafeteria

Fdo Ramon Rosero Rey / Interventor

Fdo Luz Cantor

Fecha: 19 de Enero 2024

Parque: Ciudad Montes

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 soldados y un residente de Obra.

Nota (68)

Actividades: Se continua con armado de formaleta para la Viga del Cerramiento, en zona de la huerta, se retira polisombra en zona de los Bloq y se da apertura de esta Zona para Servicio al público. Se prima puesta de Servicio con el administrador. Se libera la actividad de aseo y cafeteria

Fdo Ramon Rosero Rey / Interventor

Fdo Luz Cantor

Fecha: 20 de Enero 2024

Parque: Ciudad Montes

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 soldados y un residente de Obra.

Nota (69)

Actividades: Se continua con armado de formaleta para la Viga del Cerramiento, en zona de la huerta, se retira polisombra en zona de los Bloq y se da apertura de esta Zona para Servicio al público. Se prima puesta de Servicio con el administrador. Se libera la actividad de aseo y cafeteria

Fdo Ramon Rosero Rey / Interventor

Fdo Luz Cantor

Fecha: 21 de Enero 2024

Parque: Ciudad Montes

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 soldados y un residente de Obra.

Nota (70)

Actividades: Se continua con armado de formaleta para la Viga del Cerramiento, en zona de la huerta, se retira polisombra en zona de los Bloq y se da apertura de esta Zona para Servicio al público. Se prima puesta de Servicio con el administrador. Se libera la actividad de aseo y cafeteria

Fdo Ramon Rosero Rey / Interventor

Fdo Luz Cantor

Fecha: 22 de Enero 2024

Parque: Ciudad Montes

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 soldados y un residente de Obra.

Nota (71)

Actividades: Se continua con armado de formaleta para la Viga del Cerramiento, en zona de la huerta, se retira polisombra en zona de los Bloq y se da apertura de esta Zona para Servicio al público. Se prima puesta de Servicio con el administrador. Se libera la actividad de aseo y cafeteria

Fdo Ramon Rosero Rey / Interventor

Fdo Luz Cantor

Fecha: 23 de Enero 2024

Parque: Ciudad Montes

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 soldados y un residente de Obra.

Nota (72)

Actividades: Se continua con armado de formaleta para la Viga del Cerramiento, en zona de la huerta, se retira polisombra en zona de los Bloq y se da apertura de esta Zona para Servicio al público. Se prima puesta de Servicio con el administrador. Se libera la actividad de aseo y cafeteria

Fdo Ramon Rosero Rey / Interventor

Fdo Luz Cantor

Fecha: 24 de Enero 2024

Parque: Ciudad Montes

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 soldados y un residente de Obra.

Nota (73)

Actividades: Se continua con armado de formaleta para la Viga del Cerramiento, en zona de la huerta, se retira polisombra en zona de los Bloq y se da apertura de esta Zona para Servicio al público. Se prima puesta de Servicio con el administrador. Se libera la actividad de aseo y cafeteria

Fdo Ramon Rosero Rey / Interventor

Fdo Luz Cantor

Fecha: 25 de Enero 2024

Parque: Ciudad Montes

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 soldados y un residente de Obra.

Nota (74)

Actividades: Se continua con armado de formaleta para la Viga del Cerramiento, en zona de la huerta, se retira polisombra en zona de los Bloq y se da apertura de esta Zona para Servicio al público. Se prima puesta de Servicio con el administrador. Se libera la actividad de aseo y cafeteria

Fdo Ramon Rosero Rey / Interventor

Fdo Luz Cantor

Fecha: 26 de Enero 2024

Parque: Ciudad Montes

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 soldados y un residente de Obra.

Nota (75)

Actividades: Se continua con armado de formaleta para la Viga del Cerramiento, en zona de la huerta, se retira polisombra en zona de los Bloq y se da apertura de esta Zona para Servicio al público. Se prima puesta de Servicio con el administrador. Se libera la actividad de aseo y cafeteria

Fdo Ramon Rosero Rey / Interventor

Fdo Luz Cantor

Fecha: 27 de Enero 2024

Parque: Ciudad Montes

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 soldados y un residente de Obra.

Nota (76)

Actividades: Se continua con armado de formaleta para la Viga del Cerramiento, en zona de la huerta, se retira polisombra en zona de los Bloq y se da apertura de esta Zona para Servicio al público. Se prima puesta de Servicio con el administrador. Se libera la actividad de aseo y cafeteria

Fdo Ramon Rosero Rey / Interventor

Fdo Luz Cantor

Fecha: 28 de Enero 2024

Parque: Ciudad Montes

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 soldados y un residente de Obra.

Nota (77)

Actividades: Se continua con armado de formaleta para la Viga del Cerramiento, en zona de la huerta, se retira polisombra en zona de los Bloq y se da apertura de esta Zona para Servicio al público. Se prima puesta de Servicio con el administrador. Se libera la actividad de aseo y cafeteria

Fdo Ramon Rosero Rey / Interventor

Fdo Luz Cantor

Fecha: 29 de Enero 2024

Parque: Ciudad Montes

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 soldados y un residente de Obra.

Nota (78)

Actividades: Se continua con armado de formaleta para la Viga del Cerramiento, en zona de la huerta, se retira polisombra en zona de los Bloq y se da apertura de esta Zona para Servicio al público. Se prima puesta de Servicio con el administrador. Se libera la actividad de aseo y cafeteria

Fdo Ramon Rosero Rey / Interventor

Fdo Luz Cantor

Fecha: 30 de Enero 2024

Parque: Ciudad Montes

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 soldados y un residente de Obra.

Nota (79)

Actividades: Se continua con armado de formaleta para la Viga del Cerramiento, en zona de la huerta, se retira polisombra en zona de los Bloq y se da apertura de esta Zona para Servicio al público. Se prima puesta de Servicio con el administrador. Se libera la actividad de aseo y cafeteria

Fdo Ramon Rosero Rey / Interventor

Fdo Luz Cantor

Fecha: 31 de Enero 2024

Parque: Ciudad Montes

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 soldados y un residente de Obra.

Nota (80)

Actividades: Se continua con armado de formaleta para la Viga del Cerramiento, en zona de la huerta, se retira polisombra en zona de los Bloq y se da apertura de esta Zona para Servicio al público. Se prima puesta de Servicio con el administrador. Se libera la actividad de aseo y cafeteria

Fdo Ramon Rosero Rey / Interventor

Fdo Luz Cantor

33

Fecha 10 de Enero 2024
Parque: Ciudad Montes
Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 soldadores
1 residente
Herramienta: Herramienta menor, equipo soldadura, planta electrica
Actividades: Se realiza instalación de Acero y fleges para fundir la viga sobre la Drag 165 costado del canal.
- Se continua con la instalacion de los mallas de cerramiento sobre la cra 40.
- Se continua con excavación en terreno sobre la Drag 165 para construcción de viga de coronamiento.

FOTOGRAFIA DE LA JORNADA

Fecha 11 de Enero 2024
Parque: Ciudad Montes
Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 soldadores, 1 residente
Herramienta: Herramienta Menor, Equipo

(34)

soldadura, planta electrica
Nov(60) Actividades: Se continua y se
terminar la excavacion para viga
de cimentacion sobre la Diag 165.
- Se continua la instalacion
de malla y retoques puntos de
soldadura sobre la cimentacion.
- Se revisa por parte del residente
de interventoria la instalacion
de formaleta y acero de la
viga y pilotines para avalar
la fundida de la viga en concreto

FUNDACION
LOS INTERNOS

FECHA 17 ENERO DE 2024
PROYECTO Ciudad Montes
Personal: 2 soldadores, 1 oficial,
4 ayudantes, 1 operario mini
cargador, 1 residente, 1 paletero.
Herramienta: Herramienta menor,
equipo soldadura, mini cargador

pilotes a
electrica
Nov(61) Actividades:
concreto
para in
la Di
- Se re
con el
la for
para s
- Se
rompi
concre
sobre
no lo
- Se
desd
viga
cons
post
- Se
la p

y se
a viga
Dica 165.
ecian
más de
40.
resistent
ilacion
, la
alor
concreto

xpcial,
mini
paletero.
Mevan,
;eden

pilvo compactador de aguja, planta
electrica
Mons (61) Actividades: El dia de hoy, llego concreto premezclado de planta para iniciar fundido de la viga sobre la Dica 165.
- Se realiza toma de asentamiento con el cono de abrahám, y se realiza la toma de cilindros en concreto para ser fallados en laboratorio.
- Se solicitan los resultados del rompimiento de los cilindros de concreto tomados para la viga sobre la Cva 40, los cuales faltaba no los han entregado.
- Se realiza fundida de la viga desde el puntón hacia arriba de la viga, se realiza vibrado del concreto, y se colocan los pistes centrales.
- Se solicita al contratista realiza la prueba de tintes a los soldaduras

(36)

que se esta aplicando en sitio.
- Interventoria, realiza seguimiento y control a esta actividad por medio del residente de interventoria con el fin de que toda la actividad se realice correctamente.

FDO RESIDENTE DES INTERV

Fecha 13 enero /2024
Parques Ciudad Montes.
Personal: 2 soldadores, 1 oficial, 3 ayud, 1 residente
Herramienta Menor: Herramienta menor equipo soldadura, planta electrica
Notas Actividades: Se realizo instalacion de modulos de cerramiento pequeño al lado de la puerta de entrada ala zona de la huerta ecopuzzas
- Se realizo aseo recogiendo todo en un solo sitio
- Se realizo ajustes de soldadura solicitado por interventoria

FDO RESIDENTE DES INTERV

Fecha 15
PARQUE Ca
Personal:
1 residente
Herramient
soldadura,
Notas Actividad
puntos de
por interv
- Se req
entrega
tuercas d
- Se req
de los
fallados
- Se co
formale
organi
trabajo
del co

FDO
Res

(37)

Fecha 15 de Enero / 2024

Parque Ciudad Montes

Personal: 2 soldadores, 1 oficial, 2 ayud 1 residente, 1 ayudante.

Herramienta: Herramienta menor, Equipo soldadura, planta electrica.

Notas Actividades: Se continua con los puntos de soldadura en modulos solicitados por interventoria

- Se requiere que el contratista entregue y realice la prueba de tintas de las soldaduras.
- Se requiere entregue el resultado de los cilindros de concreto fallados en laboratorio.
- Se continua con el armado de formaleta, Hierro y fleges para organizar la fundida del ultimo tramo de la viga sobre el eje del canal Diag 16 3.

Fotos tomadas por el residente

Diseñado por el residente

014

Fecha: 16 de Enero 2024
Parque: Ciudad Montes
Personal: 1 oficial, 2 ayudantes y 2 Soldadoras.
Clima: Caldo
Actividades: Se continua con la excavación y pilotines de la Viga del cerramiento en malla eslabonada Se continua con instalación de Modulos en primer tramo de la Huerta

Fecha: 17 de Enero 2024
Parque: Ciudad Montes
Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 Soldadoras.
Actividades: Se continua con el armado de Acero y Formaleta para la fundida del Segundo tramo de la huerta, Se continua con

la instalación
la cerca

Fecha: 18
Parque Ciud
Personal:
2 soldador
Ayudantes
del tramo
el cerram
en Zona d
en concret
Se toman
el cono,
toma en
instalado

(38)

(39)

la instalacion de los modulos sobre la cubierta 40.

Luis M. [illegible] TODO CONFORME LO INTERVENIDO

Fecha: 18 de Enero 2024
Parque Ciudad Nogales
Personal: 2 ayudantes, 1 oficial, 2 soldadores
Actividades: Se realiza la fundida del frente final de la viga para el cerramiento en muro estabilizado en Zona de la huerta. Se funde con concreto premezclado de concreto, Se toman 6 cilindros de muestra y el cono, Se realizan pruebas de fuga en Sitio a los modulos y instalados:

Luis M. [illegible] TODO CONFORME LO INTERVENIDO

Fecha: 19 de Enero 2024
Parque: Ciudad Montes
Personal: 2 ayudantes, 1 oficial, 2 Soldadores
Actividades: Se retira la pavimentación de la viga, se realiza aseo y retiro de escombros y se continua con instalación de modulos.

luz Q — FOO RODRIGO — DOS INTERV

Fecha: 20 de Enero 2024
Parque: Ciudad Montes
Personal: 2 ayudantes, 1 oficial, 2 Soldadores
Actividades: se termina de desencofrada de la viga fundida y se continua con instalación de modulos en la zona del tigano que queda sobre la carretera

luz Q FOO RODRIGO DOS INTERV

Fecha: 22
Parque: Ciu
Personal: 2
Actividades
Pintura en l
la Carrera

luz

Fecha: 23
Parque: Ciud
Personal: 2
Actividades:
de pintura
en la Carrera

FOO R
DOS I

Fecha: 24
Parque: C

39

Fecha: 22 de Enero 2024
Parque: Ciudad Montes
Personal: 2 Soldados
Actividades: Se inician retoques de pintura en los modulos instalados sobre la Carrera 40.

Luz
Fdo Autoridad Del Interior

Fecha: 23 de Enero 2024
Parque: Ciudad Montes
Personal: 2 Soldados
Actividades: Se continua con el retoque de pintura en los modulos instalados en la Carrera 40 en Zona de la huerta.

Fdo Autoridad Del Interior

Luz

Fecha: 24 de Enero 2024
Parque: Ciudad Montes

personal: 2 soldadores, 1 residente
Clima: Soleado
Maquinaria y Equipo: Herramienta menor compresor,
Actividades: - Se continua con la instalacion de pintura sobre las soldaduras realizadas en los módulos de la Cva 40.
- Llegan modulos media caña elaborados para colocar en el cerramiento sobre la Dcha 165.
- Se inicia la colocacion de los modulos media caña elaborada sobre la Cva Dcha 165.

Fecha 25 de Enero 2024
Parque Ciudad Montes
Personal: 2 soldadores, 1 residente
Clima: Soleado.
- Se continua con la instalacion de modulos media caña elaborada sobre

la Dcha

Fecha 2
Parque
Personal
Clima:
- Se ra
la pint
los me
la Cva
- Se con
modulo
la Dcha
- Inicio
Se inic
la cate

Fecha
Parqué
Personal

(43)

la Diag 16.

Fecha 26 de Enero 2021

Parque Ciudad Montes

Personal: 2 soldadores

Chica Soldada...

- Se realiza por parte de intervención la puntería sobre soldadura en los módulos instalados sobre la Cra 40.
- Se continua con la instalación de módulos de allá, estabamos sobre la Diag 16.
- Interventoría solicita y requiere se inicien las actividades en la parte de la vida.

Fecha 27 de Enero 2021

Parque Ciudad Montes

Personal: 2 soldadores

617

Clima: Soleado
Actividades: - Se continua con instalacion modulos acero estabund sobre la Diag 16 S.
- Llega pintor metalico con acero estabundo para colocar y cambia el que este en mal estado.
- Se evidencia que todavia no se han iniciado actividades a los modulos ruta de la vida
- Se solicita la entrega de los resultados de los calidades de concreto fallados en laboratorio

FIRMA CONTRATISTA
Dos INTERV.

Fecha 29 Enero 2024
Parque Ciudad Montes
Personal: 2 soldadores, 1 pintor
Clima: Soleado
Actividades: Se realizan retoques de pintura en los puntos de

soldadore
estabana
sobre la
- Se real
pilares
ruta de
zona de t

Fecha 3
Parque C
Personal
Clima:
Actividad
de hyd
de la r

(45)

soldadura de los módulos quelle colaborado del corralito sobre la Dog 165.
- Se realiza el corralito en polisombra en la zona de la ruta de la vida para aislarla zona de trabajo.

FOTOGRAFÍA Nos Interesa

Fecha 30 enero 2024
Parque Ciudad Montes
Personal: 2 soldadores, 1 vez
Clima: Soleado fresco
Actividades: Se inicia actividades de hincado aséptico en los módulos de la ruta de la vida.

FOTOGRAFÍA LATERAL

BITACORA DE OBRA
PARQUE BOSQUE DE SAN CARLOS

CONTRATO 3099 DEL 2023

Objetivo: Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto Agotable, el mantenimiento, dotación, reparación y Recuperación de la infraestructura de los parques que integran el Sistema Distrital de parques Administrados por el IDRD.

CONTRATISTA: Consorcio Parque Bog.
Directora: Luz Mireya Granados
Residente: Luz Stella Montero

Interventoría: Solum SAS.
Contrato: 3031 DE 2023
Residente: FERNANDO GONZALEZ. Director:
Nota: Los profesionales adjuntos en el contrato pueden hacer anotaciones.

(24)

NOTA 32 Martes 02 de Enero de 2024

Ubicación: Bosque San Carlos

Clima: Soleado

Maquinaria y Equipo: No hay personal

Actividades:

La interventoria realiza visita al frente de obra y no se evidencia personal de obra, se solicita al contratista retomar actividades, para garantizar la entrega de las obras en los tiempos contractuales.

FOO MONDRAGON
Res/ Interv

LUZ Q.

NOTA 33 Miercoles 03 Enero - Lunes 08 Enero/24

Ubicación: Parque Bosques San Carlos

Clima: —

Maquinaria y Equipo: —

Personal: —

Actividades: Interventoria Realiza visita en estos días y no se evidencia personal en obra, se solicita nuevamente al contratista retomar actividades.

Atentamente

FOO MONDRAGON
Res/ Interv

(24)

0224.

)

onal

al frente de
onal de obra,
ebmar actividade
je de los
actividades.

LUZQ

ones 08 Enero/24
:s San Carlos

tema Realiza
4 no se
osva, se
l contratista

MONDRAGON
Lautaro

(25)

0231 Martes 09 de Enero de 2024.
Ubicación: Parque Bosques de San Carlos
Clima. Soleado.
Maquinarias y Equipo. Herramientas manuales
personal: 3 ayudantes, 1 plomero,
1 inspector.
Actividades: - Se continua arreglo
de lavamanos y inodoros en el
baño de hombres.
- Se continua con la demolición de
asfalto y excavación en los patios
de los juegos infantiles de la
media luna.
- Se solicita entrega la propuesta
de la estructura de la zona de
juegos cerca a los arrecifes
con el fin de ajustar el presupuesto

FDO MONDRAGON
Res/ LAUTERO

LUZ

NOTA 35 Miercoles 10 de Enero de 2024.
Ubicación: Parque Bosques San Carlos

(26)

Clima: Soleado
Maquinaria y Equipo: Herramienta Menor
Personal: 3 ayudantes, 1 plomero
1 supervisor.
Actividades: Se continua con la demolicion de asfalto y excavación en las patas de los juegos infantiles en la ½ luna.
- Se rectifican los fluxometros de los orinales por solicitud de la interventoría.
- Se desmontan las divisiones metalicas de los sanitarios en el baño de hombres.
- Se llevan las divisiones metalicas a la casita verde costado nor oriental del parque a cuidado de la administracion del parque.

FDO RESIDENTE
DES INTERV.

NOTA 36 Jueves 11 de Enero de 2024
Ubicacion: Parque Bosques de San Carlos

(26)

ieuta Meron
iplomero

a con la
excavación
juegos
ra.
xcavetros
olicitud de

tuciones
nteriores en

ores metálicos
rado por
cuidado de
) parque.

2024
) de San Carlos

(27)

clara: Soleado
Maquinaria y Equipo: Herramienta oficina
Personal: 2 ayudantes, 1 inspector
Actividades: Se realiza el desarme
del rodadero metalico y de los
columpios de la zona juegos infantiles
de la ½ luna.
- Se solicita nuevamente la entrega
de la propuesta de la estructura de
de la zona de juegos cerca a los
arecorrederos con el fin de evaluar
la propuesta y entregarsela al IDRD para su respectiva aprobacion
- Se solicita el suministro e instalacion de los vidrios de la casita roja estado nor-oriental del parque.

Se hace anotacion que los bancas de hombres
se encuentran habilitados sin embargo se realizo el
desmonte de las divisiones e instalacion de bancas
bancas para mejor atencion de la administracion

(82)

fue desmontada;
Se realiza desmonte de juego N3 el cual es entregado a custodia de la vigilancia del parque y son resguardados al custodio de la caseta.

FDO MONITOR SSTA INTERV

Nota 37) Viernes 12 Enero 2024
Ubicacion Parque bosque de San Carlos.
Clima: Soleado, lluvia en horas de la tarde
Maquinaria y equipo: Herramienta menor, Planta electrica, pulidora.
Actividades realizadas: Se realiza el desmonte y retiro del 2° juego N-3 y es entregado a custodia de vigilancia en la caseta.
Se informa que de acuerdo a la Nota 36 ya fue presentada la propuesta de la estructura en la zona de juegos Cerca a los grecorromanos y se espera aprobacion de la interventoria para iniciar los trabajos

FDO MONITOR SSTA INTERV

(28)

(29)

Sábado 13 Enero 2024.
Ubicación Parque Bosque de San Carlos
Clima: Soleado.
Actividades realizadas.
Se realiza retiro de juego M-3A; se hace orden y aseo en puntos de trabajo y luppi de acopio
Personal: 2 ayudantes, 1 inspector, 1 residente de interventoría, 1 residente obra de

FDO [illegible]
DEL INTERV

Lunes 15 Enero 2024.
Ubicación Parque Bosque de San Carlos
Clima Soleado
Herramientas y equipos: Herramienta menor
Personal en obra: 1 residente SST, 1 residente obra, 1 residente interventoría, 1 inspector, 1 operario y 3 ayudantes. 1
Actividades realizadas
-Se continua con el retiro del juego M3A.
Se espera respuesta de interventoría

(30)

Frente a la propuesta presentada para la estructura de juegos acerca a los requerimientos para iniciar labores.

FDO MIGUEL DRAGON
DNI 1[illegible]

Acta 39 Martes 16 Enero 2024

Personal en obra: 1 Plomero, 1 oficial y 2 ayudantes

Clima Soleado

Herramientas y equipo: Herramienta menor

Actividades realizadas

- Se revisa flujometro de anual baños y se realiza el cambio nuevamente del flujometro y se dejan los anteriores funcionando
- Se continua con el retiro de juego M-3A y se dejan vigilancia del Parque
- Se realiza reparación de aislamiento en tubos de tubería

FDO MIGUEL DRAGON
DNI [illegible]

Miercol
Personal
de obra
Inspector,
Clima
Acerca
Herrami
Actividad
-Se rea
madera
- Se h
a tubo
finaliza
juego M
- Se in
zona 6

Personal
de obra,

...rsonal de la
...ajos cerca q
...con labores.

...ro, 1 oficial

...amiento menor

...onal bajos y
...evamente del
...o anuales fenecido
...de juego M-3A
...l Parque
...amiento en

Miercoles 17 enero 2024.
Personal en obra: 1 ingeniero residente de obra, 1 residente Interventoria, 1 inspector, 1 oficial y 3 ayudantes.
Clima Soleado.
Herramientas y equipos: 1 Pulidora y Herramienta menor.
Actividades realizadas.
-Se realiza el desmonte de juego en madera zona conchas.
- Se hace el cerramiento de la zona a trabajar en zona conchas para finalizar el desmonte e instalar el juego M-3.
- Se inicia el desmonte de baranda M-80. zona Gimnasios. se libera desmonte juego 43

FOO MONTENEGRO
DAS INTERV

Jueves 18 enero 2024
Personal en obra: 1 ingeniero residente de obra, 1 residente de interventoria, 1

(32)

inspector, 1 oficial y 3 ayudantes.
clima Soleado
Herramienta y equipo: Herramienta menor
Actividades realizadas
- Se continua realizando el retiro de baranda M-go. Zona gimnasios y se valiza lleno de material en zonas dedos. de juegos desmontados
- Se reinstala polisombra para cerramiento
- Se entrega para custodia de vigilancia del parque la baranda desmontada la cual repara al costado de la casita.

[illegible] DE OBRA
[illegible] INTERNO

Jueves 11 Viernes 19 Enero 2024
Personal en obra: 1 director de obra, 1 director de interventoría, 1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 inspector de obra, 1 residente SST, 1 residente de interventoría, 1 plomero, 1

idantes.

anto menor

' ratino de
rasos y
l en
ontados
a cerramiento
& vigilancia
ntada la
a casita.

Luis Q.:

r de obra,
sidente de
rratorio, 1
: SST, 1
plomero, 1

Oficial, 4 ayudantes.
clima: soleado.
Herramientas y equipos Herramientas menores
Actividades realizadas:
- Se realiza levantamiento de cerramiento en polisombra de acuerdo a observación SST.
- Se hace desmonte de baranda in-situ zona (bioseo) gruesos.
- Se informa a interventoría que a partir de la fecha de hoy se hace un cambio de residente que ya se encuentra dentro del contrato y el cambio es la reubicación de cargos en los parques; el ing. Rodney Granados será quien firme la bitácora a partir del día de hoy.

TODOMANDADOS DEL INTERIOR

Nota 12 Sabado 20 Enero 2024.
Personal en obra: 1 oficial, 4 ayudantes, 1 inspector, 1 plomero.
Herramientas y equipos Herramientas menores
clima soleado. Nauzina. Hora de la mañana:

Actividades realizadas.

- Se continua realizando el desmonte de la bocanda m-80 la cual sera reutilizada para el amurallamiento zona de juegos infantiles, por el momento se deja bajo custodia de la vigilancia del purge.
- Se hace acta de entrega con la Administrador Yolita Dúrega por las actividades de: Pintura de tableros de canchas multiples, instalación de llaves tipo push, fluxometro de urinales, fluxometro de sanitario han sido ocupados. Al dia de hoy y evidenciado por la administracion los drenantes instalados estan, sin fuga y perfecto funcionamiento.

FDO MONDRAGON
RES/INTERV

Lunes 22 Enero 2024

Personal en obra: 1 ingeniero residente de obra, 1 ingeniero residente interventoria,

- Se re
banner

1 inspector de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Clima: Soleado.

Actividades realizadas

- Se continua con el retiro y desmonte de banquina mano de la zona de gaviones.
- Se realizan retoques obstruidos por la interventora en la casita.

FDO MUNICIPALIDAD DEL INTERV

- SE SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR RETOQUES Y LIMPIEZA EN BAÑOS DE HOMBRES. COLOCACIÓN DE 2 MAS SANITARIOS RECORDANDO DE LOS LAVAMANOS LIMPIEZA DE OFICINAS DONDE SE REALIZARÁN LOS CAMBIOS DE LOS FLUXOMETROS

FDO MUNICIPALIDAD DEL INTERV.

- Se realizan mantenimiento de la estructura del banner e instalación de la nueva valla del parque.

Martes 23 de Enero 2024

Personal en obra: 1 ingeniero residente de obra, 1 ingeniero residente de interventoría, 1 inspector, 1 cabo y 3 ayudantes.

Clima: Soleado

Herramienta y equipo: Herramienta menor

Actividades realizadas: Se continua realizando desmonte y retiro de escombro en zona de graderías y se continua realizando (desmonte) terminados, acabados de la caseta por observaciones de la interventoría.

Miércoles 24 de Enero 2024

Personal en obra: 1 ingeniero residente de obra, 1 residente interventoría, 1 inspector, 1 cabo y 3 ayudantes.

Clima: Soleado

Herramienta y equipo: Herramienta menor

Actividades realizadas: Se continua

Jueves

Perso
Obra
1 ins
ayudante
metalmi
Clima
Herrami
Activid
de bl
a tal
Se au
de la
Se rea
Supervisor

residente de
intervetoria,
udantes.

miento menor
ndo realizando
undo m-80
continua
os, acabados
ones de la

ador

024.
residente de
1 inspector,

nto menor
ouanza

con el retiro y desmonte de baranda
m-80 perimetral de la zona de
gracosi, y se finalizan remates y
retoques de la fachada; de la casita
se liberan actividades casita roja
costado nororiental del parque

Fecha: Jueves 25 Enero 2024

Personal en obra: 1 ingeniero residente de
obra, 1 residente interventoria, 1 inspector,
1 instalador de vidrios, 1 oficial y 3
ayudantes de obra civil, 2 trabajadores de
metalmecánica.
Clima soleado
Herramientas y equipo: Herramienta menor
Actividades realizadas: - Se realiza desmonte
de biosaludables los cuales fueron llevados
a taller, para su mantenimiento.
- Se avanza con el retiro de baranda m-80
de la zona de gracas.
- Se realiza cerramiento provisional con
Polisombra verde; se incluía a la interventoria

que el cerramiento será arreglado adecuadamente encuanto se realice suministro de rollizos el día de mañana.

FDO RESIDENTE DES/ICTCM

Nota 47 Viernes 26 Enero 2024

Personal en obra: 1 residente de obra, 1 residente interventoría, 1 inspector, 1 oficial y 2 ayudantes.

Clima soleado

Actividades realizadas

- Se continua con el desmonte de buenda primaveral n-80
- Se realiza Cerramiento zona bravuconables.
- Se requiere iniciar con actividades Construcctivas zona de reposo.

FDO RESIDENTE DES/INTERV.

Nota 48 Sabado 27 Enero 2024

Personal: Los obreros, 1 oficial, 2 ayud

Clim
Activ
- fac
Activ
desa
- 80
- Nota
activ
zona
- Se
realiz
en
de

Nota 49 Los
Perso
Clim
Hab
Activ

lado adecuada
suministro de

: de obra, 1 oficial y

n.t. de

b bonificables.
actividades
equs.
y
Toro

4.
oficial, 2ayud

Clima: Soleado
Actividades:
- Maquinaria y equipo: Herramienta menor
Actividades: Se continua con el desmonte perimetral parcialmente en la zona de los griegos
- Nuevamente se solicita continuar actividades constructivas en la zona de los griegos y de los grecs
- Se requiere realizar los ajustes solicitados por interventoría en la instalación del barandal de la valla: entrada al parque

FDU Recibido Dos Inicial

NOTA 9 Lunes 29 enero 2024
Personal: 1 oficial, 2 ayudantes
Clima: Soleado
Maquinaria y Equipo: Herramienta menor
Actividades: Se realiza el desmonte

(40)

de los modulos de la ruta de la vida.
- Se debe realizar acta de entrega de elementos retirados a la administradora del parque
- Se solicita instalar el juego retirado de la zona de juegos infantiles en el parque zona externa a solicitud del apoyo de la supervision del IDRD.
- Se realiza el retiro del parque de los módulos biosaludables.

FDO FUNCIONARIO IDRD. FDO CONTRATISTA

Martes 20 Febrero 2024.
Personal: 1 operal, 2 ayudantes 1 planero 1 res. obra
Maquinaria y equipo: Herramienta menor
Actividad: Retiro.
Actividades: - Se termina el desmonte de la barrera perimetral

(40)

de la

entrega

a la

que

juego

el

arque

del

el IDRD.

parque

sobs.

Gutierrez

ubos

reciente

a el

ciudad

(41)

Riego en las zonas de los juegos.

- Se realiza relleno para tapar los huecos de los juegos infantiles desanclados.

- Se realiza la colocación de sikaflex alrededor de los lavaderos a requerimiento de la interventoría.

FDO INTERVENTORÍA

Gutierrez

Fecha: 31 Enero 2024

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes y 1 vr obra.

Clima: Soleado

Maquinaria y Equipo: Herramienta menor

Actividades: - Se realiza el desmonte de los módulos precavidos para llevarlos a taller para realizar mantenimiento y pintura.

- Se requiere se micen la excavación y confinamiento de los dados para cimentación de los juegos

- Se solicita nuevamente arreglar la instalación de la caja de 6x3 entrada al parque.
- Se requiere mejor mas personal para iniciar trabajos de cuneteo de estructura zona de gradas.
- Se solicita urgentemente la instalación de los difusores metálicos en los baños.

cerramiento perimetral del parque.

NOTA 33 Continúa la demolición del granito fundido en la pista de patinaje.

NOTA 34 Avance en corte del granito fundido (pista).

NOTA 35 Revisión y ajuste de area a intervenir en pista de patinaje. (Ing. Residentes, Contratista e Interventoria)

NOTA 36 Martes 2 de Enero 2024

NOTA 37 Personal de Obra: 1 Residente de obra, 1 Cuadrilla de instaladores de granito.

Clima: Dia soleado

NOTA 38 Equipo: Pulidoras, taladro demoledor, herramienta menor

Actividades de Obra:

NOTA 39 Avance en la demolición de la placa de granito fundido en los sectores donde está mas afectado (dilataciones y grietas)

NOTA 40 Se le solicita al Contratista agilizar los trabajos para poder realizar la entrega a la Administración del Parque

Norma

Powered by CamScanner

Norma

Powered by CamScanner

Norma

Powered by CamScanner

Norma

Powered by CamScanner

Norma

Powered by CamScanner

Norma

Powered by CamScanner

JUNTA DE AVANCE DE OBRA

NOTA 02 PERSONAL DE OBRA - 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 SUPERVISOR DE OBRA, 1 OFICINISTA ALMACENERO, 1 MAESTRO DE ALMACEN - CLAVE SALIDA

NOTA 01 HERRAMIENTA Y EQUIPO DE PROTECCION, 1 TALADRO ROTOMARTILLO, 1 MARRO

NOTA 02 ACTIVIDADES: ANTES DE INSTALACION DE CANCEL BLANCO Y/O DEMOLICION DE CANCEL EXISTENTE Y EN CASO Y RETIRO DE PISO

NOTA 03 ANTES DE LA LIMPIEZA DE CANCELERIA NO PARA DICHA LABOR SE RECOMIENDA EMPLEAR LOS PRODUCTOS PARA QUITAR LAS MANCHAS, EN CASO DE QUE LAS MANCHAS SE ENCUENTREN PROFUNDAS SOBRE LOS MATERIALES

Norma

Powered by CamScanner

Norma

Powered by CamScanner

Norma

Powered by CamScanner

18

LUNES 15 DE ENERO DE 2014

NOTA 71 PERSONAL DE OBRA: 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 MAESTRO DE OBRAS A SUPERVISAR, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE CLIMA SOLEADO

NOTA 73: HERRAMIENTA Y EQUIPO: 1 PULIDORA, HORMIGUERA MEZCLA ACTIVIDADES

NOTA 74 SE INICIA EL DESMONTE DEL CARCAMO DE LA PISTA DE PATINAJE

NOTA 75 SE REALIZA VISITA DE OBRA PARA REVISAR LA DISTRIBUCIÓN DE FIGURAS EN LAS ZONAS INTERVENIDAS CON OBJETO DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CONCRETO DE LA PISTA DE PATINAJE

NOTA 76 EN DICHA REVISIÓN SE

Powered by CamScanner

DETERMINO NIVELACIÓN EL TAPÓN
MIENTO DE FISURAS CON JUNTA
FLEX Y LA INSTALACIÓN DE
UNA TIRA DE BORDE PODOTAC
PARA QUE ABSORBA LOS
MOVIMIENTOS DE DILATACIÓN Y
CONTRACCIÓN DE LOS MATERIALES

Martes, Enero 16/2024
Clima: Soleado
NOTA 1: Equipo y herramienta: Herramienta menor, palas
Personal de obra: 1 residente de obra, 1 resi-
dente SST, 2 oficiales, 1 ayudante.
NOTA 2: Actividades: Se realiza corrección en dilatacio
nes zona velódromo, se continua con actividad
de limpieza general.

Norma

Powered by CamScanner

20

Miércoles, Enero 17/ 2024.

clima: Soleado.

Nota 74 Equipo y herramienta: pulidora, herramienta menor.
Personal de obra: 1 residente de obra, 1 residente de SST, 2 oficiales, 1 ayudante.

Nota 75 Actividades: Se continua con correcion en dilataciones en zona velódromo, instalando Sika Rod y se aplica el sellador de juntas poliuretano. Se continua con actividad de limpieza constante.

Jueves, Enero 18/2024.

clima: Soleado.

Nota 76 Equipo y herramienta: pulidora, herramienta menor

Nota 77 Actividades: Se continua con correciones en dilataciones, zona velódromo, con instalación Sika Rod y se aplica sellador de juntas poliuretano, se continua con limpieza constante, se nivelaron aplicaron mortero pega

Powered by CamScanner

Viernes, Enero 19/2024

Alma: Soleado

Nota 78 Equipo y herramienta: pulidora, herramienta menor

Nota 79 Actividades: En zona administración se inicia escarificación superficie que presenta humedad se realiza aplicación-estuco en toda la superficie se finaliza mantenimiento perímetro en zona velódromo.

SABADO 20 DE ENERO DE 2024

Nota 80 PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE

CLIMA: SOLEADO

Nota 81 HERRAMIENTA MENOR

Nota 82 ACTIVIDADES: CONTINUA CON RESANE DE LOS MUROS DE LA COLUMNA CON ESTUCO PLASTICO

Norma

Powered by CamScanner

22

Nota 83.

Nota 84

Nota 85

Nota 86

Roma

Powered by CamScanner

Norma

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Norma

Powered by CamScanner

26

VIERNES 26 DE ENERO DE 2024

NOTA 99: PERSONAL DE OBRA: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 CADENERO DE [illegible]

NOTA 100: [illegible] Y EQUIPOS DE [illegible] HERRAMIENTAS MENORES

NOTA 101: ACTIVIDADES A REALIZAR DE PINTADO SE DIVIDEN EN [illegible] DE PINTURA EN COLOR BLANCO DE PISO, PARA [illegible]

NOTA 102: [illegible] LOS MUROS DE LA CASA DE LA [illegible] DE CUBRIR LA HUMEDAD [illegible] SOBRE MUROS [illegible] DE PINTURA DE COLOR BLANCO

Norma

Powered by CamScanner

(10)

Fecha: 01 de Enero 2024

Nota 10 Clima: Nublado y Caluroso

Parque: La Fragua

Actividades: Caminata por el [illegible]

del pino en grupos de [illegible]

y luego en 2 en de pelota de [illegible]

Luz Cantero

Fecha Del 30 Diciembre 2023 al 01 de

Nota 11 enero 2024.

Parque: La fragua

Actividades: Se realizo compras de

materiales electricos para instalar en

en el coliseo. / Se termino Instalar

Nota 12 Materiales Electricos para Iluminacion Exterior del

Luz Cantero.

Fecha: 09 de Enero 2024

Nota 13 Parque: La fragua

Clima: Caluroso

Personal: 3 electricos, 1 ayudante y
Actividades: Se inicia con desmonte
e instalación de luminarios en el
coliseo, se realiza cerramiento con
polisombra en zona donde cerca la
quedo la zona infantil nueva.

Hoy 5a Salida al comunidad Anchas muy bien
y pegamos los postes de las Comunidades
provisionales para Ahaguna su cerrado
y Sostenibilidad durante el transcurso de
la obra.

5a Salida una vez instalados los ...
El Coliseo Hacer entrega y puesta en ...

Hoy 5a Salida Acometer las Actividades de ...
... el principio con las Actividades ...
... Hoy ya se pueden ...

Ayud. ... Electricos
Ayudante

11.

Fecha: 12 de Enero de 2024
Parque: La Fragua
Clima: Caluroso
Personal: 1 maestro, 1 ayudante.
Actividades: Se continua con retiro de tapete amortiguador en Zona INFANTIL, y extracción en la pista de patinaje.

Luis Luz Pintor

Fecha: 13 de Enero 2024
Parque: La Fragua
Clima: Caluroso
Personal: 1 maestro, 1 ayudante.
Actividades: Se continua con la extracción en la pista de patinaje, se despacha material y se deja guardados los luminarios que se bajaron del salón fueron 2 luminarios dañados con balastro y 5 luminarios buenos con balastro.

Fecha 15 de Enero de 2024
Nave de Forja: La Fragua
Personal: 1 maestro, 1 ayudante
Maquinaria: 1 martinete
Actividades: Se inicia la jornada de
clavadores en viruta de barco con
el pedido para fabricación, se hace
parte de bandeja de los bramantes del
colchón, se hace acuerdo mensual
a la pata de palanga, se inicia
revisión de barco por mantenimiento

Sello

Firma


Fecha: 16
Nave de Forja: La Fragua
Personal: 1 maestro
Maquinaria: 1 martinete
Actividades:

Actividades
[illegible]
[illegible]
[illegible]
y mujeres
con el
[illegible]
de la

Sello

Firma

Fecha
Nave de Forja
Personal
Maquinaria
Actividades

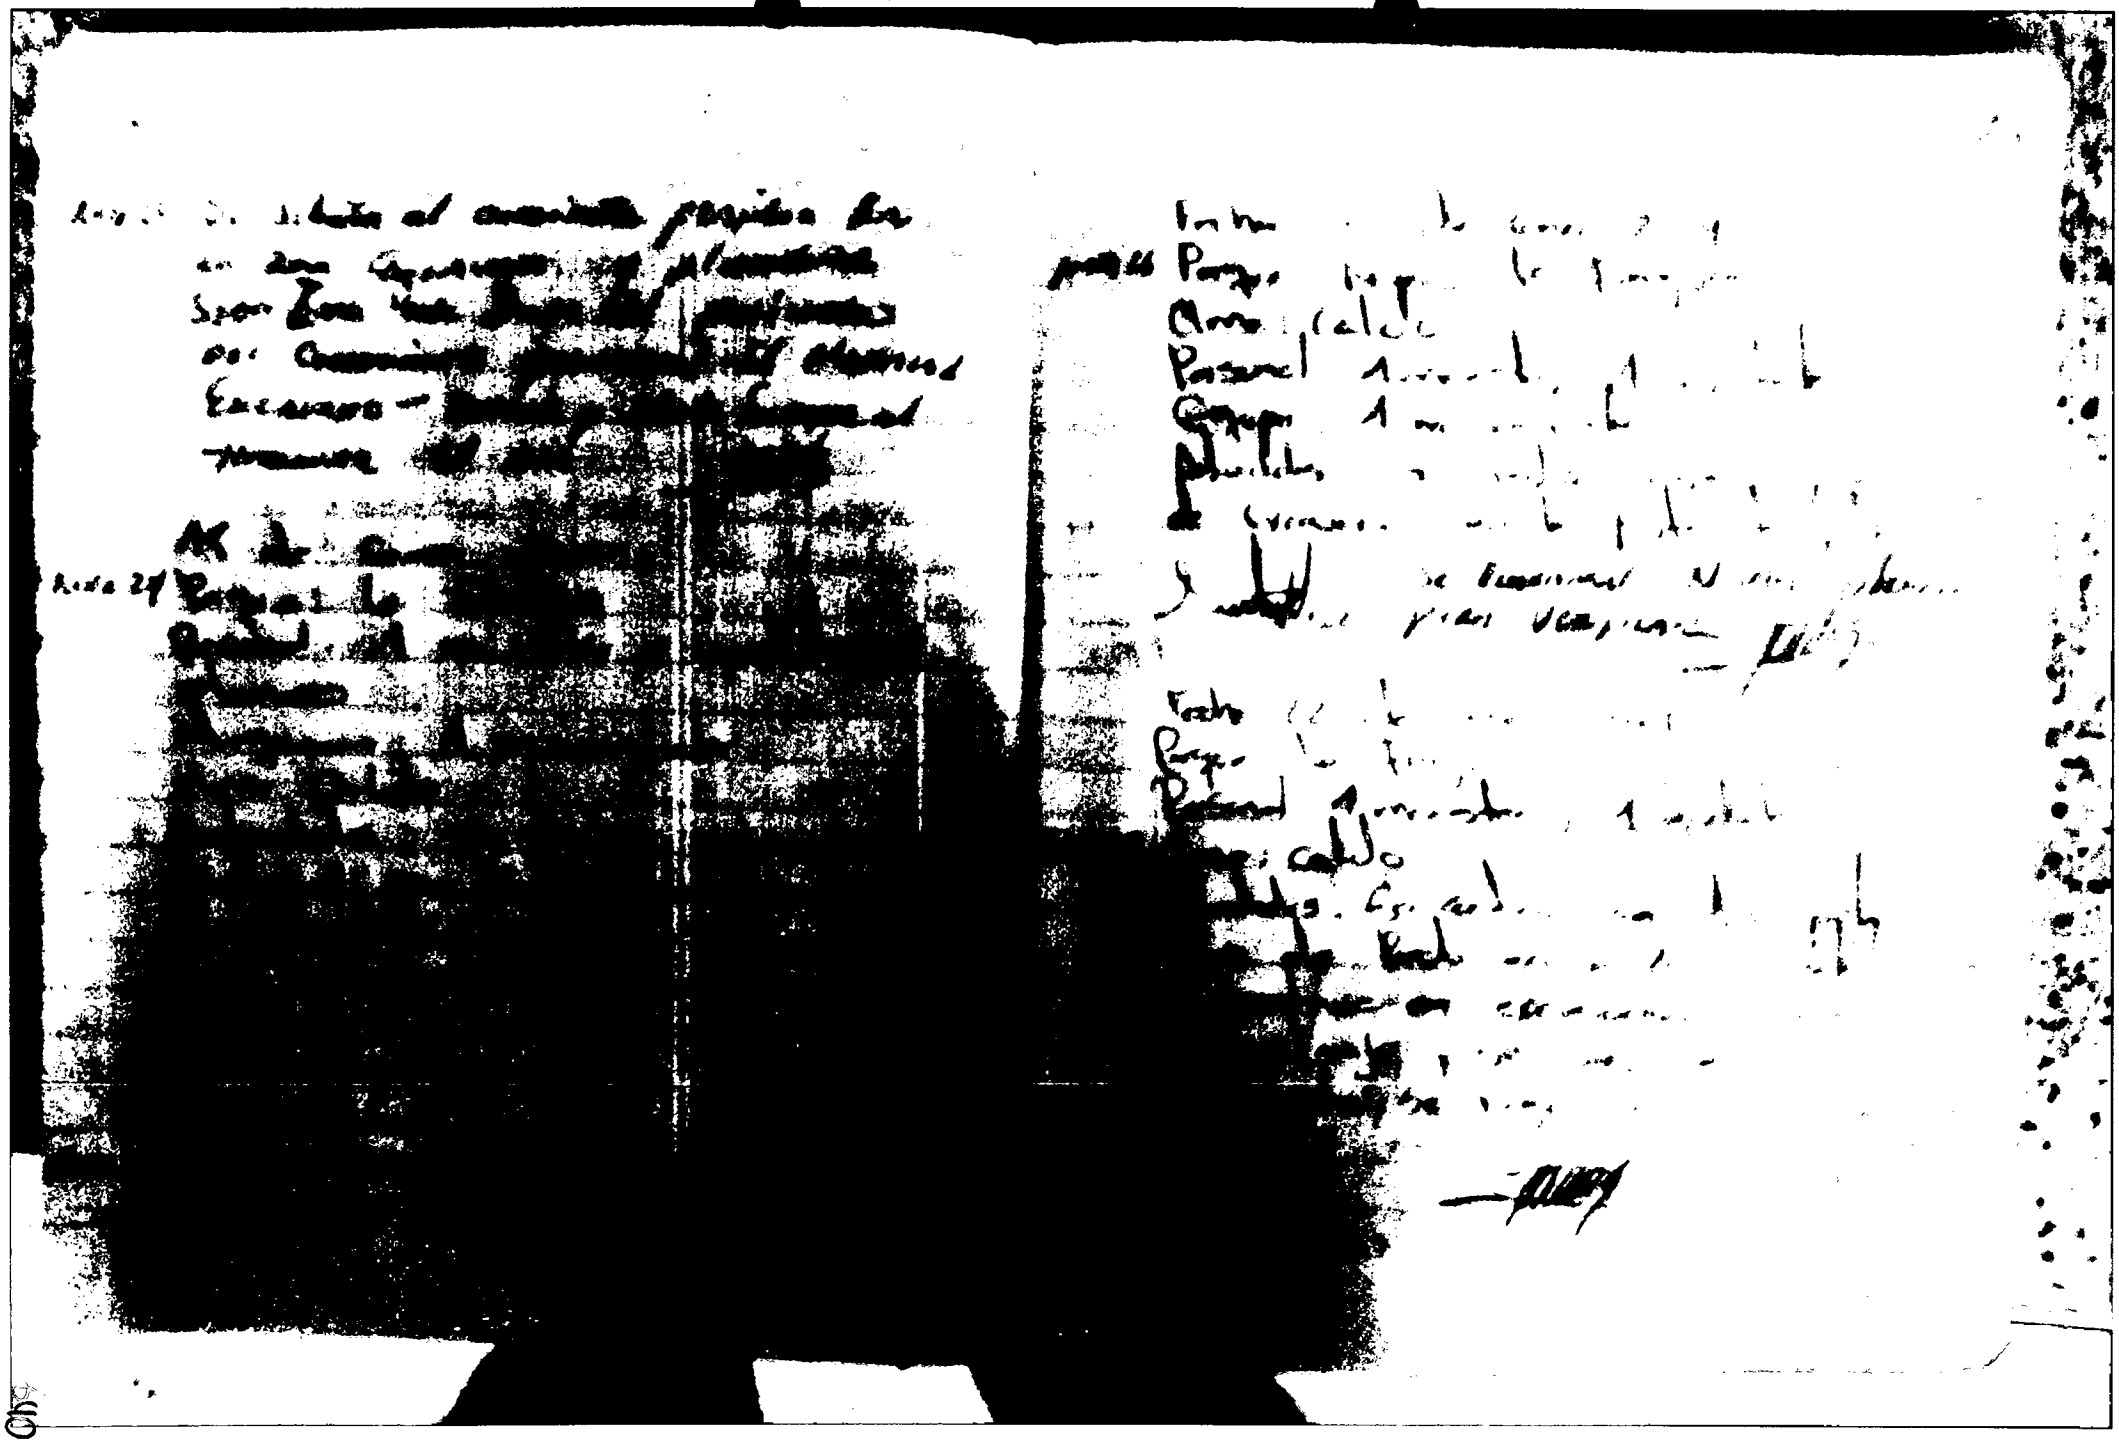

Fecha 23 de enero 2024

Nota 28 Pague la franqueo
Pone Cal.

Pague un mantenimiento y con libros
Nuevos para continuar con programación y
Comprobación de la existencia de la pista
de pelage
se realiza dragado en la zona infantil
y desvío de niños.

Nota 29 Se Reciben Oficios y Cheq al final del día

Fecha 29 de Enero 2024

Nota 30 Pague la franqueo
Pone 1 maestro, 2 libros, 1 cuaderno
Pone Cal.
Pague 1 libro y un marcador
Alumnos se inician actividades
de lectura en el patio del colegio
se entregan los cuadernos
Feria 23 - Enero 24

Nota 31 Se Salieron para la Inspección de la

Exclusión de la pista de patinaje
los siguientes
1- pinguino y Dora Mantiene Sus
Niveles para poder Mantener la pista
Bonita
2- Perfilan Bien las paredes de la Cj.
3- Regine del Mineral Alumnado de Cajas
4- Tenga los Postes y Estantes para poder
Niveles de Cajas y poder Circular

29-01-24.

N.032 Se Vuelven la Instalación de Luminarias
Especulados en el pasillo y Bodegas
del Coliseo

Nota 33 Personal Encargado Sus Oficios 2 Cheq
+ 2 Cpte + 1 Agenda y 1 Balcon

[illegible] se realizan los trabajos en taller para el [illegible]
Montaje mantenimiento de [illegible] retirados

[illegible]

[illegible]

[illegible]

12

Se informa a interventoría que
esta semana del 15 enero del 2024
se realizan trabajos en taller,
perfilado del modulo de cafe
cual estaba siendo trabajada en taller
los perfiles metalicos a instalar.

19 Enero 2024
Personal en obra 1 inspector,
soldador y 1 ayudante
Clima Soleado
Herramientas y equipos. Equipo de
soldadura, compresor y Herramienta
Actividades realizadas
se hacen instalacion de perfiles
en la perfilada restado suspendido
instalacion de malla

13

20 Enero 2024
Personal en obra 1 inspector, 1
soldador, 1 ayudante.
Clima Soleado
Herramientas y equipos. Equipo de
soldadura, compresor y Herramienta menor
instalacion de perfiles
en la perfilada restado suspendido
instalacion de malla

[illegible]
[illegible] de los
se realiza [illegible] de [illegible] estructuras y
[illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] del muelle
- Instalación de elementos de drenaje
[illegible] los [illegible]

[illegible]

22 [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] y drenajes dejando constancia
que a la fecha se encuentra en [illegible] un
Interventor Social [illegible] [illegible] observaciones
de limpieza y orden en [illegible] lugar de
Finalizar los trabajos. [illegible]
y nuestro [illegible]

- 24 Enero 2024.
Se informa que por comunicado oficial
del distrito el parque queda cerrado
debido a los incendios forestales.

Fundido de los cintos de ajuste en el sendero del adulto Mayor, se realiza la instalación de piezas de adoquín en el sendero del adulto Mayor se cuenta con el retiro de escombros.
Casa del adulto Mayor:
se cuenta con los remates de Pintura y texturo en la parte interna y externa, se cuenta con la pintura de los rejas de las ventanas
Parterio 1 y Parterio 4: se cuenta con la Pintura y texturo en las fachadas Externas de los Parterios.
Graderio zona 2: se continua con la Pintura de la placa de concreto Existente y se cuenta con la Pintura y mantenimiento en general de las Maquinas.
Pista de BMX: se cuenta con la aplicación de emulsión asfaltica y asfalto.

Se Solicita al contratista implementar cuando esten usando andamios en zonas de pendiente y otros sitios se debe rodear dichos andamios con columnas y cinta peligro. En todos los casos

Se Solicita al contratista continuar con la ejecucion de escombros de los distintos frentes de trabajo en sendero de adoquin

Nota 153 Sabado 27 Enero/2024
Personal de obra: 30 Trabajadores
Clima: Soleado.
Herramientas y Equipos: Banitin, Rona, Pulidora, Planta electrica, Compresor para Pintura, apisonador Tipo Canguro, Equipo de Soldadura.
Actividades:
Patio #4: se avanza con la instalacion de Piezas de adoquin
Senderos: se avanza con la instalacion de adoquin en el sendero de la casa del adulto Mayor, este adoquin es de reutilizacion, se continua con la instalacion de adoquin nuevo frente al sendero de la Caseta.
Casa del adulto Mayor: se avanza con la aplicacion de Pintura en Exterior y Estuco, igualmente en el interior.
Patio #1: se continua con el estuco y Pintura en las fachadas.
Patio #4: se continua con la aplicacion de Estuco y Pintura en las fachadas.

Graderios zona 2: se avanza con la aplicacion de Pintura en la Placa de Concreto Existente, se continua con el mantenimiento de los Graderios.

Continua y culmina el lunes.

Nota 154 Lunes 29 Enero/2024
Personal de obra: 30 Trabajadores
Clima: Soleado.
Herramientas y Equipos: Planta electrica, Banitin Compresor para Pintura, Pulidora, Rona, apisonador Tipo Canguro
Actividades:
Patio #4: se culmina con la instalacion de las Piezas de adoquin en los 3 Primeros Patios, se come el cerramiento y se inicia con los dos Pasos siguientes, se inicio con el retiro del adoquin Existentes.
Senderos: se avanza con el corte e instalacion de Piezas de adoquin en el sendero del adulto Mayor y sendero de la caseta, se avanza con la

Nota 152

Viernes 26 Enero/2024
Personal de obra: 26 Trabajadores
Clima: Soleado.
Herramientas y Equipos: Rana, Benitin, Planta electrico, Pulidora, Compresor de pintura, andamios, Equipo de soldadura.
Actividades:
Parque #1: se avanza con la pintura y Estuco en las fachadas
Parque #4: se continua con la aplicación de Estuco y Pintura.
Senderos: se avanza con la instalación del columpio reutilizado en el sendero de la Casa del adulto Mayor, se culmino con la instalación del columpio en el sendero frente a la caseta y se avanza con la instalación de las piezas, se avanza con la perdida de las cintas de confinamiento en concreto reforzadas con malla electro soldada, se realiza el retiro del columpio en el sendero curvo que empalma con el sendero de

la caseta se continua con el corte e instalación de las piezas de columpio en la plazoleta de la parque #4.
Casa del adulto Mayor:
se avanza con los remates de pintura en interior y exterior, se culmina con el estuco y pintura en fachadas en la parte superior,
Graderios zona 2: se avanza con la aplicación de pintura en la placa de concreto existente, se continua con el mantenimiento de las grietas, se pinten y cambian los rodamientos.
Pista de BMX: se continua con el retiro del asfalto de los Bordes, y alistado para el nuevo asfalto de Proteccion, se continua con la aplicación de Base granular para nivelación y compactación, se avanza con la aplicación de asfalto para el empalme de la recta final con el Parqueadero, se toman muestras de asfalto.

y estuco en las fachadas.
Portería #4: se avanza con el estuco y pintura en las fachadas.
Ruta de la vida: se culmina con las actividades de mantenimiento de esta zona.
Graderías zona 2: se avanza con el alistado para la aplicación de Pintura, se continua con la aplicación de recubrimiento en la placa de concreto existente.
Pista de BMX: se continua con las actividades de mantenimiento, se avanza con el retiro del asfalto en los bordes de la pista.

y ruta de datos.

Nota 151

Jueves 25 Enero/2024
Personal de obra: 26 Trabajadores.
Clima: soleado.
Herramientas y equipos: Planta eléctrica compresor para pintura, Benitin, equipo de soldadura, Rana, andamios

Actividades:
Portería #1: se avanza con la Pintura y Estuco en las fachadas.
Portería #4: se continua con la aplicación de estuco y pintura en fachadas y
Ruta de la vida: se realizo la entrega de esta zona la cual fue recibida por el administrador del parque.
Graderías zona 2: se avanza con la aplicación de Recubrimiento en la Placa de concreto Existente, se continua con el mantenimiento de las graderías.
Pista de BMX: se continua con el retiro del asfalto de los Bordes de la Pista se avanza con la aplicación de emulsión asfaltica y asfalto en la recta final de la Pista, se renivela esta parte final con base granular se toman muestras del asfalto y son llevadas al laboratorio.

INTERVENTORÍA

y ruta J.d.p

Continua con el alistado e instalación del adoquin reutilizado en el sendero del adulto Mayor, igualmente se cuenta con el retiro de la grama en este sendero.
Casa del adulto Mayor: se cuenta con la aplicación de Estuco y Pintura, en interior y Exterior, se cuenta con la limpieza.
Parque #1: se Continua con el estuco, Pegado y Pintura en la fachada.
Ruta de la Vida: se cuenta con el Pegado, Pintura y mantenimiento de los elementos que conforman esta zona.
Graffiti Zona #2: se cuenta con el alistado para la aplicación de Pintura, se continua con el sello de juntas, se continua con el mantenimiento de los graffiti.
Pista BMX: se cuenta con el mantenimiento de esta Pista, se continua con el retiro del asfalto en el borde de esta Pista.

y ruta de cobre

Nota 150 Miercoles 24 Enero / 2024
Personal de obra: 26 Trabajadores.
Clima: Soleado.
Herramientas y Equipos: Andamios, Rana, Planta electrica, Compresor para Pintura, Equipo de Soldadura, Benitin
Actividades:
Parque #4: se continua con la instalación de piezas de adoquin.
Senderos: se cuenta con el retiro del adoquin existente frente a esta caseta, se alista y se instala el adoquin nuevo en este mismo sendero, se cuenta con la instalación del adoquin reutilizado en el sendero frente a la casa del adulto Mayor.
Casa del adulto Mayor: se cuenta con estuco y Pintura interior y exterior, se cuenta con retoques en el interior de la casa, se continua con estuco y Pinturas en la parte superior.
Parque #1: se continua con la Pintura

[illegible] se monta a la cuerda
[illegible] se continua con el sendero
[illegible] hasta llegar y se
[illegible] se inicia instalacion
de [illegible] en el sendero de la
pista se continua con retiro de cuerda
y se inicia instalacion del
[illegible] en el sendero casa del adulto
mayor.

Cabe destacar Aplicacion de asfalto y
[illegible] en interior, se avanza con
retoques a exterior, se realiza limpieza.
Porteria 4 se realiza aplicacion de asfalto
y [illegible] en fachada.
Pista de lauda se Avanza con el mantenimiento
de lijado y pintura.
Obras Zona 2: Se avanza con el alistado
para la aplicacion de Pintura Epoxilico
se continua realizando sello de juntas.
Pista Zona x: se continua realizando
actividades de mantenimiento de la pista
se realiza retiro de asfalto en los bordes

de 6 pista.
Se realiza instalacion de Hoverlap R-h
en luminarias en bordes de lomberos

Nota 149

Martes 23 Enero/2024
Personal o/c obra: 23 Trabajadores
Clima: Soleado.
Herramientas y Eq. Pos: Rona, Andamios
Eq. Pos de Soldadura, Compresor para Pintura
Planta electrica, Benitin
Actividades:
Porteria #4: Se avanza con la instalacion
de Piezas de adoquin en la Plazoleta.
Senderos: Se avanza con el retiro del
adoquin Existente frente a la Caseta el
cual se reinstalara en el sendero frente
a la Casa del adulto Mayor para completar
el 30% de reutilizacion, se continua con el
alistado e instalacion del adoquin nuevo
en el sendero frente a la Caseta,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Pista de la cuesta y Sendero inferior
se realiza retiro de capa asfáltica
en berma frontal con el cerro empezando
y avanzando en el sentido hacia la puerta
de ingreso de la pista en hasta
el final, se realiza trazo y
se realiza levantamiento existente a
para realizar instalación de pista

Trabajando
y cuidando de todos

19 Enero 2024

Nota 145 Personal en obra: 21 trabajadores
Obras varios
Herramientas y equipos: Equipo de soldadura
y pintura, Andamios certificados, Herramientas
menores y varias
Actividades realizadas
- Se avanza en pintura y con la instalación
de pernos de anclajes en la plataforma.
- Se continua con el retiro de anclajes
existente frente a la cuesta el cual se

reinstalara en el sendero frente a la casa
del adulto mayor, se inicia con el alistado
para instalación de anclajes en el sitio
de la cuesta se continua con el retiro de
la berma existente y limpieza Pre - instal.
co la instalación del anclajes
Se continua con la aplicación de asfalto
unimex en interior, se avanza con la
instalación de luminarias
Se realiza aplicación de asfalto y terminado
fachada
se inicia el armamento para vaciado de
Muros trincheras; se realiza acta de trabajo
con la administración de dicho trabajo inicio
& continua realizando limpieza y pintura de
ruta de fuerza.

Nota 146 Se avanza con la instalación de asfalto
ultimo carril de la pista se toma muestra del
asfalto se avanza con el alistado y
la protección de los botantes de la
ultimo carril se avanza con la aplicación
& avanza con el armamento para vaciado

[illegible] de Bux
se [illegible] las puertas Fuera las Bases
[illegible] calle del cuarto Mayor. Se
[illegible] con la Instalacion y puesta
de Barrera En la puerta #4
Se Actua con puerta de puerta # 1
Se Actua con el Comando provisional
de la Zona de Comunicacion, Se Esta
Reunido Patrol a la Base de la Rum or
a Vida.

NOVIEMBRE 142 Se Juntan el Comandante Mayor
Carreno y Asesor Toro los puestos
y Cyar Asegurado los Brocker de
los Comando provisionales de los distintos
puestos para Evitar el ingreso de personal
[illegible] y particular a las Zonas de trabajo
- Zona Medio cuidado con el Comando de
Posesion dentro de la pista de Bux
para Evitar que los particulares y Automotores
se Junten mas Cerca y puedan causar
un Accidente [illegible]

14 DIC 14 Personal encargado de [illegible]
[illegible] Herramientas y equipos Mecanicos y
Mecanicos, compresor, [illegible] y Herramientas
armas
Absolutos reclamos
se Asume en la entrada de la pista
Asistencia en la Plataforma
se continua con el Desarme de las
Barrera a Cafetera el cual se esta
en Sombra completa mayor
se realiza el Retiro de [illegible]
mayor
se realiza aplicacion de [illegible]
Cultivo con Abono mayor
se retiran cintas [illegible]
en Zonas cuarto mayor
se realiza [illegible]
Aplicacion de cultivo y [illegible]
puesto 1

DICIEMBRE 144 Se [illegible] de Nº 1
entrega mediante [illegible]
se continua en [illegible]

15-01-24 Nota 138 Se realizan ejercicios de calentamiento en la pista de BMX Coinco, posteriormente de la liga, El entrenamiento del parcial, concluyendo IDAEO pidiendo permiso por el apoyo a los Supervisores transportes Social del Comunidad y La Junta de Vecinos para Definir y Acordar El Alcance de las Intervenciones En la pista de BMX. Se Hace acto de Presencia y Visita.

16-01-24 Nota 139 Clima: Soleado
Mañana personas en obras: 4 personas en Estado y Puerta casa Adulto Mayor + 2 personas en Ruta de la Vida + 8 En Asamblea en puerta # 4 + 2 En Estado y puerta En La puerta # 2 uno + 2 Ayudantes Obras Viales + 1 Residente + 1 inspector del contratista TOTAL = 20 personas.
Se Reunen En Estado y puerta Casa

Adulto Mayor. Se Continuan con Estado y puerta de portón # 1 Se Continua Con con la Instalación de Maya en la plataforma portón # 4 Se Evidencia Compromiso de puerta, y Cumplimiento de Pinta con H y Colegio En Concreto

Nota 140 Se programa con el contratista el inicio de Obras en la pista de BMX para Mañana Miercoles 17 de Enero 2024

17-01-24 Nota 141 Clima: Soleado
Mañana personal En Obra ⇒ 2 Soldados 12 personas En Guardias y 3 En Contratista de Brasil de 4 pers En BMX. y 4 personas En Casa Adulto Mayor + 5 personas en Ruta de Asamblea portón # 4 + 2 En portón # 1 personas Total: 22 personas
Se Realizan Acercamiento para [illegible] la Entrada de la pista BMX. Se [illegible]

Opinos Varios Casa Adulto Mayor y Orden y Aseo de los Acopios. de Escombros.
Se Continua Trasladando En Soldaduras Regane y puertas de Aparatos En la Ruta de la Vida

Nota 133- Se Empuadicia Volquete y Botar Sacando Escombros y Limpiando punto de Acopios

Nota 134- Se Continua y Avanza Con la instalacion DE ADOQUIN Nuevo En la plazoleta portones #4 Se Evidencia Que No lo Han Confinado Aun y No Han Instalado Los Medios Que Van En los Extremos de Cada Paño.

13-01-24 Clima Soleado
Nota 135 personal: 2+8+4 = 14 personas.
Actividades: Aseo y Retiro de Escombros
- Instalacion por Adoquin portones #4
- Pintura En Aparatos Zona de la Vida

15-01-24 Clima: Soleado
Nota 136 personal En Obra: 4- En Estudio y pintura Casa Adulto Mayor + 2 En Ruta de la Vida + 8 En Adoquin portones #4 +2 En Estudio y pintura portones #1.
Se Avanza Con la Instalacion de Adoquin Nuevo En la plazoleta- puerta #4 Se Inicia Confinamiento con Cintas En Conjunto E Instalacion de piezas En los Extremos para Recortar Paños, Se continuan Trabajos de Estudio y pinturas En Muros y techos Exteriores Casa del Adulto Mayor

Nota 137 Se Soluciona al Contratista Accesorios Ya Cuanto Antes los Trabajos y Retiros En:
1-Techo Casa Adulto Mayor 2- Baños Casa Adulto Mayor 3- Ornamentacion Puertas y Ventanas x Dentro y x Fuera Casa Adulto Mayor 4- Recortar Faltantes Casa Adulto Mayor 5- Techos Paños Comenzados En los Sectores Frente a Casa Adulto Mayor 6- Instalacion Completa De Adoquin Exterior

Acumuladas en el Sector de la Arboleda Residencial frente a la Casa del Adulto Mayor, Si se Aplica el Material "Abaquin" Recicrado se Solicita Capacitación e Inducción en pasos el Abaquin Nuevo Cuando Antes

11-01-24 Clima: Soleado.

Norma Personal en Obra: 2 en Ruta de la Vida + 8 en Abaquin puesto #4 + 2 en Oficios Varios en Casa Adulto Mayor

- Se Solicita al Contratista Mandar a Retirar Todo el Escombro que Hay en el Acopio y Hacer Orden y Aseo en Todos los Frentes Aperados en el predio.

12-01-24 Clima: Soleado

Norma Personal Capacitado en Obra: 2 en ruta de la Vida + 8 en Abaquin + 4 en

[illegible]

Normas para Capacitar Abaquin Reciclado Cemento #4.

Norma - Se Entrega Ficha de personal en las Acumuladas de la ponencia #1
- Ficha de personal en El Sendero en Abaquin frente a Casa adulto Mayor
- Ficha personal Retornando Acumulados en Estuco y pintura frente Exteriores Casa adulto Mayor

10-I-24 Clima: Soleado

Norma Personal en Obra: 2- En Bioruta de la Vida + 4 Oficios + 4 Jardinería en Zona de Abaquin ponencia #4 + 2 Oficios en Estuco y pintura - pinte Exteriores Casa del Adulto Mayor

Norma Se Solicita al Contratista Recolectar

aplicación de cerámica y lavamanos en posterior N° 3, cerámica en posterior N° 4.
Desmonte de cobertura en placa loza e instalación de cobertura nueva en placa loza de posterior N° 4

Viernes 24 Personal en obra: residente de obra, residente de
Nota 122 de interventoría, 1 inspector, 2 oficiales y 9 ayudantes
Herramienta y equipo varia palustre Herramienta menor.
Actividades realizadas
- Se aplica pañete en posterior N° 1
- Se realiza desmonte de cobertura en placa loza Baño 1
- Limpieza de cobertura en buen estado del desmontado en la placa loza de posterior 4

Lunes 24 Personal en obra: residente de obra, residente de
Nota 123 interventoría, 1 inspector, 2 oficiales y 9 ayudantes

Herramienta y equipo; Palustre, Varios, Herramienta menor.
Actividades realizadas.
instalación de cobertura nueva en placa loza de posterior N° 4

Jueves 24 Personal en obra: Residente de obra, residente de
Nota 124 interventoría, inspector, 2 oficiales y 6 ayudantes
Clima soleado
Actividades realizadas
Desmonte de cobertura e instalación de cobertura nueva en placa loza posterior N° 4.
Aplicación de pañete en posterior N° 1

Nota 125 Se Saluda al Contratista Continuar Nuevamente con La Instalación de Cobertura en placa loza de los Cuartos

Viernes 25 Personal en obra: Residente de obra, residente de
Nota 126 interventoría, inspector, 4 oficiales y 2 ayudantes
1 soldador 1 pintor
Clima Soleado
Actividades realizadas
- Depositación de escombros de pañete y loza

Actividades realizadas.
- Se realiza aplicación de lacre en pisos. L
- Se realiza aplicación de lacre en pisos de (cuartos)
- Se realiza aplicación de lacre en pisos de (cuartos)
- Se realiza topeo de tablero electrico en

Nota 117 Se Solicita El ingreso de personal para atacar la pintura Que se Vuelve Realizar y los Nuevos

y se coloca luz y No se realizan actividades por no haber

Nota 114 Personal encabe: 2 oficiales y 4 ayudantes, herramientas y equipos Herramientas menores, Pala y

Nota 116 Pulidora.
Actividades realizadas.
- Se realiza aplicación de lacre en pasillos y
- desmonte de cobertor en planta de pasillos 4
- y se instala cobertor nuevo y el 30% de cobertor es instalado en buen estado

Nota 119 Se Evidencia Fractura Que Se Viene Trabajando y A Hoy No Ha personal TRABAJANDO En Estos.
1- Sellado En Arrocillo perimetro a Casa Bombas 4
2- Resana y pintura Interno Casa Bombas 4.
3- Resane de Impermeabilizacion techos Casa bombas 4.
4- Resane y pintura En perimetro # 1 incluye OTRAS porterias YA Con este Mantenimiento
5- Inicio de Arreglo piso Bulk.
6- Reinstalar Cerramiento provisional en la parte de la vida Que lo Vandalizaron
7- TRABAJOS Hierro Soldados y TAPAR Registros en Bombas Casa Bombas Mayor

Nota 120 FAVOR proponer plan de Contingencia para MITIGAR ATRAZOS

Nota 124 Personal en obra: Residente de obra, 1 inspector, 2 oficiales y 4 ayudantes

Nota 126 de interventoria, 1 inspector, 2 oficiales y 4 ayudantes
Herramientas y equipos Rana, Pulidora, Herramienta menor
Actividades realizadas
- Se trabaja en resanes y aplicación de
Vinilo interior

ANEXO 10. COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS

SOLIUN INGENIERÍA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CONTRATO DE OBRA No:	3029-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	3131-2023
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"
PARQUE	Parques Bogotá

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA RECIBIDA

No. CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	OBSERVACIONES
CTO-IDRD-3099-2023-149	9/1/2024	H.V Profesional gerencia	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-159	9/1/2024	Informe mensual - Anticipo	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-160	11/1/2024	Rta 183	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-162	12/1/2024	Orden giro No. 3	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-163	12/1/2024	Rta req SST	Se da respuesta a lo solicitado
CTO-IDRD-3099-2023-164	15/1/2024	Plan adquisiciones	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-166	15/1/2024	Ensayo adoquin	Se entrega control de adoquin
CTO-IDRD-3099-2023-167	16/1/2024	Entrega items NP	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-168	16/1/2024	Inf anticipo dic 2023	Se entrega informe correspondiente a diciembre de 2023
CTO-IDRD-3099-2023-169	17/1/2024	Diseño Marshall	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-170	17/1/2024	Listado materiales	Se remiten para revisión y aprobación

SOLIUN INGENIERÍA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CONTRATO DE OBRA No:	3029-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	3131-2023
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"
PARQUE	Parques Bogotá

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA RECIBIDA

No. CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	OBSERVACIONES
CTO-IDRD-3099-2023-171	17/1/2024	Items NP	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-172	17/1/2024	Intervención parque niños	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-173	18/1/2024	Control calidad materiales	Se entregan resultados de ensayos
CTO-IDRD-3099-2023-175	18/1/2024	Control adoquin	Se entrega control de adoquin
CTO-IDRD-3099-2023-177	18/1/2024	Rta 194	Se realizan las aclaraciones pertienentes.
CTO-IDRD-3099-2023-178	18/1/2024	Interv La Fragua	Se realizan las aclaraciones pertienentes.
CTO-IDRD-3099-2023-179	18/1/2024	Rta 200	Se realizan las aclaraciones pertienentes.
CTO-IDRD-3099-2023-180	18/1/2024	Rta activi alta blanca	Se realizan las aclaraciones pertienentes.
CTO-IDRD-3099-2023-181	18/1/2024	Fotometría Servita	Se entrega estudio fotométrico
CTO-IDRD-3099-2023-176	19/1/2024	Rta atrasos programación	Se da respuesta a lo solicitado
CTO-IDRD-3099-2023-182	22/1/2024	Orden giro No. 3	Se remite para revisión y firma
CTO-IDRD-3099-2023-183	22/1/2024	Personal Villa Alpes	Se remite registro fotográfico
CTO-IDRD-3099-2023-184	22/1/2024	Plan Gestión Social Actualizado	Se remiten para revisión y aprobación

SOLIUN INGENIERÍA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CONTRATO DE OBRA No:	3029-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	3131-2023
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"
PARQUE	Parques Bogotá

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA RECIBIDA

No. CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	OBSERVACIONES
CTO-IDRD-3099-2023-186	22/1/2024	Actas inicio, Inspección	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-187	23/1/2024	Inf Inspección calidad soldaduras	Se entrega informe de inspección de calidad
CTO-IDRD-3099-2023-188	23/1/2024	Fotometría	Se entrega estudio fotométrico
CTO-IDRD-3099-2023-185	23/1/2024	Inf No. 4	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-189	25/1/2024	Items NP	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-190	25/1/2024	Especificaciones Estructuras moviles	Se presentan especificaciones de los equipamientos
CTO-IDRD-3099-2023-191	25/1/2024	Diseño Marshall	Se entrega diseño Marshall
CTO-IDRD-3099-2023-193	26/1/2024	Plan de adquisiciones	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-194	26/1/2024	Ensayo adoquin Tunal	Se entrega control de calidad de adoquin
CTO-IDRD-3099-2023-195	26/1/2024	Ensayo granulares PRD	Se hace entrega de los controles de calidad
CTO-IDRD-3099-2023-196	26/1/2024	Procedimientos SST	Se entrega procedimientos de trabajos a realizar
CTO-IDRD-3099-2023-198	30/1/2024	PIE actualizado	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-200	30/1/2024	Diagramas control iluminación	Se entregan diagramas de control de iluminación.
CTO-IDRD-3099-2023-199	30/1/2024	Ubicación luminarias	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-201	30/1/2024	Intervenciones tunel - Novios	Se entrega detalles construtivos del tunel
CTO-IDRD-3099-2023-202	30/1/2024	Actas de baja	Se entregan actas de retiro de mobiliario

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Informe Mensual – Anticipo

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 9 de enero de 2024, 11:06
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

radezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

2 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-159 Informe Anticipo Noviembre 2023.pdf
222K

Noviembre_2023.pdf
101K

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 9 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-159

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Informe Mensual – Anticipo

Cordial saludo,

Para su conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos hacer entrega del informe mensual correspondiente al periodo de noviembre de 2023 del contrato de fiducia No. FID 318515.

Finalmente se aclara que, la entidad fiduciaria emitirá el extracto evidenciando los rendimientos generados en el mes de diciembre de 2023 el día 11 de enero de 2024.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Tres (3) Folios
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Respuesta comunicado IDRD-3131-2024-183

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 11 de enero de 2024, 14:28
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

radezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

4 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-160 Intervenciones Bosque San Carlos.pdf
254K

PRE_B_SAN CARLOS V.0.5.xlsx
2962K

PLANO ZONA GIMANSIO - DETALLES PQ SAN CARLOS.pdf
1124K

BOSQUE SAN CARLOS OT-6115-2023.zip
5438K

655

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 11 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-160

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Respuesta comunicado IDRD-3131-2024-183

Cordial saludo,

Dando respuesta al comunicado del asunto del 11 de enero de 2024, nos permitimos hacer entrega del presupuesto actualizado, detalles constructivos y ensayos de laboratorios realizados en la zona de juegos infantiles del parque Bosque De San Carlos identificado con código 18-028.

De acuerdo a lo anterior, por parte del especialista se presentan las dos (2) alternativas de estructura mencionadas a continuación:

<table>
<tr><th>Alternativa</th><th>Estructura</th><th>Nota</th></tr>
<tr><td>1</td><td>
<table>
<tr><th></th><th>ESPESOR [m]</th></tr>
<tr><td>LOSA DE CONCRETO</td><td>0,10</td></tr>
<tr><td>BASE GRANULAR TIPO IDRD</td><td>0,20</td></tr>
<tr><td>SUB-BASE GRANULAR TIPO IDRD</td><td>0,20</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>MEJORAMIENTO EN RAJÓN CON SELLO TIPO SUB-BASE</td><td>0,40</td></tr>
</table>
</td><td>En caso previo en el momento del proceso constructivo, si se evidencian fallas en el subsuelo como fisuras, acolchonamientos, deformaciones y/o otras, el nivel de Subsuelo ò granular preexistente se debe mejorar por medio de compactación y/o reemplazo del material de subsuelo ò granular preexistente con la instalación de una capa de material de mejoramiento tipo rajón de 0.30 m con un sello en material tipo SBG de un espesor de 0.10 m, que garantice la capacidad de soporte de la estructura que conformara la vía. En caso de que no sea suficiente con los 40 cm de mejoramiento, se deberá llevar hasta encontrar un suelo adecuado de acuerdo con lo observado durante la etapa de construcción, garantizando la estabilidad de estas</td></tr>
<tr><td>2</td><td>
<table>
<tr><th></th><th>ESPESOR [m]</th></tr>
<tr><td>LOSA DE CONCRETO</td><td>0,10</td></tr>
<tr><td>BASE GRANULAR TIPO IDRD</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>CARPETA ASFALTICA PREEXISTENTE CON TRATAMIENTO DE PARCHEO Y SELLO DE FISURAS</td><td></td></tr>
</table>
</td><td>En caso previo en el momento del proceso constructivo, si se evidencian fallas en el subsuelo como fisuras, acolchonamientos, deformaciones y/o otras, el nivel de Subsuelo ò granular preexistente se debe mejorar por medio de compactación y/o reemplazo del material de subsuelo ò granular preexistente con la instalación de una capa de material de mejoramiento tipo rajón de 0.30 m con un sello en material tipo SBG de un espesor de 0.10 m, que garantice la capacidad de soporte de la estructura que conformara la vía. En caso de que no sea suficiente con los 40 cm de mejoramiento, se deberá llevar hasta encontrar un suelo adecuado de acuerdo con lo observado durante la etapa de construcción, garantizando la estabilidad de estas</td></tr>
</table>

Carrera 15 No 90-64 ofc 402 – Bogotá
6017333-4113160
c.parquesbog@gmail.com

656

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Lo anterior, para su revisión y concepto con el fin de programar la logística de compra y entrega de los insumos.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Treinta y siete (37) Folios + un (01) archivo excel
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Orden Giro 3 – Anticipo

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 12 de enero de 2024, 17:04
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

radezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

ORDEN DE GIRO 3.rar

CTO.IDRD-3099-2023-162 Orden de Giro3.pdf
508K

657

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 12 enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-162

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Orden Giro 3 – Anticipo

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto nos permitimos hacer entrega de la orden de giro 3, de acuerdo al listado de proveedores listados a continuación, por un valor de $ 1.418.282.338

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	VALOR A DESEMBOLSAR
8301459807	CERAMICAS GRANITO DE ORO LTDA	32.561.900
9002810404	C.I. NEGOCIOS INTERNACIONALES	16.628.346
74081153	JUAN CARLOS GOMEZ RAMIREZ	271.464.728
85451879	WINGEL ALFONSO CAMARGO TOBIAS	199.767.877
8300893775	CONSTRITURAR SAS	32.487.000
80256957	WILMAR ALFONSO GARCIA	6.664.000
9010061541	AGGREMAX S.A.S	50.011.260
9012893068	CONCRETOS Y PREFABRICADOS DEL SUR SAS	82.323.535
9004356183	KONKRETUS SAS	22.022.735
9005501453	LEDS LS COLOMBIA SAS	216.289.973
9003118116	LYD PROYECTOS SAS	488.060.984

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal
Anexo: Un (01) Archivo Comprimido
Elaboro: JKCG
Aprobo: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Respuesta comunicado IDRD-3131-2023-188

1 mensaje

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 12 de enero de 2024, 17:34
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: yinethsiso28@gmail.com, residentesst3099@gmail.com

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

a su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

CTO.IDRD-3099-2023-163 Respuesta requerimiento SST.pdf
821K

659

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 12 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-163

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad


REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Respuesta comunicado IDRD-3131-2023-188

Cordial saludo,

Dando respuesta al comunicado del asunto, nos permitimos realizar las siguientes aclaraciones en cada uno de estos:

1. Desde el día 9 de enero de 2024 se vienen realizando jornadas de orden y aseo, además de mantenimiento al cerramiento provisional, en el parque y/o escenario Tunal (Ver registro fotográfico)

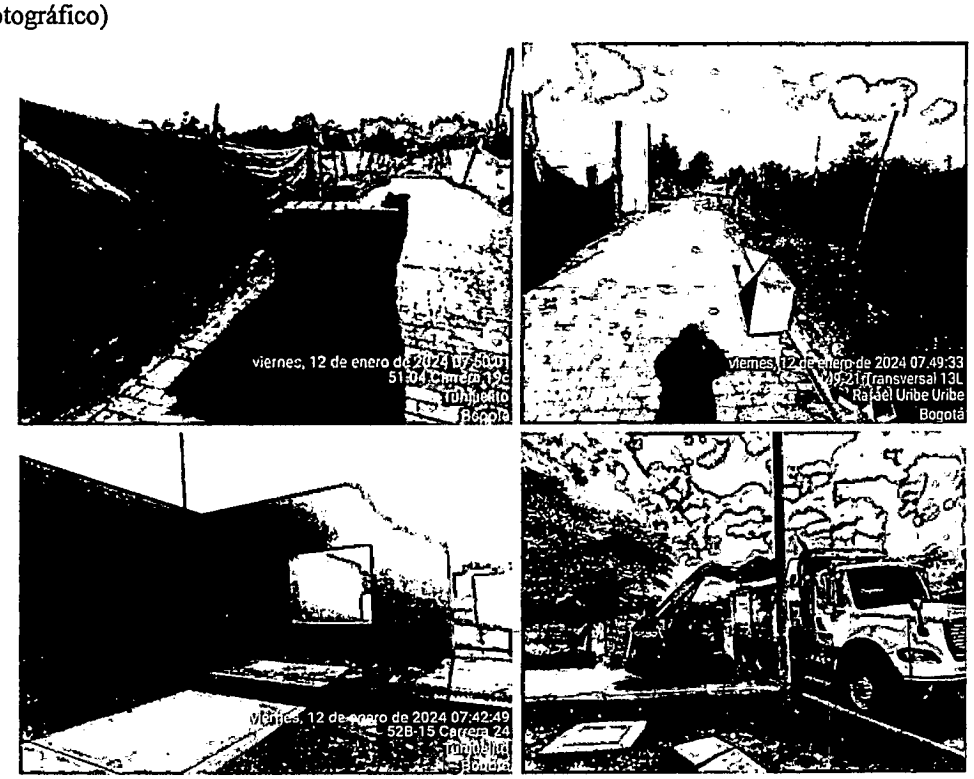

Carrera 15 No 90-64 ofc 402 – Bogotá
6017333-4113160
c.parquesbog@gmail.com



2. En cuanto a los documentos del guarda de seguridad Oreste Segovia, nos permitimos aclarar que, no hace parte del personal vinculado al contrato 3099. Su presencia obedecía a una medida de contingencia por parte del proveedor que alquila la formaleta.

   Lo anterior, con el fin de asegurar el no vandalismo y/o robo de los elementos que se usarían para la fundida del muro de concreto.

   Finalmente, nos permitimos anexar la evidencia del orden y aseo realizado en el parque y/o escenario Ciudad Montes. (Ver registro fotográfico)



CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

3. Se anexa el registro fotográfico, evidenciando la entrega de dotación al Cadenero David Muete.



Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: N/A
Elaboro: JKCG
Aprobo: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Plan Adquisiciones

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 15 de enero de 2024, 10:02
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

3 adjuntos

PLAN_DE_ADQUISICIONES_120124.xlsx
232K

PLAN_DE_ADQUISICIONES_120124.pdf
142K

CTO.IDRD-3099-2023-164 Plan Adquisiciones.pdf
229K

602

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 15 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-164

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Plan Adquisiciones

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al compromiso adquirido en el comité No. 13 del 10 de enero de 2024 y a lo propuesto en el plan de calidad, nos permitimos hacer entrega del plan de adquisiciones y su respectivo seguimiento, para su revisión y concepto.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Un (01) PDF
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Caracterización Materiales Granulares

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 15 de enero de 2024, 10:15
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

3 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-165 Caracterización Materiales Granulares.pdf
237K

CAracterizacion SBR RECLADOS INDUSTRIALES.pdf
616K

Caracterizacion Base IDRD AGGREMAX.pdf
1167K

864

CONSORCIO PARQUES BOG
901737645-4

Bogotá D.C., 15 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-165

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Caracterización Materiales Granulares

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al compromiso adquirido en el comité No. 13 del 10 de enero de 2024 y a lo establecido en los documentos contractuales del proyecto, nos permitimos hacer entrega de la caracterización de materiales granulares listada a continuación para su revisión y concepto:

- Caracterización Subbase Reciclada, la cual será suministrada por el proveedor Reciclados Industriales De Colombia S.A.S.
- Caracterización Base IDRD, la cual será suministrada por el proveedor AGGREMAX SAS.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Quince (15) Folios
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Control Calidad Adoquín

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 15 de enero de 2024, 12:30
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

2 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-166 Ensayo Adoquin.pdf
228K

OT-6090-2023 ADOQUIN ARCILLA.pdf
283K

666

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 15 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-166

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Control Calidad Adoquín

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al compromiso adquirido en el comité No. 13 del 10 de enero de 2024, nos permitimos hacer entrega del control de calidad de adoquín realizado en el parque y/o escenario deportivo Tunal idenficiado con código 06-063.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Cuatro (4) Folios
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Entrega Items No Previstos

1 mensaje

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 16 de enero de 2024, 8:24
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega del listado de materiales con sus respectivos soportes

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

2 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-167 Items No Previstos.pdf
233K

NP BASE CIO V4.xlsx
10129K

668

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 16 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-167

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Entrega Items No Previstos

Cordial saludo,

De acuerdo a los diagnósticos y actividades priorizadas en los diferentes escenarios y/o parques, nos permitimos hacer entrega de los análisis de precios unitarios ítems no previstos tal y como se lista a continuación para su revisión y aprobación:

Ítems No Previstos	Unidad
Suministro E Instalación Baranda Pasamanos + Modulo De Malla Eslabonada Con Platina Y Chazo	ML
Compactación Fondo De Excavación Con Vibro compactador Doble Rodillo	M2
Suministro E Instalación Baranda M-81 Anclada Con Platina Y Chazo	ML
Cerramiento Malla Ondulada. Cal 10 IDRD H=2.50 Ml	ML
Desmonte Y Retiro De Cerramiento Metálico Ondulado H=2.50m	ML
Cargue Y Retiro De Arena Peldar Existente	M3
Cargue Y Retiro De Gravilla 3/4" Existente	M3
Modulo M-144(Punto De Café) Diseñoc.M.U. (sum+Ins)	UND
Desmonte Cerramiento Existente (Malla Eslabonada+ Alambre De Puas+ Retiro De Troncos De Madera	ML
Juego De Cuerdas Estrella 2 A 6 Años Cap.: 21 Niños	UND
Juego Balancin Doble Mas 4años Cap:2 Niños	UND
Juego cuerdas poliedro 5-12añoscap:40niñosh=3,8 (sum+Ins)	UND
Piso Caucho Recicl 11cm (EPDM 1cm+Sbr 10cm (sum+Ins)	M2
Piso Caucho Recicl 9 Cm (EPDM 1cm+Sbr 8 Cm (sum+Ins)	M2
Sardinel Prefab.A-10 A=0.20 H=0.50l=0.8 Sin Atraqu	ML

Carrera 15 No 90-64 ofc 402 – Bogotá
6017333-4113160
c.parquesbog@gmail.com

669

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Demolición Cerramiento Contra Impacto H=5.0m **	ML
Cerram Malla Nylon H= 5 M+ Pilotines (sum +Inst)	ML
Demarcación Pintura Trafico Tenis A=0.05	M2
Desmonte Estruc. De Cancha Múltiple + Retiro	JGO

Aclarando que, estos no cuentan con numeración puesto que se definirá según el orden de aprobación de los ítems.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Un (1) Archivo Excel
Elaboro: JKCG
Aprobo: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Informe Mensual – Anticipo

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 16 de enero de 2024, 12:09
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

radezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

2 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-168 Informe Anticipo Diciembre 2023.pdf
220K

Diciembre_2023.pdf
1107K

670

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 16 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-168

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Informe Mensual – Anticipo

Cordial saludo,

Para su conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos hacer entrega del informe mensual correspondiente al periodo de diciembre de 2023 del contrato de fiducia No. FID 318515.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail:com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Tres (3) Folios
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Diseño Marshall

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 17 de enero de 2024, 14:10
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

3 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-169 Diseño Marshal.pdf
440K

DISEÑO MDC 19 INV 450-13.pdf
1327K

DISEÑO R-1350-IDRD.pdf
15162K

672

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 15 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-169

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Diseño Marshall

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al compromiso adquirido en el comité No. 13 del 10 de enero de 2024 y a las especificaciones tecnicas del contrato, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado a continuación, para su revisión y concepto:

- Marshall concreto asfaltico rodadura 135O, tipo IDRD - proveedor PAVIOBRAS, la cual será se utilizara en las canchas de tenis y baloncesto del Parque de los Niños y PRD.
- Marshall MD19 - proveedor PAVIOBRAS, la cual será se utilizara en el Parque de los Niños.

Adicionalmente, es importante aclarar que, estos diseños se incluirán en el informe de calidad No.5 correspondiente al seguimiento del contrato para el periodo de enero de 2024.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Veintinueve (29) Folios
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Listado de Materiales - Respuesta IDRD-3131-2024-187

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 17 de enero de 2024, 13:45
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

2 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-170 Listado Materiales.pdf
425K

LISTA MATERIALES.xlsx
273K

671

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 16 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-170

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Listado de Materiales

Cordial saludo,

Dando respuesta al comunicado IDRD-3131-2024-187, nos permitimos hacer entrega del listado de materiales consolidado desde el inicio del proyecto hasta el día sábado 13 de enero de 2024.

Nuestro compromiso es enviar el primer día hábil de cada semana el listado de materiales de la semana inmediatamente anterior, con los soportes que apliquen relacionados con la conformidad de los materiales.

Lo anterior, se evidencia en el correo electrónico del 15 de enero de 2024 donde se reporta el listado de material de la semana de ejecución del 8 al 12 de enero.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Un (01) archivo en Excel
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Entrega Items No Previstos

1 mensaje

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 17 de enero de 2024, 12:35
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega del listado de materiales con sus respectivos soportes

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

2 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-171 Items No Previstos.pdf
436K

NP BASE CIO V5.xlsx
21194K

676

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 17 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-171

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Entrega Items No Previstos

Cordial saludo,

De acuerdo a los diagnósticos y actividades priorizadas en los diferentes escenarios y/o parques, nos permitimos hacer entrega de los análisis de precios unitarios ítems no previstos tal y como se lista a continuación para su revisión y aprobación:

Ítems No Previstos	Unidad
Pintura Esmalte Sintético	M2
Señalética De Zonas Infantiles y Zona Biosaludables 120x80 Cm*2 Caras Suministro E Instalacion)	UND
Cerramiento Paneles Modulares Acero Alto=2.0 M Ancho=3.0 STC	ML
Suministro E Instalac. Tapa Toma Corriente**	UND
Cerramiento Contra Impacto Idrd H= 5 **	ML
Pintura Baranda Cerramientos M-83	ML
Desmonte, Pintura De Estructura y Reinstalación De Señal (0,60*0,70-Idg-S)+ Cambio De Lamina Y Vinilo	UND
Desmonte, Pintura De Estructura y Reinstalación De Señal (0,80*1,20-Valla Normas Generales)+ Cambio De Lamina Y Vinilo	UND
Desmonte, Pintura De Estructura Y Reinstalación De Señal (0,30*0,40-Sc-80)+ Cambio De Lamina Y Vinilo	UND
Modulo Complemento En Malla Eslabonada Para Baranda M-80 H:0,85m	ML
Paral Para Baranda Cerramiento (Sum +Inst)	ML
Sumidero caja Lateralsl-100 En Ladrillo Con Excavac	UND
Tela Para Cerrameinto Verde Oliva H=2.00 (Suministro+Instalacion)	ML
Tela Verde Para Cerramiento H=2.00 (Suministro+Instalacion+Parales Rollizos)	M2
Rodadura Asfáltica IDRD E=0.12 Compactado **	M2

Carrera 15 No 90-64 ofc 402 – Bogotá
6017333-4113160
c.parquesbog@gmail.com

677

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Señal Poste Direccional (Sumin + Insta) H.=3.50	UND
Pintura Anticorrosivo + Esmalte Tubería 2 1/2"	ML
Pintura Anticorrosivo + Esmalte Tubería 4"	ML

Aclarando que, estos no cuentan con numeración puesto que se definirá según el orden de aprobación de los ítems.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Un (1) Archivo Excel
Elaboro: JKCG
Aprobo: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Intervenciones Parque De Los Niños 12-141 - Respuesta IDRD-3131-2023-192

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 17 de enero de 2024, 15:10
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

radezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

4 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-172 Intervenciones Parque Niños.pdf
442K

P_D_NIÑOS V2 PARQUEADERO-PLANO DETALLES.pdf
308K

PLANO_ARQ_PARQUEADERO NIÑOS (1).pdf
762K

PRE_P_D_NIÑOS V0.4.xlsx
3993K

678

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 17 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-172

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Intervenciones Parque De Los Niños 12-141

Cordial saludo,

Dando respuesta al comunicado IDRD-3131-2023-192 del 15 de enero de 2024, nos permitimos hacer entrega de los detalles constructivos y del presupuesto de la zona identificada como parqueadero del parque y/o escenario mencionado en el asunto, aclarando que:

- Se realiza el ajuste de la mezcla asfáltica según el concepto remitido MD-12 a MDC-19
- Se realiza el ajuste del geotextil propuesto según el concepto remitido Geotextil T-2400 a Geotextil T-2100
- Se realiza el ajuste de la Sub-Base propuesta según el concepto remitido Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A a Relleno Recebo Subbase granular

Lo anterior, para su revisión y concepto con el fin de programar la logística de compra y entrega de los insumos.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Dos (2) Folios + Un (01) archivo en Excel
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Control Calidad De Materiales - Respuesta IDRD-3131-2024-191

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 18 de enero de 2024, 11:40
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

radezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

3 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-173 Control Calidad Materiales.pdf
225K

OT-7017-2024 LYD IDRD.pdf
588K

INFORME PRUEBA TINTAS A SOLDADURA 19 dic 2023.pdf
2198K

680

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 18 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-173

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Control Calidad De Materiales

Cordial saludo,

Dando respuesta al comunicado IDRD-3131-2024-191 y cumplimiento a las especificaciones del contrato, nos permitimos hacer entrega de los resultados de ensayos de resistencia a la comprensión de concreto del parque y/o escenario Ciudad Montes identificado con código 16-112, tal y como se listan a continuación:

Muestra	Días De Fallado	Resistencia Mpa	% Resistencia Real
1	14	17.2	81.8%
2	14	16.9	80.4%
3	28	21.2	100.9%
4	28	21.4	102.0%

Adicionalmente, nos permitimos hacer entrega del ensayo de tintas realizados el 19 de diciembre de 2023 al cerramiento M-83.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Once (11) Folios
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Control Calidad Adoquín - Respuesta IDRD-3131-2024-193

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 18 de enero de 2024, 11:40
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

2 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-175 Ensayo Adoquin Tunal.pdf
223K

OT-6090-2023 ADOQUIN ARCILLA.pdf
308K

682

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 18 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-175

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Control Calidad Adoquín

Cordial saludo,

Dando respuesta al comunicado IDRD-3131-2024-193, nos permitimos hacer entrega del control de calidad de adoquín realizado en el parque y/o escenario deportivo Tunal idenficiado con código 06-063, debidamente revisado por la profesional de Calidad – Monica Rodriguez Gaona.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Cuatro (4) Folios
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Respuesta Comunicado IDRD-3131-2023-194

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 18 de enero de 2024, 14:35
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

radezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

CTO.IDRD-3099-2023-177 Respuesta Materiales Bosque San Carlos.pdf
231K

684

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 18 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-176

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Respuesta Comunicado IDRD-3131-2023-194

Cordial saludo,

Dando respuesta al comunicado mencionado en el asunto, nos permitimos realizar las siguientes aclaraciones:

- Los vidrios serán instalados en el transcurso del día de hoy 18 de enero de 2024.
- El suministro e instalación o reparación de los módulos de mallas bajo el puente, cuentan con la respectiva orden de compra y se estima como fecha de entrega el 29 de enero de 2024.
- Las divisiones en acero Inoxidable en la zona de administración, se encuentran en proceso de fabricación y se estima como fecha de entrega el 29 de enero de 2024. Es de resaltar que, en programación esta actividad esta establecida ejecutar del 26 de enero al 2 de febrero al 2024.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: N/A
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Intervenciones Parque La Fragua - Respuesta CTO-IDRD-3099-2023-178

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 18 de enero de 2024, 15:20
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160

c.parquesbog@gmail.com

5 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-178 Intervenciones Parque La Fragua.pdf
300K

PRESUPUESTO LA FRAGUA V0.5.xlsx
2826K

15-040- LA FRAGUA SENDERO -DETALLES V0.2.pdf
995K

ZONA JUEGOS LA FRAGUA V0.2.pdf
1872K

PARQUE LA FRAGUA-ZONA PISTA V0.2.pdf
1472K

686

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 18 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-178

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Intervenciones Parque La Fragua

Cordial saludo,

Dando respuesta al comunicado IDRD-3131-2024-198 del 17 de enero de 2024, nos permitimos realizar las siguientes anotaciones:

- **Zona De Juegos**

  - Se realiza ajuste en el plano y en el presupuesto en cuanto al geotextil T-2100.
  - Se tendrá en cuenta la pendiente del 1% hacia las zonas de desagüe.
  - Es importante resaltar que, el uso de la Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A CIO 19249, se implementa con el fin de dar cumplimiento a la *resolución 507 de 2023 artículo 46 "En obras públicas o privadas de infraestructura vial, urbanismo, espacio público, transporte o servicios públicos, se deberá incorporar el 20% en peso de materiales de construcción provenientes de la valorización de RCD pétreos y no pétreos definidos en la clasificación del artículo 19 de la presente norma, respecto del peso total de los materiales de construcción usados en la obra.* Esta meta del 20% deberá ser cumplida a partir de la entrada en vigencia de la presente norma y se incrementará un punto porcentual anualmente hasta lograr la incorporación del 35% ", de acuerdo con los porcentajes de circularidad se pueden cumplir *"Utilizando elementos o materiales de construcción elaborados a partir de residuos de construcción y demolición provenientes de proveedores registrados ante la Secretaría Distrital de Ambiente".*
    Por lo anterior, solicitamos no modificar la sub base reciclada y mantener la especificación sugerida por el especialista, además de lograr cumplir con el porcentaje de RCD.
  - El mejoramiento Propuesto, solo será utilizado previa autorización de la interventoría en los puntos que presenten y/o evidencien fallos puntuales.
  - Se ajustan la planimetría indicando las pendientes propuestas.
  - En cuanto a la baranda perimetral M-83, se encuentra incluida en presupuesto y se corrige la planimetría incluyendo el detalle de la misma.

- En el presupuesto se evidencia que el Item de placa contrapiso corresponde al CIO 18657, el cual especifica 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **.
- Se da inclusión al Item filtro francés **(trinchera)35x35 Excav+geoNT-1800 **** CIO 10071, de acuerdo a lo sugerido en el comunicado.

- **Zona Sendero Juegos**

  - Se realiza ajuste en el plano y en el presupuesto en cuanto al geotextil T-2100.
  - Se realiza ajuste en los planos, evidenciando las pendientes propuestas
  - Es importante resaltar que, el uso de la Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A CIO 19249, se implementa con el fin de dar cumplimiento a la resolución 507 de 2023 artículo 46 "En obras públicas o privadas de infraestructura vial, urbanismo, espacio público, transporte o servicios públicos, se deberá incorporar el 20% en peso de materiales de construcción provenientes de la valorización de RCD pétreos y no pétreos definidos en la clasificación del artículo 19 de la presente norma, respecto del peso total de los materiales de construcción usados en la obra. Esta meta del 20% deberá ser cumplida a partir de la entrada en vigencia de la presente norma y se incrementará un punto porcentual anualmente hasta lograr la incorporación del 35% ", de acuerdo con los porcentajes de circularidad se pueden cumplir "Utilizando elementos o materiales de construcción elaborados a partir de residuos de construcción y demolición provenientes de proveedores registrados ante la Secretaría Distrital de Ambiente".
    Por lo anterior, solicitamos no modificar la sub base reciclada y mantener la especificación sugerida por el especialista, además de lograr cumplir con el porcentaje de RCD.
  - El mejoramiento Propuesto, solo será utilizado previa autorización de la interventoría en los puntos que presenten y/o evidencien fallos puntuales.

- **Pista De Patinaje**

  - Se realiza ajuste en el plano y en el presupuesto en cuanto al geotextil T-2100.
  - Se realizan las correcciones en planos y presupuestos teniendo en cuenta las recomendaciones generales en la zona de pista de patinaje enunciadas en el comunicado.
  - Es importante resaltar que, el uso de la Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A CIO 19249, se implementa con el fin de dar cumplimiento a la resolución 507 de 2023 artículo 46 "En obras públicas o privadas de infraestructura vial, urbanismo, espacio público, transporte o servicios públicos, se deberá incorporar el 20% en peso de materiales de construcción provenientes de la valorización de RCD pétreos y no pétreos definidos en la clasificación del artículo 19 de la presente norma, respecto del peso total de los materiales de construcción usados en la obra. Esta meta del 20% deberá ser cumplida a partir de la entrada en vigencia de la presente norma y se incrementará un punto porcentual anualmente hasta lograr la incorporación del 35% ", de acuerdo con los porcentajes de circularidad se pueden cumplir "Utilizando elementos o materiales de construcción elaborados a partir de residuos de construcción y demolición provenientes de proveedores registrados ante la Secretaría Distrital de Ambiente".

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Por lo anterior, solicitamos no modificar la sub base reciclada y mantener la especificación sugerida por el especialista, además de lograr cumplir con el porcentaje de RCD.

- El mejoramiento Propuesto, solo será utilizado previa autorización de la interventoría en los puntos que presenten y/o evidencien fallos puntuales.
- En cuanto a las rampas de acceso se tendrán en cuenta, sin embargo, es pertinente aclarar que, se está ejecutando un mantenimiento sobre una huella existente y uno una construcción nueva por lo que los accesos se encuentran sujetos a las condiciones prexistentes al inicio de nuestra intervención.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Tres (3) Folios + un (01) Excel
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Respuesta comunicado IDRD-3131-2023-200

1 mensaje

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 18 de enero de 2024, 17:10
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: residentesst3099@gmail.com, yinethsiso28@gmail.com

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

ıra su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

CTO.IDRD-3099-2023-179 Respuesta requerimiento SST.pdf
333K

689

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 18 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-179

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Respuesta comunicado IDRD-3131-2023-200

Cordial saludo,

Dando respuesta al comunicado del asunto, nos permitimos realizar las siguientes aclaraciones en cada uno de estos:

1. Se realiza entrega de dotación a cuadrilla de eléctricos (ver registro fotográfico)







2. En cuanto a los documentos del guarda de seguridad Nilson Ávila, nos permitimos aclarar que, no hace parte del personal vinculado al contrato 3099. Su presencia obedecía a una

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

medida de contingencia para cuidar la máquina, el cual no realiza ninguna actividad de obra.

Lo anterior, con el fin de asegurar el no vandalismo y/o robo de los elementos que se usarían para la fundida del muro de concreto.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: N/A
Elaboro: JKCG
Aprobo: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Desarrollo Actividades Escenario Deportivo y/o Parque Alta Blanca

1 mensaje

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 18 de enero de 2024, 22:25
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

CTO.IDRD-3099-2023-180 Respuesta Desarrollo Actividades Alta Blanca.pdf
858K

691

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 18 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-180

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Desarrollo Actividades Escenario Deportivo y/o Parque Alta Blanca

Cordial saludo,

Dando respuesta al comunicado IDRD-3131-2024-189, nos permitimos realizar las siguientes anotaciones:

- Inicialmente, se proyectó finalizar las actividades en la zona de la pista de patinaje el día 20 de enero de 2024.

- El día viernes 12 de enero de 2023, se presentó un fisuramiento en la capa de granito lanzado el día 11 de enero, motivo por el cual el proveedor que se encuentra interviniendo la pista solicitó se revisara la causa real y se determinaran correcciones.

  De lo anterior, se evidencio que el fisuramiento se encontraba relacionado con las uniones entre placas de concreto y las mismas se calcaron en el granito nuevo. (Ver Registro fotográfico)

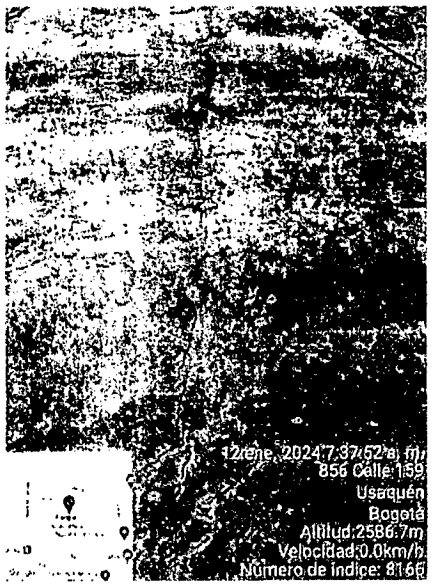


Ilustración 1 Detalle mortero lanzado entre placa y granito fisurado

Carrera 15 No 90-64 ofc 402 – Bogotá
6017333-4113160
c.parquesbog@gmail.com

692

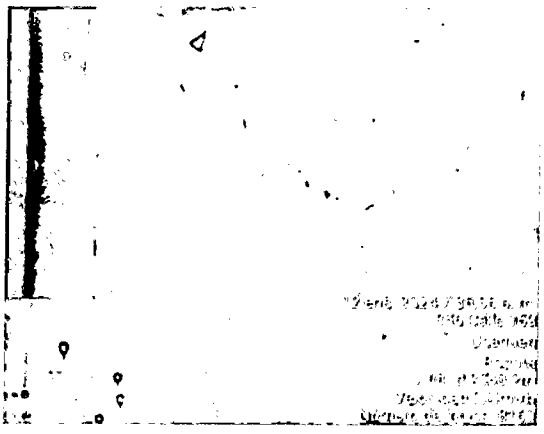


Ilustración 2 Detalle granito lanzado fisurado


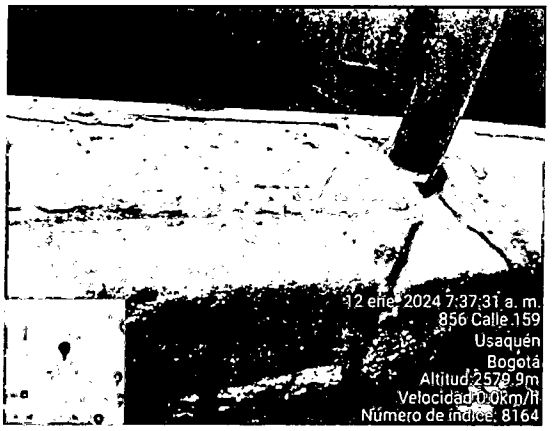


Ilustración 3 Detalle uniones entre placas que se calcan en la Superficie

- Se realizó una visita técnica conjuntamente interventoría, supervisión y contratista, concluyendo realizar un tratamiento-sello de fisuras al concreto con espesor de 5cm aproximadamente, utilizando Sikarod y Sikaflex 1A, tal y como se evidencia a continuación:

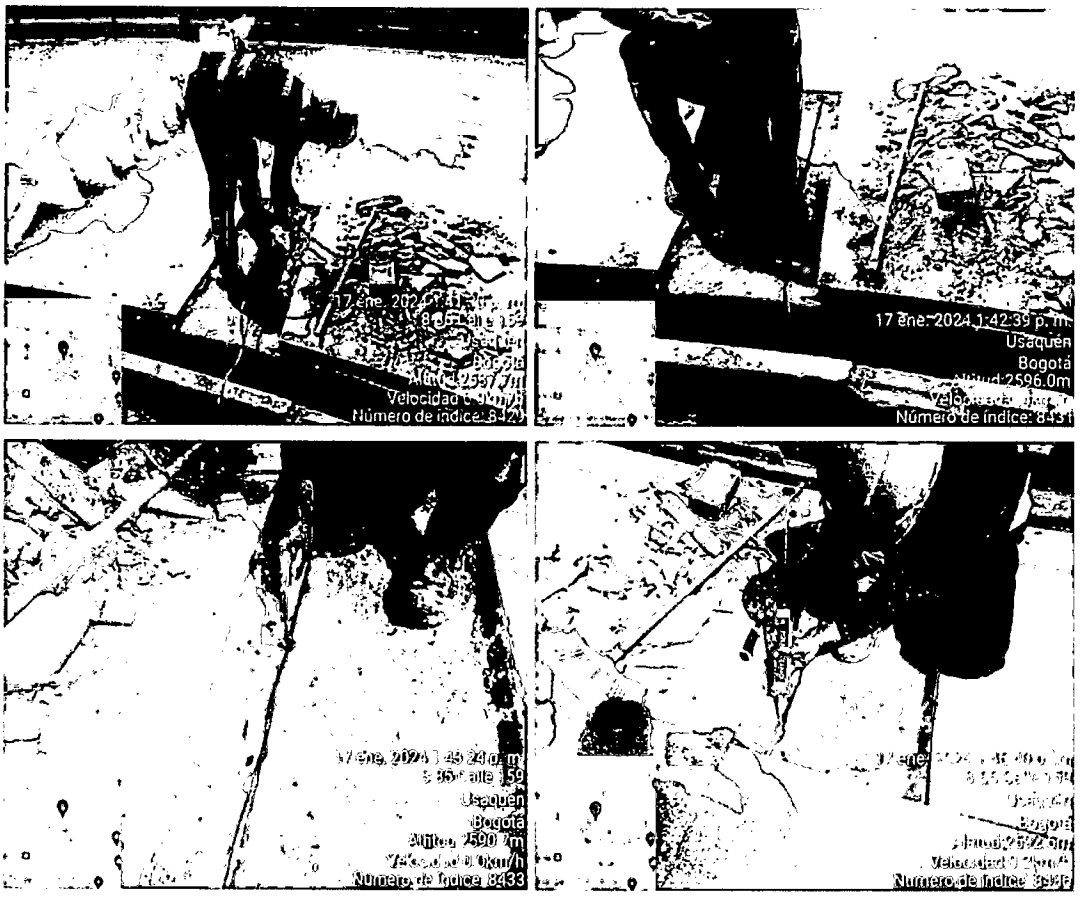

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

En consecuencia, el fisuramiento evidenciado impide finalizar en la fecha inicialmente proyectada, motivo por el cual solicitamos respetuosamente se amplié el plazo para la terminación de actividades en la pista para el día 27 de enero de 2024.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Tres (3) Folios + un (01) Excel
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Fotometría Servita

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 18 de enero de 2024, 22:29
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

radezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

3 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-181 Fotometria Servita.pdf
431K

INFORME_ILU_P_SERVITA.pdf
2352K

ILU_P_SERVITA.dwg
16393K

694

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 18 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-181

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Fotometría

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a los compromisos establecidos en comité de seguimiento, nos permitimos hacer entrega del estudio fotométrico del parque o escenario Servita identificado con código 01-023.

De acuerdo a lo anterior, es necesario la definición y/o concepto de las propuestas presentadas con el fin de programar la logística de compra y entrega de los insumos con anticipación.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo Veinticuatro (24) Folios
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Respuesta Comunicado IDRD-3131-2023-181

1 mensaje

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 19 de enero de 2024, 10:03
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

ra su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

6 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-176 Respuesta Atrasos Programación.pdf
1082K

CRONOGRAMA ALTA BLANCA.pdf
961K

CRONOGRAMA SIMON BOLIVAR.pdf
981K

PRE_ALTA BLANCA V0.3.xlsx
1673K

CRONOGRAMA IDRD 3099 V4.1.mpp
3060K

PRE_SIMON BOLIVAR V0.5.xlsx
3722K

696

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 19 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-176

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Respuesta Comunicado IDRD-3131-2023-181

Cordial saludo,

Dando respuesta al comunicado mencionado en el asunto, nos permitimos realizar las siguientes aclaraciones:

1. En el contrato de obra 3099 - Cláusula 10. Obligaciones Específicas Del Contratista numeral 24. Especifica que, *"Entregar a la interventoría del contrato, la programación de obra en formato Gantt Project en concordancia con los presupuestos aprobados y flujo de inversión. La programación de obra deberá ser entregada al interventor del contrato en original y en medio magnético. Dentro de los cinco (5) días siguientes calendario a la aprobación del presupuesto de los parques priorizados y que la Entidad le va entregando el cual debe ir siendo consolidado y aprobado. Deberá reflejar las actividades objeto del contrato, autorizadas y priorizadas para desarrollar en los diferentes campos profesionales de fútbol y campos deportivos objeto de este contrato..."*

   De acuerdo a lo anterior, es importante aclarar que, no se cuenta con un cronograma definitivo aprobado ya que, se han presentado variaciones de cantidades y actividades representativas en los diferentes escenarios y/o parques priorizados, conllevando a una actualización constante del plan de trabajo.

2. Siendo específico en las tareas mencionadas en el comunicado, es importante tener en cuenta que:

   a. Simón Bolívar

   De acuerdo con el diagnóstico inicial, en el tanque y/o pozo se priorizaron algunas actividades con el fin de evitar el desbordamiento causado posiblemente por la falta de mantenimiento rutinario y/o preventivo. Sin embargo, transcurriendo los días y luego de realizar el movimiento de aproximadamente 450 m3 en el vactor, se evidenciaron los siguientes problemas:

   - Filtraciones en el costado Nor-Occidental del tanque
   - Humedad en el costado Oriental
   - Hormigueros en concreto
   - Presencia de varillas al exterior del tanque (posiblemente residuos de material utilizado para el encofrado del tanque)
   - Instalación del tubo entre tanque norte y sur defectuosa en la unión del PVC y concreto
   - Pobre resistencia del sustrato
   - Incorporación de agua por nivel freático
   - Sustrato en malas condiciones



Desde el día 20 octubre del 2023 no se lograba identificar la causa raíz de las problemáticas evidenciadas en el tanque y/o pozo, motivo por el cual fue necesario excavar aproximadamente 190 m3 causando diferencias significativas en el presupuesto y la programación del escenario y/o parque.

Ya que para el mes de diciembre de 2023 se actualizo el presupuesto del escenario, con una intervención en la zona de los tanques de aproximadamente $124.229.800 y actualmente se evidencia un valor de intervención de $373.901.173.



Adicionalmente, se programaron diferentes visitas conjuntas (interventoría, contratista y supervisión) donde se evidencio y se concluyó realizar actividades que permitan corregir los problemas antes mencionados.


Es importante resaltar que, a la fecha se cuenta con una ejecución de 60 días en esta área y como alternativa de solución se realizará un procedimiento sugerido por el proveedor especializado para el proceso de rehabilitación del elemento, tal y como se describe a continuación:

- **Retiro del revestimiento existente:** Wet Blasting y/o hidrolavado (No genera polución y cumple las normas internacionales de salubridad en el trabajo) y de esta manera poder cumplir con lo establecido en la Noma ASMT D 4258. El desbastado debe remover todo el concreto, revestimiento suave o quebradizo y aleatoriamente generar perfil de anclaje CSP 3 a 4. En el caso de encontrar varillas de acero durante el desbastado, se debe remover.

- **Tratamiento de fisuras:** posterior al retiro del revestimiento existente se procederá a realizar una inspección del sustrato donde se presenten fisuras, juntas constructivas o fisuras pasantes se deberá realizar su respectiva reparación según lo establece la norma ACI 224 R "Control of Cracking in concrete structures" (Sikalflex y/o similar).

  En el caso de fisuras pasantes se procederá a instalar boquillas en las fisuras externas y externas del muro perimetral a una separación de 30 centímetros o menos. Una vez instaladas las boquillas se debe realizar la inyección de resina epóxica de la más baja viscosidad. Se debe comprobar la salida de la resina en las boquillas adyacentes. Adicionalmente se recomienda considerar los requisitos mencionados en el numeral 4.3 "Sello Impermeable para Grietas o Fisuras" de la norma técnica "NS-127 Impermeabilización de tanques existentes de agua potable".

- **Rehabilitación del sustrato:** Se deberá incorporar un mortero de rehabilitación estructural el cual deberá tener una resistencia a la compresión (mínimo 25 N/mm2) con una resistencia mínima a la tracción de 1,5 N/mm2 (Sikatop 121 y/o similar) Generando una superficie uniforme y de una alta resistencia a la tracción: Adicionalmente se recomienda seguir los requisitos de preparación de superficies de concreto indicados en la norma ACI 564R "Concrete Repair Guided".
- **Revestimiento o Capa final:** este recubrimiento tendrá varias características, deberá ser elástico para que permita cualquier movimiento de los tanques; tener una excelente adherencia al sustrato y permita sus movimientos estructurales y de alta resistencia química.

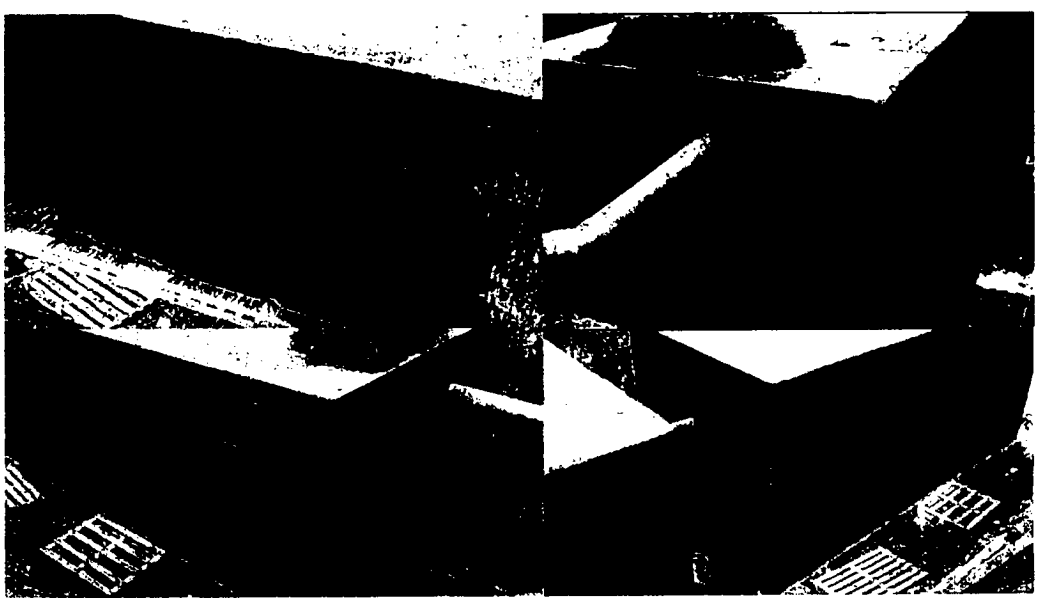

En cuanto a las otras zonas, es de resaltar que:

Zona Kioskos

Inicialmente se tenía presupuestado el mantenimiento de 9 Kioskos con un total de 27.08 m2. Sin embargo, posterior a una revisión conjunta entre contratista de obra e interventoría se evidencio la necesidad de intervenir 43 kioskos.

De acuerdo a lo anterior, se incrementó el personal para realizar las actividades con una cuadrilla adicional de pintura. Adicionalmente, se actualizo el presupuesto y el cronograma dando cumplimiento a la actividad priorizada.

Es de resaltar que, dicha actividad incrementó financieramente de manera significativa ya que de contemplarse $ 7.750.235,40 se actualizo a una intervención de $69.908.534,70.

Zona Bebederos

Inicialmente se tenía presupuestado 12 bebederos. Sin embargo, posterior a una revisión conjunta entre contratista de obra e interventoría se evidencio la necesidad de presupuestar 21 unidades.

Lo anterior, evidencio un incrementó financiero ya que, de contemplarse $72.442.678 se actualizo a una intervención de $100.235.068.

b. Alta Blanca

Las actividades listadas a continuación y que corresponden a la zona de baños, se ejecutaran en el transcurso de la semana del 15 al 20 de enero de 2024:

- Desmonte de vidrio y/o espejo
- Desmonte canal existente+andamio
- Canal PVC 3" (raingo)
- Espejo cristal incoloro 5mm (sum+inst)

Zona Velódromo

Se realiza la actualización de la actividad (Recuperación de granito fundido y pulido en sitio + dilat.bronce), así mismo de la cantidad la cual corresponde a 110 m2. Evidenciando un incrementó financiero significativo ya que, de contemplarse $7.904.345,62 se actualizo a una intervención de $29.061.642,90.

Zona Baños

Se actualiza la actividad (instalación de aparato sanitario Cod 13742) en remplazo de la actividad anterior (Orinal Seco sumin + Instal Cod 14031)

Zona Cerramientos

Se actualiza cantidades y actividades de la zona del cerramiento para su revisión y aprobación. Resaltando que esta, representa un cambio financiero significativo ya que de contemplarse $2.103.018 se actualiza a una intervención de $20.125.673,05.

3. Según definiciones que se han venido informando en comités de seguimiento y en pro de dar cumplimiento a las actividades priorizadas, el CONSORCIO PARQUES BOG realizo la contratación de 7 trabajadores que apoyaran las actividades antes mencionadas.

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

En consecuencia, el Consorcio Parques BOG, ratifica que no se encuentra en atrasos del cronograma de obra ya que, este se irá actualizando y consolidando con cada una de las actividades priorizadas en los escenarios y las cuales son informadas y/o definidas en los comités de seguimiento.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Dos (2) Archivos Excel + Dos (2) Cronogramas
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Orden Giro 3 – Anticipo Respuesta Comunicado IDRD-3131-2024-197

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 22 de enero de 2024, 9:13
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

radezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

Orden Giro 3.rar

CTO.IDRD-3099-2023-182 Orden de Giro3.pdf
314K

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 22 enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-182

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Orden Giro 3 – Anticipo

Cordial saludo,

Dando respuesta al comunicado IDRD-3131-2024-197, nos permitimos hacer entrega de la orden de giro 3, de acuerdo al listado de proveedores listados a continuación, por un valor de $1.537.155.572:

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	VALOR A DESEMBOLSAR
8301459807	CERAMICAS GRANITO DE ORO LTDA	32.561.798
9001371381	EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	27.885.724
9002810404	C.I. NEGOCIOS INTERNACIONALES	16.124.745
74081153	JUAN CARLOS GOMEZ RAMIREZ	271.464.728
85451879	WINGEL ALFONSO CAMARGO TOBIAS	199.767.764
8300893775	CONSTRITURAR SAS	32.486.974
80256957	WILMAR ALFONSO GARCIA	6.664.004
9010061541	AGGREMAX S.A.S	50.001.673
9003609541	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS	24.965.010
9012893068	CONCRETOS Y PREFABRICADOS DEL SUR SAS	82.322.993
9004356183	KONKRETUS SAS	21.487.889
9005501453	LEDS LS COLOMBIA SAS	104.869.738
9003118116	LYD PROYECTOS SAS	488.071.195
9010832326	DISTRIBUCIONES PBB SAS	178.481.337

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal
Anexo: Un (01) Archivo Comprimido
Elaboro: JKCG
Aprobo: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Desarrollo Actividades Escenario Deportivo y/o Villa de Los Alpes Respuesta IDRD-3131-2024-184

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 22 de enero de 2024, 13:07
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

ra su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

CTO.IDRD-3099-2023-183 Personal Villa Alpes.pdf
840K

702

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 22 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-183

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".


Asunto: Desarrollo Actividades Escenario Deportivo y/o Villa de Los Alpes

Cordial saludo,


Dando respuesta al comunicado IDRD-3131-2024-184, nos permitimos realizar las siguientes anotaciones:

1. Es importante tener en cuenta que, la actividad requirió una modificación conllevando a realizar una nueva logística con el fin de, ejecutar de manera correcta el suministro e instalación del elemento.

   La situación antes mencionada, fue expuesta a todas las partes en el comité del día miércoles 10 de enero de 2024. (Ver registro fotográfico)

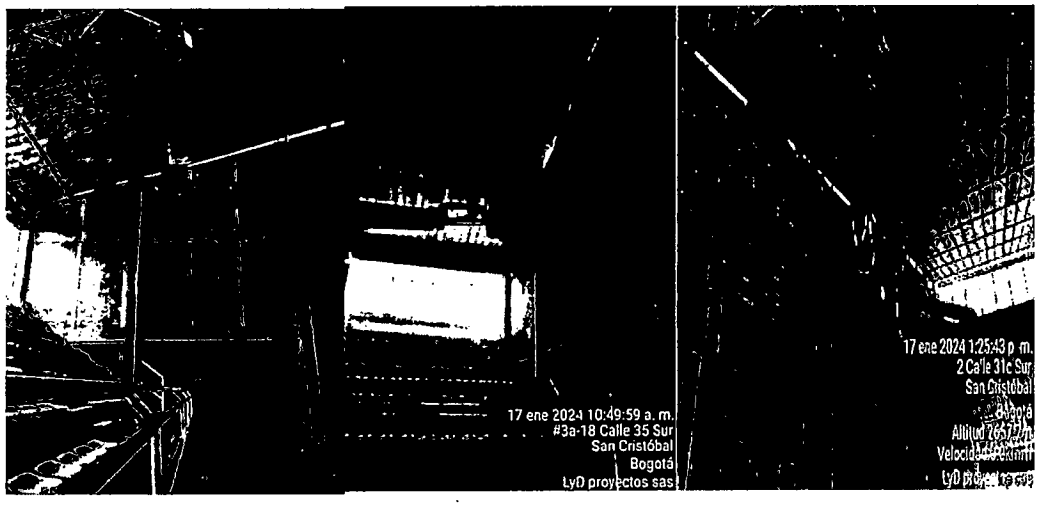

2. En cuanto al mantenimiento de los biosaludables, se realizó desmonte y retiro del parque y/o escenario el 15 de enero de 2024 y se encuentra en taller ejecutándose las actividades de soldadura y pintura. Se tiene previsto realizar nuevamente la instalación el día 29 de enero de 2024. (Ver registro fotográfico)

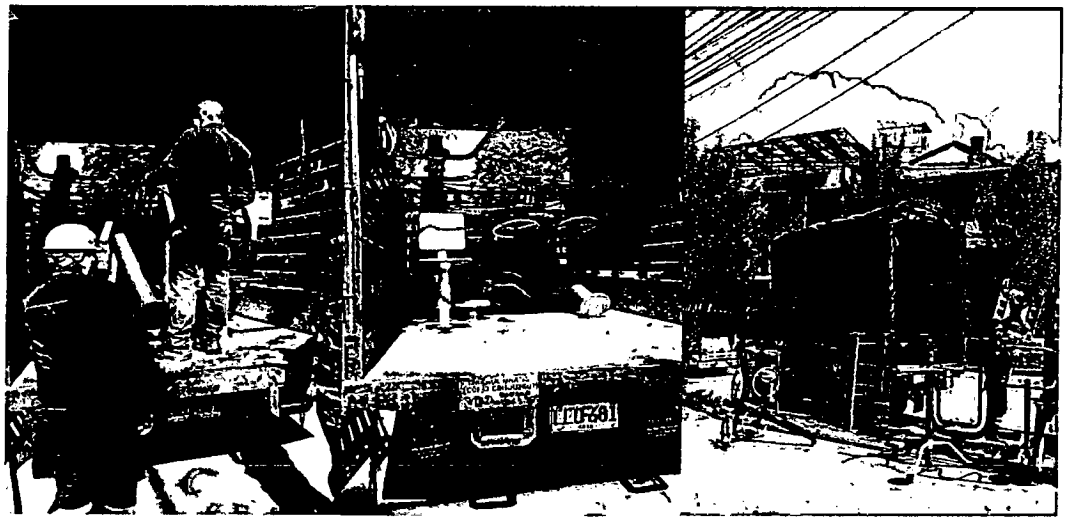

3. En cuanto al mantenimiento de la zona de ruta de la vida, los elementos se encuentran lijados y se tiene previsto finalizar la actividad día 29 de enero de 2024. (Ver registro fotográfico)



4. En cuanto al mantenimiento de la zona de M-5, es importante tener en cuenta que se tenía previsto un (1) juego y se priorizo posteriormente un (1) juego adicional, por otra parte, nos permitimos informar que, los elementos se encuentran lijados y se prevé finalizar la actividad día 29 de enero de 2024. (Ver registro fotográfico)

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4



5. El arreglo de la puerta y marco de la zona de cafetería se estima entregar al 100% ejecutado el 29 de enero de 2024.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: N/A
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Actas contractuales

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 22 de enero de 2024, 19:23
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

radezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

ACTAS.rar

CTO.IDRD-3099-2023-186 Actas Inicio, Inspección, Puesta Servicio.pdf
532K

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 22 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-186

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Actas contractuales

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico: a) "...Suscribir junto con la interventoría del contrato el acta de inspección por cada parque en donde se deja constancia del estado de las diferentes áreas de trabajo, las áreas no intervenidas y el estado de estas y hará parte integral del contrato, junto con los documentos fotográficos en los que conste el estado en que se entrega el parque..." b) "...Al finalizar los trabajos el contratista, hará entrega material de las obras ejecutadas al IDRD, por conducto del interventor, para lo cual informará a este con antelación de 8 días calendario la fecha en que las obras se encuentren listas para su aprobación y recibo final. El recibo de las obras a satisfacción se hará constar en un acta de puesta en servicio suscrita por el interventor y el contratista..."

Nos permitimos hacer entrega de las actas contractuales de los parques priorizados, tal y como se mencionan a continuación, para su revisión, concepto y firma de las mismas:

Parque y/o Escenario	Código	Acta		
		Inicio	Inspección	Puesta En Servicio
Alta Blanca	01-075	x	x	
Bosque San Carlos	18-028	x		x
Cayetano Cañizares	08-241	x	x	
Ciudad Montes	16-112	x	x	
Deportivo Primera de Mayo	04-196	x		
Eduardo Santos	14-030	x		
Estadio De Techo	08-554	x	x	x
Mirador Ilimani	19-788	x	x	x
La Fragua	15-040	x		
Laureles Naranjos	07-035	x	x	
Nuevo Muzu	06-017	x	x	
Estadio Olaya Herrera	18-207	x	x	x
Palestina	07-165	x	x	x

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Niños	12-141	x	x	
Novios	12-092	x	x	
Porvenir	07-391	x		
PRD	12-091	x		x
Servita	01-023	x		
Simón Bolivar	13-089	x	x	
Tunal	06-063	x	x	x
UDS	10-290	x		
Villa De Los Alpes	04-075	x	x	
Canal El Virrey- El Chico	02-014	x		
Atahualpa	09-104			x
Auto Sur Pavco	07-152			x
Candelaria La Nueva	19-189			x
La Estación	12-093			x
La Serena	10-223			x
Meissen	19-230			x
Patio Bonito	08-034			x
San Cristobal	04-127			x
Tabora	10-192			x

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Una (1) Carpeta Comprimida
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

Rta 207.

Bogotá D.C., 22 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-184

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Plan de Gestión Social Actualizado

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico *"El Contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los quince (15) días calendario a la orden de iniciación del Contrato de interventoría para su revisión y aprobación."*, y de acuerdo a lo solicitado por la entidad supervisora, nos permitimos hacer entrega del plan de gestión social actualizado.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

Fecha: 22-01-2024
Hora: 2:53 pm
Recibe: Lady castillo
Recibido para estudio
No implica aceptación

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Cincuenta y un (51) folios + 1 CD
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 23 de enero de 2024

Rtq 210

CTO-IDRD-3099-2023-185

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Informe Mensual No. 4

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a la cláusula 10 – Obligaciones específicas del contratista *"Presentar informes mensuales de cada componente (técnico: (administrativo, contable/financiero y jurídico), calidad, social, ambiental-RCD, SST) a la interventoría del contrato con las novedades a que haya lugar, con recomendaciones y sugerencias, los cuales son soportes del acta parcial mensual señala en el numeral anterior"*. Nos permitimos hacer entrega del informe mensual No. 4 correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2023, aprobado previamente vía correo electrónico por los diferentes componentes.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Fecha: 23-01-2024
Hora: 10:49 am
Recibe: Heth castilho
Recibido para estudio
NO implica aceptación

Anexo: Mil Cuatrocientos setenta y siete folios(1477) + un CD
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Informe De Inspección De Calidad De Soldaduras

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 23 de enero de 2024, 8:57
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

radezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

2 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-187 Informe Prueba Tintas.pdf
574K

Informe Pruebas Tintas Ciudad Montes.pdf
733K

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 23 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-187

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Informe De Inspección De Calidad De Soldaduras

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a los compromisos establecidos en comité de seguimiento del 19 de enero de 2023, nos permitimos hacer entrega del informe de inspección de calidad de soldaduras en el parque Ciudad Montes identificado con código 16-112.

En consecuencia, *"Se encontró que un total de 2 cordones analizados (100%) en 1 tipo de producto (Estructura cerramiento malla eslabonada h=2,5m), el 100% presenta resultados de aceptación (sin poro entre el 70% y 90% del cordón).*

Adicionalmente, se realizó la inspección visual al 100 % de las soldaduras aplicadas siguiendo los criterios de aceptación establecidos en documentos técnicos de la GTC 110 de Icontec, la NTC 2120 o lo establecido en la AWS D1.1 y se determina aceptación del lote de soldaduras propuestas".

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Nueve (9) Folios
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Fotometría

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 23 de enero de 2024, 9:08
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

radezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

- **ILU_FUTBOL_5.pdf**
- **ILU_FUTBOL_8.pdf**
- **ILU_PATINAJE.pdf**
- **INFORME_ILU_P_GJ_FUTBOL_5_A_V1.pdf**
- **INFORME_ILU_P_GJ_FUTBOL_5_B_V1.pdf**
- **INFORME_ILU_P_GJ_FUTBOL_8_V1.pdf**
- **INFORME_ILU_P_GJ_PISTA_DE_PATINAJE_V1.pdf**
- **P_GILMA JIMENEZ_ILU.dwg**

CTO.IDRD-3099-2023-188 Fotometria Gima Jimenez.pdf
426K

711

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 23 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-188

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Fotometría

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a los compromisos establecidos en comité de seguimiento, nos permitimos hacer entrega del estudio fotométrico del parque o escenario Gima Jiménez identificado con código 08-552.

De acuerdo a lo anterior, es necesario la definición y/o concepto de las propuestas.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo Ochenta y un (81) Folios + un (1) archivo editable
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Entrega Items No Previstos - Respuesta comunicados IDRD-3131-2024-202 y IDRD-3131-2024-207

1 mensaje

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 25 de enero de 2024, 10:58
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

a su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

Acta Fijación 5.rar

CTO.IDRD-3099-2023-189 Items No Previstos.pdf
248K

713

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 25 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-189

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Entrega Items No Previstos

Cordial saludo,

Dando respuesta a los comunicados IDRD-3131-2024-202 y IDRD-3131-2024-207, nos permitimos hacer entrega de los análisis de precios unitarios ítems no previstos tal y como se lista a continuación para su revisión y aprobación:

ITEM	ITEM	UNIDAD	VALOR UNITARIO
NP 71	Suministro e instalación baranda pasamanos m-80 con platina y chazo	ML	$385.997,00
NP 72	Nivelación y compactación de subrasante(mdro+cilin)	M2	$1.396,00
NP 73	Suministro e instalacion baranda m-81 anclada con platina y chazo	ML	$395.792,00
NP 74	Cerrammalla m71-fortinet-h=2m, c9m viga+pilotin.** (sum + inst)	ML	$372.089,00
NP 75	Desmonte y retiro malla fortinet h=2.00m	ML	$16.345,00
NP 76	Cargue y retiro de materiales granulares existentes (arena tipo peldar / gravilla 3/4")	M3	$62.589,00
NP 77	Modulo m-144(punto de café)diseñoc.m.u. (sum+ins)	UND	$79.482.360,00
NP 78	Desmonte cerramiento existente (malla eslabonada+ alambre de puas+ elementos verticales de madera)	M2	$13.782,00
NP 79	Juego de cuerdas estrella 2 a 6 años cap: 21 niños (sum + inst)	UND	$ 255.956.289,00
NP 80	Juego balancín doble mas 4años cap:2 niños (sum + inst)	UND	$ 30.015.401,00
NP 81	Juego cuerdas poliedro 5-12añoscap:40niños (sum+ins)	UND	$ 223.682.193,00
NP 82	Piso caucho recicl 11cm (epdm 1cm+sbr 10cm sum+ins	M2	$1.011.292,00
NP 83	Piso caucho recicl 9cm (epdm 1cm+sbr 8cm sum+inst)	M2	$ 889.477,00
NP 84	Sardinel prefab.a-10 a=0.20 h=0.50l=0.8 sin atraqu	ML	$ 85.177,00
NP 85	Demolición cerramiento contra impacto h=5.0m **	ML	$ 200.883,00
NP 86	Cerram malla nylon h= 5 m+ pilotines (sum +inst)	ML	$549.512,00
NP 87	Demarcación pintura tráfico tenis a=0.05	M2	$4.057,00
NP 88	Desmonte estruc. De cancha multiple + retiro	JGO	$334.566,00

Carrera 15 No 90-64 ofc 402 – Bogotá
6017333-4113160
c.parquesbog@gmail.com

714

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

NP 89	Pintura esmalte sintético altura hasta 2,00m	M2	$23.088,00
NP 90	Señalética de zonas infantiles y zona biosaludables 120x80 cmc*2 caras suministro e instalación)	UND	$1.469.961,00
NP 91	Cerramiento paneles modulares acero alto=2.0 m ancho=3.0 stc (sum+inst)	ML	$220.182,00
NP 92	Suministro e instalac. Tapa toma corriente** (sum+inst)	UN	$ 7.356,00
NP 93	Cerramiento contra impacto idrd h= 5 **	ML	$ 1.608.951,00
NP 94	Pintura baranda cerramientos m-83	ML	$26.574,00
NP 95	Desmonte, pintura de estructura y reinstalacion de señal (0,60*0,70-idg-s)+ cambio de lamina y vinilo a 2 caras	UN	$353.263,00
NP 96	Desmonte, pintura de estructura y reinstalacion de señal (0,80*1,20-valla normas generales) + cambio de lámina y vinilo a 2 caras	UN	$740.838,00
NP 97	Desmonte, pintura de estructura y reinstalacion de señal (0,30*0,40-sc-80)+ cambio de lamina y vinilo a 2 caras	UN	$139.666,00
NP 98	Paral para baranda cerramiento (sum +inst)	ML	$65.588,00
NP 99	Sumidero caja lateralsl-100 en ladrillo con excavac	UND	$ 1.178.166,00
NP 100	Tela para cerramiento verde oliva h=2.00 (suministro+instalacion)	ML	$ 10.897,00
NP 101	Desmonte y retiro de tela verde h=2.00	ML	$6.432,00
NP 102	Rodadura asfáltica mdc-19 e=0.08 compactado ** (sum+inst)	M2	$98.172,00
NP 103	Señal poste direccional (sumin + insta) h.=3.50	UN	$428.697,00
NP 104	Pintura anticorrosiva+esmalte tubería 1 1/4"	ML	$12.708,00
NP 105	Pintura anticorrosiva+esmalte tubería 4"	ML	$ 25.821,00

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Un (1) Archivo Comprimido
Elaboro: JKCG
Aprobo: JCM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Propuesta Equipamiento deportivo para escenarios de voleibol, tenis y futbol de playa en el Parque Simón Bolívar sector Ciudad de los Niños

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 25 de enero de 2024, 11:33
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

Beachsport-Spielfeld_Plan_26x18m.pdf

Beachtennis-Pro-Set_111117.pdf

Funtec_Benutzerhandbuch_Beachtore_112001_.pdf

Funtec_manual_BC.pdf

Funtec_manual_PB.pdf

CTO.IDRD-3099-2023-190 Especificaciones Estructuras Moviles.pdf
366K

715

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 25 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-190

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Propuesta Equipamiento deportivo para escenarios de voleibol, tenis y futbol de playa en el Parque Simón Bolívar sector Ciudad de los Niños.

Cordial saludo,

De acuerdo a las actividades definidas y/o priorizadas en el escenario parque de los niños, nos permitimos presentar las especificaciones de los equipamientos sugeridos para voleibol de playa y tenis de playa y que corresponden a la marca FUNTEC, de origen alemán como más de 40 años en el mercado. Esta marca ha sido la marca oficial usada en diferentes competiciones mundiales oficiales.

FUNTEC cumple con los estándares europeos de la EN16579, normativa que regula los equipamientos de los campos de juego. Porterías portátiles y fijas. Requisitos funcionales, de seguridad y métodos de ensayo

1. **Voleibol de Playa**




Carrera 15 No 90-64 ofc 402 – Bogotá
6017333-4113160
c.parquesbog@gmail.com

Para voleibol el equipamiento recomendado es Netzanlage Pro beach SCB el cual contiene:

- 1 par de postes de red Pro Beach, incluidos los anclajes de suelo del sistema extraíbles, postes de red de perfil de aluminio de 91 x 91 mm, con recubrimiento de polvo amarillo, marca de prueba DVV 1
- 2 piezas de paneles de suelo para colocar libremente con la ayuda de vigas de madera, con marco de protección de arena firmemente soldado y tapa de 3 piezas
- 1 pieza de juego de vigas (6 piezas), que consiste en postes de pino impregnados a presión de caldera (1500 x 88 x 88 mm), adecuado para el contacto continuo con la tierra, cantidad de entrega adecuada para 2 piezas de placas de suelo
- 1 pieza Pro Beach Net PLUS, para instalaciones permanentes de red de voleibol de playa
- 2 antenas de red de voleibol de playa
- 1 pieza Pro Beach Courtline, con placas de anclaje de arena fijadas elásticamente en las esquinas, ajustables con precisión, con marcas para campos de juego de tamaño 8 x 16 y 9 x 18 m
- 2 de almohadillas de protección de voleibol de playa, 2 m de largo (dimensión interior: 100 x 100 mm), completamente recubiertas y soldadas a prueba de intemperie.

2. Tenis de Playa


Respecto al equipamiento de tenis playa, el producto sugerido es Beachtennis-Netzanlage Beach Champ el cual consta de:

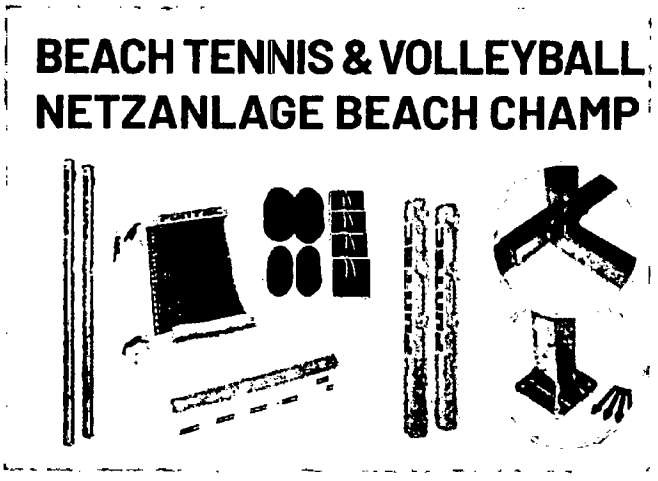

- 2 postes de red Beach Champ, hechos de perfil de aluminio de 91 x 91 mm, con recubrimiento de polvo amarillo, marca de prueba DVV 1
- 2 piezas de fundas de suelo según la variante
- 2 piezas de placas de suelo (solo con anclajes de suelo extraíbles)
- 1 juego de medios de fijación (vigas de madera o anclajes compuestos, dependiendo de la variante seleccionada)
- 1 pieza de red Pro Beach PLUS BT, con pequeñas mallas de red (ideal para observar)
- 1 par de antenas de red de voleibol de playa, 2 piezas (para voleibol de playa)
- 1 pieza Pro Beach Courtline, con placas de anclaje de arena fijadas elásticamente en las esquinas, ajustables con precisión, con marcas para campos de juego de tamaño 8 x 16 y 9 x 18 m

- 1 par de almohadillas de protección de voleibol de playa, 2 m de largo (dimensión interior: 100 x 100 mm), completamente recubiertas y soldadas a prueba de intemperie

3. Futbol de Playa

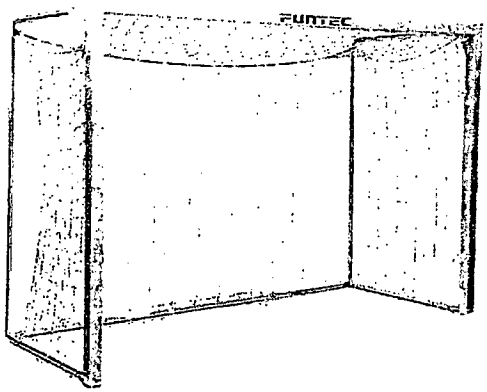


Las porterías Pro Beach Soccer Tore3 son la versión profesional de alta calidad (variante de competición internacional). El tamaño del campo de juego para estos partidos internacionales de fútbol playa es de 37 x 28 m. El tamaño de las porterías es 5,49x2,21m.
Incluye:

- Porterías independientes
- Soportes de red plegables
- Redes y dispositivos antivuelco

4. Rugby de playa

Para la práctica de rugby de playa solamente es necesario contar con la cinta de marcación perimetral del espacio donde se realizará el deporte.

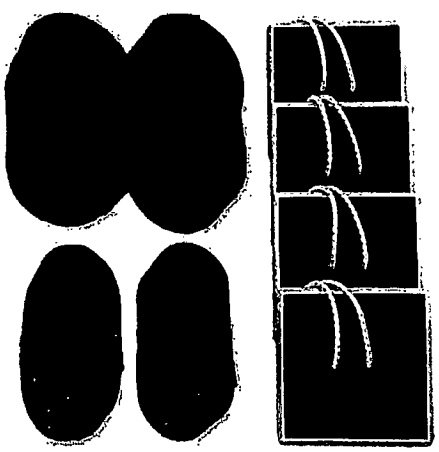

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Se sugiere el ProBeach Courtline de la misma marca el cual consta de:

- Cinta de polipropileno de 25 mm de ancho, color: azul
- Precisamente ajustable para compensar los efectos de estiramiento.
- Marcas para tamaños de campo: 8 x 16 m y 9 x 18 m
- Con marcas centrales rojas debajo de la red.
- Con clavijas de plástico y cables de goma.

Los precios de los 4 kits, están pendientes de cotización por parte del proveedor. Sin embargo, es necesario definir las especificaciones de cada una, con el fin de programar la logística de compra y entrega de los insumos en los tiempos establecidos en el cronograma.

Adicionalmente, una vez se cuente con la especificación definida por parte de la interventoría y la entidad supervisora se procederá a la creación del análisis de precio unitario no previsto.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Noventa y cinco (95) Folios
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Diseño Marshall

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 25 de enero de 2024, 11:40
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

radezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

2 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-191 Diseño Marshal.pdf
121K

DISEÑO MD 12 IDU 510-11 Rev MRG.pdf
1073K

718

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 25 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-191

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Diseño Marshall

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al compromiso adquirido en el comité de seguimiento del 24 de enero de 2024 y a las especificaciones técnicas del contrato, nos permitimos hacer entrega del Marshall MD12 - proveedor PAVIOBRAS.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Catorce (14) Folios
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Entrega De Plan De Adquisiciones

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 26 de enero de 2024, 12:14
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

adezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

2 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-193 Plan Adquisiciones.pdf
425K

ANE6_Plan_adquisiciones_260124.xlsx
232K

720

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 26 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-193

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Entrega De Plan De Adquisiciones

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al compromiso establecido en comité de seguimiento No.15, nos permitimos hacer entrega del plan de adquisiciones actualizado para su revisión y concepto.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Un (01) Folio

Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Control Calidad Adoquín

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 26 de enero de 2024, 12:22
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

radezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

3 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-194 Ensayo Adoquin Tunal.pdf
426K

OT-7019-2024 ADOQUIN ARCILLA Rev MRG.pdf
323K

OT-7020-2024 ADOQUIN ARCILLA Rev MRG.pdf
332K

122

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 26 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-194

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Control Calidad Adoquín

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a las especificaciones del contrato, nos permitimos hacer entrega del control de calidad de adoquín realizado en el parque y/o escenario deportivo Tunal idenficiado con código 06-063, debidamente revisado por la profesional de Calidad – Monica Rodriguez Gaona.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Ocho (8) Folios
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Control Calidad - PRD

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 26 de enero de 2024, 14:00
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

radezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

4 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-195 Ensayo Granulares PRD.pdf
426K

DENSIDADES EN CAMPO Rev MRG.pdf
371K

Ensayos BASE esp IDRD Rev MRG.pdf
1395K

Ensayos SBR Rev MRG.pdf
1490K

774

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 26 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-195

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Control Calidad

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a las especificaciones técnicas del contrato, nos permitimos hacer entrega de los controles de calidad de SBG - Material Gravo Arenoso De Color Café, SUB-BASE Granular y BG - Material Gravo Arenoso De Color Amarillo, realizados en el parque y/o escenario deportivo PRD idenficiado con código 12-091, debidamente revisado por la profesional de Calidad – Monica Rodriguez Gaona.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Treinta y tres (33) Folios
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Procedimientos SST - Simón Bolívar - Pozo o Tanque

2 mensajes

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 26 de enero de 2024, 15:55
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

6 adjuntos

- **CTO.IDRD-3099-2023-196 Procedimiento SST Simon Bolivar.pdf** 426K
- **3. GYG-HSE-P-017 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN ALTURAS.pdf** 187K
- **1. GYG-HSE-P-017 PROCEDIMIENTO DE WETBLASTING.pdf** 101K
- **4. GYG-HSE-PR-078 PROCEDIMIENTO RESCATE EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS SERVI GYG.pdf** 225K
- **2. GYG-HSE-P-014 PROCEDIMIENTO EN ESPACIOS CONFINADOS.pdf** 187K
- **5. GYG-HSE-P-030 PROCEDIMIENTO SEGURO DE APLICACION DE POLIUREA.pdf** 416K

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 29 de enero de 2024, 20:26
Para: CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com>, Ingrid Baez <residentesst3099@gmail.com>

Buenas Noches,

De acuerdo a la revisión de procedimientos y alcance a las observaciones remitidas, se da aprobación de procedimientos para trabajos en el Parque Simón Bolívar ubicación Mana Pozo.
[El texto citado está oculto]
--
CORDIALMENTE:

726

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 26 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-196

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Procedimientos SST

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al compromiso establecido en comité de seguimiento, nos permitimos hacer entrega de los procedimientos de trabajos a realizar en el parque y/o escenario deportivo Simón Bolívar identificado con código 13-089 en la zona de Pozo o Tanque (Mana).

Los cuales fueron revisados y aprobados vía correo electrónico previamente por la interventoría el 25 de enero de 2024, aclarando que, a estos se les realizara acompañamiento y seguimiento por parte de la profesional SST del Consorcio Parques BOG.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Treinta y un (31) Folios
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Entrega Plan De Inspección, Medida Y Ensayo

2 mensajes

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 30 de enero de 2024, 8:41
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

2 adjuntos

FC-09 Plan Inspección Ensayo.pdf
654K

CTO.IDRD-3099-2023-198 Plan Inspección Ensayo Actualizado.pdf
223K

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 30 de enero de 2024, 9:06
Para: vianney.leano@gmail.com

[El texto citado está oculto]
--
CORDIALMENTE:

SOLIUN
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

728

Libre de virus.www.avast.com

2 adjuntos

FC-09 Plan Inspección Ensayo.pdf
654K

CTO.IDRD-3099-2023-198 Plan Inspección Ensayo Actualizado.pdf
223K

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 30 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-198

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Entrega Plan De Inspección, Medida Y Ensayo

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al compromiso establecido en comité de seguimiento No.15, nos permitimos hacer entrega del plan de inspección, medida y ensayo actualizado, de acuerdo con las actas de fijación de Items no previstos suscritas a la fecha, para su revisión y concepto.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Siete (07) Folios

Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Ubicación de luminarias

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 30 de enero de 2024, 10:04
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

5 adjuntos

- **CTO.IDRD-3099-2023-199 Ubicación Luminarias.pdf** 230K
- **SERVITA- DETALLES DE UBICACION.zip** 537K
- **SOFTBALL-DETALLES DE UBICACION.zip** 1388K
- **VELODROMO- DETALLES DE UBICACION.zip** 953K
- **BASEBALL- DETALLES DE UBICACION.zip** 1726K

730

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 30 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-199

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Ubicación de luminarias

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al compromiso establecido en comité de seguimiento, nos permitimos hacer entrega de los análisis de ubicación de las nuevas luminarias para los escenarios deportivos y/o parques mencionados a continuación:

- 10-290 UDS - Softbol
- 10-290 UDS - Beisbol
- 04-196 Deportivo Primera de Mayo - Velódromo
- 01-023 - Servita

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Cuatro (04) Archivos Comprimidos

Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Diagramas Control Iluminación

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 30 de enero de 2024, 12:37
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

radezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

3 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-200 Diagrama Control Iluminación.pdf
229K

DIAGRAMA CONTROL ILUMINACION PRD.pdf
35K

DIAGRAMA CONTROL ILUMINACION TUNAL.pdf
39K

732

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 30 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-200

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Diagramas Control Iluminación

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al compromiso establecido en comité de seguimiento, nos permitimos hacer entrega de los diagramas control de iluminación de los escenarios deportivos y/o parques mencionados a continuación:

- 06-063 El Tunal
- 12-091 PRD

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Dos (02) Folios

Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Intervenciones Parque De Los Novios

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 30 de enero de 2024, 18:07
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

radezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

4 adjuntos

- **Diseño Tunel Novios 002.pdf** 572K
- **Diseño Tunel Novios 003.pdf** 822K
- **Diseño Tunel Novios 001.pdf** 2414K
- **CTO.IDRD-3099-2023-201 Intervenciones Tunel - Novios.pdf** 425K

734

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 30 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-201

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Intervenciones Parque De Los Novios

Cordial Saludo,

Dando cumplimiento al compromiso establecido en comité de seguimiento No. 15, nos permitimos hacer entrega de los detalles constructivos del túnel del amor ubicado en el parque de los novios identificado con código 12-092, para su revisión y concepto.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Tres (3) Folios
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Actas Retiro Mobiliario

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 30 de enero de 2024, 19:04
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

7 adjuntos

- **CTO.IDRD-3099-2023-202 Actas De Baja.pdf** 442K
- **Acta de baja Tunal.pdf** 181K
- **Acta de Baja PRD.pdf** 218K
- **Acta de baja parq de los niños.pdf** 420K
- **Acta de Baja Cayetano.pdf** 155K
- **Acta de baja Nuevo Muzu.pdf** 327K
- **CONTROL MATERIAL DADO DE BAJA.xlsx** 230K

736

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 30 de enero de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-202

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Actas Retiro Mobiliario

Cordial Saludo,

Dando cumplimiento al compromiso establecido en comité de seguimiento No. 15, nos permitimos hacer entrega de las actas de retiro de mobiliario ajustadas, de los parques y/o escenarios mencionados a continuación:

- 12-141 Niños
- 12-091 PRD
- 06-063 El Tunal
- 08-241 Cayetano Cañizares
- 06-017 Nuevo Muzu

Es importante aclarar que, el soporte de entrega de los elementos del Parque de los Niños identificado con código 12-141 al Instituto Distrital De Recreación y Deporte - IDRD, se evidencia en el acta anexa y que se encuentra firmada por Dino Cuellar.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Catorce (14) Folios + Un (01) Archivo Excel
Elaboro: JKCG

SOLIUN INGENIERÍA	CORRESPONDENCIA ENVIADA	VERSIÓN	1
		FECHA DE ELABORACIÓN	15/9/2023

CONTRATO DE OBRA No:	3099-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
CONTRATO INTERVENTORÍA. No:	3131-2023
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"
PARQUE	Parques Bogotá

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA ENVIADA

No. CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	DIRIGIDO A:	OBSERVACIONES	ENCARGADO	SEGUIMIENTO
IDRD-3131-2023-171	miércoles, 3 de enero de 2024	Inf semanal No. 15 de interventoria	IDRD	Se remite informe semanal	KA	Radicado fisico IDRD No. 20242100002482 el dia 3-01-2024, a las 14:26 PM para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-172	miércoles, 3 de enero de 2024	Remisión informes mensuales de obra No. 2	IDRD	Se remiten informes de obra	KA	Radicado fisico IDRD No. 20242100002422 el dia 3-01-2024, a las 14:15 PM para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-173	miércoles, 3 de enero de 2024	Remisión hoja de vida profesional de calidad de obra	IDRD	Se remite hoja de vida avalada	KA	Radicado fisico IDRD No. 20242100002462 el dia 3-01-2024, a las 14:24 PM para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-174	miércoles, 3 de enero de 2024	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-146 Solicitud vinilos vallas	CONSORCIO PARQUES BOG	Se emite respuesta correspondiente	KA	Se remite vía correo electrónico el dia 3/01/2024, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-175	miércoles, 3 de enero de 2024	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-149 Hoja de vida profesional de gerencia de proyectos	CONSORCIO PARQUES BOG	Se emite respuesta correspondiente	KA	Se remite vía correo electrónico el dia 3/01/2024, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-176	miércoles, 3 de enero de 2024	Remisión subsanación acta de fijación de precios no previstos No. 2	IDRD	Se remite para el tramite correspondiente	KA	Se remite vía correo electrónico radicado 20242100002362 3/01/2024, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-177	viernes, 5 de enero de 2024	Remisión acta de fijación de precios no previstos No. 2 - VF	IDRD	Se remite última versión legalizada del acta	KA	Se remite vía correo electrónico radicado 20242100004002 5/01/2024, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-178	viernes, 5 de enero de 2024	Inf semanal No. 16 de interventoria	IDRD	Se remite informe semanal	KA	Se remite vía correo electrónico radicado 20242100004012 5/01/2024, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-180	viernes, 5 de enero de 2024	Reiterada solicitud de atencion a compromisos	cONSORCIO PARQUES BOG	Reiterada solicitud entrega listado semanal de materiales e informe de calidad n°4	VLU	Se remite vía correo electrónico 5/01/2024, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-181	jueves, 11 de enero de 2024	Atraso programación Parques Alta Blanca y Simón Bolivar	CONSORCIO PARQUES BOG	Se remite requerimiento	L.M.	Se remite vía correo electrónico 11/01/2024, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-182	jueves, 11 de enero de 2024	Remisión informes mensuales No. 4 interventoria	IDRD	Se remiten informes	KA	Radicado fisico IDRD No. 20242100009472 el dia 11-01-2024, a las 14:50 PM para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-183	jueves, 11 de enero de 2024	Solicitud Propuesta Estructura de Piso	CONSORCIO PARQUES BOG	Se solicita información	KA	Se remite vía correo electrónico 11/01/2024, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-184	jueves, 11 de enero de 2024	Falta de personal para ejecutar obras. Parque Villa de los Alpes – Cod. 04-075	CONSORCIO PARQUES BOG	Se remite comprobante de pago	KA	Se remite vía correo electrónico 11/01/2024, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-185	jueves, 11 de enero de 2024	Remisión comprobante de pago rendimientos financieros noviembre 2023	IDRD	Se remite comprobante de pago	KA	Radicado fisico IDRD No. 20242100010632 el dia 12-01-2024, a las 14:42 PM para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-186	jueves, 11 de enero de 2024	Remisión acta de fijación de precios no previstos No. 3	IDRD	Se remite acta de fijación	KA	Se remite vía correo electrónico radicado 20242100009212 11/01/2024, para fines pertinentes

SOLIUN INGENIERÍA	CORRESPONDENCIA ENVIADA	VERSIÓN	1
		FECHA DE ELABORACIÓN	15/9/2023
CONTRATO DE OBRA No:	3099-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG		
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".		
CONTRATO INTERVENTORÍA. No:	3131-2023		
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS		
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"		
PARQUE	Parques Bogotá		

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA ENVIADA

No. CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	DIRIGIDO A:	OBSERVACIONES	ENCARGADO	SEGUIMIENTO
IDRD-3131-2024-187	jueves, 11 de enero de 2024	Respuesta correo electrónico	CONSORCIO PARQUES BOG	Se informa que el formato no corresponde	VLU	Se remite vía correo electrónico 11/01/2024, a las 11:44 am, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-188	jueves, 11 de enero de 2024	Solicitud componente SST	CONSORCIO PARQUES BOG	Se remite Solicitud SST (Orden y aseo de Obra y Documentos.	YCA	Se remite vía correo electrónico 11/01/2024, a las 16:00 pm, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-189	sábado, 13 de enero de 2024	Desarrollo de actividades Parque Alta Blanca	CONSORCIO PARQUES BOG	Se solicita agilizar los trabajos	L.M.	Se remite vía correo electrónico 15/01/2024, a las 17:11 pm, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-190	lunes, 15 de enero de 2024	Inf semanal No. 17 de interventoria	IDRD	Se remite informe semanal	KA	Radicado físico IDRD No. 20242100012782 el día 15-01-2024, a las 15:08 PM para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-191	lunes, 15 de enero de 2024	Entrega y Realización de Ensayos de Laboratorio Parque Ciudad Montes – Cod. 16 – 112.	CONSORCIO PARQUES BOG	Se solicita lo correspondiente	LFM	Se remite vía correo electrónico 15/01/2024, a las 17:14 pm, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-192	lunes, 15 de enero de 2024	Respuesta correo electrónico - Intervenciones parque de los niños	CONSORCIO PARQUES BOG	Se remite respuesta correspondiente	KA	Se remite vía correo electrónico 15/01/2024, a las 17:23 pm, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-193	lunes, 15 de enero de 2024	Respuesta CTO-IDRD-3099-2023-166	CONSORCIO PARQUES BOG	Respuesta CTO-IDRD-3099-2023-166	VLU	Se remite vía correo electrónico 15/01/2024, a las 7:24 pm, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-194	martes, 16 de enero de 2024	Falta de materiales Parque Bosques de San Carlos	CONSORCIO PARQUES BOG	Se solicita se presente el soporte de liberación	LFM	Se remite vía correo electrónico 16/01/2024, a las 9:55 am, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-195	martes, 16 de enero de 2024	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-160 Estructura Bosque San Carlos	CONSORCIO PARQUES BOG	Se remite respuesta correspondiente	KA	Se remite vía correo electrónico 25/01/2024, a las 10:53 am, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-196	martes, 16 de enero de 2024	Remisión observaciones acta de fijación de precios no previstos 4	CONSORCIO PARQUES BOG	Se remiten observaciones	KA	Se remite vía correo electrónico 16/01/2024, a las 17:25 pm, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-197	miércoles, 17 de enero de 2024	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-162 Respuesta orden de giro 3	CONSORCIO PARQUES BOG	Se remiten observaciones	KA	Se remite vía correo electrónico 17/01/2024, a las 16:48 pm, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-198	miércoles, 17 de enero de 2024	Respuesta correo electrónico - Intervenciones Fragua	CONSORCIO PARQUES BOG	Se remiten observaciones	KA	Se remite vía correo electrónico 17/01/2024, a las 17:01 pm, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-199	miércoles, 17 de enero de 2024	Remisión acta de fijación de precios no previstos No. 4	IDRD	Se remite acta de fijación	KA	Radicado virtual IDRD No. 20242100016702 el día 17-01-2024, a las 17:54 PM para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-200	jueves, 18 de enero de 2024	Requerimiento SST	CONSORCIO PARQUES BOG	Solicitud SST(Dotación y documentos de 1 trabajador).	YCA	Se remite vía correo electrónico 18/01/2024, a las 7:27 am, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-201	jueves, 18 de enero de 2024	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-172 Intervenciones parque de los niños 12-141	CONSORCIO PARQUES BOG	Se remite aval correspondiente	KA	Se remite vía correo electrónico 18/01/2024, a las 7:58 am, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-202	lunes, 22 de enero de 2024	RESPUESTA COMUNICADO CTO-IDRD-3099-2023-167 - ENTREGA ITEMS NO PREVISTOS	CONSORCIO PARQUES BOG	Se remiten observaciones	KA	Se remite vía correo electrónico 22/01/2024, a las 10:33 am, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-203	lunes, 22 de enero de 2024	RESPUESTA COMUNICADO CTO-IDRD-3099-2023-144 - Intervenciones parque Tunal	CONSORCIO PARQUES BOG	Se remite respuesta correspondiente	KA	Se remite vía correo electrónico 22/01/2024, a las 9:49 am, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-204	lunes, 22 de enero de 2024	Remisión acta de fijación de precios no previstos No. 3 - VF	IDRD	Se remite última versión legalizada del acta	KA	Radicado físico IDRD No. 20242100021952 el día 23-01-2024, a las 14:28 PM para fines pertinentes

SOLIUN INGENIERÍA	CORRESPONDENCIA ENVIADA	VERSIÓN	1
		FECHA DE ELABORACIÓN	15/9/2023
CONTRATO DE OBRA No:	3099-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG		
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".		
CONTRATO INTERVENTORÍA. No:	3131-2023		
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS		
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"		
PARQUE	Parques Bogotá		

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA ENVIADA

No. CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	DIRIGIDO A:	OBSERVACIONES	ENCARGADO	SEGUIMIENTO
IDRD-3131-2024-205	lunes, 22 de enero de 2024	Remisión corrección informes mensuales de interventoría No. 4	IDRD	Se remiten informes	KA	Radicado físico IDRD No. 20242100021942 el día 23-01-2024, a las 14:25 PM para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-206	lunes, 22 de enero de 2024	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-181 Fotometría Servitá	CONSORCIO PARQUES BOG	Se remiten observaciones	KA	Se remite vía correo electrónico 22/01/2024, a las 11:30 am, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-207	martes, 23 de enero de 2024	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-171 entrega ítems NP	CONSORCIO PARQUES BOG	Se remiten observaciones	CF-SR	Se remite vía correo electrónico 23/01/2024, a las 14:20 pm, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-208	miércoles, 24 de enero de 2024	Remision Plan de Gestion Social V3	IDRD	Se remite plan de gestion social	MRCJ	Radicado físico IDRD No. 20242100023092 el día 24-01-2024, a las 10:30 aM para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-209	miércoles, 24 de enero de 2024	RESPUESTA COMUNICADO CTO-IDRD-3099-2023-178 - INTERVENCIONES FRAGUA	CONSORCIO PARQUES BOG	Se remiten recomendaciones	KA	Se remite vía correo electrónico 25/01/2024, a las 9:52 am, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-210	jueves, 25 de enero de 2024	Remisión informes mensuales de obra No. 4	IDRD	Se remiten informes	KA	Radicado físico IDRD No. 20242100025712 el día 25-01-2024, a las 14:12 am para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-211	jueves, 25 de enero de 2024	Remisión orden de operación No. 3	CONSORCIO PARQUES BOG	Se remite orden de giro	ABR	Se remite vía correo electrónico 25/01/2024, a las 17:43 pm, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-212	viernes, 26 de enero de 2024	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-190 Equipamiento deportivo parque de los niños	CONSORCIO PARQUES BOG	Se remite respuesta correspondiente	KA	Se remite vía correo electrónico 26/01/2024, a las 11:58 am, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-213	lunes, 29 de enero de 2024	Remisión acta de fijación de precios no previstos No. 4 - VF	IDRD	Se remite última versión legalizada del acta	KA	Radicado físico IDRD No. 20242100031272 el día 30-01-2024, a las 14:05 pm para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-214	lunes, 29 de enero de 2024	Solicitud actas de inspeccion preliminar	CONSORCIO PARQUES BOG	Se remite oficio solicintando actas de inspeccion preliminares.	MRCJ	Se remite vía correo electrónico 29/01/2024, a las 15:38 Pm, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-215	martes, 30 de enero de 2024	Solicitud de Señalización y Demarcación en los frentes a Intervenir	CONSORCIO PARQUES BOG	Se solicita la subsanación de las observaciones	YCA	Se remite vía correo electrónico 30/01/2024, a las 12:31 Pm, para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-216	martes, 30 de enero de 2024	Remisión acta de fijación de precios no previstos No. 5	IDRD	Se remite acta de fijación	KA	Radicado virtual IDRD No. 20242100030762 el día 30-01-2024, a las 11:32 am para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-217	miércoles, 31 de enero de 2024	Remisión acta de fijación de precios no previstos No. 5 - VF	IDRD	Se remite acta de fijación	KA	Radicado físico IDRD No. 20242100031892 el día 31-01-2024, a las 9:25 am para fines pertinentes
IDRD-3131-2024-221	martes, 30 de enero de 2024	Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-200	CONSORCIO PARQUES BOG	Se remite respuesta correspondiente	KA	Se remite vía correo electrónico 02/02/2024, para fines pertinentes

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-142

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 27 de diciembre de 2023, 9:47
Para: CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

IDRD-3131-2023-160 - Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-142.pdf
219K

741

SOLIUN INGENIERÍA | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

NIT. 901.114.547-5

IDRD-3131-2023-160

Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2023

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Atn. Juan Camilo Mosquera Mosquera
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: "**CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Asunto: Respuesta comunicado CTO-IDRD 3099-2023-142– **Parque de los Novios Cod. 12-092**

Se le solicita al Contratista presentar el informe ajustado por el geotecnista, para validar la estructura que presenta en el oficio para cimentación del Módulo de baño , las cuales están basadas en los análisis a los apiques que se realizaron directamente en el terreno.
Además, en el plano presentado se requiere dar la ubicación clara y exacta donde quedará localizado el Módulo, así como los niveles o cotas del terreno, para la correspondiente cimentación.
Es importante la validación con los especialistas del despiece de acero (diámetros y dimensiones) para las zapata, viga y pedestales en la cimentación que está proponiendo, así como la resistencia de los concretos para estos elementos.

Cordialmente,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboró: L.M.

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-134

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 27 de diciembre de 2023, 9:48
Para: CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

IDRD-3131-2023-161 - Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-134.pdf
219K

743

IDRD-3131-2023-161

Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2023

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Atn. Juan Camilo Mosquera Mosquera
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: "**CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Asunto: Respuesta comunicado CTO-IDRD 3099-2023-134– **PRD Cod. 12-091**

Es válida la afirmación de utilizar alguno de los criterios de aceptación para las estructuras propuestas por el IDRD, acorde con la caracterización de materiales y análisis de la subrasante.

Se le solicita al Contratista presentar el Informe ajustado por el geotecnista, para validar las estructuras que presenta en el oficio para la Cancha de tenis del muro Squash y la Cancha Múltiple , las cuales están basadas en los análisis a los apiques que se realizaron directamente en el terreno.
Estos aspectos ya se habían tratado y se le habían hecho saber al Ing. José O. Peña, quien manifestó que estaban a la espera de los resultados de caracterización de los materiales y la entrega del Informe.

Cordialmente,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboró: L.M.

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-147 - Fotometrías Coliseos y velódromo

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 27 de diciembre de 2023, 9:55
Para: CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

IDRD-3131-2023-162 - Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-147 - Fotometrías Coliseos y velódromo.pdf
298K

745

IDRD-3131-2023-162

Bogotá D.C., 27 de diciembre de 2023

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Atn. Juan Camilo Mosquera Mosquera
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: "**CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Asunto: **RESPUESTA COMUNICADO CTO-IDRD 3099-2023-147**
ESTUDIOS FOTOMÉTRICOS COLISEOAS Y VELÓDROMO

En atención al comunicado del asunto, nos permitimos remitir las siguientes observaciones:

1. Cayetano (PDF: EF_Parque_Cayetano)

* La fotometría producto de la simulación no es viable, en comité del miércoles del 20 de diciembre 2023; se definió continuar con las luminarias propiedad de la entidad de 1000 W, con la instalación de vinilo en los paneles led.

2. Coliseos MUZU y ALPES (PDFs: Estudio Cancha TIP, Ledvance High)

* La altura de montaje no es real, se simuló con una altura de 8 metros y la real es de 16 metros aproximadamente, tomar medida real en sitio.

3. Coliseo La Fragua (PDFs: EVO_Coliseo_Baloncesto, Informe_Ilu_La_Fragua)

* La altura de montaje no es real, se simuló con una altura de 8 metros y la real es de 16 metros aproximadamente, tomar medida real en sitio.

4. Velódromo 1 de mayo (PDFs: Datasheet_ActiStar y Estudio Velodromo 1 de mayo)

* Los niveles fotométricos y uniformidad para las zonas críticas corresponden a los solicitados para competencia, las otras áreas aledañas dan cumplimiento a niveles de entrenamiento.

Lista de superficies de cálculo

N°	Designación	Tipo	Trama	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	Llegadas Pista	perpendicular	10 x 3	320	251	411	0.786	0.612
2	Curvas Pista	perpendicular	10 x 9	320	220	463	0.688	0.476
3	Embalaje Pista	perpendicular	10 x 3	310	238	395	0.769	0.603
4	Cancha minifutbol	perpendicular	14 x 7	160	120	205	0.748	0.586
5	Patinodromo	perpendicular	20 x 60	179	118	347	0.659	0.339

* Para los frentes de obra Velódromo primera de mayo se debe presentar estudio técnico y económico con los tres diseños fotométricos.

Atentos a su respuesta,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboró: PR - KA

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Remisión observaciones actas de Inspección Preliminar e Inventario de elementos existentes

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 27 de diciembre de 2023, 10:07
Para: CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com>
Cc: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

RDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

IDRD-3131-2023-163 - Remisión observaciones actas de Inspección Preliminar e Inventario de elementos existentes.pdf
233K

747

IDRD-3131-2023-163

Bogotá D.C., 27 de diciembre de 2023

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Atn. Juan Camilo Mosquera Mosquera
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: "**CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Asunto: **REMISIÓN OBSERVACIONES ACTAS DE INSPECCIÓN PRELIMINAR E INVENTARIO DE ELEMENTOS EXISTENTES** – PARQUE CIUDAD MONTES (16-112) - ESTADIO DE TECHO (08-554) – ESTADIO OLAYA HERRERA (18-207) PARQUE LAURELES NARANJOS- COD. 07-035, PARQUE VELÓDROMO 1 DE MAYO – COD. 04-196, PARQUE VILLA DE LOS ALPES – COD. 04-075

Cordial Saludo,

De acuerdo con la revisión efectuada por esta Interventoría SOLIUN INGENIERÍA SAS, con relación a las actas de inspección preliminares e inventario de elementos existentes enviadas por ustedes de los Parque Ciudad Montes - Cod 16-112, Estadio de Techo - Cod. 08-554. Estadio Olaya Herrera- Cod. 18-207, Parque Laureles Naranjos- Cod. 07-035, Parque Velódromo 1 de mayo – Cod. 04-196, Parque Villa de los Alpes – Cod. 04-075, se observa que:

Acta de Inspección Preliminar:

1.- Que en las seis (6) Actas entregadas de Inspección Preliminar, se evidencias las siguientes observaciones a fin de ser subsanadas por el contratista de Obra:

1.1- Sobre la fecha se tiene marcado mes de enero y esta no corresponde con la fecha de noviembre que es la que se estipula en el acta, por lo tanto, se debe eliminar el mes de enero.

1.2.- En la fecha de terminación del contrato se colocó el año 2023 y el contrato termina es en el año 2024, por lo tanto, se debe cambiar esta fecha.

1.3.- En el nombre del coordinador este está bien, solamente se debe alinear a la izquierda el nombre y apellido par que este que concordante con los otros datos allí anotados.

1.4.- Se debe revisar y cambiar el orden de la fecha, en Bogotá D.C. a los, donde dice letras está en número se debe colocar en letras, donde dice días no hay nada allí se debe anotar el número respectivo, y en la casilla de meses está en número y se debe cambiar a letras.

1.5.- En cuanto a la descripción de las áreas a intervenir se debe tener mayor claridad ya que al realizar la revisión se observó que se debe aparte de detallar el área donde se va a realizar la actividad se debe

mencionar que actividad se va a desarrollar, como ejemplo Parque Ciudad Montes: Ej.: Zona de la huerta (Cerramiento perimetral), Zona juegos Infantiles (cambio de banner), Zona de Biosaludables (Pintura y mantenimiento), Zona ruta de la vida (pintura y arreglo de algunos elementos), Zona Laguna (Arreglo tubería y cableado eléctrico).

1.6.- Se debe anotar que se tiene registro fotográfico.

1.7.- Al final del acta se tienen las casillas de las fechas, las cuales también están mal colocadas ya que allí, donde está en número se debe cambiar por letras, donde está vacía se debe colocar en letras, y donde está el mes en número se debe colocar en letras.

Actas de Inventario de Elementos Existentes

2.- Que en las seis (6) Actas entregadas de Inventario de Elementos Existentes, se evidencias las siguientes observaciones a fin de ser subsanadas por el contratista de Obra:

2.1.- La cantidad allí consignada deben ser congruente con las cantidades que se van a realizar, ya que en estas aparecen todas como cantidad 1 y allí se deben colocar las cantidades que se van a realizar.

2.2.- También aparece el estado de los mismos en los cuales todos aparecen que están en buen estado, esto se debe revisar y cambiar ya que no todos presentan el mismo estado.

Por lo anteriormente mencionado se deben revisar las actas de inspección preliminar, y las actas de inventario de elementos existentes y subsanarlos y volverlos a entregar para ser nuevamente revisados y así poder ser avalados por esta interventoría y enviarlos a la entidad contratante el IDRD,

Cordialmente,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboró: L.F.M.

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

INFRAESTRUCTURA IDRD IDRD-3131-2023-164 - Respuesta CTO-IDRD-3099-2023-150 Rechazo hoja de vida Diana Marcela Mejia Pinto

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 27 de diciembre de 2023, 13:11
Para: CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com>, Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>, Monica Rodriguez <monicagahona@gmail.com>, edna constanza qq <ednacoce@gmail.com>

Buenas tardes

Se envía oficio IDRD-3131-2023-164 - Respuesta CTO-IDRD-3099-2023-150 Rechazo hoja de vida Diana Marcela Mejia Pinto, para su conocimiento y fines pertinentes

CORDIALMENTE:

SOLIUN

VIANNEY LEAÑO
INGENIERA CIVIL › CALIDAD / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

IDRD-3131-2023-164 - Respuesta CTO-IDRD-3099-2023-150 Rechazo hoja de vida Diana Marcela Mejia Pinto.pdf
238K

749

IDRD-3131-2023-164

Bogotá D.C., 27 de diciembre de 2023

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Atn. Juan Camilo Mosquera Mosquera
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: "**CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Asunto: **Respuesta CTO-IDRD-3099-2023-150 Rechazo hoja de vida Diana Marcela Mejía Pinto**

Revisada la información aportada correspondiente a la auditora DIANA MARCELA MEJIA PINTO, informamos que su hoja de vida no es aprobada dado a que el profesional que ejecute la auditoria debe demostrar un perfil igual o superior al requerido para el contrato;

- "Ingeniero Civil arquitecto, Ingeniero industrial, administrador de obras. Titulo expedido por una Institución de formación aprobada por el Ministerio de Educación Nacional.
- Un (1) año de experiencia certificada en la elaboración y seguimiento de protocolos de gestión de calidad y según norma ISO- 9001:2008 Y/O 2015, aplicada en Obras civiles. (Revisión- Verificación y Validación), la cual podrá estar contenida en la experiencia general.

Teniendo en cuenta lo anterior, la profesional DIANA MARCELA MEJIA PINTO, no cumple con el titulo requerido ni la experiencia dado que su profesión es Ingeniera Ambiental y su experiencia esta basada en seguridad y salud en el trabajo.

Dado lo anterior solicitamos se aporte hoja de vida de auditor que cupla con lo anteriormente descrito

Cordialmente,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboró: VLU

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Respuesta CTO-IDRD-3099-2023-131 Remisión PMT - Parque Fragua

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 28 de diciembre de 2023, 11:51
Para: CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto

Sin otro particular,

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

3 adjuntos

ANEXO 7. ACTA DE RESTITUCIÓN DE CONDICIONES ENCONTRADAS.pdf
266K

FORMATO COI (3).pdf
193K

IDRD-3131-2023-165 - Respuesta CTO-IDRD-3099-2023-131 Remisión PMT - Parque Fragua.pdf
222K

751

SOLIUN INGENIERÍA | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

NIT. 901.114.547-5

IDRD-3131-2023-165

Bogotá D.C.,28 de diciembre de 2023

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Atn. Juan Camilo Mosquera Mosquera
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: "**CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Asunto: **RESPUESTA COMUNICADO CTO-IDRD-3099-2023-131**
Remisión PMT – Parque la Fragua

Cordial saludo,

En atención al comunicado descrito en el asunto, mediante el cual se allega el PMT del Parque Fragua, por medio de la presente nos permitimos remitir el COI suscrito y el ANEXO 7 de dicho documento para los trámites correspondientes ante la secretaria de movilidad.

Sin otro particular,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (02) folios
Con copia: N/A
Elaboró: KA

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Respuesta CTO-IDRD-3099-2023-132 Remisión PMT - Parque Bosque San Carlos

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 28 de diciembre de 2023, 15:52
Para: CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

3 adjuntos

IDRD-3131-2023-166 - Respuesta CTO-IDRD-3099-2023-132 Remisión PMT - Parque Bosque San Carlos.pdf
222K

FORMATO COI (3).pdf
191K

ANEXO 7. ACTA DE RESTITUCIÓN DE CONDICIONES ENCONTRADAS.pdf
266K

753

SOLIUN INGENIERÍA | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

NIT. 901.114.547-5

IDRD-3131-2023-166

Bogotá D.C.,28 de diciembre de 2023

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Atn. Juan Camilo Mosquera Mosquera
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Asunto: **RESPUESTA COMUNICADO CTO-IDRD-3099-2023-132**
Remisión PMT – Bosque San Carlos (18-028)

Cordial saludo,

En atención al comunicado descrito en el asunto, mediante el cual se allega el PMT del Parque Bosque San Carlos, por medio de la presente nos permitimos remitir el COI suscrito y el ANEXO 7 de dicho documento para los trámites correspondientes ante la secretaria de movilidad.

Sin otro particular,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (02) folios
Con copia: N/A
Elaboró: KA

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

INFRAESTRUCTURA IDRD IDRD-3131-2023-167 Respuesta CTO-IDRD-3099-2023-158 – APROBACION HOJA DE VIDA AUDITOR

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 29 de diciembre de 2023, 8:00
Para: CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com>, edna constanza qq <ednacoce@gmail.com>, "ING. MONICA RODRIGUEZ G" <gaonamr@yahoo.com.ar>

Buenos días

Enviamos adjunto oficio IDRD-3131-2023-167 Respuesta CTO-IDRD-3099-2023-158 – APROBACION HOJA DE VIDA AUDITOR para su conocimiento y trámite correspondiente

--

CORDIALMENTE:

SOLIUN

VIANNEY LEAÑO
INGENIERA CIVIL > CALIDAD / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

IDRD-3131-2023-167 Respuesta CTO-IDRD-3099-2023-158 – APROBACION HOJA DE VIDA AUDITOR.pdf
222K

755

SOLIUN INGENIERÍA | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

NIT. 901.114.547-5

IDRD-3131-2023-167

Bogotá D.C., 29 de diciembre de 2023

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Atn. Juan Camilo Mosquera Mosquera
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: "**CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Asunto: **Respuesta CTO-IDRD-3099-2023-158 – APROBACION HOJA DE VIDA AUDITOR**

Revisada la información aportada correspondiente a la auditora CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO, informamos que se da aprobación de la hoja de vida para la ejecución de las auditorias internas a realizar en el proyecto.

Cordialmente,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboró: VLU

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Observaciones actas de Inspección Preliminar e Inventario de elementos existentes

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 30 de diciembre de 2023, 21:15
Para: CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com>
Cc: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

21 adjuntos

- **IDRD-3131-2023-168 - Observaciones actas de Inspección Preliminar e Inventario de elementos existentes.pdf** 230K
- **Alta Blanca 5.pdf** 860K
- **Alta Blanca 2.pdf** 720K
- **Alta blanca 3.pdf** 702K
- **Alta Blanca 1.pdf** 989K
- **Alta blanca 4.pdf** 908K
- **Novios 1.pdf** 777K
- **Novios 3.pdf** 717K
- **Novios 5.pdf** 735K
- **Novios 4.pdf** 807K

757

Novios 2.pdf
832K

Parque de los Niños 1.pdf
917K

Parque de los Niños 2.pdf
738K

Parque de los Niños 3.pdf
681K

Simon Bolívar 1.pdf
879K

Parque de los Niños 4.pdf
900K

Simon Bolivar 2.pdf
887K

Simon Bolívar 3.pdf
681K

Simón Bolívar 4.pdf
884K

Simón Bolívar 5.pdf
872K

Simón Bolívar 6.pdf
811K

SOLIUN INGENIERÍA | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

NIT. 901.114.547-5

IDRD-3131-2023-168

Bogotá D.C., 29 de diciembre de 2023

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Atn. Juan Camilo Mosquera Mosquera
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: "**CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD**".

Asunto: **REMISIÓN OBSERVACIONES ACTAS DE INSPECCIÓN PRELIMINAR E INVENTARIO DE ELEMENTOS EXISTENTES** – PARQUES: SIMÓN BOLÍVAR, DE LOS NOVIOS, ALTA BLANCA, DE LOS NIÑOS.

Cordial Saludo,

Acta de Inspección Preliminar:
De acuerdo con la revisión efectuada por la Interventoría SOLIUN INGENIERÍA SAS, con relación a las actas de inspección preliminares e inventario de elementos existentes enviadas POR EL CONSORCIO PARQUES BOG, se hacen observaciones las cuales, por facilidad están contenidas dentro del cuerpo en cada una de las actas, para que las tengan en cuenta y realicen las correcciones respectivamente.
Actas de Inventario de Elementos Existentes:
Las cantidades que están presentando en las actas de Inventario deben ser equivalentes con las cantidades que se van a realizar en cada uno de los escenarios cotejando con lo presupuestado, y es importante verificar plenamente el estado de los elementos encontrados.
Registro fotográfico:
En lo posible describir de manera resumida lo que se presenta en cada una de las fotos.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y una vez subsanadas, se revisarán y avalarán por la Interventoría para luego tramitarlas ante la Entidad IDRD.

Favor realizar entrega de las Actas de Inspección preliminar del Parque PDR – Canchas Squash Tenis y de la Cancha de baloncesto. (están pendientes).

Cordialmente,

RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: veinte (20) folios
Con copia: N/A
Elaboró: L.M.

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Revisión memorias cantidades obra Parques Novios , Niños y PDR

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 30 de diciembre de 2023, 21:16
Para: CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

IDRD-3131-2023-169 - Revisión memorias cantidades obra Parques Novios , Niños y PDR.pdf
239K

759

IDRD-3131-2023-169

Bogotá D.C., 30 de diciembre de 2023

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Atn. Juan Camilo Mosquera Mosquera
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **Revisión Memorias Cantidades de obra Parques: Novios, PDR y Niños**

Cordial Saludo,

Una vez revisadas por la Interventoría SOLIUN INGENIERÍA SAS, las Memorias de Cantidades de Obra presentadas en físico, por el CONSORCIO PARQUES BOG para los parques de los Novios, PDR- cancha de tenis, y Parque de los Niños, le hacemos devolución para que se tengan en cuenta y se subsanen las observaciones, las cuales se hallan dentro del contenido de las mismas.
Cabe anotar que se hizo al respecto mesa de trabajo con el Ing. Residente José O. Peña, para esclarecimiento de presentación y especificaciones.

Cordialmente,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: treinta y siete (37)folios
Con copia: N/A
Elaboró: L.M.

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Revisión observaciones Informe Técnico No. 4. Diciembre

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 2 de enero de 2024, 9:10
Para: CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com>

Observaciones al Informe Tecnico 4.pdf

Remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

IDRD-3131-2023-170- Revisión Informe Técnico No. 4. Diciembre.pdf
225K

761

SOLIUN INGENIERÍA | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

NIT. 901.114.547-5

IDRD-3131-2023-170

Bogotá D.C., 30 de diciembre de 2023

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Atn. Juan Camilo Mosquera Mosquera
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: "**CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD**".

Asunto: **Revisión del Informe Técnico No. 4- V0**

Cordial Saludo,

Recibido el Informe Técnico N° 4, en V0 remitido por ustedes en formato PDF , la Interventoría Soliun Ingeniería SAS, les informa que es importante tener en cuenta algunas de las observaciones que se le realizaron y que están plasmadas dentro del contenido del informe en modo de comentarios.

Además, se informa que el registro fotográfico que presentan está bastante incompleto y no hay evidencia en este, de algunos de los Parques tales como: Ilimaní, Cayetano Cañizares, Muzu, Palestina, San Carlos, La Fragua, Novios Eduardo Santos, considerando que durante el periodo hubo intervención en estos Escenarios.

Es importante mejorar la descripción que se presenta en cada una de las imágenes del trabajo que se realiza y la ubicación en el sitio del Escenario.

Agradecemos la subsanación, para poder continuar con el trámite correspondiente.

Cordialmente,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Informe (574) folios
Con copia: N/A
Elaboró: L.M.

SOLIUN INGENIERÍA | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

NIT. 901.114.547-5

IDRD-3131-2023-171

Bogotá D.C., 03 de enero de 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. IDRD
No. 20242100002482 Código Web: PlaYc2
FECHA:03-01-2024 14:26:18 FOLIOS: 18
RADICADOR: KATHERIN ANDREA GONZALEZ MURIL
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: SOLIUN INGENIERIA S.A.S
ASUNTO: REMISION INFORME DE INTERVENTORIA N 15
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: **Contrato de interventoría No. 3131-2023** cuyo objeto es: ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 15**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 15, para el periodo comprendido entre el 17 de diciembre y el 23 de diciembre de 2023.

Lo anterior para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal


Anexos: Lo referido en (17) folios
Con copia: N/A
Elaboró: KA
Revisó: N/A

SOLIUN INGENIERÍA | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

NIT. 901.114.547-5

IDRD-3131-2024-172

Bogotá D.C., 03 de enero de 2024



Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Asunto: **REMISIÓN INFORMES MENSUALES DE OBRA No. 3**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir lo informes mensuales del contratista de obra CONSORCIO PARQUES BOG correspondientes al periodo entre el 1 de noviembre de 2023 y el 31 de noviembre de 2023:

INFORME	FOLIOS
COMPONENTE TÉCNICO	01 – 427 folios (03 tomos)
COMPONENTE SOCIAL	428 – 693 folios (02 tomos)
COMPONENTE AMBIENTAL	694 – 742 folios (01 tomo)
COMPONENTE SST	743 – 1093 folios (02 tomos)
COMPONENTE CALIDAD	1094 – 1366 folios (02 tomos)

Lo anterior para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (1366) folios – (10) tomos + 1CD
Con copia: N/A
Elaboró: KA
Revisó: N/A

SOLIUN INGENIERÍA | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

NIT. 901.114.547-5

IDRD-3131-2024-173

Bogotá D.C., 03 de enero de 2024

No. 20242100002462 Código Web: Uyu3@U
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. IDRD
FECHA:03-01-2024 14:24:45 FOLIOS: 26
RADICADOR: KATHERIN ANDREA GONZALEZ MURIL
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: SOLIUN INGENIERIA S.A.S
ASUNTO: REMISION CAMBIO HOJA DE VIDA PROFESIONAL
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A -06 PBX: 660 6400

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023 cuyo objeto es: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION, Y RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Asunto: **Remisión cambio hoja de vida profesional de calidad**

Cordial Saludo,

Una vez revisadas las hojas de vida del personal mínimo para el contrato descrito en la referencia, por medio de la presente nos permitimos remitir la hoja de vida de la profesional que se describe a continuación, debidamente avalada por esta interventoría:

Nombre profesional	*Cargo*	*Perfil requerido experiencia especifica IDRD*	*Cumple*		*Observaciones*
			SI	NO	
MÓNICA RODRIGUEZ GAONA	PROFESIONAL EN SISTEMA DE CALIDAD	Ingeniero Civil o arquitecto o Ingeniero Industrial o administrador de obras. Título expedido por una Institución de formación aprobada por el Ministerio de Educación Nacional. **EXPERIENCIA:** Tres (3) años de experiencia profesional a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Un (1) año de experiencia certificada en la elaboración y Seguimiento de Protocolos de Gestión de calidad y según norma ISO- 9001:2008 Y/O 2015, aplicada en obras civiles. (Revisión- Verificación)	X		**CUMPLE**

Atentos a su respuesta,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (25) folios
Con copia: N/A
Elaboró: KA
Revisó: N/A

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-146 - Vinilos vallas

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 3 de enero de 2024, 12:04
Para: CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto

Sin otro particular,

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

IDRD-3131-2024-174 - Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-146 - Vinilos vallas.pdf
227K

766

SOLIUN INGENIERÍA | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

NIT. 901.114.547-5

IDRD-3131-2024-174

Bogotá D.C., 03 de enero de 2024

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Atn. Juan Camilo Mosquera Mosquera
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Asunto: **RESPUESTA COMUNICADO CTO-IDRD 3099-2023-146**
SOLICITUD VINILOS VALLAS

En atención al comunicado del asunto, y de acuerdo con lo informado el pasado 29 de diciembre de 2023 por la supervisión delegada del IDRD, nos permitimos remitir link de drive para revisión de los vinilos que, de acuerdo con lo manifestado no se pudieron visualizar en el link anterior:

https://drive.google.com/drive/folders/1F68oQYt6q-kpm7Ap6BQO22m8h-7HDF11?usp=drive_link

Así las cosas, se solicita realizar la revisión respetiva con el fin de aclarar si es posible la descarga de todas las vallas faltantes, para continuar con el proceso de impresión de las mismas.

Atentos a su respuesta,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboró: KA

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-149 Hoja de vida profesional de gerencia de proyectos

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 3 de enero de 2024, 12:18
Para: CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

IDRD-3131-2024-175 - Respuesta comunicado CTO-IDRD-3099-2023-149 Hoja de vida profesional de gerencia de proyectos.pdf
247K

IDRD-3131-2024-175

Bogotá D.C., 03 de enero de 2024

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Atn. Juan Camilo Mosquera Mosquera
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023 cuyo objeto es: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION, Y RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Asunto: **Respuesta al comunicado CTO-IDRD-3099-2023-146 –HOJAS DE VIDA PROFESIONAL GERENCIA DE PROYECTOS**

Cordial Saludo,

Una vez revisada la hoja de vida allegada conforme a lo establecido por el IDRD mediante memorando 20236000295691 del 19 de diciembre de 2023, por medio de la presente nos permitimos remitir las observaciones correspondientes:

Nombre profesional	*Cargo*	*Perfil requerido experiencia especifica IDRD*	*Cumple*		*Observaciones*
			SI	NO	
MARYORY PASACHOVA SANCHEZ	PROFESIONAL EN GERENCIA DE PROYECTOS	Profesional que acredite tener una especialización, maestría o doctorado en Gerencia de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de mantenimientos o adecuación en espacio público (exceptuando vías y playas marítimas).	X		**CUMPLE** *Se solicita radicar en físico en interventoría para el traslado correspondiente a la entidad * Se recuerda que la dedicación de la profesional es 100% para la ejecución del contrato por lo tanto debe contar con la mencionada disponibilidad.

Atentos a su respuesta,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboró: KA

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Remisión subsanación acta de fijación de precios no previstos No. 2

2 mensajes

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 3 de enero de 2024, 13:31
Para: Angelica Maria Romero Hernandez <angelica.romero@idrd.gov.co>
Cc: IDRD Correspondencia <idrdcorrespondencia@idrd.gov.co>, CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com>

2. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NP 2 03-01-202...

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--

DIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

5 adjuntos

- **IDRD-3131-2024-176- Remisión subsanación acta de fijación de precios no previstos No. 2.pdf** 322K
- **1. ACTA_DE_APROBACION_ACTIVIDADES_NO_PREVISTAS_2.pdf** 903K
- **1. ACTA_DE_APROBACION_ACTIVIDADES_NO_PREVISTAS_2.xls** 162K
- **2. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NP 2 03-01-2024.pdf** 20347K
- **3. LISTA DE INSUMOS.pdf** 2068K

IDRD Correspondencia <idrdcorrespondencia@idrd.gov.co> 3 de enero de 2024, 13:45
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Buen día.

El IDRD le informa que su comunicación se radicó en el Sistema de Información

Documental de la entidad con el número **20242100002362**

Su requerimiento es tramite

Recuerde que los términos de respuesta para PQRSD (Petición, Queja, Reclamo,

Denuncia o Sugerencia) son los establecidos en la Ley 1755 de 2015.

770

Si necesita hacer seguimiento a su requerimiento puede comunicarse con nuestra


línea de Atención al Cliente 6016605400 Ext. 625 - 251-252 o al correo

atncliente@jdrd.gov.co

Cordial saludo,

Calle 63 # 59ª - 06
(571) 660 5400

[El texto citado está oculto]

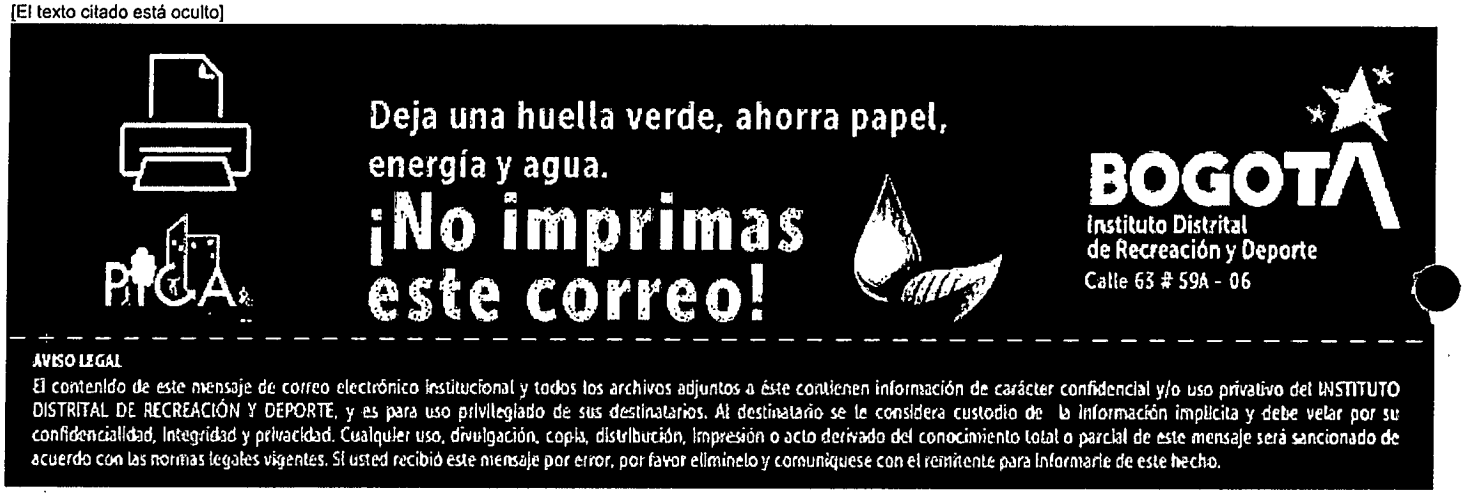

IDRD-3131-2024-176

Bogotá D.C., 03 de enero de 2024

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Asunto: **REMISIÓN SUBSANACIÓN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 2**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir la subsanación a las observaciones realizadas por el IDRD al acta de fijación de precios no previstos No. 2 el pasado 29 de diciembre del 2023, documentación que fue allegada por el CONSORCIO PARQUES BOG vía correo electrónico, y que se encuentran debidamente verificados y avalados por esta interventoría, se aclara que se remiten los APUS NP que no cuentan con precio de referencia CIO con las correspondientes cotizaciones.

Se aclara que conforme a lo establecido en la *CLAUSULA DECIMA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS* del contrato de obra pública No. 3099 de 2023, numeral *30,* nos permitimos remitir:

- Acta de fijación de precios no previstos 2
- Análisis de precios unitarios no previstos (NP – 27 al NP – 36)
- Listado de insumos

Los Análisis de precios unitarios no previstos mencionados anteriormente, se encuentran relacionados en los documentos anexos de la siguiente manera:

ITEM	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
NP 27	Desmonte y reinstalacion, pintura general y arreglo, reposicion piezas biosaludables	UND	1,00	$ 954.388,00
NP 28	Desmonte e instalac bordillo prefabricado a-80 **	ML	1,00	$ 50.739,00
NP 29	Limp. estruct. metalica y pintura esmalte+ antic**	M2	1,00	$ 25.419,00
NP 30	Demolicion cielo raso modular ligera (cargue y ret	M2	1,00	$ 7.927,00
NP 31	Valla normas generales campos deportivos 3,00m x 1,00m (incluye dados en concreto)	UND	1,00	$ 6.964.140,00

NP 32	Desmonte,corte,reinstalac adoquin pegado con sumin	M2	1,00	$	66.786,00
NP 33	Marco+tapa(äng+plat+acero+conc.3.000)caja 60x60cm (sum + inst)	UND	1,00	$	223.489,00
NP 34	Llave grival jardin 1/2" 60400	UND	1,00	$	51.576,00
NP 35	Pulida de piso tablon en granito	M2	1,00	$	121.875,00
NP 36	Recuperacion de granito fundido y pulido en sitio + dilat.bronce.	M2	1,00	$	211.366,00
NP 37	Suministro e instalación de tomacorriente GFCI 20 A	UND	1,00	$	66.160,00
NP 38	Suministro e instalación de ducha eléctrica de 110v - 220v	UND	1,00	$	156.791,00
NP 39	Tablero/tifasi-24 circ-conpuerta-espaco-totalizado	UND	1,00	$	572.923,00
NP 40	Desmonte de luminaria para altura hasta 3 metros con escalera	UND	1,00	$	14.775,00
NP 41	Desmonte de luminaria altura mayor a 3 metros con andamio certificado	UND	1,00	$	222.217,00
NP 42	Instalación de luminaria escenario deportivo hasta 3 mts con escalera	UND	1,00	$	18.588,00
NP 43	Instalación de luminaria en altura con escalera tipo extensión altura superior a 4 mts	UND	1,00	$	301.189,00
NP 44	Instalación de luminaria escenario deportivo h=2 a 3 mts con andamio certificado	UND	1,00	$	272.846,59
NP 45	Instalación de luminaria alumb publico con plataforma trabajo altura	UND	1,00	$	489.784,00
NP 46	Desmonte kit de luminaria 400w, arranc, cond, redactancia	UND	1,00	$	21.686,00
NP 47	Sum + inst caja rawelt 4 salidas 3/4"-2.400 (4x4)	UND	1,00	$	25.049,00
NP 48	Totalizador 3 x 60 amp (sum+inst.)	UND	1,00	$	125.590,00
NP 49	Acometida en cable aluminio 3#4 + 1#4 awg 600v	ML	1,00	$	31.962,00
NP 50	Acometida de cable en aluminio 4(3X350) F + 1X2/0 T THNN-AWG (sum+instalación)	ML	1,00	$	336.147,00
NP 51	Simulación fotométrica de coliseos	UND	1,00	$	1.380.804,00
NP 52	Apuntamiento de proyectores según diseño de iluminación	UND	1,00	$	34.666,00
NP 53	Desmonte de luminaria en altura con escalera tipo extensión altura superior a 4 mts	UND	1,00	$	253.429,00

Lo anterior para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (322) folios
Con copia: N/A
Elaboró: KA
Revisó: N/A

SOLIUN INGENIERÍA | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

NIT. 901.114.547-5

IDRD-3131-2024-177

Bogotá D.C., 04 de enero de 2024



Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Asunto: **REMISIÓN EN FÍSICO ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 2**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir el acta de fijación de precios no previstos No. 2 del contrato de obra descrito en la referencia, debidamente suscrita, la cual fue tramitada y legalizada el pasado 4 de enero de 2024, con el fin de que repose en el expediente contractual.

Los Análisis de precios unitarios no previstos mencionados anteriormente, se encuentran relacionados en los documentos anexos de la siguiente manera:

ITEM	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
NP 27	Desmonte y reinstalacion, pintura general y arreglo, reposicion piezas biosaludables	UND	1,00	$ 954.388,00
NP 28	Desmonte e instalac bordillo prefabricado a-80 **	ML	1,00	$ 50.739,00
NP 29	Limp. estruct. metalica y pintura esmalte+ antic**	M2	1,00	$ 25.419,00
NP 30	Demolicion cielo raso modular ligera (cargue y ret	M2	1,00	$ 7.927,00
NP 31	Valla normas generales campos deportivos 3,00m x 1,00m (incluye dados en concreto)	UND	1,00	$ 6.964.140,00
NP 32	Desmonte,corte,reinstalac adoquin pegado con sumin	M2	1,00	$ 66.786,00
NP 33	Marco+tapa(äng+plat+acero+conc.3.000)caja 60x60cm (sum + inst)	UND	1,00	$ 223.489,00
NP 34	Llave grival jardin 1/2" 60400	UND	1,00	$ 51.576,00
NP 35	Pulida de piso tablon en granito	M2	1,00	$ 121.875,00

NP 36	Recuperacion de granito fundido y pulido en sitio + dilat.bronce.	M2	1,00	$	211.366,00
NP 37	Suministro e instalación de tomacorriente GFCI 20 A	UND	1,00	$	66.160,00
NP 38	Suministro e instalación de ducha eléctrica de 110v - 220v	UND	1,00	$	156.791,00
NP 39	Tablero/tifasi-24 circ-conpuerta-espaco-totalizado	UND	1,00	$	572.923,00
NP 40	Desmonte de luminaria para altura hasta 3 metros con escalera	UND	1,00	$	14.775,00
NP 41	Desmonte de luminaria altura mayor a 3 metros con andamio certificado	UND	1,00	$	222.217,00
NP 42	Instalación de luminaria escenario deportivo hasta 3 mts con escalera	UND	1,00	$	18.588,00
NP 43	Instalación de luminaria en altura con escalera tipo extensión altura superior a 4 mts	UND	1,00	$	301.189,00
NP 44	Instalación de luminaria escenario deportivo h=2 a 3 mts con andamio certificado	UND	1,00	$	272.846,59
NP 45	Instalación de luminaria alumb publico con plataforma trabajo altura	UND	1,00	$	489.784,00
NP 46	Desmonte kit de luminaria 400w, arranc, cond, redactancia	UND	1,00	$	21.686,00
NP 47	Sum + inst caja rawelt 4 salidas 3/4"-2.400 (4x4)	UND	1,00	$	25.049,00
NP 48	Totalizador 3 x 60 amp (sum+inst.)	UND	1,00	$	125.590,00
NP 49	Acometida en cable aluminio 3#4 + 1#4 awg 600v	ML	1,00	$	31.962,00
NP 50	Acometida de cable en aluminio 4(3X350) F + 1X2/0 T THNN-AWG (sum+instalación)	ML	1,00	$	336.147,00
NP 51	Simulación fotométrica de coliseos	UND	1,00	$	1.380.804,00
NP 52	Apuntamiento de proyectores según diseño de iluminación	UND	1,00	$	34.666,00
NP 53	Desmonte de luminaria en altura con escalera tipo extensión altura superior a 4 mts	UND	1,00	$	253.429,00

Sin otro particular,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (65) folios
Con copia: N/A
Elaboró: KA
Revisó: N/A

SOLIUN INGENIERÍA | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

NIT. 901.114.547-5

IDRD-3131-2024-178

Bogotá D.C., 05 de enero de 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. IDRD
No. 20242100004012 Código Web: V4sM)8
FECHA:05-01-2024 11:02:36 FOLIOS: 19
RADICADOR: DANNA SOFÍA QUINCHE MONTAÑA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: SOLIUN INGENIERIA S.A.S
ASUNTO: REMISION INFORME SEMANAL DE INTERVENTORI
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: **Contrato de interventoría No. 3131-2023** cuyo objeto es: ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 16**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 16, para el periodo comprendido entre el 24 de diciembre de 2023 y el 30 de diciembre de 2023.

Lo anterior para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (18) folios
Con copia: N/A
Elaboró: KA
Revisó: N/A

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

INFRAESTRUCTURA IDRD - IDRD-3131-2024-180 Reiterada solicitud de atención a compromisos

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 5 de enero de 2024, 12:51
Para: CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com>, edna constanza qq <ednacoce@gmail.com>, Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>, Monica Rodriguez <monicagahona@gmail.com>

Buenas tardes

Enviamos oficio IDRD-3131-2024-180 Reiterada solicitud de atención a compromisos para su conocimiento y trámite correspondiente

--

CORDIALMENTE:

SOLIUN

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

IDRD-3131-2024-180 Reiterada solicitud de atención a compromisos.pdf
220K

775

SOLIUN INGENIERÍA | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

NIT. 901.114.547-5

IDRD-3131-2024-180

Bogotá D.C., 5 de enero de 2024

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Atn. Juan Camilo Mosquera Mosquera
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: "**CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Asunto: **Reiterada solicitud de atención a compromisos**

Teniendo en cuenta los compromisos relacionados con el componente de calidad, los cuales recordamos deben cumplir de manera permanente durante la ejecución del proyecto, solicitamos nuevamente se realice entrega semanal del listado de materiales por frente de obra, actualizado el primer día hábil de cada semana, en el cual se registren los materiales ingresados a obra durante la semana anterior; este debe ser entregado el día de hoy con la información correspondiente al periodo comprendido entre el 17 diciembre de 2023 y 5 de enero de 2024, lo cual no ha sido reportado.

De igual forma reiteramos se realice la entrega del informe mensual de calidad N°4 cuyo compromiso de entrega se surtiría el pasado viernes 29 de diciembre de 2023.

Agradecemos se realice la entrega de estos compromisos el día de hoy 5 de enero de 2024

Cordialmente,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboró: VLU

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Atraso programación Alta Blanca y Simón Bolívar.

1 mensaje

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 11 de enero de 2024, 9:21
Para: CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

IDRD-3131-2024-181- Atraso programación Alta Blanca y Simón Bolívar..pdf
293K

777

IDRD-3131-2023-181

Bogotá D.C., 09 de enero de 2023

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Atn. Juan Camilo Mosquera Mosquera
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: "**CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD**".

Asunto: **Atraso programación Parques Alta Blanca y Simón Bolívar**

Cordial Saludo,
De acuerdo con la revisión al Cronograma de parques Priorizados presentados por el CONSORCIO PARQUES BOG, el día 28 de diciembre de 2023, según oficio CTO IDRD 3099 2023-155, informamos que a la fecha de corte 6 de enero de 2023, se registra un atraso en la programación así:

1. Parque Simón Bolívar.

Zona de Kioskos (esmalte sobre lámina llena)
Zona de Tanques.
Es importante la entrega del PMT del parque Simón Bolívar, para poder realizar la evacuación, transporte y retiro de escombros. A la fecha, no se ha recibido este documento avalado por SDM.

2. Parque Alta Blanca.

En Zona de baños
Desmontes
Cubiertas
Espejos

De acuerdo con la programación estas actividades están reflejando atraso. Se le solicita la Contratista ponerse al día con estas actividades en consideración a que empezaron el mes anterior y no se han iniciado, a la fecha del corte.

Por otra parte, según la revisión realizada a los Presupuestos Priorizados, según oficio CTO IDRD 3099 2023-152, para el parque Alta Blanca, se encuentra que no están actualizadas las cantidades de obra y hay actividades que no corresponden a las que realmente se deben ejecutar en obra. Por ejemplo:

- En la pista de patinaje el piso que se arregla, no es baldosín de granito pulido, sino piso en granito pulido (se deben ajustar las cantidades).
- No debe ser suministro e instalación de orinal seco; es un orinal que está en la obra y se debe montar.
- Mantenimiento para la malla del cerramiento en algunos tramos.

Por lo anterior, se le solicita ajustar estos presupuestos acorde con las cantidades que realmente se van a ejecutar.

Cordialmente,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboró: L.M.

SOLIUN INGENIERÍA | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

NIT. 901.114.547-5

IDRD-3131-2024-182

Bogotá D.C., 11 de enero de 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20242100009472 Código Web: MCoQO5
FECHA:11-01-2024 14:50:31 FOLIOS: 1024
RADICADOR: KATHERIN ANDREA GONZALEZ MURIL
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: SOLIUN INGENIERIA S.A.S
ASUNTO: REMISIÓN INFORMES MENSUAL DE INTERVENTOR
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: **Contrato de interventoría No. 3131-2023** cuyo objeto es: ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **REMISIÓN INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA No. 4.**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir los informes mensuales de interventoría No. 4, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2023 para el contrato descrito, los cuales se relacionan a continuación:

INFORME	FOLIOS
COMPONENTE SOCIAL	1 – 219 (01) Tomo
COMPONENTE AMBIENTAL	220 – 258 (01) Tomo
COMPONENTE CALIDAD	259 – 539 (02) Tomos
COMPONENTE TÉCNICO	540 – 954 (02) Tomos
COMPONENTE SST	955 – 1023 (01) Tomo

Lo anterior para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (1023) folios en (07) tomos
Con copia: N/A
Elaboró: KA
Revisó: N/A

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Solicitud Propuesta Estructura de Piso

1 mensaje

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 11 de enero de 2024, 12:36
Para: CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com>
Cc: Luis Fernando Mondragón Camacho <fermonca65@gmail.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--

CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

IDRD-3131-2024-183- Solicitud Propuesta Estructura de Piso.pdf
205K

780

IDRD-3131-2024-183

Bogotá D.C., 11 de enero de 2024

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Atn. Juan Camilo Mosquera Mosquera
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Asunto: **Solicitud Propuesta Estructura de Piso Zona de Juegos Infantiles cerca de la zona de Grecoromanos. Parque Bosques de San Carlos – Cod. 18-028**

Cordial Saludo,

Esta Interventoría SOLIUN INGENIERÍA SAS, solicita nuevamente al contratista de obra CONSORCIO PARQUES BOG, entregar la propuesta concerniente a la estructura del piso zona de juegos infantiles cerca a los grecoromanos, ya que en el sitio se han encontrado raíces superficiales de los árboles adyacentes a la zona de intervención, esta propuesta se ha solicitado en comité de obras anteriores, sin que a la fecha la hayan entregado, con el fin de iniciar las actividades constructivas inmediatamente y a si no ver entorpecido las actividades y poder entregar el parque en la fecha estipulada. Igualmente, de acuerdo a la propuesta entregada se debe ajustar el presupuesto del parque.

Por lo anteriormente mencionado se solicita de manera inmediata entregar la propuesta solicitada para poder ser revisada y avalada por esta interventoría y enviarlos a la entidad contratante el IDRD,

Cordialmente,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboró: L.F.M.
Reviso: E.C.C.

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Falta de personal para ejecutar obras. Parque Villa de los Alpes – Cod. 04-075

1 mensaje

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 11 de enero de 2024, 12:37
Para: CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--

CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

IDRD-3131-2024-184- Falta de personal para ejecutar obras. Parque Villa de los Alpes – Cod. 04-075.pdf
210K

782

IDRD-3131-2024-184

Bogotá D.C., 08 de enero de 2024

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Atn. Juan Camilo Mosquera Mosquera
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Asunto: **Falta de personal para ejecutar obras. Parque Villa de los Alpes – Cod. 04-075**

Cordial Saludo,

Esta Interventoría SOLIUN INGENIERÍA SAS, solicita al contratista de obra CONSORCIO PARQUES BOG., contratar mas personal de obra para realizar las actividades pendientes en el Parque Villa de los Alpes, ya que se evidencia poco personal y están pendientes actividades por iniciar o ejecutar como:

1. Suministro e instalación de flanche sobre cubierta en el coliseo costado oriental.
2. Inicio del mantenimiento y pintura en la zona de los biosaludables.
3. Inicio de mantenimiento y pintura en la zona ruta de la vida.
4. Inicio pintura módulo M5 (columpios).
5. Inicio arreglo puerta y marco zona de cafetería.

Por lo anteriormente mencionado se solicita de manera inmediata entregar la propuesta solicitada para poder ser revisada y avalada por esta interventoria y enviarlos a la entidad contratante el IDRD,

Cordialmente,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboró: L.F.M.
Reviso: E.C.C.

SOLIUN INGENIERÍA | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

NIT. 901.114.547-5

IDRD-3131-2024-185

Bogotá D.C., 04 de enero de 2024

Sticker web https://orfeo.idrd.gov.c...

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. IDRD
No. 20242100010632 Código Web:
FECHA:12-01-2024 14:42:59 FOLIOS: 3
RADICADOR: MARISOL CARDONA HINCAPIE
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: SOLIUN SAS
ASUNTO: REMISION COMPROBANTE DE PAGO RENDIMIENTO
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 69A - 08 PBX: 660 6400

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Asunto: **REMISIÓN COMPROBANTE DE PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE DE 2023**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir el comprobante de pago de los rendimientos financieros provenientes del manejo del anticipo para el mes de noviembre de 2023.

Lo anterior con el fin de que repose en el expediente del contrato.

Sin otro particular,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (02) folios
Con copia: N/A
Elaboró: KA
Revisó: N/A

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Remisión acta de fijación de precios no previstos No. 3

2 mensajes

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 11 de enero de 2024, 11:52
Para: Angelica Maria Romero Hernandez <angelica.romero@idrd.gov.co>, IDRD Correspondencia <idrdcorrespondencia@idrd.gov.co>
Cc: CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN
KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS
Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

8 adjuntos

- **1. ACTA_DE_APROBACION_ACTIVIDADES_NO_PREVISTAS No.3.pdf** 596K
- **4. MEMORANDO DE APROBACIÓN INSUMOS IDRD.pdf** 184K
- **5. FICHAS TÉCNICAS.rar** 891K
- **1. ACTA_DE_APROBACION_ACTIVIDADES_NO_PREVISTAS No.3.xls** 157K
- **3. LISTA DE INSUMOS CONTRACTUALES.pdf** 2072K
- **2. NO PREVISTOS BASE CIO No 3.xlsx** 1161K
- **IDRD-3131-2024-186- Remisión acta de fijación de precios no previstos No. 3.pdf** 299K
- **2. NO PREVISTOS BASE CIO No 3.pdf** 4560K

IDRD Correspondencia <idrdcorrespondencia@idrd.gov.co> 11 de enero de 2024, 12:50
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Buen día.

El IDRD le informa que su comunicación se radicó en el Sistema de Información

Documental de la entidad con el número **20242100009212**

Su requerimiento es un tramite

Recuerde que los términos de respuesta para PQRSD (Petición, Queja, Reclamo,

785

IDRD-3131-2024-186

Bogotá D.C., 11 de enero de 2024

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Asunto: **REMISIÓN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 3**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir el acta de fijación de precios no previstos No. 3 del contrato de obra descrito en la referencia, la cual fue allegada por el CONSORCIO PARQUES BOG vía correo electrónico, debidamente verificados y avalados por esta interventoría, se aclara que se remiten los APUS NP que no cuentan con precio de referencia CIO con las correspondientes cotizaciones.

Se aclara que conforme a lo establecido en la *CLAUSULA DECIMA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS* del contrato de obra pública No. 3099 de 2023, numeral *30,* nos permitimos remitir:

- Acta de fijación de precios no previstos 3
- Análisis de precios unitarios no previstos (NP – 54 al NP – 58)
- Listado de insumos

Los Análisis de precios unitarios no previstos mencionados anteriormente, se encuentran relacionados en los documentos anexos de la siguiente manera:

ITEM	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
NP 54	Estación de equilibrio Parkour 6 Elementos	UND	1,00	$ 157.059.610,00
NP 55	Estación de equilibrio Parkour 5 Elementos	UND	1,00	$ 204.109.486,00
NP 56	Estación de equilibrio Parkour 16 Elementos	UND	1,00	$ 296.370.756,00

NP 57	Estación de equilibrio Parkour 11 Elementos	UND	1,00	$	168.960.438,00
NP 58	Estación de equilibrio Parkour 13 Elementos	UND	1,00	$	239.613.939,00

Lo anterior para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (311) folios
Con copia: N/A
Elaboró: KA
Revisó: N/A

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

INFRAESTRUCTURA IDRD IDRD-3131-2024-187 Respuesta correo electrónico 9 enero 2024 listado de materiales

1 mensaje

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 11 de enero de 2024, 11:44
Para: CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com>, "ING. MONICA RODRIGUEZ G" <gaonamr@yahoo.com.ar>, Monica Rodriguez <monicagahona@gmail.com>, edna constanza qq <ednacoce@gmail.com>, Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Buenos dias

Enviamos IDRD-3131-2024-187 Respuesta correo electrónico 9 enero 2024 listado de materiales, para su conocimiento y trámite correspondiente

--

ORDIALMENTE:

SOLIUN

VIANNEY LEAÑO
INGENIERA CIVIL > CALIDAD / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

IDRD-3131-2024-187 Respuesta correo electrónico 9 enero 2024 listado de materiales.pdf
346K

787

IDRD-3131-2024-187

Bogotá D.C., 11 de enero de 2024

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Atn. Juan Camilo Mosquera Mosquera
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Asunto: **Respuesta correo electrónico 9 enero 2024 listado de materiales**

Dando alcance al correo electrónico del pasado 9 de enero de 2024 en el cual referencian la entrega del listado de materiales ingresados a obra, informamos que la documentación entregada y de acuerdo a lo establecido en el Plan de Calidad aprobado para el proyecto corresponde al seguimiento de los materiales en obra, formato en el cual se registra la trazabilidad y liberación de las certificaciones y ensayos correspondientes.

Así las cosas, y de acuerdo a los materiales y las actividades ejecutadas en cada frente de obra, se evidencia que el formato presentado no corresponde a al control de ingreso de materiales y que el formato "SEGUIMIENTO DE MATERIALES" se encuentra desactualizado; por lo anterior, solicitamos nuevamente se realice entrega semanal del listado de materiales por frente de obra, actualizado el primer día hábil de cada semana, en el cual se registren los materiales ingresados a obra durante la semana anterior; en el cual se refleje el frente de obra al cual ingresa, material o insumo, unidad de medida, cantidad recibida, proveedor y fecha de ingreso.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, adjuntamos el ultimo listado de materiales suministrado por ustedes, para que se tenga en cuenta la fecha a partir de la cual esta pendiente el reporte hasta el día de hoy

Agradecemos se realice la entrega de estos compromisos el día de mañana 12 de enero de 2024

Cordialmente,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: LISTADO DE MATERIALES 4 FOLIOS
Con copia: N/A
Elaboró: VLU

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Remisión de Solicitud SST

1 mensaje

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 11 de enero de 2024, 16:00
Para: CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com>, Ingrid Baez <residentesst3099@gmail.com>

Buenas Tardes,

Se remite oficio para su conocimiento y fines pertinentes.

CORDIALMENTE:

SOLIUN

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

IDRD-3131-2024-188 - Solictud SST.pdf
421K

IDRD-3131-2024-188

Bogotá D.C., 11 de enero de 2024

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Atn. Juan Camilo Mosquera Mosquera
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad


Referencia: Contrato de obra No. **3099-2023** cuyo objeto es: ***"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **Solicitud Componente SST**


Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras funciones como interventores del contrato y teniendo en cuenta las obligaciones contractuales establecidas en el Anexo Técnico y SG-SST de acuerdo a la normatividad vigente.

1. En atención a lo evidenciado y observado al contratista **CONSORCIO PARQUES BOG**, en lo referente a las actividades que se adelantan en los frentes de obra del Parque **Tunal**, el día de ayer 10 de enero de 2024 se encontro desorden y falta de organización de materiales y residuos de obra.

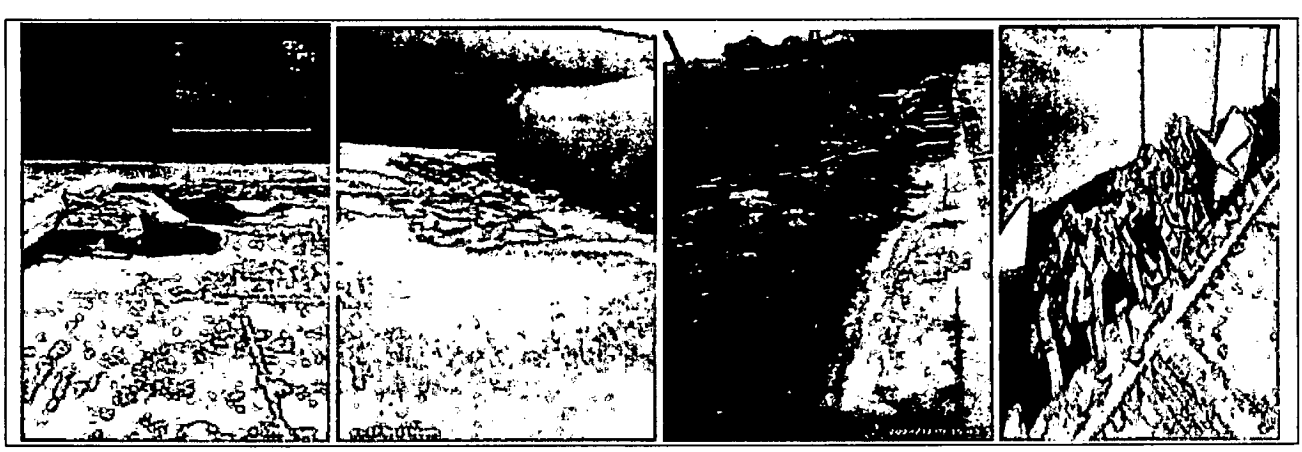

2. En el Parque Ciudad Montes se evidencio también falta de aseo, como también se solicita los documentos de ingreso de un vigilante Oreste Segovia que se encontró en este parque sin dotación.

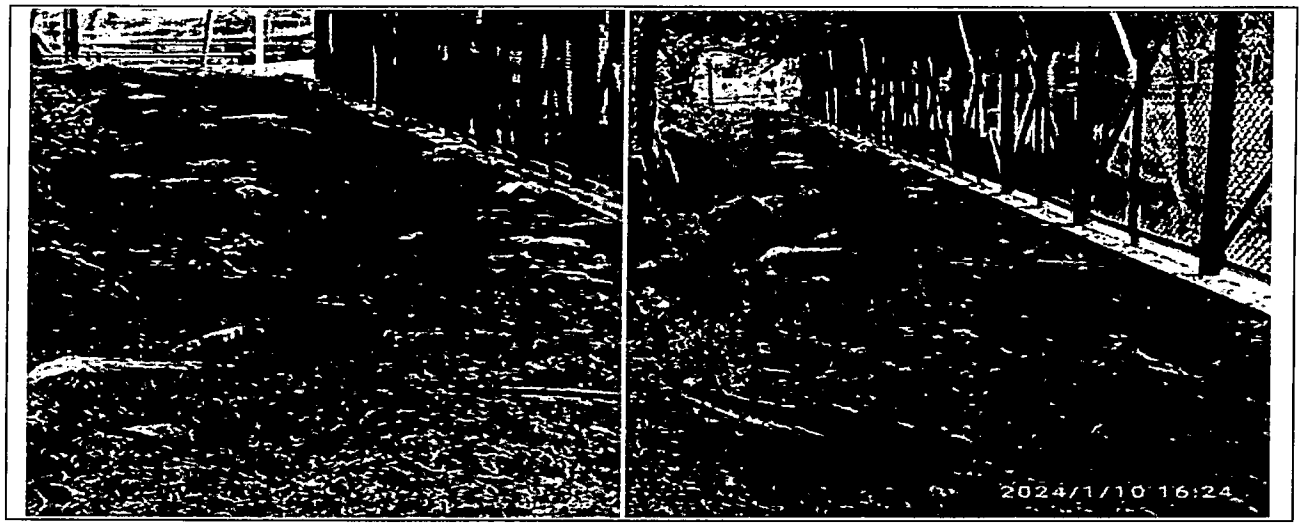

3. Se solicita la entrega de dotación del cadenero David Muete que se encontró el día de ayer en el Parque de los niños solo tenia las botas de seguridad pendiente la demás dotación.

Quedamos atentos a la subsanación y respuesta de las observaciones en un tiempo perentorio de (1) día hábil a partir del recibido del presente oficio.

Atentos a su respuesta,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: N/A
Con copia: IDRD
Elaboró: YCA

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Desarrollo de Actividades Parque Alta Blanca.

1 mensaje

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 15 de enero de 2024, 17:11
Para: CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--

ORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

IDRD-3131-2024-189- Desarrollo de Actividades Parque Alta Blanca..pdf
219K

791

IDRD-3131-2023-189

Bogotá D.C., 13 de enero de 2023

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Atn. Juan Camilo Mosquera Mosquera
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: "**CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Asunto: **Desarrollo de Actividades Parque Alta Blanca.**

Cordial Saludo,

La Interventoría SOLIUN INGENIERÍA SAS, se permite recordarle que el acuerdo con el Administrador del Escenario, es entregar la totalidad de los arreglos de la pista de patinaje para el día 20 de enero de 2024; por lo tanto, se le solicita al CONSORCIO PARQUES BOG, agilizar estos trabajos e implementar los recursos que sean necesarios para poder entregar a satisfacción en la fecha convenida.

Cordialmente,

RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboró: L.M.

SOLIUN INGENIERÍA | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

NIT. 901.114.547-5

IDRD-3131-2024-190

Bogotá D.C., 15 de enero de 2024

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: **Contrato de interventoría No. 3131-2023** cuyo objeto es: ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 17**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 17, para el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2023 y el 6 de enero de 2024.

Lo anterior para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20242100012782 Código Web:+x&XN9
FECHA:15-01-2024 15:08:17 FOLIOS: 17
RADICADOR: ANGIE STEPHANY PORRAS ROMERO
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: SOLIUN SAS
ASUNTO: REMISION INFORME SEMANAL DE INTERVENTORI
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 05 PBX: 660 5400

Anexos: Lo referido en (16) folios
Con copia: N/A
Elaboró: KA
Revisó: N/A

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Entrega y realización de ensayos de laboratorio Ciudad Montes

1 mensaje

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 15 de enero de 2024, 17:14
Para: CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

IDRD-3131-2024-191 - Entrega y realización de ensayos de laboratorio Ciudad Montes.pdf
201K

794

IDRD-3131-2024-191

Bogotá D.C., 13 de enero de 2023

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Atn. Juan Camilo Mosquera Mosquera
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Asunto: **Desarrollo de Actividades Parque Alta Blanca.**

Cordial Saludo,

Esta Interventoría SOLIUN INGENIERÍA SAS, solicita al contratista de obra CONSORCIO PARQUES BOG., la entrega de los resultados de los cilindros de concreto fallados en laboratorio, los cuales fueron tomados el día 15 de diciembre del 2023, para la conformación de la viga de cerramiento del Parque Ciudad Montes sobre la Cra 40 y a la fecha no han sido entregado los resultados.

Igualmente se requiere para los trabajos de soldadura la inspección visual y el ensayo de tintas de los elementos que se hayan soldado y que se estén soldando en sitio, concerniente a los módulos de las mallas de cerramiento, ensayos que determinan la adherencia de los materiales e inspecciones de las uniones soldadas.

Por lo anteriormente mencionado se solicita de manera inmediata la entrega de los resultados de los ensayos de los cilindros de concreto tomados para fundir la viga de cerramiento sobre la cra 40., y realizar los ensayos de tintas de las soldaduras en los módulos de cerramiento.
Cordialmente,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboró: L.F.M.
Reviso: E.C.C.

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Respuesta correo electrónico - intervenciones parque de los niños

1 mensaje

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 15 de enero de 2024, 17:23
Para: CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

IDRD-3131-2024-192 - Respuesta correo electrónico - intervenciones parque de los niños.pdf
430K

796

IDRD-3131-2024-192

Bogotá D.C., 15 de enero de 2023

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Atn. Juan Camilo Mosquera Mosquera
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Asunto: **Respuesta correo electrónico – Intervenciones parque de los niños**

Cordial Saludo,

En atención al comunicado del asunto, se remite respuesta correspondiente:

OBSERVACIONES COMPONENTE DE GEOTECNIA:
REVISIÓN ESTRUCTURA PARQUEADERO PARQUE DE LOS NIÑOS

- **REVISIÓN ESTRUCTURA ZONA DE PARQUEADERO:**
  - Con relación a los apiques realizados no se aporta el registro fotográfico ni plano de ubicación de los sondeos con lo que se calculó el CBR de diseño.

  - En el cálculo del CBR de diseño se tomó como valor preliminar el promedio de los apiques A1 Y A2, equivalente a 1.35, sin embargo se requiere aportar la ubicación de los sondeos y registro fotográfico que evidencie que los sondeos se realizaron en la zona donde se plantea el diseño.

  - El módulo resiliente fue rectificado mediante la expresión Keukelom y Klomp (1962):

$$Mr = 1500 * CBR$$
$$Mr = 1500 * 1.35 = 2025\ psi$$

  - Considerando que se trata de un parqueadero, de poco uso debido a su baja capacidad de ingreso se recomienda seguir lo propuesto en el documento **"GUÍA DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA BAJOS VOLÚMENES DE TRÁNSITO Y VÍAS LOCALES PARA BOGOTÁ D.C."** a partir de la cual se recomienda seguir las siguientes consideraciones:

    - Tránsito de diseño del parqueadero:

Tabla 1.1 Categorías de tránsito IDU

Categoría de tránsito	Nivel de tránsito	
	Criterio 1(VPDo)	Criterio 2 (NAEE 80, millones)
T0	VPDo < 20	NAEE 80 < 0.2
T1	20 ≤ VPDo < 50	0.2 ≤ NAEE 80 < 0.5
T2	50 ≤ VPDo < 150	0.5 ≤ NAEE 80 < 1.5
T3	150 ≤ VPDo < 300	1.5 ≤ NAEE 80 < 3.0
T4	300 ≤ VPDo < 750	3.0 ≤ NAEE 80 < 7.5
T5	VPDo ≥ 750	NAEE 80 ≥ 7.5

- Clasificación de la subrasante para suelo de Bogotá:

Tabla 3.4 Tipos de subrasante para Bogotá

Tipo de Subrasante	CBR (%)	Modulo Resiliente (MPa)
SR1	< 1.5	< 11.25
SR2	1.5 – 2.5	11 – 19
SR3	2.5 – 3.5	19 – 26
SR4	3.5 – 4.0	26 – 40
SR5	> 4.0	> 40

- Periodo de diseño pavimento flexible:

Tabla 4.6 Periodo de diseño

Tipo de pavimento	Periodo de diseño (años)
Flexible	10
Rígido	20
Articulado	10

- El transito propuesto por el contratista para el caso de la estructura del pavimento flexible se debe aclarar que le caso de la proyección del tránsito, el especialista del contratista plantea 500000 EE de 8.2 T. En la propuesta de interventoría basada en la **"GUÍA DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA BAJOS VOLÚMENES DE TRÁNSITO Y VÍAS LOCALES PARA BOGOTÁ D.C."** se plantea un tránsito de 200000 EE de 8.2 T en un periodo de 10 años, lo que se traducirá en el paso de 54 Ejes Equivalentes de 8.2 Toneladas diariamente. Corresponde al paso diario de 13 veces del vehículo C-2G (3.92).

  - Se realiza la verificación de la estructura de pavimento mediante el método AASHTO 93, obteniendo el número estructural requerido de SN de 3.38 para el tránsito 200000 EE de 8.2 T.

  - Teniendo en cuenta las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CARRERETERAS – INVIAS 2022, se recomienda:


Tabla 450 – 6. Tipo de mezcla por utilizar en función del tipo y espesor compacto de la capa

Tipo de capa	Espesor de capas de compactación (mm)	Tipo de mezcla
Rodadura	30 – 40	MDC-10
	40 – 60	MDC-19, MSC-19
	> 60	MDC-25, MDC-19, MSC-19, MAM-19
Intermedia	> 50	MDC-25, MSC-25
Base	> 75	MSC-25, MGC-38, MGC-25
	60 – 130	MAM-25
Bacheos	50 – 75	MSC-25, MGC-25
	> 75	MSC-25, MGC-38, MGC-25

A continuación, se presenta el resumen del modelamiento por el método AASHTO 93 de la zona de PARQUEADERO.

CALCULO CBR's de DISEÑO	
TRAMO	CBR Diseño
A1	1.5
A2	1.2
PROMEDIO	1.35
CBR DE DISEÑO	1.35
Mr* (PSI)	2025

MODELAMIENTO MÉTODO AASHTO - PAVIMENTO FLEXIBLE	
VARIABLES DE ENTRADA	
CBR DE DISEÑO:	1.35
Modulo Resiliente de la subrasante, Mr PSI	2025
Confiabilidad, R:	90%
Desviación Estandar, So:	0.44
Servicialidad Inicial	4.2
Servicialidad final	2.0
Pérdida de servicialidad	2.2
Coeficiente estructural a1 MDC-19	0.3
Coeficiente estructural a2 Base Granular	0.14
Coeficiente estructural a3 Subbase Granular	0.12
Coeficiente de drenaje m2 y m3	1.0

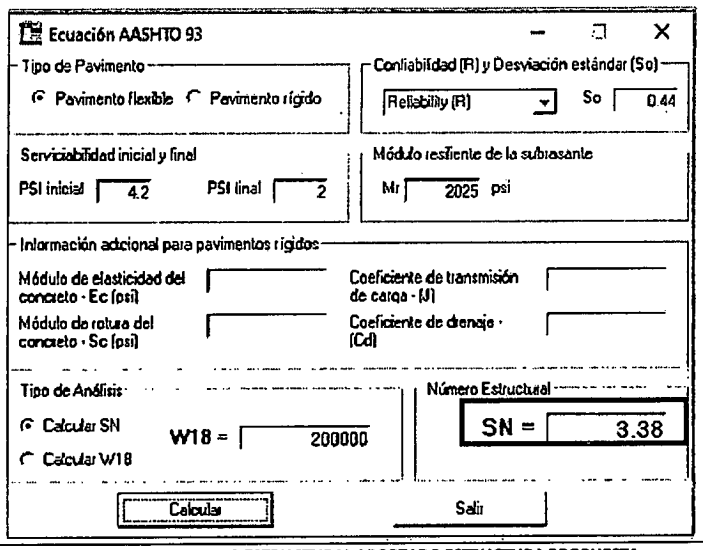

CALCULO DEL NUMERO ESTRUCTURAL APORTADO ESTRUCTURA PROPUESTA						
ESTRUCTURA ANALIZADA		PARQUE DE LOS NIÑOS_ZONA DE PARQUEADERO				
EJES EQUIVALENTES 8,2 T		200 000				
Mr* (PSI)		2 025				
NO. CAPA	DESCRIPCIÓN	ESPESOR		ai	Mi	SNI
		cm	Pulg.	(De tablas)		
1	MDC-19	8	3.15	0.30		0.95
2	BASE GRANULAR	20	7.87	0.14	1.0	1.10
3	SUBBASE GRANULAR	30	11.81	0.12	1.0	1.42
	GEOTEXTIL T-2100					
4	SUBRASANTE					

SN TOTAL ESTRUCTURA CALCULADA	3.47
SN TOTAL ESTRUCTURA REQUERIDA	3.38
SN REQ < SN CAL	Cumple

➢ **ESTRUCTURA RECOMENDADA POR INTERVENTORÍA:**

Capa Asfáltica (MDC-19) de 8 cm.
Base granular (BG-1) de 20 cm.
Subbase granular (SBG-1) de 30 cm.
Geotextil T-2100

➢ **RECOMENDACIONES GENERALES:**

1. Se solicita al especialista del contratista presentar el registro fotográfico y evidencia que los CBRs tomados corresponden a la ubicación de la zona de parqueadero del parque de los niños.

2. El asfalto para capas de rodadura recomendado es MDC-19 acorde a especificación INVIAS 2022. Acorde al modelamiento realizado, se considera suficiente un espesor de pavimento asfáltico MDC-19 de 8 cm de espesor.

3. Las capas granulares recomendadas corresponden respectivamente BG-1 Y SBG-1. No se recomienda el uso de granulares tipo PEA.

4. El geotextil a emplear se considera suficiente un geotextil tejido T-2100.

5. El mejoramiento solamente deberá incorporarse en aquellas zonas donde se evidencie la presencia de fallos o material orgánico, esto será aprobado únicamente con previa conciliación del residente de interventoría en campo.

6. El plano presentado carece de las pendientes a proponer para el manejo de las aguas, esto requieres ser complementado.

Cordialmente,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos:	N/A
Con copia:	N/A
Elaboró:	CF
Reviso:	N/A

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

INFRAESTRUCTURA IDRD IDRD-3131-2024-193 Respuesta CTO-IDRD-3099-2023-166

1 mensaje

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 15 de enero de 2024, 19:24
Para: CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com>, Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>, ANDRES PULIDO <apulido@lydonline.com>, "ING. MONICA RODRIGUEZ G" <gaonamr@yahoo.com.ar>

Buenas noches

Enviamos oficio IDRD-3131-2024-193 Respuesta CTO-IDRD-3099-2023-166 para trámite correspondiente

--

CORDIALMENTE:

SOLIUN

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

IDRD-3131-2024-193 Respuesta CTO-IDRD-3099-2023-166.pdf
217K

799

SOLIUN INGENIERÍA | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

NIT. 901.114.547-5

IDRD-3131-2024-193

Bogotá D.C., 15 de enero de 2024

Señores
CONSORCIO PARQUES BOG
Atn. Juan Camilo Mosquera Mosquera
Representante Legal
CR 15 90 64 OF 402
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 3099-2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Asunto: **Respuesta CTO-IDRD-3099-2023-166**

Teniendo en cuenta los resultados de laboratorio correspondientes al adoquín de arcilla instalado en el Parque el Tunal, presentados con el oficio CTO-IDRD-3099-2023-166, solicitamos se presente el soporte de verificación y liberación por parte del profesional de calidad del Consorcio

Cordialmente,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboró: VLU
