1703-26/0025 (Al contestar cite este número)
Villavicencio, 23 de enero de 2024

Señores
CONSORCIO INTER SEMAFORICAS 2023,
R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTORIA
Ciudad.

Ref: CONTRATO 2546 DE 2023, modificación de cantidades de obra y suministro según acta de adición nro. 01 del 11 de diciembre de 2023.
Asunto: Requerimientos para presentación de informes al secretario de Movilidad, Alcalde, Contraloría y Personería municipal


De acuerdo con la referencia, me permito solicitarle a usted presentar informe sobre el avance, actividades y resultados obtenidos con respecto a la interventoría desarrollada desde el 5 de septiembre de 2023 hasta el 18 de enero de 2023, teniendo como presente lo siguiente:

Con la ejecución del contrato de interventoría **No. 2577 de 2023** cuyo objeto contractual es: "**INTERVENTORIA PARA REALIZAR LA MODERNIZACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"**, se permite certificar la ejecución de las labores de seguimiento financiero, administrativo, jurídico y técnico con el fin de lograr la correcta ejecución del contrato de obra **No. 2546 de 2023** cuyo objeto contractual es **"REALIZAR LA MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".** Lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 32 de la ley 80 de 1993 el cual señala: " …En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto…" Igualmente se hizo necesario contratar esta interventoría si se tiene en cuenta lo señalado en el parágrafo 1 de artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 el cual establece: "…En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría…".


De conformidad con el No. 2577 DE 202, clausula 45. Desarrollar las actividades de seguimiento y control del contrato de obra objeto de interventoría verificando el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas y obligaciones

especiales fijadas para este; y a las exigencias propias de la interventoría, en sus diferentes ámbitos, ya registradas en este estudio previo, la supervisión le solicita formalmente y de forma inmediata indicar y suministrar la información relacionada con el desarrollo del contrato de obra nro. 2546 de 2023 y sus anexos lo siguiente:

1. En una tabla de Excel indicar el tipo de unidad, cantidad de elementos a suministrar e instalar, el valor unitario de cada elemento o actividad, el vr. Total de los elementos o actividades desarrolladas y el porcentaje de instalación de las cantidades contratadas a corte 17 de enero de 2024. Según acta de visita en campo practicada con funcionarios de la Personería y Contraloría Municipal, señalando al igual los grupos de cada control semafórico que se desprenden de la nota interna nro. 1703-19.18/1448, con respecto a la adición presupuestal según las condiciones contractuales iniciales de acuerdo al acta de adición 01 del 11 de diciembre de 2023 así:

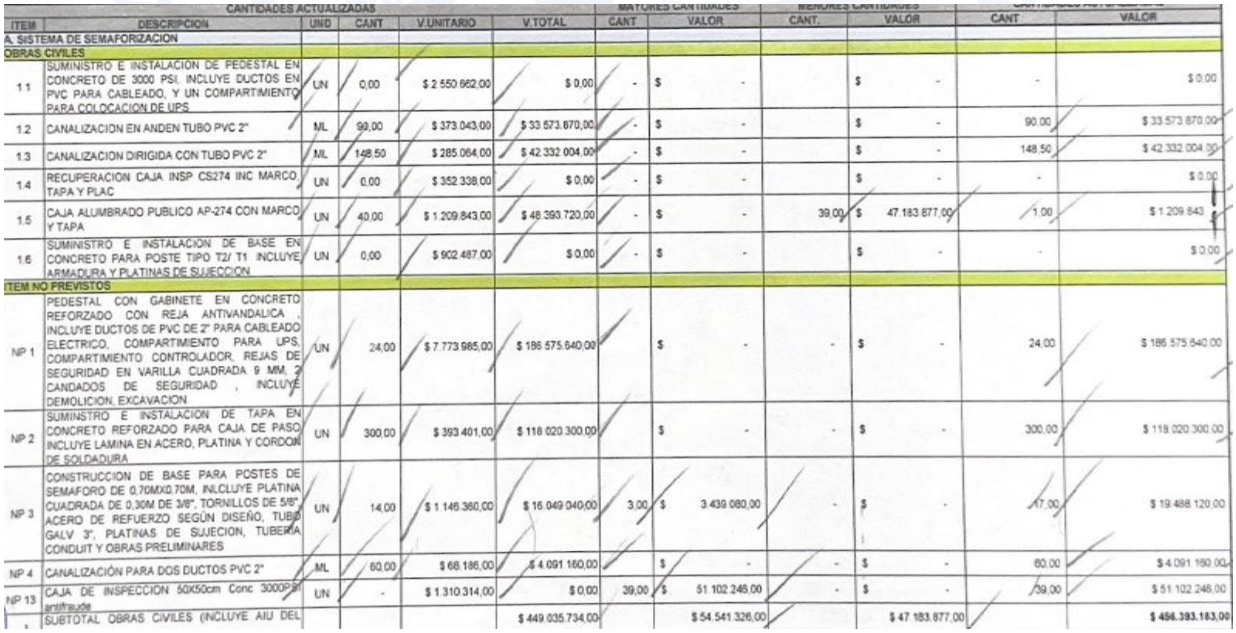


CANTIDADES ACTUALIZADAS						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
A. SISTEMA DE SEMAFORIZACION											
OBRAS CIVILES											
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE DUCTOS EN PVC PARA CABLEADO, Y UN COMPARTIMIENTO PARA COLOCACION DE UPS	UN	0,00	$ 2.550.662,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ 0,00
1.2	CANALIZACION EN ANDEN TUBO PVC 2"	ML	90,00	$ 373.043,00	$ 33.573.870,00	-	$ -		$ -	90,00	$ 33.573.870,00
1.3	CANALIZACION DIRIGIDA CON TUBO PVC 2"	ML	148,50	$ 285.064,00	$ 42.332.004,00	-	$ -		$ -	148,50	$ 42.332.004,00
1.4	RECUPERACION CAJA INSP. CS274 INC MARCO, TAPA Y PLAC	UN	0,00	$ 352.338,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ 0,00
1.5	CAJA ALUMBRADO PUBLICO AP-274 CON MARCO Y TAPA	UN	40,00	$ 1.209.843,00	$ 48.393.720,00	-	$ -	39,00	$ 47.183.877,00	1,00	$ 1.209.843
1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE EN CONCRETO PARA POSTE TIPO T2/ T1 INCLUYE ARMADURA Y PLATINAS DE SUJECCION	UN	0,00	$ 902.487,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ 0,00
ITEM NO PREVISTOS											
NP 1	PEDESTAL CON GABINETE EN CONCRETO REFORZADO CON REJA ANTIVANDALICA , INCLUYE DUCTOS DE PVC DE 2" PARA CABLEADO ELECTRICO, COMPARTIMIENTO PARA UPS, COMPARTIMIENTO CONTROLADOR, REJAS DE SEGURIDAD EN VARILLA CUADRADA 9 MM, 2 CANDADOS DE SEGURIDAD , INCLUYE DEMOLICION, EXCAVACION	UN	24,00	$ 7.773.985,00	$ 186.575.640,00		$ -	-	$ -	24,00	$ 186.575.640,00
NP 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN CONCRETO REFORZADO PARA CAJA DE PASO, INCLUYE LAMINA EN ACERO, PLATINA Y CORDON DE SOLDADURA	UN	300,00	$ 393.401,00	$ 118.020.300,00		$ -	-	$ -	300,00	$ 118.020.300,00
NP 3	CONSTRUCCION DE BASE PARA POSTES DE SEMAFORO DE 0,70MX0,70M, INLCLUYE PLATINA CUADRADA DE 0,30M DE 3/8", TORNILLOS DE 5/8", ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑO, TUBO GALV 3", PLATINAS DE SUJECION, TUBERIA CONDUIT Y OBRAS PRELIMINARES	UN	14,00	$ 1.146.360,00	$ 16.049.040,00	3,00	$ 3.439.080,00	-	$ -	17,00	$ 19.488.120,00
NP 4	CANALIZACIÓN PARA DOS DUCTOS PVC 2"	ML	60,00	$ 68.186,00	$ 4.091.160,00		$ -	-	$ -	60,00	$ 4.091.160,00
NP 13	CAJA DE INSPECCION 50X50cm Conc 3000PSI antifraude	UN	-	$ 1.310.314,00	$ 0,00	39,00	$ 51.102.246,00	-	$ -	39,00	$ 51.102.246,00
	SUBTOTAL OBRAS CIVILES (INCLUYE AIU DEL				$ 449.035.734,00		$ 54.541.326,00		$ 47.183.877,00		$ 496.393.183,00

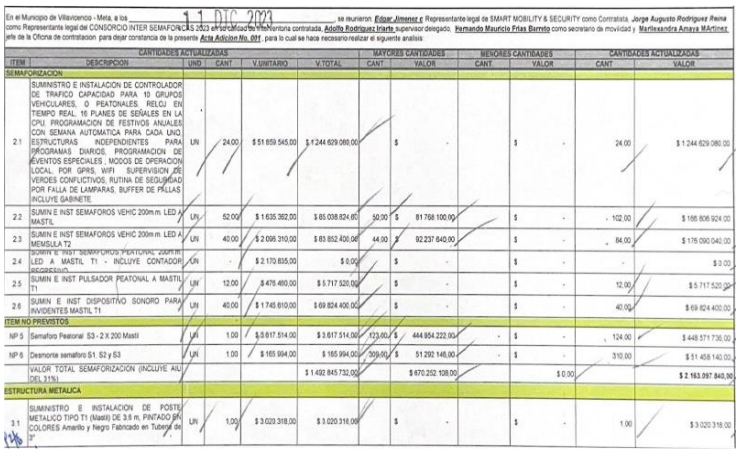

En el Municipio de Villavicencio - Meta, a los 11 DIC 2023 se reunieron **Edgar Jimenez c** Representante legal de SMART MOBILITY & SECURITY como Contratista, **Jorge Augusto Rodriguez Reina** como Representante legal del CONSORCIO INTER SEMAFORICAS 2023 en su calidad de Interventoria contratada, **Adolfo Rodriguez Iriarte** supervisor delegado, **Hernando Mauricio Frias Barreto** como secretario de movilidad y **Marllexandra Amaya Martinez** jefe de la Oficina de contratacion para dejar constancia de la presente **Acta Adicion No. 001**, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES ACTUALIZADAS UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	MAYORES CANTIDADES CANT	VALOR	MENORES CANTIDADES CANT	VALOR	CANTIDADES ACTUALIZADAS CANT	VALOR
SEMAFORIZACION											
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR DE TRAFICO CAPACIDAD PARA 10 GRUPOS VEHICULARES, 0 PEATONALES, RELOJ EN TIEMPO REAL, 16 PLANES DE SEÑALES EN LA CPU, PROGRAMACION DE FESTIVOS ANUALES CON SEMANA AUTOMATICA PARA CADA UNO, ESTRUCTURAS INDEPENDIENTES PARA PROGRAMAS DIARIOS, PROGRAMACION DE EVENTOS ESPECIALES , MODOS DE OPERACION LOCAL POR GPRS, WIFI SUPERVISION DE VERDES CONFLICTIVOS, RUTINA DE SEGURIDAD POR FALLA DE LAMPARAS, BUFFER DE FALLAS INCLUYE GABINETE	UN	24.00	$ 51.859.545,00	$ 1.244.629.080,00		$ -		$ -	24.00	$ 1.244.629.080,00
2.2	SUMIN E INST SEMAFOROS VEHIC 200m.m. LED A MASTIL	UN	52.00	$ 1.635.382,00	$ 85.038.824,60	50.00	$ 81.768.100,00		$ -	102.00	$ 166.806.924,00
2.3	SUMIN E INST SEMAFOROS VEHIC 200m.m. LED A MENSULA T2	UN	40.00	$ 2.098.310,00	$ 83.852.400,00	44.00	$ 92.237.640,00		$ -	84.00	$ 176.090.040,00
2.4	SUMIN E INST SEMAFOROS PEATONAL 200m.m. LED A MASTIL T1 - INCLUYE CONTADOR REGRESIVO	UN	-	$ 2.170.835,00	$ 0,00		$ -		$ -	-	$ 0,00
2.5	SUMIN E INST PULSADOR PEATONAL A MASTIL T1	UN	12.00	$ 478.460,00	$ 5.717.520,00		$ -		$ -	12.00	$ 5.717.520,00
2.6	SUMIN E INST DISPOSITIVO SONORO PARA INVIDENTES MASTIL T1	UN	40.00	$ 1.745.610,00	$ 69.824.400,00		$ -		$ -	40.00	$ 69.824.400,00
ITEM NO PREVISTOS											
NP 5	Semaforo Featonal S3 - 2 X 200 Mastil	UN	1.00	$ 3.617.514,00	$ 3.617.514,00	123.00	$ 444.954.222,00	-	$ -	124.00	$ 448.571.736,00
NP 6	Desmonte semaforo S1, S2 y S3	UN	1.00	$ 165.994,00	$ 165.994,00	309.00	$ 51.292.146,00	-	$ -	310.00	$ 51.458.140,00
	VALOR TOTAL SEMAFORIZACION (INCLUYE AIU DEL 31%)				$ 1.492.845.732,00		$ 670.252.108,00		$ 0,00		$ 2.163.097.840,00
ESTRUCTURA METALICA											
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO TIPO T1 (Mastil) DE 3.6 m, PINTADO EN COLORES Amarillo y Negro Fabricado en Tuberia de 3"	UN	1.00	$ 3.020.318,00	$ 3.020.318,00		$ -		$ -	1.00	$ 3.020.318,00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	MAYORES CANTIDADES CANT	VALOR	MENORES CANTIDADES CANT	VALOR	CANTIDADES ACTUALIZADAS CANT	VALOR
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO TIPO T1I (Mastil) DE 5 m, PINTADO EN COLORES Amarillo y Negro Fabricado en Tuberia de 3"	UN	1.00	$ 3.552.961,00	$ 3.552.961,00		$ -		$ -	1.00	$ 3.552.961,00
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 6 METROS Y ESTRUCTURA AJUSTABLE EN ALUMINIO PARA SOPORTAR 2 PANELES SOLARES DE 300 WATTS	UN	12.00	$ 4.525.427,00	$ 54.305.124,00		$ -		$ -	12.00	$ 54.305.124,00
ITEM NO PREVISTOS											
NP 7	SUMIN E INST MENSULAS S5 O 4.5 M INC ANCLAJE CONC	UN	1.00	$ 6.833.775,00	$ 6.833.775,00	2.00	$ 13.667.550,00		$ -	3.00	$ 20.501.325,00
	VALOR TOTAL ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE AIU DEL 31%)				$ 67.712.178,00	-	$ 13.667.550,00		$ 0,00		$ 81.379.728,00
COMPONENTES ELECTRICOS											
4.1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ELECTRICO 2X10 AWG PARA ACOMETIDA ELECTRICA	ML	800.00	$ 26.632,00	$ 21.305.600,00				$ -	800.00	$ 21.305.600,00
4.2	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ELECTRICO 3X16 AWG PARA CONTROL DE SEMAFOROS VEHICULARES	ML	2.408.00	$ 17.400,00	$ 41.899.200,00	4.920.00	$ 85.608.000,00		$ -	7.328.00	$ 127.507.200,00
4.3	SUMINEINST CABLE DE CONTROL 4X16 AWG 600 V	ML	1.283.00	$ 19.147,00	$ 24.565.601,00	8.231,00	$ 157.598.957,00		$ -	9.514.00	$ 182.164.558,00
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RESPALDO ELÉCTRICO (UPS DE 2 KVA 2000 VA A 110 VAC-60 HZ) CON CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA DE 900VATIOS / 1.44 KVA, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL 120V, FRECUENCIA DE SALIDA 50/60HZ +/- 3 HZ1, TIPO DE UPS INTERACTIVA DE	UN	1.00	$ 7.013.139,00	$ 7.013.139,00	1.00	$ 7.013.139,00		$ -	2.00	$ 14.026.278,00

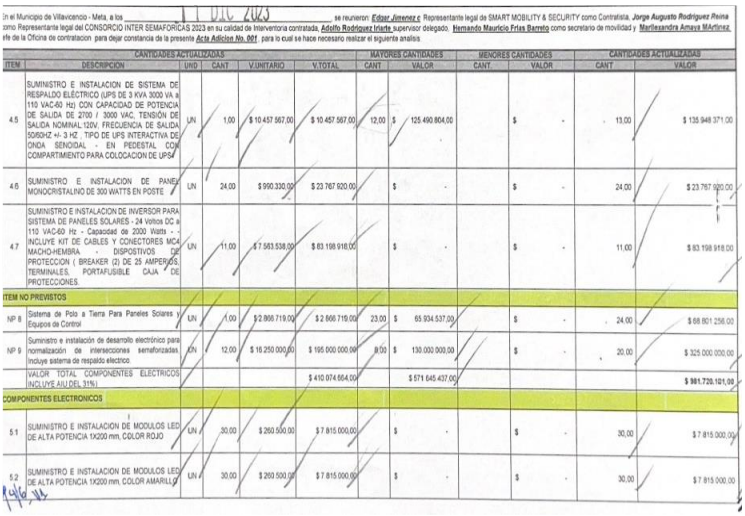

En el Municipio de Villavicencio - Meta, a los 11 DIC 2023 se reunieron **Edgar Jimenez c** Representante legal de SMART MOBILITY & SECURITY como Contratista, **Jorge Augusto Rodriguez Reina** como Representante legal del CONSORCIO INTER SEMAFORICAS 2023 en su calidad de Interventoria contratada, **Adolfo Rodriguez Iriarte** supervisor delegado, **Hernando Mauricio Frias Barreto** como secretario de movilidad y **Marllexandra Amaya Martinez** jefe de la Oficina de contratacion para dejar constancia de la presente **Acta Adicion No. 001**, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES ACTUALIZADAS UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	MAYORES CANTIDADES CANT	VALOR	MENORES CANTIDADES CANT	VALOR	CANTIDADES ACTUALIZADAS CANT	VALOR
4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RESPALDO ELÉCTRICO (UPS DE 3 KVA 3000 VA a 110 VAC-60 Hz) CON CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA DE 2700 / 3000 VAC, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL 120V, FRECUENCIA DE SALIDA 50/60HZ +/- 3 HZ , TIPO DE UPS INTERACTIVA DE ONDA SENOIDAL - EN PEDESTAL CON COMPARTIMIENTO PARA COLOCACION DE UPS	UN	1.00	$ 10.457.567,00	$ 10.457.567,00	12.00	$ 125.490.804,00		$ -	13.00	$ 135.948.371,00
4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL MONOCRISTALINO DE 300 WATTS EN POSTE	UN	24.00	$ 990.330,00	$ 23.767.920,00		$ -		$ -	24.00	$ 23.767.920,00
4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERSOR PARA SISTEMA DE PANELES SOLARES - 24 Voltios DC a 110 VAC-60 Hz - Capacidad de 2000 Watts - - INCLUYE KIT DE CABLES Y CONECTORES MC4 MACHO-HEMBRA - DISPOSITIVOS DE PROTECCION (BREAKER (2) DE 25 AMPERIOS, TERMINALES PORTAFUSIBLE CAJA Y DE PROTECCIONES.	UN	11.00	$ 7.563.538,00	$ 83.198.918,00		$ -		$ -	11.00	$ 83.198.918,00
ITEM NO PREVISTOS											
NP 8	Sistema de Polo a Tierra Para Paneles Solares y Equipos de Control	UN	1.00	$ 2.866.719,00	$ 2.866.719,00	23.00	$ 65.934.537,00		$ -	24.00	$ 68.801.256,00
NP 9	Suministro e instalación de desarrollo electrónico para normalización de intersecciones semaforizadas incluye sistema de respaldo electrico	UN	12.00	$ 16.250.000,00	$ 195.000.000,00	8.00	$ 130.000.000,00		$ -	20.00	$ 325.000.000,00
	VALOR TOTAL COMPONENTES ELECTRICOS (INCLUYE AIU DEL 31%)				$ 410.074.664,00		$ 571.645.437,00				$ 981.720.101,00
COMPONENTES ELECTRONICOS											
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS LED DE ALTA POTENCIA 1X200 mm, COLOR ROJO	UN	30.00	$ 260.500,00	$ 7.815.000,00		$ -		$ -	30.00	$ 7.815.000,00
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS LED DE ALTA POTENCIA 1X200 mm, COLOR AMARILLO	UN	30.00	$ 260.500,00	$ 7.815.000,00		$ -		$ -	30.00	$ 7.815.000,00

En el Municipio de Villavicencio - Meta, a los 11 DIC 2023, se reunieron: ***Edgar Jimenez c*** Representante legal de SMART MOBILITY & SECURITY como Contratista, ***Jorge Augusto Rodriguez Reina*** como Representante legal del CONSORCIO INTER SEMAFORICAS 2023 en su calidad de Interventoria contratada, **Adolfo Rodriguez Iriarte** supervisor delegado, **Hernando Mauricio Frias Barreto** como secretario de movilidad y **Marilexandra Amaya MArtinez** jefe de la Oficina de contratacion para dejar constancia de la presente ***Acta Adicion No. 001***, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDADES ACTUALIZADAS CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	MAYORES CANTIDADES CANT	MAYORES CANTIDADES VALOR	MENORES CANTIDADES CANT.	MENORES CANTIDADES VALOR	CANTIDADES ACTUALIZADAS CANT	CANTIDADES ACTUALIZADAS VALOR
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS LED DE ALTA POTENCIA 1X200 mm, COLOR VERDE	UN	32,00	$ 289.444,00	$ 9.262.208,00		$ -		$ -	32,00	$ 9.262.208,00
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA DE GEL DE CICLO PROFUNDO 120 Ah A 12 VOLTIOS	UN	22,00	$ 2.929.539,00	$ 64.449.858,00		$ -		$ -	22,00	$ 64.449.858,00
5.5	VALOR TOTAL COMPONENETES ELECTRONICOS (INCLUYE AIU DEL 31%)				$ 89.342.066,00		$ 0,00		$ -		$ 89.342.066,00
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SEMAFORICO											
6.1	LAVADO, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE SEMAFORO TIPO T1	UN	171,00	$ 149.671,00	$ 25.593.741,00		$ -		$ -	171,00	$ 25.593.741,00
6.2	LAVADO, MANTENIM Y PINTURA DE SEMAFORO TIPO T2	UN	281,00	$ 204.720,00	$ 57.526.320,00		$ -		$ -	281,00	$ 57.526.320,00
	VALOR TOTAL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SEMAFORICO (INCLUYE AIU DEL 31%)				$ 83.120.061,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 83.120.061,00
B. SUMINISTROS											
SUMINISTRO PARA ADECUACIONES											
7.1	SUMINISTRO DE PLATAFORMA WEB - SERVICIO POR UN AÑO - INCLUYE MODULO DE COMUNICACIÓN	UN	24,00	$ 13.807.618,00	$ 331.382.832,00		$ -		$ -	24,00	$ 331.382.832,00
7.2	SUMINISTRO DE MONITOR INDUSTRIAL DE 55"	UN	4,00	$ 8.988.159,00	$ 35.952.636,00		$ -		$ -	4,00	$ 35.952.636,00
7.3	SUMINISTRO DE CONTROLADORA DE VIDEO WALL HD 3x3 - CON CAPACIDAD 4x4	UN	1,00	$ 7.693.630,00	$ 7.693.630,00		$ -		$ -	1,00	$ 7.693.630,00
7.4	SUMINISTRO DE COMPUTADOR DESKTOP INCLUYE MONITOR 24"-TECLADO-MOUSE, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10	UN	2,00	$ 6.636.475,00	$ 13.272.950,00		$ -		$ -	2,00	$ 13.272.950,00
7.5	SUMINISTRO DE ESCRITORIO CON ARCHIVADOR DE 1.20 X60 INCLUYE SILLA	UN	2,00	$ 2.917.137,00	$ 5.834.274,00		$ -		$ -	2,00	$ 5.834.274,00
7.6	SUMINISTRO DE CABLE DE CONTROL 4X16 AWG A 600 V	ML	2.305,00	$ 10.423,00	$ 24.025.015,00		$ -		$ -	2.305,00	$ 24.025.015,00

En el Municipio de Villavicencio - Meta, a los 11 DIC 2023, se reunieron: ***Edgar Jimenez c*** Representante legal de SMART MOBILITY & SECURITY como Contratista, ***Jorge Augusto Rodriguez Reina*** como Representante legal del CONSORCIO INTER SEMAFORICAS 2023 en su calidad de Interventoria contratada, **Adolfo Rodriguez Iriarte** supervisor delegado, **Hernando Mauricio Frias Barreto** como secretario de movilidad y **Marilexandra Amaya MArtinez** jefe de la Oficina de contratacion para dejar constancia de la presente ***Acta Adicion No. 001***, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDADES ACTUALIZADAS CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	MAYORES CANTIDADES CANT	MAYORES CANTIDADES VALOR	MENORES CANTIDADES CANT.	MENORES CANTIDADES VALOR	CANTIDADES ACTUALIZADAS CANT	CANTIDADES ACTUALIZADAS VALOR
ITEM NO PREVISTOS											
NP 10	Comunicación para Camaras de Video Vigilancia y Conexión con Secretaria de Movilidad	UN		$ 4,369,200.00		1.00	$ 4,369,200.00		$ -	1.00	$ 4,369,200.00
NP 11	Kit de Video Vigilancia Remota para Intersecciones Semaforizadas	UN		$ 5,262,161.00		11.00	$ 57,883,771.00		$ -	11.00	$ 57,883,771.00
NP 12	Suministro e instalacion NVR 32 Canales Capacidad para 8 discos duros - compresion H.265	UN		$ 12,689,800.00		1.00	$ 12,689,800.00		$ -	1.00	$ 12,689,800.00
	VALOR TOTAL SUMINISTRO PARA ADECUACIONES (NO INCLUYE A DEL 26%)				$ 418,161,337.00		$ 74,942,771.00				$ 493,104,108.00
	VALOR TOTAL COSTO DEL CONTRATO				$ 526,683,284.82 / $ 3,119,013,720		$ 94,427,891.46 / $ 1,404,534,312		$ 47,183,877		$ 621,311,176.08 / $ 4,476,364,155.00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,119,029,300.00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 3,119,013,720.00
VALOR MAYORES CANTIDADES	$ 1,404,534,312.00
VALOR MENORES CANTIDADES	$ 47,183,877.00
VALOR ADICIÓN No.1	$ 1,357,350,435.00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 4,476,364,155.00

LA PRESENTE ACTA MODIFICATORIA SE FIRMA A LOS 11 DIC 2023

Firma
SMART MOBILITY & SECURITY SAS
EDGAR JIMENEZ CARREÑO
CONTRATISTA

Firma
CONSORCIO INTER SEMAFORICAS 2023
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTORIA

Firma
ADOLFO RODRIGUEZ IRIARTE
SUPERVISOR DELEGADO

Firma
HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO
SECRETARIO DE MOVILIDAD

Firma
MARILEXANDRA AMAYA MARTINEZ
JEFE OFICINA DE CONTRATACION

Revisó Asesor Tecnico

2. Indicar como quedaron las cantidades adicionadas y si modificación precios unitarios del mismo, esta información se solicita presentar en Excel sin ninguna clave.

3. Facturas y manifiesto de importación de los equipos suministrados

4. En igual de condiciones indicar en formato de Excel, cuáles fueron las cantidades de modificatorias que realizaron al contrato, adjuntando el otro si del mismo para realizar dicha modificación.

5. Al igual se adjunta un formato de inventario del estado de los semáforos para que sea diligenciado tanto por usted como el contratista, con el fin de indicar a fecha de hoy que puntos han sido intervenidos, en qué condiciones se encuentran.

6. De acuerdo con la adición aprobada por ustedes, indicar la justificación técnica y el avance de obra para la época de los hechos, anexando los soportes respectivos de dicha justificación.

7. De acuerdo con la justificación, indique el avance de obra porcentual a la fecha de corte para proyectar la adición aprobada por la interventoría.

8. De igual forma y en aras de determinar los porcentajes de ejecución del contrato objeto de la referencia: sírvase indicar de acuerdo a los avances alcanzados un informe pormenorizado mes a mes de las actuaciones adelantadas en su interventoría indicando lo siguiente:

   - Acta de recibo Parcial debidamente suscrita por el MUNICIPIO, el INTERVENTOR y el CONTRATISTA
   - Paz y Salvo de pagos de aportes parafiscales por el contrato ejecutado.
   - Registro fotográfico (archivo jpg) secuencial con fecha de registro o toma, ítem por ítem, con el compilado de todas las fotografías tomadas en obra para el corte que se presenta, con su respectiva referenciaría

- Memorias descriptivas de cálculo de cantidades de obra ítem por ítem ejecutado.
- Todos los soportes digitalizados.
- Copia de la bitácora.
- Acreditación sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2.007, 1122 de 2007 y 1753 de 2015.
- Los demás exigidos por la entidad. (Ver hoja de ruta).
- Indicar si solicitaron póliza de adición, fecha y aprobación.
- Las demás establecidas en la cláusula del contrato 2546 de 2023.
- Justificación técnica de dicha adición.

Cordialmente,



OMAR YESID DE LA PEÑA MUÑOZ
Director de Planeación y Prospectiva
Cc Personería Municipal
Cc Contraloría Municipal
Cc Secretario de Movilidad

Anexos:

NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO	FIRMA
V°B°:	N/A	N/A	
Revisó:	N/A	N/A	
Elaboró: Omar Yesid De la Peña		Director de Planeación y prospectiva	
