INFORME DE SUPERVISION

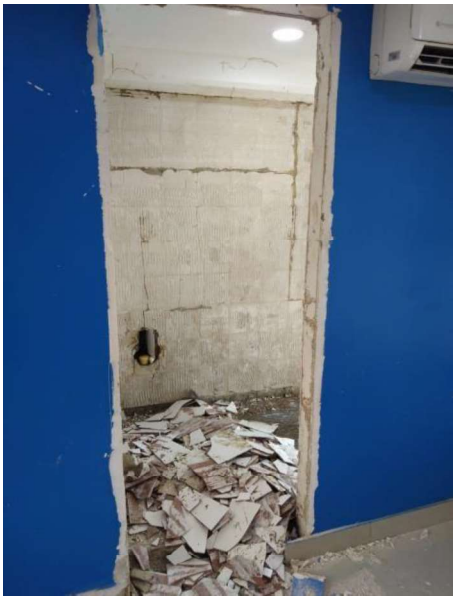
CONTRATO No:	CO1.PCCCNTR.5660305
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO:	CONTRATAR LA ADECUACION DE LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO (APE) YATENCION A VICTIMAS SEDE TERNERA - SENA REGIONAL BOLIVAR
VALOR INICIAL:	$60.341.260
VALOR ACTA # 1:	$ 81.405.460
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA BLANZAR SAS
NIT:	901161127-5
REPRESENTANTE LEGAL:	BLADIMIR BLANCO ALCAZAR
SUPERVISOR DEL CONTRATO	HERNANDO DIAZ
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El lugar de ejecución del contrato será en el Centro multisectorial Ternera SenaRegional Bolívar ubicada en la ciudad de Cartagena Bolívar

En la ciudad de Cartagena a los 15 días del mes de diciembre de 2023, entre los entre los suscritos, JAIME TORRADO CASADIEGO identificado con cedula de ciudadanía No. 88.147.752 como ordenador del gasto por parte del SENA, el señor BLADIMIR BLANCO ALCAZAR identificado con cédula de ciudadanía No. 1.143.343.886 en calidad de representante legal de la empresa CONSTRUCTORA BLANZAR S.A.S. con NIT. 901.161.127-5, el señor HERNANDO DIAZ FORERO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.758.563 como supervisor del contrato y el arquitecto MARCELINO GONZALEZ GARCES identificado con cedula de ciudadanía No. 73.184.153 como apoyo técnico en la ejecución del contrato, con el fin de llevar a cabo la ampliación de presupuesto del contrato CO1.PCCCNTR.5660305, para lo cual se desarrolló:

- Visita de campo
- Verificación de cronograma de ejecución
- Verificación de actividades ejecutadas

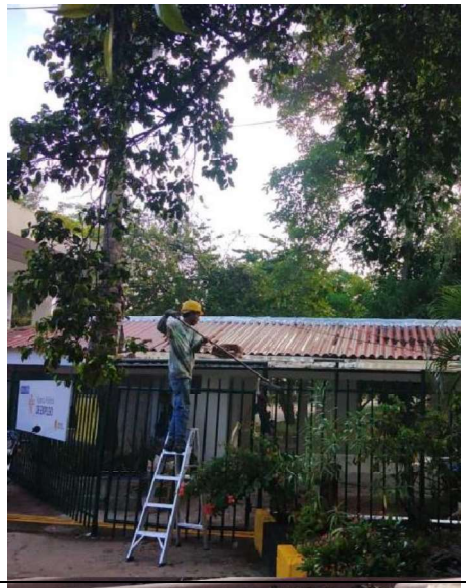
ALCANCE DE OBRAS			
	ALCANCE INICIAL	**ALCANCE ACTUAL**	**AVANCE**
Construcción			
Rehabilitación			
Mejoramiento			
Mantenimiento	X	X	100%

Las actividades ejecutadas por parte de la Constructora Blanzar S.A.S., son las relacionadas en el siguiente cuadro.

PRELIMINARES	REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES	REGISTRO FOTOGRÁFICO DESPUÉS
Desmonte de aviso luminoso existente de 0,60 x 6 mts a una altura mayor a 4 mts		
Desmonte de puerta existente de 0,7 a 1 mts de ancho x 2,2 mts de altura		
Desmonte de puerta existente de 1,5 mts x 2,2 mts (2 hojas de 75 cm)		

Demolición de enchape de pisos y pared de baños		
Desmonte de tomacorriente sencillo existente		
Desmonte de cielo raso existente incluye retiro a botadero autorizado		

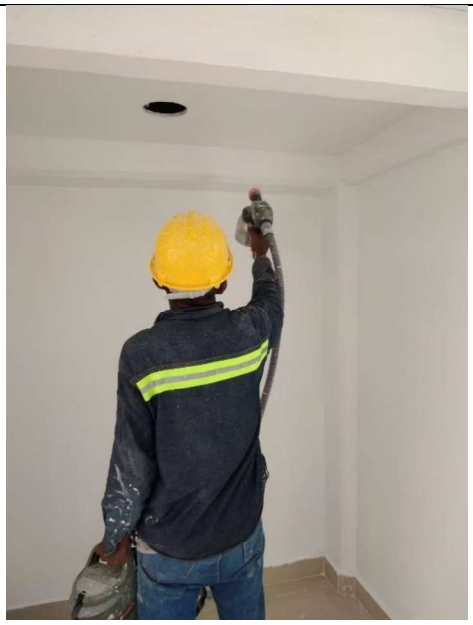
Demolición de muro en mampostería		
Desmonte de sanitarios		
Desmonte de lavamanos		
Desmonte de ventanas existentes en aluminio y vidrio crudo		
CUBIERTA		

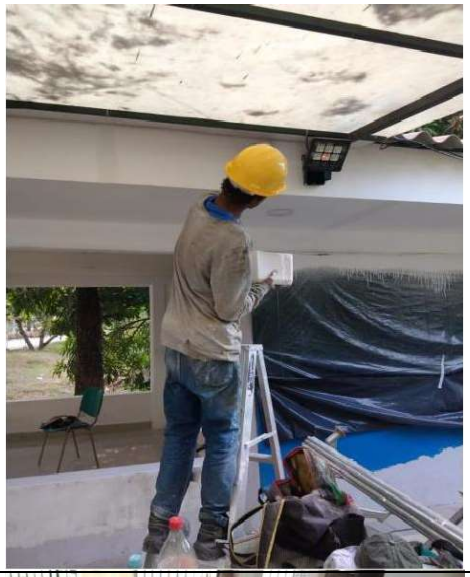
Limpieza de cubierta existente incluye el retiro a botadero autorizado		
Mantenimiento de caballete y limatesas en cubierta incluye cambio de amarres y ajustes		
Suministro e instalación de manto edil con foil de aluminio de 3 mm en caliente para el caballete y limatesa, ancho de 1 mts, incluye pintura rojo colonial		

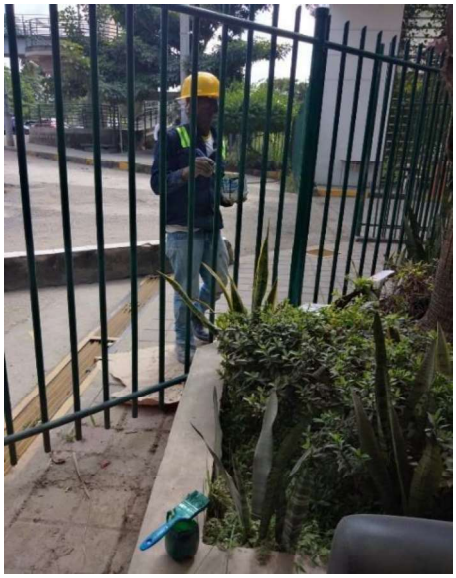
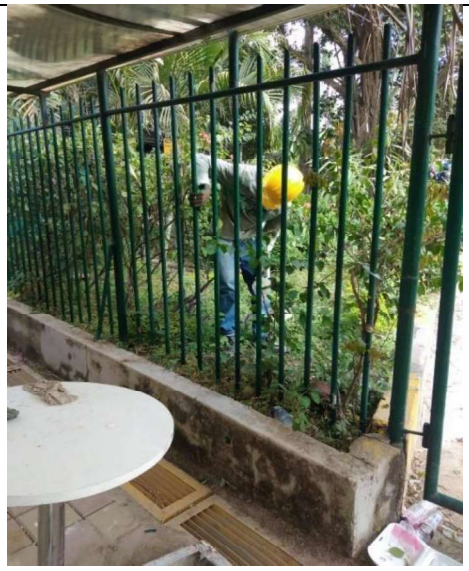
Suministro e instalación de tapa en lamina metálica calibre 1/8 de espesor, soldada para cercha de cubierta de 4" x 6"		
MAMPOSTERIA Y ENCHAPES		
Levante en block No. 4		

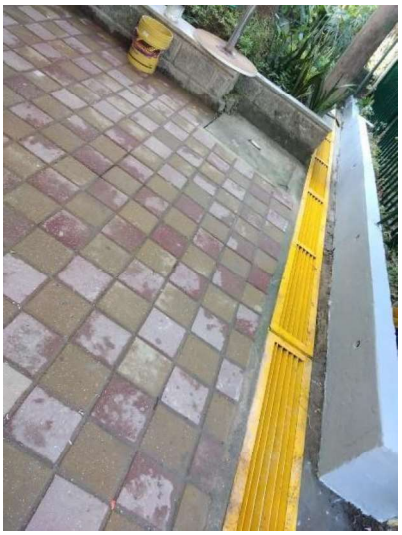
Pañete impermeabilizado mortero 1:4		
Pañete mortero 1:4		
Mortero de nivelación		

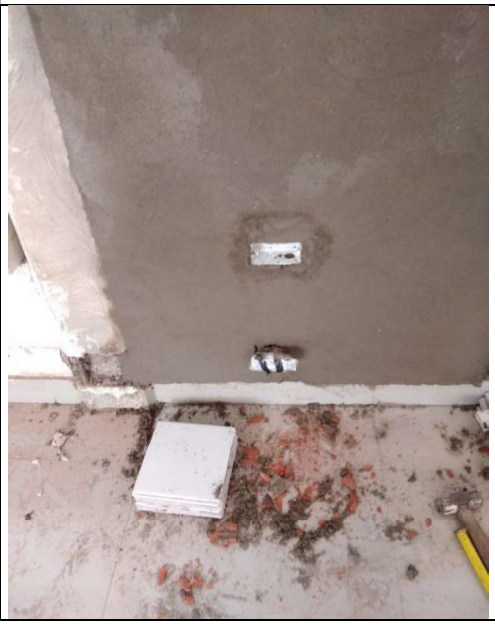
Suministro e instalación de pared cerámico boreal Avella 24.5x50cm o similar, de primera calidad incluye pegante pegacor o similar y demás accesorios necesarios para su instalación; incluye emboquillado de juntas (bindaboquilla de Sika o similar). Altura promedio muro a enchapar 2.5metros.		
Suministro e instalación de piso cerámico boreal Avella 24.5x50cm o similar, de primera calidad incluye pegante pegacor o similar y demás accesorios necesarios para su instalación; incluye emboquillado de juntas (bindaboquilla de Sika o similar). Altura promedio muro a enchapar 2.5metros.		
Suministro e instalación de piso porcelanato pulido 60x60cm Beige		

Suministro e instalación de guarda escobas en porcelanato pulido beige		
PINTURA		
Pintura acrílica de alta resistencia tipo 1, tres manos, para muros interiores (APE y Atencion a Victimas)		
Pintura acrílica de alta resistencia tipo 1, tres manos, para muros interiores menores a 50 cm de espesor (APE y Atencion a Victimas)		

Pintura acrílica de alta resistencia tipo 1, tres manos, para muros exteriores		
Pintura acrílica de alta resistencia tipo 1, tres manos, para muros exteriores menores a 50 cm de espesor		
Pintura acrílica de alta resistencia tipo 1, tres manos, tres caras para bordillos exteriores		

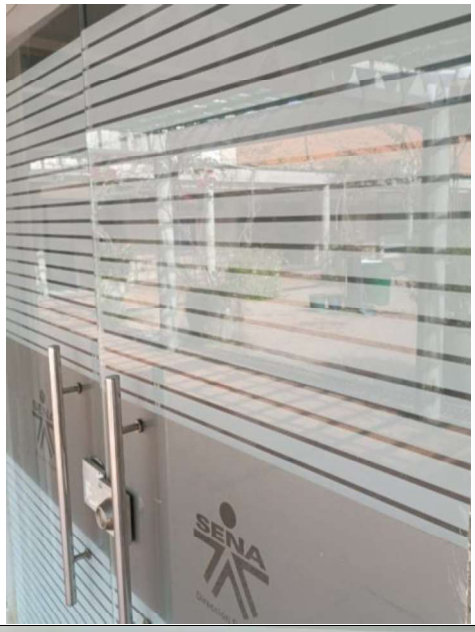
Pintura anticorrosiva para rejas tubular de 1 1/2" @ 15 cm x 2.20 mts de altura incluye limpieza y lijado		
Pintura esmalte para rejas tubular de 1 1/2" @ 15 cm x 2.20 mts de altura		
Suministro y aplicación de estuco lijado y pintado		

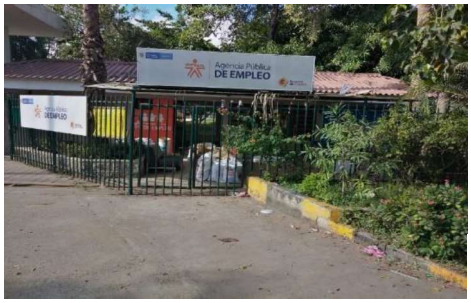
Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva para rejilla de piso ancho = 0,30 mts		
Suministro y aplicación de pintura esmalte para rejilla de piso ancho = 0,30 mts		
Pintura vinilo para cielo raso existente 3 manos color blanco tipo 1 incluye los lineales y resanes (APE y Atencion a Victimas)		
CIELO RASO		

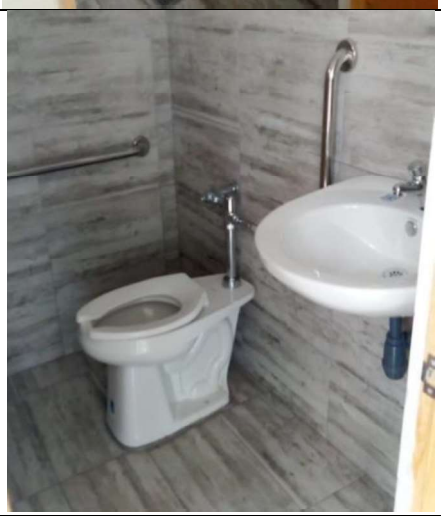
Cielo raso en drywall con perfilería de aluminio (incluye acabado final con cinta y pintura).		
INSTALACIONES ELECTRICAS		
Suministro e instalación de lámparas circular led panel para incrustar ultra delgado 18w redondo economizador de energía duración de más de 30.000 horas. Medidas: *grosor 1.5 cm *circunferencia: interior 20cm exterior diámetro 22cm		
Suministro e instalación de interruptor sencillo		

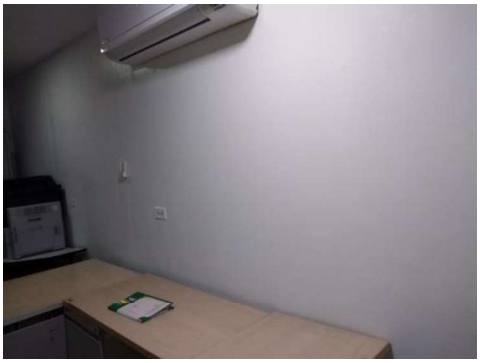
Suministro e instalación de salida para tomacorriente en tuberia EMT, incluye tomacorriente (APE)		
Suministro e instalación de tablero eléctrico con tapa de 12 circuitos incluye los breakeres		
CARPINTERIA		
Suministro e instalación de ventana corrediza en vidrio templado de 6 mm y aluminio natural ref.8025 incluye todos los soportes inferiores y superiores y todos los accesorios para su adecuada instalación		


Suministro e instalación de puerta de 2 hojas de 75 cm x 2,2 mts cada una, en vidrio templado de 10 mm incluye gato, manija en 60 – 40 en acero inoxidable y todos los accesorios para su adecuada instalación		
Suministro e instalación de puerta de 90 cm x 2,2 mts, en vidrio templado de 10 mm incluye gato, manija en 60 – 40 en acero inoxidable y todos los accesorios para su adecuada instalación		
Suministro e instalación de puerta en alma de roble entamborada en tríplex de 3,2 mm medidas 0,65 mts x 2,2 mts incluye marco, bisagra y cerradura para baño		

Samblasting sobre vidrio templado de 10 mm		
Logo del SENA según diseño para puertas y ventanas		

Polarizado nano cerámico semi oscuro para ventanas (APE), incluye el retiro de película existente		
Suministro e instalación de aviso luminoso existente de 0,60 x 6 mts a una altura mayor a 4 mts con el logo y nombre de la Regional		
APARATOS SANITARIOS		
Suministro e instalación taza adriática o similar 1.28 litros de agua de consumo, con fluxómetro (válvula flujo ajustable, cuerpo expuesto tipo palanca); incluye tapa asiento y accesorios de instalación + barra en acero inoxidable de 30 pulgadas para personal discapacitado.		

Suministro e instalación taza adriática o similar 1.28 litros de agua de consumo, con fluxómetro (válvula flujo ajustable, cuerpo expuesto tipo palanca); incluye tapa asiento y accesorios de instalación		
suministro y colocación de lavamanos color blanco y referencia free en caja o similar para personal discapacitado; incluye grifería tipo push y accesorios de instalación; incluye barra de seguridad de 24 pulgadas de largo en acero inoxidable.		
suministro y colocación de lavamanos color blanco y referencia free en caja o similar para personal discapacitado, incluye grifería tipo push y accesorios de instalación.		

Suministro e instalación de drenaje para aire acondicionado incluye pasante y resanes con los acabados (APE)		
ASEO GENERAL DE OBRA		
Aseo general de obra		



SUPERVISOR DEL CONTRATO

HERNANDO DIAZ FORERO
C.C. 79.758.563

Factura Electrónica De Venta No

BA No. 1218

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764047870641 que habilita desde BA 1064 hasta BA 2000. Vence 2024-04-21

CONSTRUCTORA BLANZAR S.A.S

Nit 901161127

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4210 6900.00 X 1000

CLIENTE	SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDISAJE		
NIT	899999034 1		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 57 No. 8 - 69		Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE
#$36-02-00-013-000000;CO1.PCCNTR.5660305;rezambrano@sena.edu.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
04/03/2024	04/03/2024	BLADIMIR BLANCO ALCAZAR	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SENA MC-BL	CONTRATAR LA ADECUACION DE LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO (APE) Y ATENCION A VICTIMAS SEDE TERNERA - SENA REGIONAL BOLIVAR	1	Und.	17.014.892	0%	0	17.014.892
2	6130100110	ADMINISTRACION	1	Und.	4.253.723	0%	0	4.253.723
3	6130100120	UTILIDAD	1	Und.	850.745	19%	161.642	850.745

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**22.119.360**
DESCUENTO	**0**
IVA	**161.642**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**22.281.002**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**22.281.002**

Valor en Letras

VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/03/2024 15:18:33
Medios de Pago: Efectivo

BRR SAN FERNANDO CL 21 82 116 Teléfono 3002872046 Cartagena
Correo Electrónico contabilidad.blanzar@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cf1dc1d0bd88b628cac91235e93b0423af8d2ce87a310caa2e1b9d2052daeeea434822cd3843a31c068583ed7d152ef0 --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2024 3:38:39 p. m.

SENA	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° _____

FECHA:	8/02/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	Catagena/
COD REGIONAL:	13	REGIONAL	BOLIVAR
CENTRO DE COSTO:	Despacho Regional Bolivar		
COD CENTRO DE COSTO:	1010		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCCNTR.5660305	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	15/12/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3699-1300-14-0-3699011-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA BLANZAR SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901161127		
VALOR TOTAL:	81,405,460		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADECUACION DE LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO (APE) YATENCION A VICTIMAS SEDE TERNERA - SENA REGIONAL BOLIVAR

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Especificaciones tecnicas según documento soporte: Factura de venta No. FV 138 del proveedor BLANZAR SAS El supervisor certifica que verifico que el contratista se encuentre al dia con los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral , de conformidad con lo dispuesto en el Art.23 de la ley 1150 de 2007, para la cual se anexa certificacion y pagos correspondientes.



FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	HERNANDO DIAZ FORERO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	79758563		
CORREO INSTITUCIONAL	hdiazf@sena.edu.co		
CARGO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	N° DE CONTACTO	300 4921097

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el NIT 901161127 no se encuentra registrado en nuestra base de datos de aportantes.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidadesdel estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizacionesal Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuestosobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate elcumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2023-12-10

Generado por : Eliana Margarita Vitola

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 3833146816 - Número de Certificado:287997

SENA, MÁS TRABAJO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

GIL-F-064
V-1

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA ACTA DE OBRA				ACTA Nº 2
CO1.PCCNTR.5660305	CONSTRUCTORA BLANZAR SAS	22 DE DICIEMBRE DE 2023				
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION DE LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO (APE) Y ATENCION A VICTIMAS SEDE TERNERA - SENA REGIONAL BOLIVAR	INTERVENTOR: NO APLICA SUPERVISOR: HERNANDO DIAZ				
Plazo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor ACTA		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	15 DE DICIEMBRE DE 2023	30 DE DICIEMBRE DE 2023				

Localización de la obra	Vigencia del contrato	$ 22.364.872	$ 81.405.460
SENA MULTISECTORIAL DE TERNERA REGIONAL BOLIVAR, ACCESO PRINCIPAL	30 DE DICIEMBRE 2023	Valor I.V.A. ACTA	Valor total I.V.A. contrato

Valor inicial del contrato	$ 60.341.260,43	Valor anticipo	$ 0,00	$162.250	$ 590.570,34
Valor adición	$ 21.064.199,09				
Valor total	$ 81.405.459,52				

PRESUPUESTO CONTRATADO			CONTRATO INICIAL			ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 1			ACTA DE OBRA N.01			ACTA DE OBRA N.02			VALOR ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
1	**PRELIMINARES**																
1,1,1	Desmonte de aviso luminoso existente de 0,60 x 6 mts a una altura mayor a 4 mts	UN	1,00	$ 37.116	$ 37.116	0,00	37.116	0	1,00	$ 37.116	$ 37.116	0,00	$ 37.116	$ -	1	$ 37.116	$ 37.116
1,1,2	Desmonte de puerta existente de 0,7 a 1 mts de ancho x 2,2 mts de altura	UN	4,00	$ 28.950	$ 115.799	-1,00	28.950	-28.950	3,00	$ 28.950	$ 86.850	0,00	$ 28.950	$ -	3	$ 28.950	$ 86.850
1,1,3	Desmonte de puerta existente de 1,5 mts x 2,2 mts (2 hojas de 75 cm)	UN	1,00	$ 34.146	$ 34.146	0,00	34.146	0	1,00	$ 34.146	$ 34.146	0,00	$ 34.146	$ -	1	$ 34.146	$ 34.146
1,1,4	Demolicion de enchape de pisos y pared de baños	M2	42,16	$ 13.362	$ 563.339	0,00	13.362	0	42,16	$ 13.362	$ 563.339	0,00	$ 13.362	$ -	42,16	$ 13.362	$ 563.339
1,1,5	Desmonte de tomacorriente sencillo existente	UND.	1,00	$ 5.939	$ 5.939	11,00	5.939	65.329	1,00	$ 5.939	$ 5.939	11,00	$ 5.939	$ 65.329	12	$ 5.939	$ 71.268
1,1,6	Desmonte de cielo raso existente incluye retiro a botadero autorizado	M2	10,00	$ 18.557	$ 185.574	0,00	18.557	0	10,00	$ 18.557	$ 185.574	0,00	$ 18.557	$ -	10	$ 18.557	$ 185.574
1,1,7	Demolicion de muro en mamposteria	M2	3,07	$ 12.619	$ 38.741	5,13	12.619	64.736	3,07	$ 12.619	$ 38.741	5,13	$ 12.619	$ 64.736	8,2	$ 12.619	$ 103.477
1,1,8	Desmonte de sanitarios	UN	2,00	$ 28.950	$ 57.900	0,00	28.950	0	2,00	$ 28.950	$ 57.900	0,00	$ 28.950	$ -	2	$ 28.950	$ 57.900
1,1,9	Desmonte de lavamanos	UN	2,00	$ 28.950	$ 57.900	0,00	28.950	0	2,00	$ 28.950	$ 57.900	0,00	$ 28.950	$ -	2	$ 28.950	$ 57.900
1,1,10	Desmonte de ventanas existentes en aluminio y vidrio crudo	M2	15,36	$ 29.693	$ 456.079	0,00	29.693	0	15,36	$ 29.693	$ 456.079	0,00	$ 29.693	$ -	15,36	$ 29.693	$ 456.079
	SUBTOTAL				$ 1.552.533			101.115			$ 1.523.583			$ 130.065			$ 1.653.648
1	**CUBIERTA**																
1,2,1	Limpieza de cubierta existente incluye el retiro a botadero autorizado	M2	0,00	$ 22.269	$ -	315,20	22.269	7.019.159	35,00	$ 22.269	$ 779.412	280,20	$ 22.269	$ 6.239.747	315,2	$ 22.269	$ 7.019.159
1,2,2	Mantenimiento de caballete y limatesas en cubierta incluye cambio de amarres y ajustes	ML	22,00	$ 23.754	$ 522.580	40,00	23.754	950.146	22,00	$ 23.754	$ 522.580	40,00	$ 23.754	$ 950.146	62	$ 23.754	$ 1.472.726
1,2,3	Suministro e instalación de manto edil con foil de aluminio de 3 mm en caliente para el caballete y limatesa, ancho de 1 mts, incluye pintura rojo colonial	ML	22,00	$ 72.004	$ 1.584.081	0,00	72.004	0	22,00	$ 72.004	$ 1.584.081	0,00	$ 72.004	$ -	22	$ 72.004	$ 1.584.081
1,2,4	Suministro e instalacion de tapa en lamina metalica calibre 1/8 de espesor, soldada para cercha de cubierta de 4" x 6"	UN	3,00	$ 22.269	$ 66.807	0,00	22.269	0	3,00	$ 22.269	$ 66.807	0,00	$ 22.269	$ -	3	$ 22.269	$ 66.807
0	**SUBTOTAL**				$ 2.173.468			7.969.304			$ 2.952.880			$ 7.189.893			$ 10.142.772
1	**MAMPOSTERIA Y ENCHAPES**																
1,3,1	Levante en block No. 4	M2	2,20	$ 24.496	$ 53.892	1,40	24.496	34.295	2,00	$ 24.496	$ 48.993	1,60	$ 24.496	$ 39.194	3,6	$ 24.496	$ 88.187
1,3,2	Pañete impermeabilizado mortero 1:4	M2	11,96	$ 23.012	$ 275.219	7,04	23.012	162.002	11,00	$ 23.012	$ 253.128	8,00	$ 23.012	$ 184.093	19	$ 23.012	$ 437.221
1,3,3	Pañete mortero 1:4	M2	15,53	$ 20.785	$ 322.790	29,47	20.785	612.531	15,00	$ 20.785	$ 311.774	30,00	$ 20.785	$ 623.547	45	$ 20.785	$ 935.321
1,3,4	Mortero de nivelacion	M2	5,61	$ 30.475	$ 170.963	2,18	30.475	66.435	5,00	$ 30.475	$ 152.373	2,79	$ 30.475	$ 85.024	7,79	$ 30.475	$ 237.398
1,3,5	Suministro e instalacion de pared cerámico boreal avella 24.5x50cm o similar , de primera calidad incluye pegante pegacor o similar y demas accesorios necesarios para su instalación ; incluye emboquillado de juntas (bindaboquilla de sika o similar). Altura promedio muro a enchapar 2.5metros.	M2	11,96	$ 80.169	$ 958.817	7,04	80.169	564.387	11,00	$ 80.169	$ 881.855	8,00	$ 80.169	$ 641.349	19	$ 80.169	$ 1.523.204
1,3,6	Suministro e instalacion de piso cerámico boreal avella 24.5x50cm o similar , de primera calidad incluye pegante pegacor o similar y demas accesorios necesarios para su instalación ; incluye emboquillado de juntas (bindaboquilla de sika o similar). Altura promedio muro a enchapar 2.5metros.	M2	3,43	$ 77.942	$ 267.341	0,00	77.942	0	3,00	$ 77.942	$ 233.826	0,43	$ 77.942	$ 33.515	3,43	$ 77.942	$ 267.341
1,3,7	Suministro e instalacion de piso porcelanato pulido 60x60cm Beige	M2	2,18	$ 89.076	$ 194.186	0,00	89.076	0	2,18	$ 89.076	$ 194.186	0,00	$ 89.076	$ -	2,18	$ 89.076	$ 194.186
1,3,8	Suministro e instalaciobn de guarda escobas en porcelanato pulido beige	ML	3,03	$ 44.539	$ 134.952	2,97	44.539	132.279	3,00	$ 44.539	$ 133.616	3,00	$ 44.539	$ 133.616	6	$ 44.539	$ 267.231

0	**SUBTOTAL**				$ 2.378.160			1.571.930			$ 2.209.751			$ 1.740.339			$ 3.950.090
1	**PINTURA**																		
1,4,1	Pintura acrílica de alta resistencia tipo 1, tres manos, para muros interiores (APE y Atencion a Victimas)	M2	210,00	$ 13.362	$ 2.806.007	150,00	13.362	2.004.290	210,00	$ 13.362	$ 2.806.007	150,00	$ 13.362	$ 2.004.290	360	$ 13.362	$ 4.810.297
1,4,2	Pintura acrílica de alta resistencia tipo 1, tres manos, para muros interiores menores a 50 cm de espesor (APE y Atencion a Victimas)	ML	50,00	$ 7.423	$ 371.148	0,00	7.423	0	50,00	$ 7.423	$ 371.148	0,00	$ 7.423	$ -	50	$ 7.423	$ 371.148
1,4,3	Pintura acrílica de alta resistencia tipo 1, tres manos, para muros exteriores	M2	50,00	$ 13.362	$ 668.097	0,00	13.362	0	50,00	$ 13.362	$ 668.097	0,00	$ 13.362	$ -	50	$ 13.362	$ 668.097
1,4,4	Pintura acrílica de alta resistencia tipo 1, tres manos, para muros exteriores menores a 50 cm de espesor	ML	30,00	$ 7.423	$ 222.689	3,00	7.423	22.269	30,00	$ 7.423	$ 222.689	3,00	$ 7.423	$ 22.269	33	$ 7.423	$ 244.958
1,4,5	Pintura acrílica de alta resistencia tipo 1, tres manos, tres caras para bordillos exteriores	ML	37,63	$ 9.650	$ 363.147	0,00	9.650	0	35,00	$ 9.650	$ 337.766	2,63	$ 9.650	$ 25.381	37,63	$ 9.650	$ 363.147
1,4,6	Pintura anticorrosiva para rejas tubular de 1 1/2" @ 15 cm x 2.20 mts de altura incluye limpieza y lijado	M2	35,00	$ 14.104	$ 493.638	0,00	14.104	0	35,00	$ 14.104	$ 493.638	0,00	$ 14.104	$ -	35	$ 14.104	$ 493.638
1,4,7	Pintura esmalte para rejas tubular de 1 1/2" @ 15 cm x 2.20 mts de altura	M2	35,00	$ 14.846	$ 519.608	0,00	14.846	0	35,00	$ 14.846	$ 519.608	0,00	$ 14.846	$ -	35	$ 14.846	$ 519.608
1,4,8	Suministro y apliacacion de estuco lijado y pintado	M2	14,00	$ 16.331	$ 228.629	130,00	16.331	2.122.988	10,00	$ 16.331	$ 163.307	134,00	$ 16.331	$ 2.188.311	144	$ 16.331	$ 2.351.618
1,4,9	Suministro y apliacacion de pintura anticorrosiva para rejilla de piso ancho = 0,30 mts	ML	15,00	$ 7.423	$ 111.345	0,00	7.423	0	15,00	$ 7.423	$ 111.345	0,00	$ 7.423	$ -	15	$ 7.423	$ 111.345
1,4,10	Suministro y apliacacion de pintura esmalte para rejilla de piso ancho = 0,30 mts	ML	15,00	$ 7.423	$ 111.345	0,00	7.423	0	15,00	$ 7.423	$ 111.345	0,00	$ 7.423	$ -	15	$ 7.423	$ 111.345
1,4,11	Pintura vinilo para cielo raso existente 3 manos color blanco tipo 1 incluye los lineales y resanes (APE y Atencion a Victimas)	M2	220,00	$ 13.362	$ 2.939.626	10,00	13.362	133.619	220,00	$ 13.362	$ 2.939.626	10,00	$ 13.362	$ 133.619	230	$ 13.362	$ 3.073.245
0	**SUBTOTAL**				$ 8.835.277			4.283.167			$ 8.744.574			$ 4.373.870			$ 13.118.444
2	**CIELO RASO**																
1,5,1	Cielo raso en dry wall con perfilería de aluminio (incluye acabado final con cinta y pintura).	M2	10,00	$ 67.846	$ 678.463	20,00	67.846	1.356.925	10,00	$ 67.846	$ 678.463	20,00	$ 67.846	$ 1.356.925	30	$ 67.846	$ 2.035.388
0	**SUBTOTAL**				$ 678.463			1.356.925			$ 678.463			$ 1.356.925			$ 2.035.388
2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**																
1,6,1	Suministro e instalación de lámparas circular led panel para incrustar ultra delgado 18w redondo economizador de energía duración de más de 30.000 horas. Medidas: *grosor 1.5 cm *circunferencia: interior 20cm exterior diámetro 22cm	UND.	3,00	$ 56.415	$ 169.245	9,00	56.415	507.735	3,00	$ 56.415	$ 169.245	9,00	$ 56.415	$ 507.735	12	$ 56.415	$ 676.980
1,6,2	Suministro e instalacion de interruptor sencillo	UND.	1,00	$ 22.269	$ 22.269	19,00	22.269	423.109	1,00	$ 22.269	$ 22.269	19,00	$ 22.269	$ 423.109	20	$ 22.269	$ 445.378
1,6,3	Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tubería EMT, incluye tomacorriente (APE)	UND.	10,00	$ 148.461	$ 1.484.608	-10,00	148.461	-1.484.608	0,00	$ 148.461	$ -	0,00	$ 148.461	$ -	0	$ 148.461	$ -
1,6,4	Suministro e instalacion de tablero electrico con tapa de 12 circuitos incluye los breaker	UND.	1,00	$ 601.265	$ 601.265	0,00	601.265	0	1,00	$ 601.265	$ 601.265	0,00	$ 601.265	$ -	1	$ 601.265	$ 601.265
0	**SUBTOTAL**				$ 2.277.387			-553.764			$ 792.779			$ 930.844			$ 1.723.623
2	**REJAS Y BARANDAS**																
1,7,1	Suministro e instalacion de baranda en acero inoxidable para proteccion de anden existente; altura de la baranda 0.90 m; incluye dos barras horizontales intermedias de Ø 1 1/2" y soportes verticales @ 1.5 metros de 2", tubo superior de la baranda Ø 2" pulgadas, incluye los accesorios para su instalacion	ML	0,00	$ 728.734	$ -	0,00	728.734	0	0,00	$ 728.734	$ -	0,00	$ 728.734	$ -	0	$ 728.734	$ -
0	**SUBTOTAL**				$ -			0			$ -			$ -			$ -
2	**CARPINTERIA**																
1,8,1	Suministro e instalación de ventana corrediza en vidrio templado de 6 mm y aluminio natural ref.8025 incluye todos los soportes inferiores y superiores y todos los accesorios para su adecuada instalación	M2	15,36	$ 593.842	$ 9.121.411	0,00	593.842	0	15,36	$ 593.842	$ 9.121.411	0,00	$ 593.842	$ -	15,36	$ 593.842	$ 9.121.411
1,8,2	Suministro e instalacion de puerta de 2 hojas de 75 cm x 2,2 mts cada una, en vidrio templado de 10 mm incluye gato, manija en 60 – 40 en acero inoxidable y todos los accesorios para su adecuada instalación	UND	1,00	$ 3.401.230	$ 3.401.230	0,00	3.401.230	0	1,00	$ 3.401.230	$ 3.401.230	0,00	$ 3.401.230	$ -	1	$ 3.401.230	$ 3.401.230
1,8,3	Suministro e instalacion de puerta de 90 cm x 2,2 mts, en vidrio templado de 10 mm incluye gato, manija en 60 – 40 en acero inoxidable y todos los accesorios para su adecuada instalación	UND	1,00	$ 1.457.882	$ 1.457.882	0,00	1.457.882	0	1,00	$ 1.457.882	$ 1.457.882	0,00	$ 1.457.882	$ -	1	$ 1.457.882	$ 1.457.882
1,8,4	Suministro e instalacion de puerta en alma de roble entamborada en triplex de 3,2 mm medidas 0,65 mts x 2,2 mts incluye marco, bisagra y cerradura para baño	UND	2,00	$ 728.942	$ 1.457.883	0,00	728.942	0	2,00	$ 728.942	$ 1.457.883	0,00	$ 728.942	$ -	2	$ 728.942	$ 1.457.883
1,8,5	Samblasting sobre vidrio templado de 10 mm	M2	13,60	$ 66.807	$ 908.581	14,36	66.807	959.355	13,60	$ 66.807	$ 908.581	14,36	$ 66.807	$ 959.355	27,96	$ 66.807	$ 1.867.936

1,8,6	Logo del SENA según diseño para puertas y ventanas	UND		8,00	$ 99.478	$ 795.822	0,00	99.478	0	8,00	$ 99.478	$ 795.822	0,00	$ 99.478	$ -	8	$ 99.478	$ 795.822
1,8,7	Polarizado nano ceramico semi oscuro para ventanas (APE), incluye el retiro de pelicula existente	M2		5,25	$ 111.345	$ 584.563	0,00	111.345	0	5,25	$ 111.345	$ 584.563	0,00	$ 111.345	$ -	5,25	$ 111.345	$ 584.563
1,8,8	Suministro e instalacion de aviso luminoso existente de 0,60 x 6 mts a una altura mayor a 4 mts con el logo y nombre de la Regional	UND		1,00	$ 3.401.230	$ 3.401.230	0,00	3.401.230	0	1,00	$ 3.401.230	$ 3.401.230	0,00	$ 3.401.230	$ -	1	$ 3.401.230	$ 3.401.230
0	**SUBTOTAL**					$ 21.128.603			959.355			$ 21.128.603			$ 959.355			$ 22.087.958
1,9	**APARATOS SANITARIOS**																	
1,9,1	Suministro e instalacion taza adriática o similar 1.28 litros de agua de consumo , con fluxómetro (válvula flujo ajustable , cuerpo expuesto tipo palanca);incluye tapa asiento y accesorios de instalación + barra en acero inoxidable de 30 pulgadas para personal discapacitado.	UND		1,00	$ 2.164.863	$ 2.164.863	0,00	2.164.863	0	1,00	$ 2.164.863	$ 2.164.863	0,00	$ 2.164.863	$ -	1	$ 2.164.863	$ 2.164.863
1,9,2	Suministro e instalacion taza adriática o similar 1.28 litros de agua de consumo , con fluxómetro (válvula flujo ajustable , cuerpo expuesto tipo palanca);incluye tapa asiento y accesorios de instalación	UND		1,00	$ 1.976.971	$ 1.976.971	0,00	1.976.971	0	1,00	$ 1.976.971	$ 1.976.971	0,00	$ 1.976.971	$ -	1	$ 1.976.971	$ 1.976.971
1,9,3	suministro y colocación de lavamanos color blanco y referencia free en caja o similar para personal discapacitado ; incluye grifería tipo push y accesorios de instalación;incluye barra de seguridad de 24 pulgadas de largo en acero inoxidable.	UND		1,00	$ 936.524	$ 936.524	0,00	936.524	0	1,00	$ 936.524	$ 936.524	0,00	$ 936.524	$ -	1	$ 936.524	$ 936.524
1,9,4	suministro y colocación de lavamanos color blanco y referencia free en caja o similar para personal discapacitado, incluye grifería tipo push y accesorios de instalación.	UND		1,00	$ 896.896	$ 896.896	0,00	896.896	0	1,00	$ 896.896	$ 896.896	0,00	$ 896.896	$ -	1	$ 896.896	$ 896.896
1,9,5	Suministro e instalacion de drenaje para aire acondicionado incluye pasante y resanes con los acabados (APE)	UND		1,00	$ 397.649	$ 397.649	1,00	397.649	397.649	1,00	$ 397.649	$ 397.649	1,00	$ 397.649	$ 397.649	2	$ 397.649	$ 795.298
	SUBTOTAL					$ 6.372.903			397.649			$ 6.372.903			$ 397.649			$ 6.770.552
1,10	**ASEO GENERAL DE OBRA**																	
1,10,1	Aseo general de obra	GL		1,00	$ 682.826	$ 682.826	0,00	682.826	0	1,00	$ 682.826	$ 682.826	0,00	$ 682.826	$ -	1	$ 682.826	$ 682.826
	SUBTOTAL					$ 682.826			0			$ 682.826			$ -			$ 682.826
	COSTO DIRECTO TOTAL					$ 46.079.619			16.085.681			$ 45.086.359			$ 17.078.940			$ 62.165.299
	A.U.	ADM		0,25		$ 11.519.905			4.021.420	0,25	%	$ 11.271.590		25%	$ 4.269.735	0,25	$ -	$ 15.541.325
		UTILIDAD		0,05		$ 2.303.981			804.284	0,05	%	$ 2.254.318		5%	$ 853.947	0,05	$ -	$ 3.108.265
	TOTAL A.U.	0		0,30		$ 13.823.886			4.825.704	0,30	$ -	$ 13.525.908		30%	$ 5.123.682	0,30	$ -	$ 18.649.590
	COSTO DIRECTO + A.U	0		0,00														
	I.V.A. DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD	0		0,19		$ 437.756			152.814	0,19	$ 0	$ 428.320		0,19%	$ 162.250	0,19	$ -	$ 590.570
		0		0,00														
	VALOR TOTAL OFERTADO			0,00		$ 60.341.260			21.064.199			$ 59.040.588			$ 22.364.872	0,00	$ -	$ 81.405.460

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**60.341.260**	**V/R ANTICIPO:**	-
V/R ADICIONES:	**21.064.199**		
V/R ACTUAL CONTRATO:	**81.405.460**	**% ANTICIPO :**	**0%**

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR				% PAGADO ACUMULADO
	(1)											
TOTAL			0	$ -	$ -	0	-	-				

Presento:

BLADIMIR BLANCO ALCAZAR
REPRESENTENTE LEGAR CONTRATISTA

Aprobó:

HERNANDO DIAZ
SUPERVISOR SENA

Visto Bueno:

MARCELINO GONZALEZ
APOYO TECNICO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlyserna	LENNIN YAFITH SERNA CAMPO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-013-000000	SENA REGIONAL BOLIVAR-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-29-6:14 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6223 de fecha 2023-03-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	93623	**Fecha Registro:**	2023-12-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-013-000000 SENA REGIONAL BOLIVAR-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	60.341.260,00	**Valor Total Operaciones:**	21.064.199,00			**Valor Actual:**	81.405.459,00	**Saldo x Obligar:**	81.405.459,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901161127	**Razón Social:**	CONSTRUCTORA BLANZAR S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	389385733	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	88147752	**Nombre:**	JAIME TORRADO CASADIEGOS	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL BOLIVAR

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.5660305	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2023-12-14

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101024 CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-14-0-3699011-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	2023-12-29	60.341.260,00	21.064.199,00		
					Total:	60.341.260,00	21.064.199,00	81.405.459,00	81.405.459,00

Objeto:	Contratar la adecuación de la agencia pública de empleo (APE) y atención a víctimas sede ternera - Sena regional Bolívar

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-013-000000	SENA REGIONAL BOLIVAR-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-14	60.341.260,00	60.341.260,00	NINGUNO
36-02-00-013-000000	SENA REGIONAL BOLIVAR-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-29	21.064.199,00	21.064.199,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
