

SDM 2023-2310 - RDE

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors
1	**1 SDM - RDE**	**526 hours**	**Thu 11/01/24**	**Fri 5/04/24**	
2	**1.1 CC DE RDE**	**526 hours**	**Thu 11/01/24**	**Fri 5/04/24**	
3	**1.1.1 FASE DE ELABORACION**	**68 hours**	**Thu 11/01/24**	**Mon 22/01/24**	
4	**1.1.1.1 Elaboración de las Historias de usuario**	**68 hours**	**Thu 11/01/24**	**Mon 22/01/24**	
5	1.1.1.1.1 Elaboración historias de usuario	16 hours	Thu 11/01/24	Fri 12/01/24	
6	1.1.1.1.2 Revisión de pares de las Historias de usuario	2 hours	Fri 12/01/24	Fri 12/01/24	5
7	1.1.1.1.3 Ajustes a las Historias de usuario	2 hours	Tue 16/01/24	Tue 16/01/24	6SS+2 days
8	1.1.1.1.4 Entrega al cliente de las historias de usuario	2 hours	Wed 17/01/24	Wed 17/01/24	7FS+1 day
9	1.1.1.1.5 Aprobación de las historias de usuario	24 hours	Wed 17/01/24	Mon 22/01/24	8
10	**1.1.2 FASE DE CONSTRUCCIÓN**	**426 hours**	**Fri 26/01/24**	**Fri 5/04/24**	
11	**1.1.2.1 Desarrollo**	**67 hours**	**Fri 26/01/24**	**Tue 6/02/24**	
12	1.1.2.1.1 Desarrollo de la solución	50 hours	Fri 26/01/24	Fri 2/02/24	9FS+4 days
13	1.1.2.1.2 Entega de la solución a QA	9 hours	Mon 5/02/24	Tue 6/02/24	12FS+1 day
14	**1.1.2.2 Pruebas y Ajustes**	**116 hours**	**Wed 7/02/24**	**Mon 26/02/24**	
15	1.1.2.2.1 Pruebas QA ciclo 1 (ciclo 2 alcance incial + cc)	50 hours	Wed 7/02/24	Wed 14/02/24	13FS+1 day
16	1.1.2.2.2 Ajustes pruebas de QA	24 hours	Thu 15/02/24	Tue 20/02/24	15FS+1 day
17	1.1.2.2.3 Pruebas QA ciclo 2	18 hours	Wed 21/02/24	Fri 23/02/24	16FS+1 day
18	1.1.2.2.4 Liberacion cliente desarrollo y pruebas	0 hours	Mon 26/02/24	Mon 26/02/24	17FS+1 day
19	**1.1.2.3 TRANSICIÓN**	**227 hours**	**Tue 27/02/24**	**Fri 5/04/24**	
20	**1.1.2.3.1 Pruebas UAT**	**174 hours**	**Tue 27/02/24**	**Tue 26/03/24**	
21	1.1.2.3.1.1 Despliegue UAT	24 hours	Tue 27/02/24	Thu 29/02/24	18FS+1 day
22	1.1.2.3.1.2 Pruebas de usuario de SDM	90 hours	Thu 29/02/24	Thu 14/03/24	21
23	1.1.2.3.1.3 Ajustes de UAT	36 hours	Thu 14/03/24	Wed 20/03/24	22
24	1.1.2.3.1.4 Pruebas de usuario de SDM 2do ciclo	24 hours	Wed 20/03/24	Tue 26/03/24	23
25	**1.1.2.3.2 Documentación**	**45 hours**	**Tue 27/02/24**	**Tue 5/03/24**	
26	1.1.2.3.2.1 Elaboración de documentacion funcional y técnica	45 hours	Tue 27/02/24	Tue 5/03/24	18FS+1 day
27	**1.1.2.3.3 Paso a producción**	**45 hours**	**Wed 27/03/24**	**Fri 5/04/24**	
28	1.1.2.3.3.1 Despliegue producción	45 hours	Wed 27/03/24	Fri 5/04/24	24FS+1 day



Proyecto: PLAN 7102-24-FTBA1 ES
Fecha: Wed 21/02/24 SDM CC42_RDE
controles de cambios_v3.0.mpp


SDM 2023-2310 - RDE

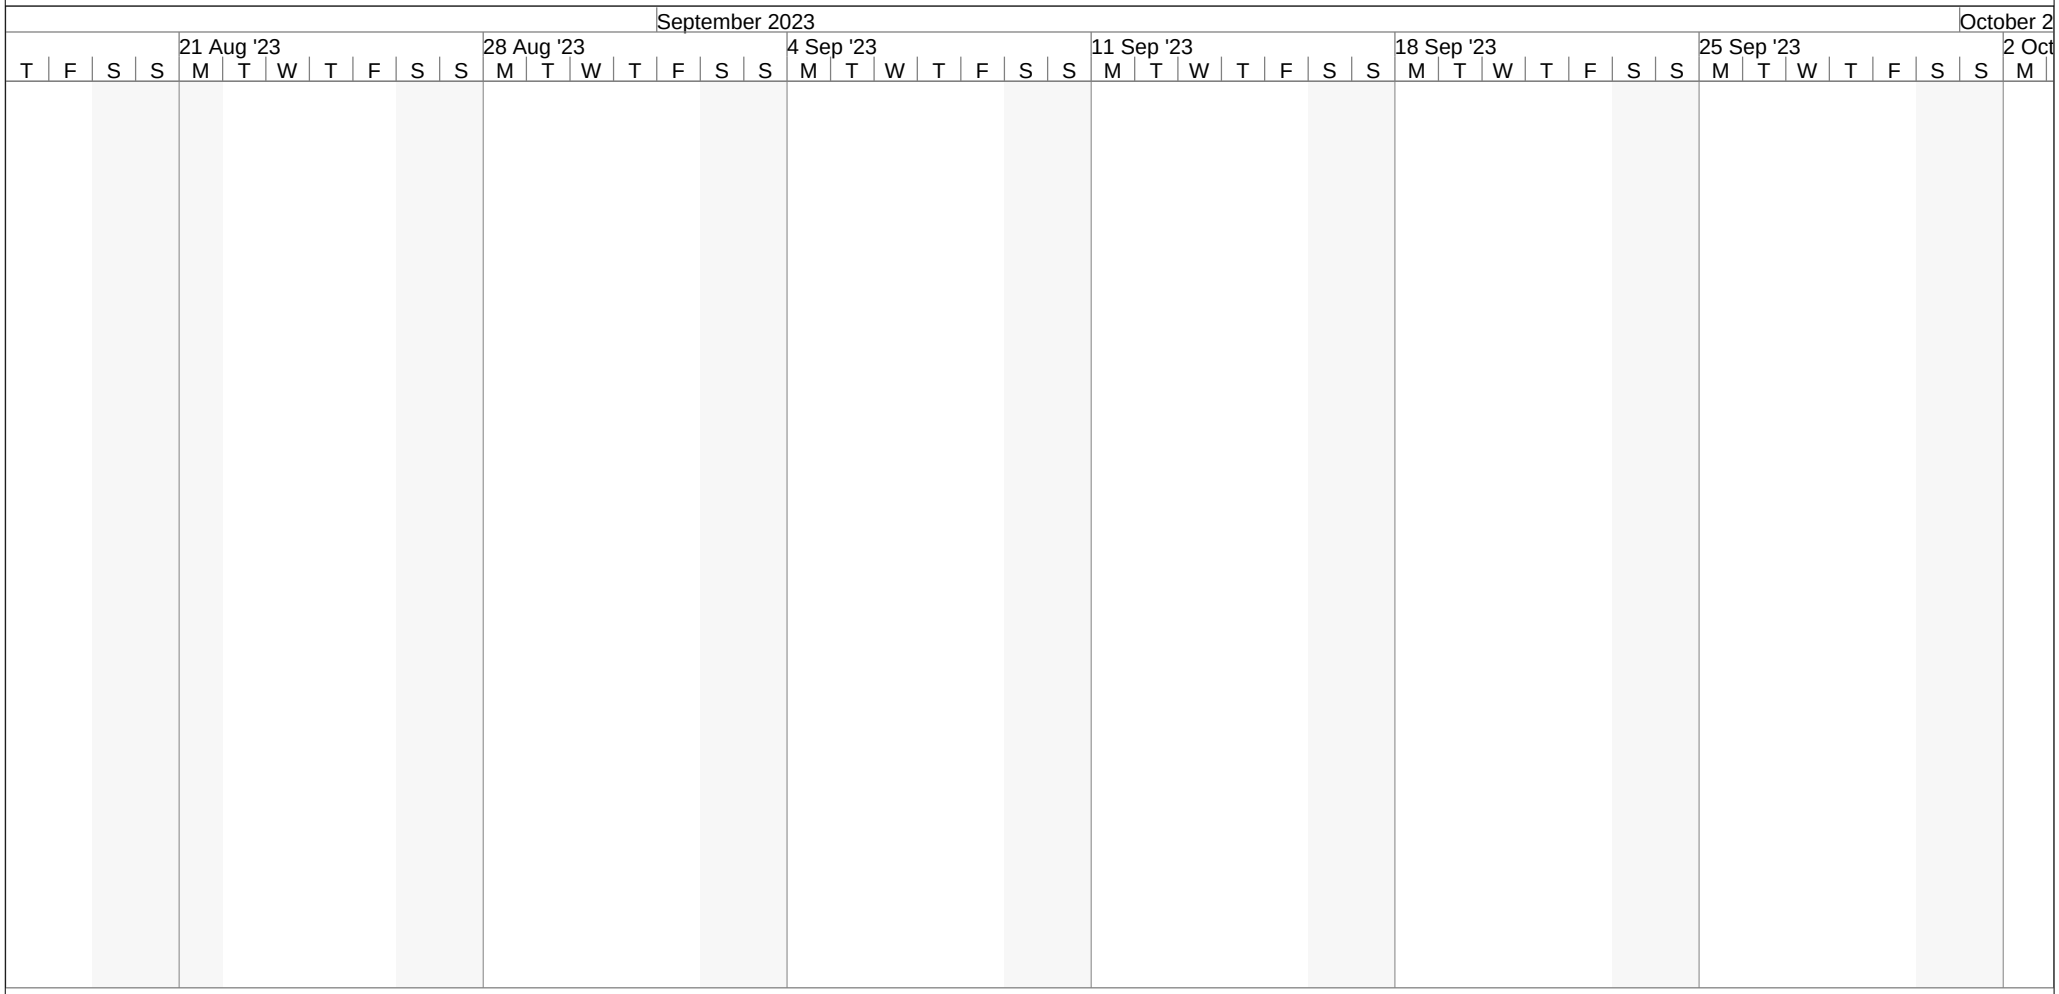

Proyecto: PLAN 2023-2310 RDE CONTROLES
Fecha: Wed 21/02/24 SDM CC42_RDE controles de cambios_v3.0.mpp

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Progreso	
Tareas externas		Sólo duración		Fecha límite	


SDM 2023-2310 - RDE

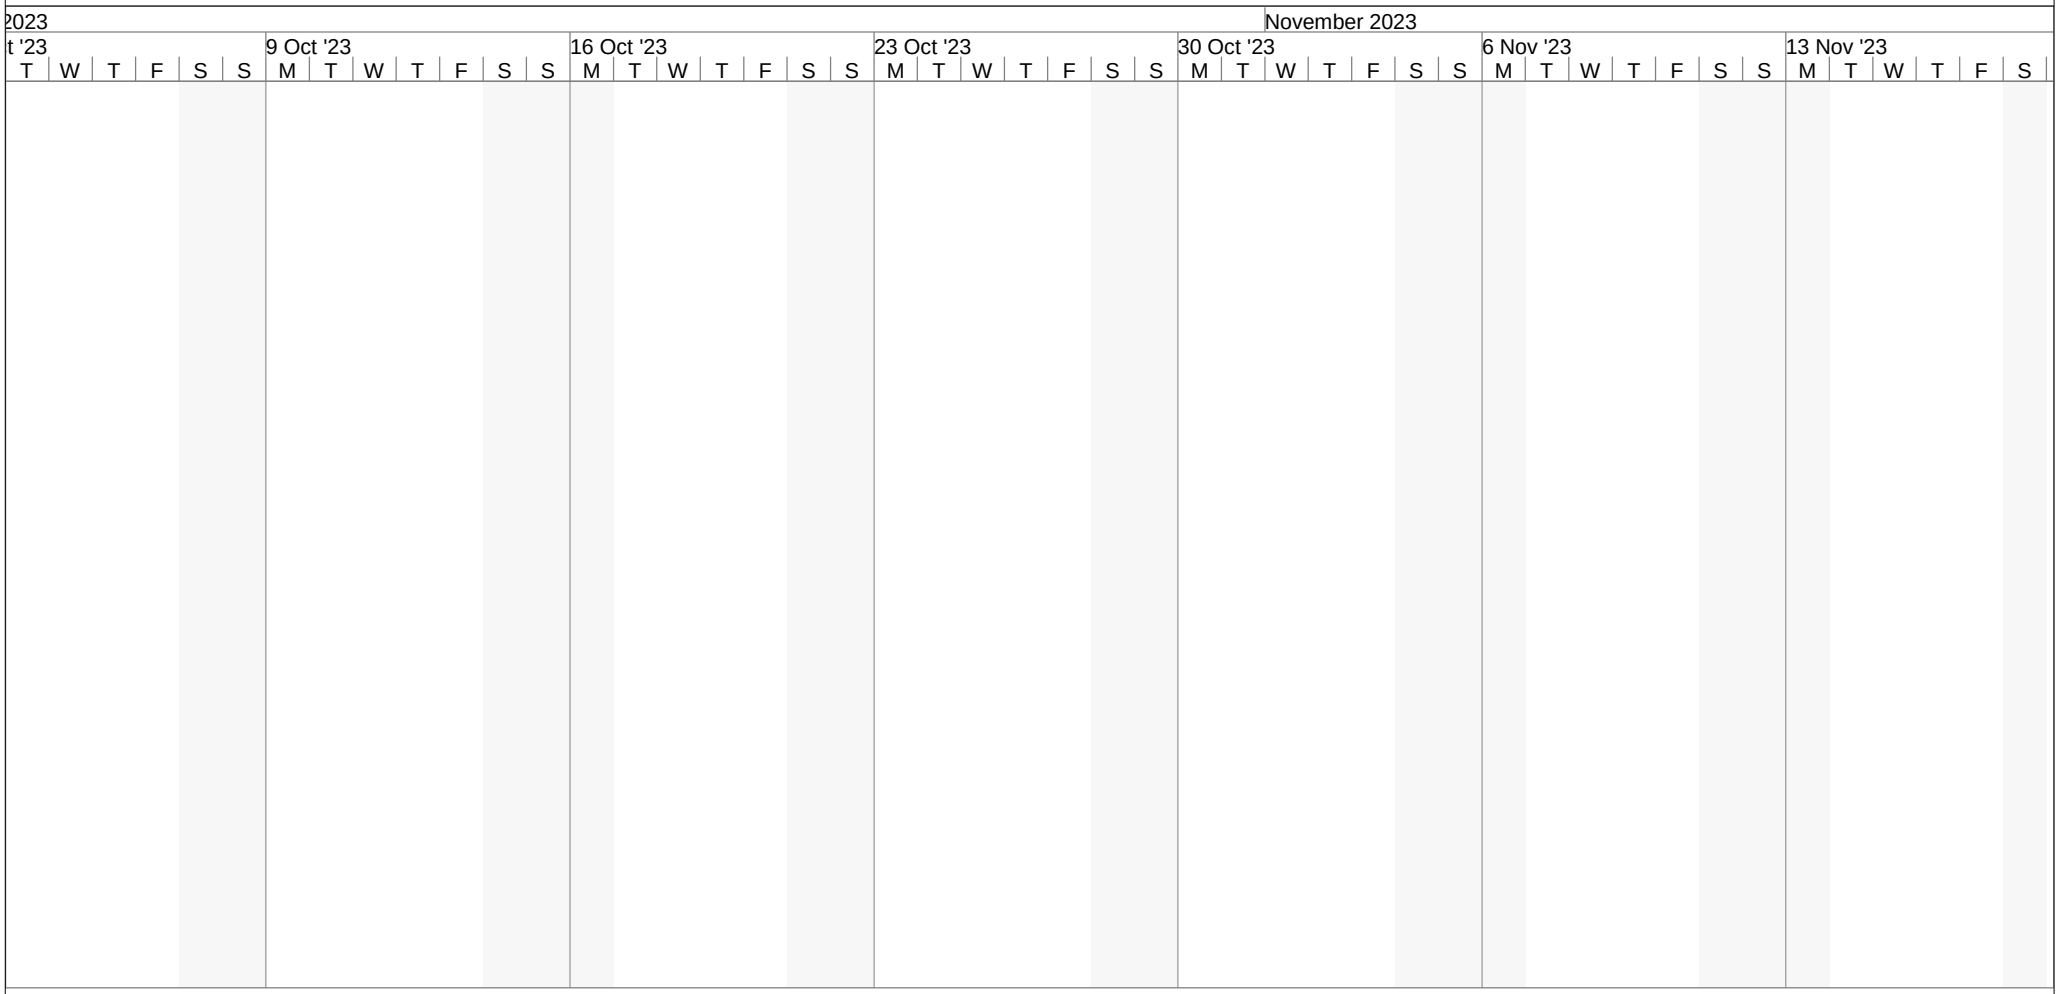

Proyecto: PLAN 2023-2310 SDM CC42_RDE controles de cambios_v3.0.mpp
Fecha: Wed 21/02/24

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Progreso	
Tareas externas		Sólo duración		Fecha límite	


SDM 2023-2310 - RDE

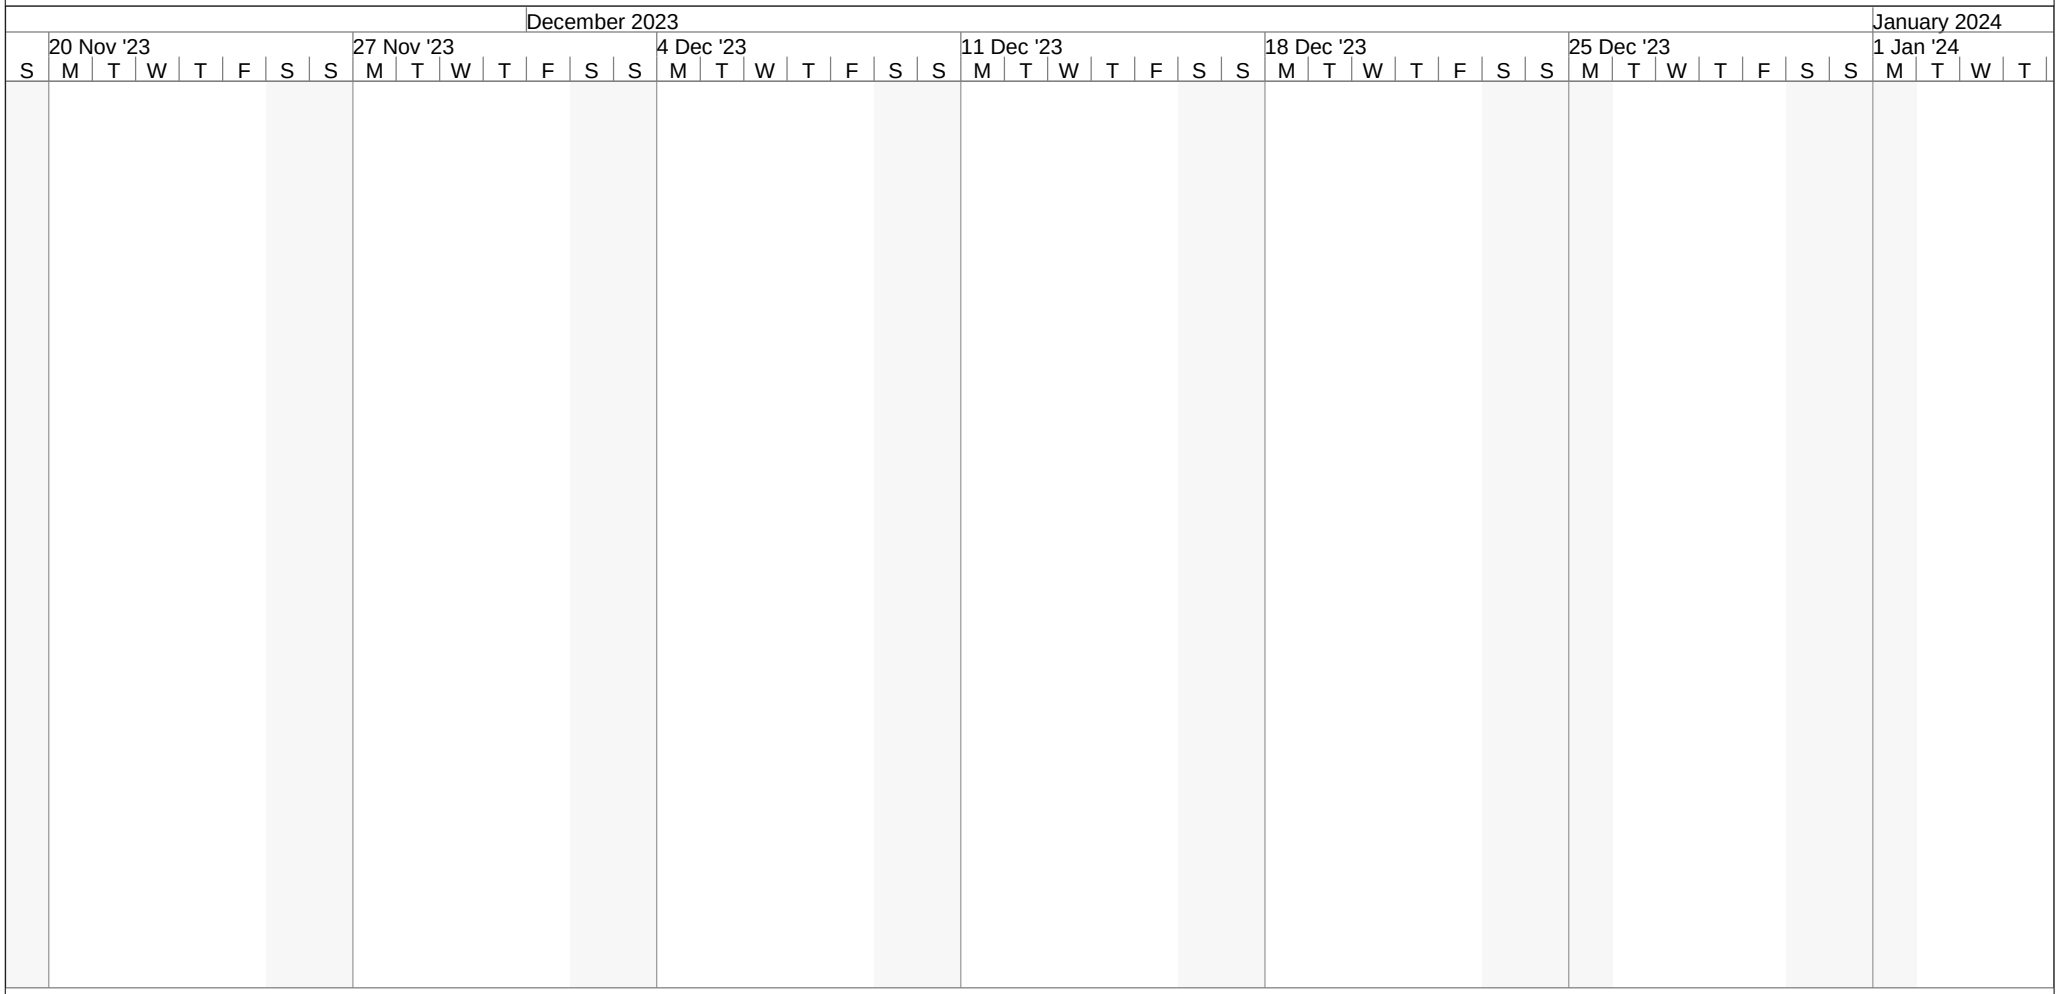

Proyecto: PLAN 2310-2311 SDM CC42_RDE controles de cambios_v3.0.mpp

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Progreso	
Tareas externas		Sólo duración		Fecha límite	


SDM 2023-2310 - RDE

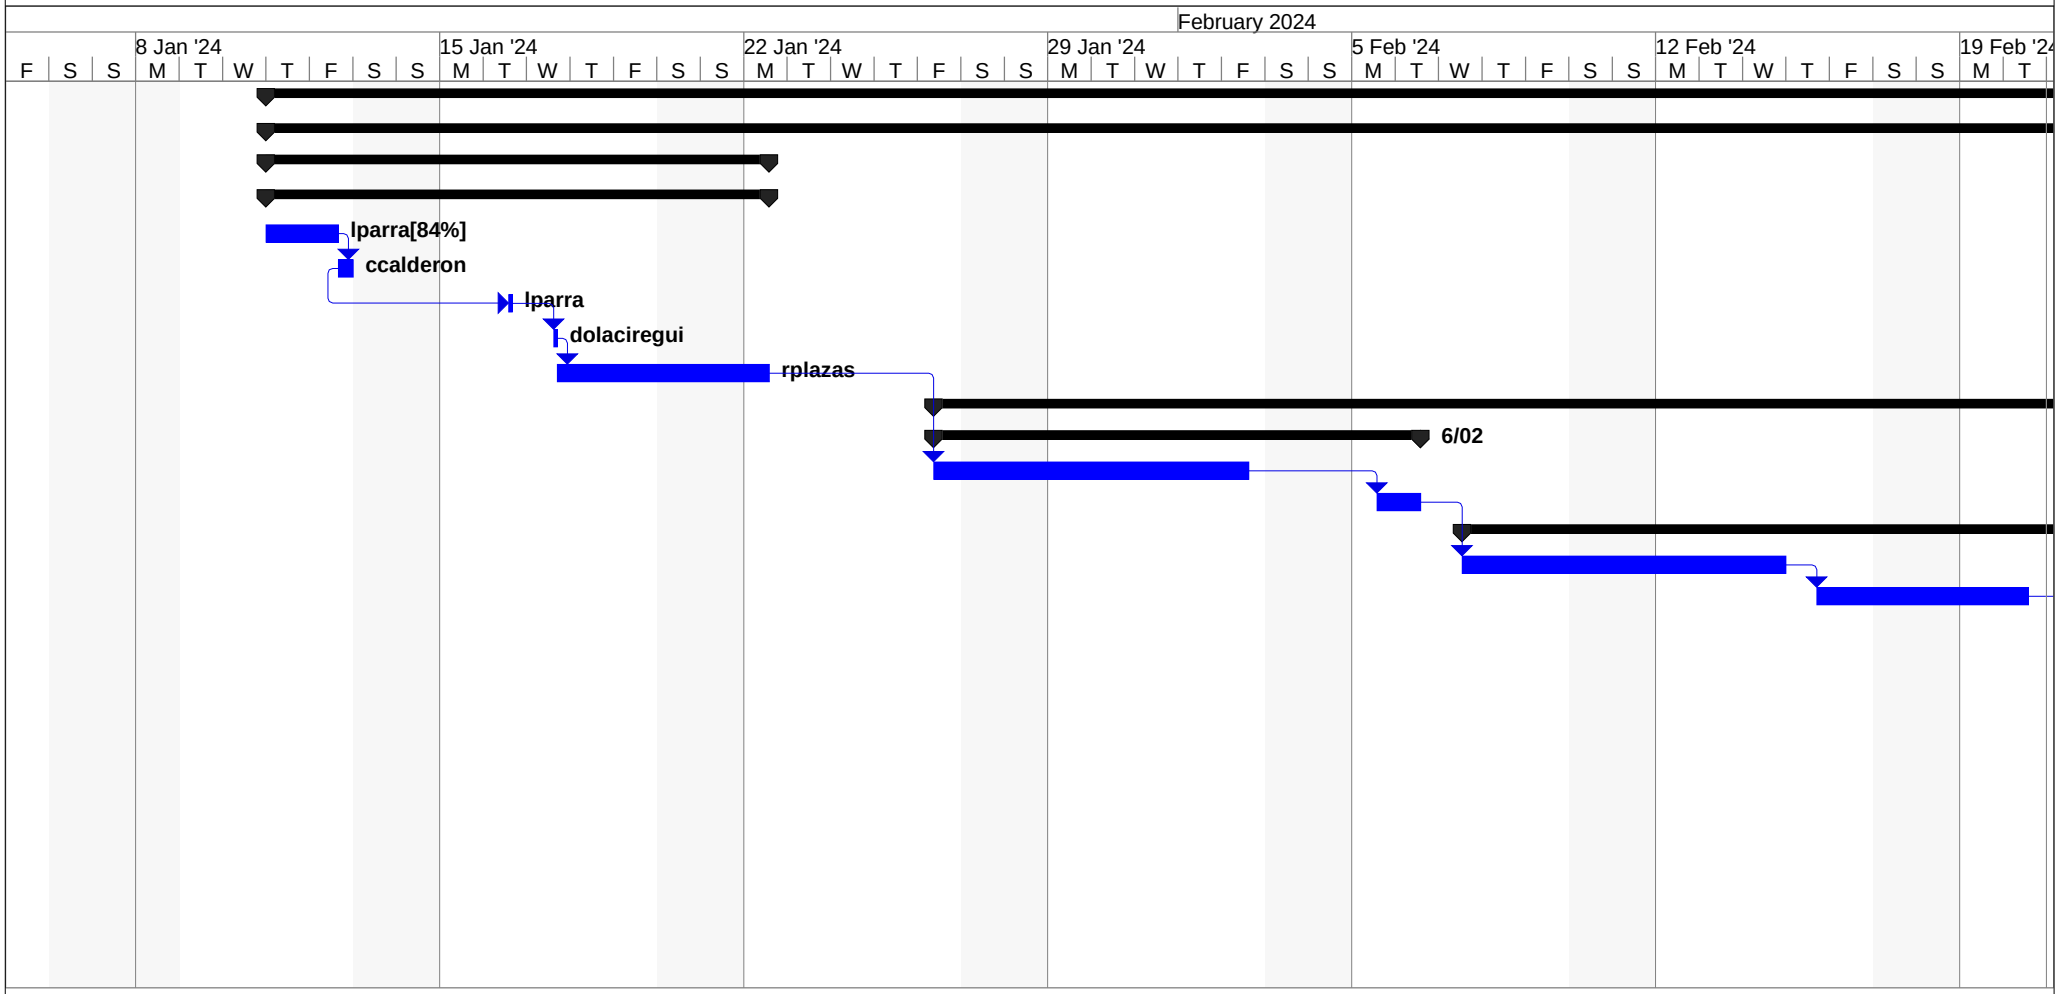

Proyecto: PLAN 2023-2310 RDE CONTROLES
Fecha: 06/12/23 SDM CC42_RDE controles de cambios_v3.0.mpp

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Progreso	
Tareas externas		Sólo duración		Fecha límite	

SDM 2023-2310 - RDE

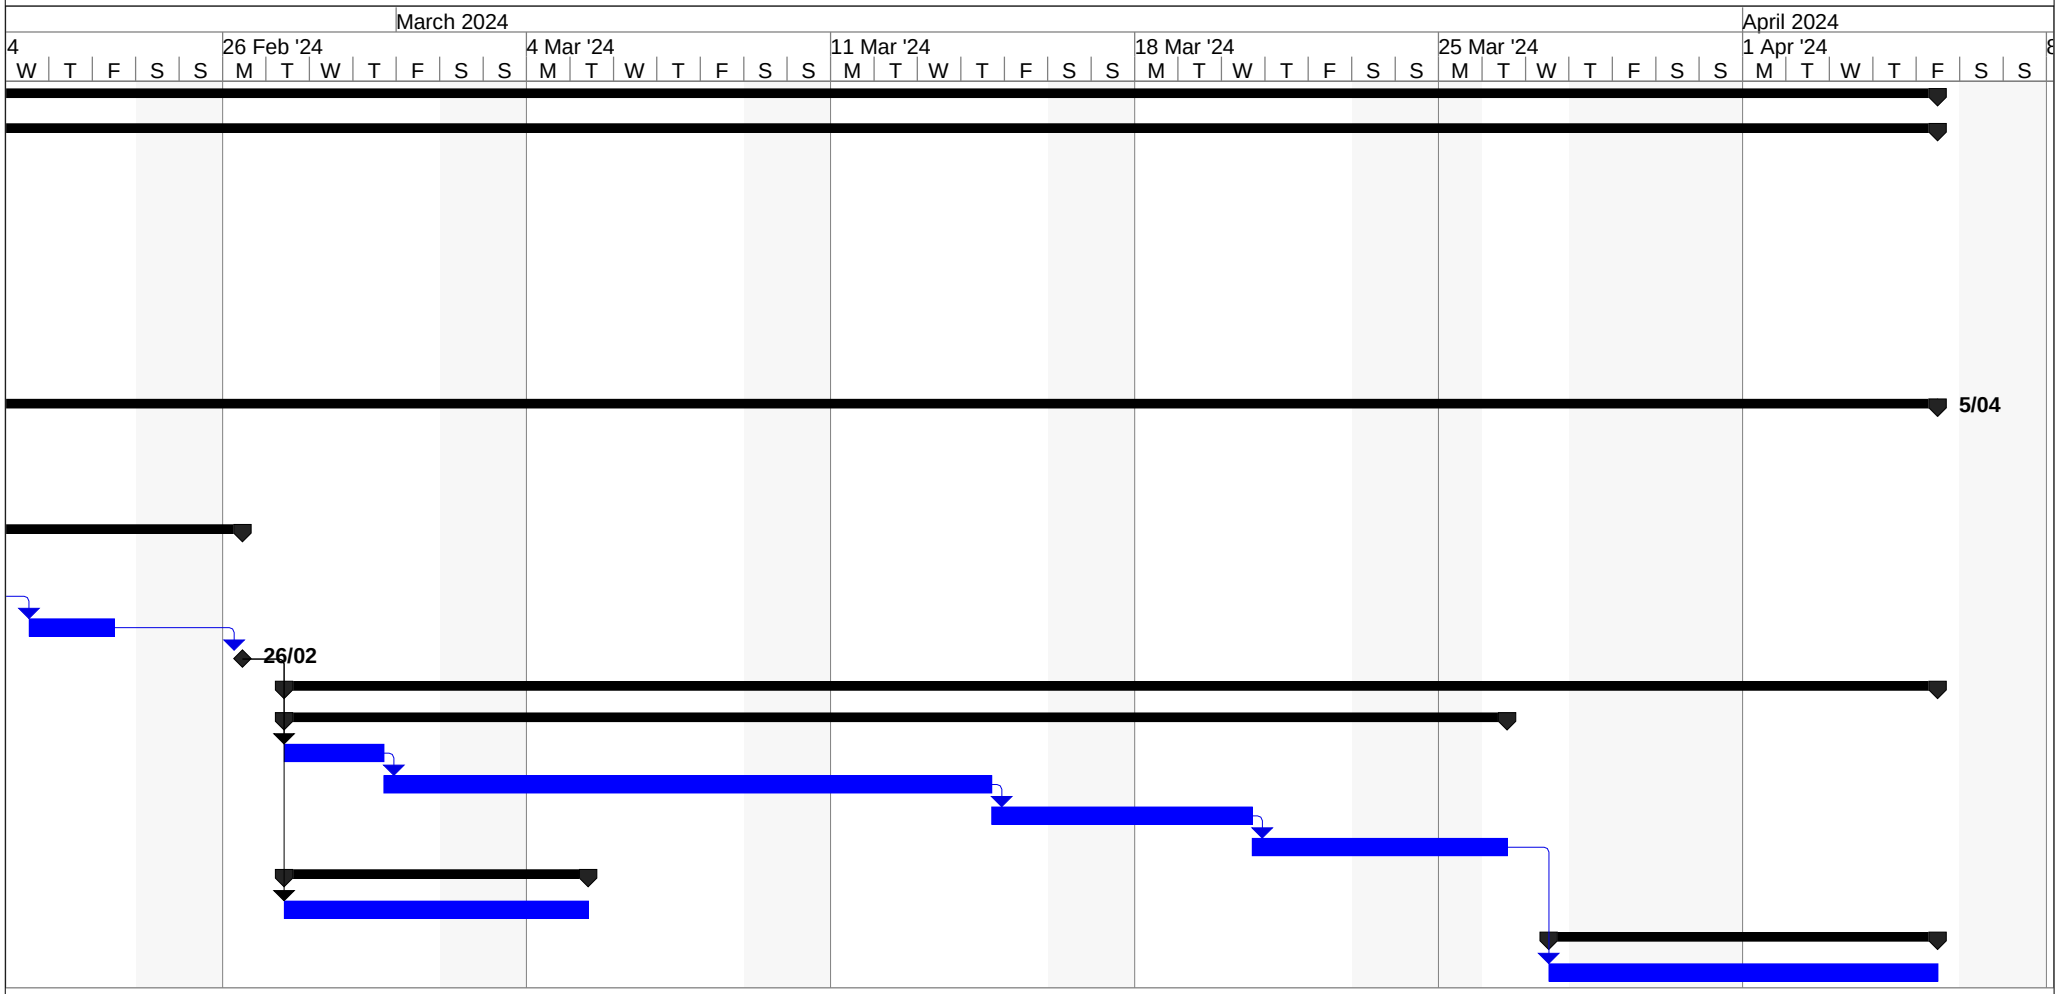

Proyecto: PLAN 21022024 FINAL ES CONVERSIÓN 2310 SDM CC42_RDE controles de cambios_v3.0.mpp

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Progreso	
Tareas externas		Sólo duración		Fecha límite	
