
Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	Predecesoras	Sucesoras
0	0	IDU-1714-2021-CONMALLVIALNOTRONG3-CLB-20240116	vie 3/12/21	mié 2/10/24	696 días	$ 67,870,996,759.00		
1	1	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3	vie 3/12/21	mié 2/10/24	696 días	$ 67,870,996,759.00		
2	1.1	Acta de Inicio	vie 3/12/21	vie 3/12/21	0 días	$ 0.00		5;7
3	1.2	ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	vie 3/12/21	vie 2/06/23	370 días	$ 1,062,081,320.46		
4	1.2.1	ACTIVIDADES PREVIAS	vie 3/12/21	jue 3/03/22	63 días	$ 0.00		
5	1.2.1.1	Enviar Hojas de vida del recurso humano mínimo requerido para el inicio de la ejecución	vie 3/12/21	jue 6/01/22	24 días	$ 0.00	2	6FC+4 días;10CC+1 día;11;12CC+1
6	1.2.1.2	Visitar de Obra	vie 14/01/22	mar 25/01/22	8 días	$ 0.00	5FC+4 días;8	24
7	1.2.1.3	Recopilar Información	vie 3/12/21	mar 21/12/21	12 días	$ 0.00	2	8
8	1.2.1.4	Otras actividades requeridas	mié 22/12/21	vie 31/12/21	8 días	$ 0.00	7	6
9	1.2.1.5	Documentos Preliminares	lun 6/12/21	jue 3/03/22	62 días	$ 0.00		
10	1.2.1.5.1	Realizar Plan Detallado de Inversión del Anticipo	lun 6/12/21	mié 29/12/21	17 días	$ 0.00	5CC+1 día	11
11	1.2.1.5.2	Relacionar de Equipo Mínimo	vie 7/01/22	vie 4/02/22	20 días	$ 0.00	5;10;12;13;15;17	24;20FC-1 día
12	1.2.1.5.3	Desglosar del AIU ofertado	lun 6/12/21	mié 29/12/21	17 días	$ 0.00	5CC+1 día	11;236FC+52 días
13	1.2.1.5.4	Realizar Cronograma General del Proyecto	lun 6/12/21	jue 23/12/21	13 días	$ 0.00	5CC+1 día	11
14	1.2.1.5.5	Realizar Programa de manejo Ambiental en Obra – MAO	vie 7/01/22	mar 25/01/22	12 días	$ 0.00	5	24
15	1.2.1.5.6	Realizar Planes de Manejo de Tránsito (PMT)	lun 6/12/21	mié 29/12/21	17 días	$ 0.00	5CC+1 día	11
16	1.2.1.5.7	Realizar Plan Anual de Caja – PAC	vie 7/01/22	mar 25/01/22	12 días	$ 0.00	5	24
17	1.2.1.5.8	Realizar Plan de Calidad de Obra	lun 6/12/21	jue 23/12/21	13 días	$ 0.00	5CC+1 día	11
18	1.2.1.5.9	Realizar Análisis de precios unitarios de los ítems correspondientes a la propuesta económica	lun 6/12/21	mié 29/12/21	17 días	$ 0.00	5CC+1 día	11
19	1.2.1.5.10	Realizar Plan de diálogo ciudadano y comunicación estratégica	vie 7/01/22	mar 25/01/22	12 días	$ 0.00	5	24
20	1.2.1.5.11	Realizar Plan de Gestión Integral de residuos de construcción y demolición (RCD)	vie 4/02/22	jue 3/03/22	20 días	$ 0.00	11FC-1 día	24FC-1 día
21	1.2.2	DIAGNÓSTICOS	jue 3/03/22	vie 3/03/23	248 días	$ 878,024,604.30		
22	1.2.2.1	Diagnósticos Aprobados 100% de los tramos preseleccionados (vigencia 2021 - 2022)	jue 3/03/22	jue 30/06/22	80 días	$ 460,982,659.50		
23	1.2.2.1.1	Diagnósticos aprobados corredor AV Boyacá Sur-norte	jue 3/03/22	lun 13/06/22	69 días	$ 318,812,571.00		
24	1.2.2.1.1.1	Elaborar diagnóstico calzada lenta	jue 3/03/22	mar 17/05/22	51 días	$ 159,923,406.00	6;14;16;19;11;20	25CC+20 días;32;
25	1.2.2.1.1.2	Elaborar diagnóstico calzada rápida	vie 1/04/22	lun 13/06/22	49 días	$ 158,889,165.00	24CC+20 días	26CC+14 días;32
26	1.2.2.1.2	Elaborar Diagnósticos aprobados corredor AV Caracas	lun 25/04/22	jue 30/06/22	46 días	$ 142,170,088.50	25CC+14 días	33FC-1 día;29FC+104
27	1.2.2.2	Diagnósticos Aprobados 100% de los tramos preseleccionados (vigencia 2023)	mar 18/10/22	vie 3/03/23	95 días	$ 417,041,944.80		
28	1.2.2.2.1	Elaborar Diagnósticos aprobados corredor AV Gaitán Cortes	mar 18/10/22	vie 3/03/23	95 días	$ 362,310,187.80	26FC+73 días	35FC+15 días;365FC+55
29	1.2.2.2.2	Elaborar Diagnósticos aprobados corredor AV Boyacá Norte - Sur	vie 2/12/22	vie 3/03/23	64 días	$ 54,731,757.00	26FC+104 días	35;395FC-14 días
30	1.2.3	DISEÑO	jue 30/06/22	vie 2/06/23	229 días	$ 184,056,716.16		
31	1.2.3.1	Diseños Aprobados 100% de los tramos preseleccionados (vigencia 2021 - 2022)	jue 30/06/22	mié 31/08/22	42 días	$ 126,005,366.40		
32	1.2.3.1.1	Elaborar Diseños aprobados corredor AV Boyacá Sur-norte	jue 30/06/22	mié 31/08/22	42 días	$ 12,331,315.20	25FC+10 días;24	211FC+85 días
33	1.2.3.1.2	Elaborar Diseños aprobados corredor AV Caracas	jue 30/06/22	mié 31/08/22	42 días	$ 113,674,051.20	26FC-1 día	233FC+85 días
34	1.2.3.2	Diseño Aprobados 100% de los tramos preseleccionados (vigencia 2023)	mar 28/03/23	vie 2/06/23	45 días	$ 58,051,349.76		
35	1.2.3.2.1	Elaborar Diseños aprobados corredor AV Gaitán Cortes	mar 28/03/23	vie 2/06/23	45 días	$ 58,051,349.76	28FC+15 días;29	647;641;645;642
36	1.3	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	lun 14/03/22	mié 2/10/24	626 días	$ 66,808,915,438.54		
37	1.3.1	ACTIVIDADES DE OBRA	lun 14/03/22	lun 2/09/24	604 días	$ 55,044,256,256.95		
38	1.3.1.1	Inicio de Intervención Av. Boyacá sentido Sur – Norte.	vie 29/04/22	vie 29/04/22	0 días	$ 0.00	24CC+39 días	42CC-1 día
39	1.3.1.2	Realizar actividades de Mantenimiento Periódico (vigencia 2021-2022)	vie 29/04/22	jue 5/01/23	170 días	$ 17,817,040,467.94		
40	1.3.1.2.1	Realizar Corredor AV Boyacá sur-norte Calzada lenta. FRENTE No 1	vie 29/04/22	mar 20/12/22	158 días	$ 9,475,406,714.77		
41	1.3.1.2.1.1	Tramo 5	vie 29/04/22	jue 7/07/22	46 días	$ 2,132,201,376.05		
42	1.3.1.2.1.1.1	8011524-91024947	vie 29/04/22	mié 4/05/22	4 días	$ 234,121,040.20	38CC-1 día	43
43	1.3.1.2.1.1.2	8011511-2517886	jue 5/05/22	jue 5/05/22	1 día	$ 64,300,173.92	42	44
44	1.3.1.2.1.1.3	8011492-521964	vie 6/05/22	mar 10/05/22	3 días	$ 97,021,119.83	43	45
45	1.3.1.2.1.1.4	8014329-24122056	mié 11/05/22	lun 16/05/22	4 días	$ 237,685,525.06	44	46
46	1.3.1.2.1.1.5	8014330-24122060	mar 17/05/22	jue 19/05/22	3 días	$ 202,631,417.87	45	47
47	1.3.1.2.1.1.6	8011358-521942	vie 20/05/22	mié 1/06/22	8 días	$ 421,209,412.34	46	48
48	1.3.1.2.1.1.7	8013257-91021547	jue 2/06/22	lun 6/06/22	3 días	$ 116,893,995.90	47	49
49	1.3.1.2.1.1.8	8011175-521931	mar 7/06/22	lun 13/06/22	5 días	$ 151,373,126.21	48	50
50	1.3.1.2.1.1.9	8011076-521920	mar 14/06/22	jue 16/06/22	3 días	$ 94,115,293.95	49	51
51	1.3.1.2.1.1.10	8011000-521911	vie 17/06/22	mar 21/06/22	2 días	$ 152,850,756.95	50	52
52	1.3.1.2.1.1.11	8013256-91021548	mié 22/06/22	vie 24/06/22	3 días	$ 72,936,011.06	51	53
53	1.3.1.2.1.1.12	8010746-521902	mar 28/06/22	mar 28/06/22	1 día	$ 79,691,455.97	52	54
54	1.3.1.2.1.1.13	8010647-521893	mié 29/06/22	jue 30/06/22	2 días	$ 35,286,452.88	53	55
55	1.3.1.2.1.1.14	8010562-521884	vie 1/07/22	mar 5/07/22	2 días	$ 64,819,163.36	54	56
56	1.3.1.2.1.1.15	8010453-521875	mié 6/07/22	jue 7/07/22	2 días	$ 107,266,430.55	55	58
57	1.3.1.2.1.2	Tramo 4	vie 8/07/22	mar 23/08/22	31 días	$ 2,240,121,529.74		
58	1.3.1.2.1.2.1	8010311-521866	vie 8/07/22	mar 12/07/22	3 días	$ 299,279,130.95	56	59
59	1.3.1.2.1.2.2	8009933-521855	mié 13/07/22	vie 15/07/22	3 días	$ 159,796,554.15	58	60
60	1.3.1.2.1.2.3	8009746-521844	lun 18/07/22	lun 18/07/22	1 día	$ 143,181,227.14	59	61
61	1.3.1.2.1.2.4	8009540-521833	mar 19/07/22	mar 19/07/22	1 día	$ 128,254,543.19	60	62
62	1.3.1.2.1.2.5	8009365-509001	jue 21/07/22	jue 21/07/22	1 día	$ 118,937,506.14	61	63
63	1.3.1.2.1.2.6	8009167-521811	vie 22/07/22	mié 27/07/22	4 días	$ 208,334,931.77	62	64
64	1.3.1.2.1.2.7	8008510-509046	jue 28/07/22	vie 29/07/22	2 días	$ 218,138,418.40	63	65
65	1.3.1.2.1.2.8	8008285-521800	lun 1/08/22	mié 3/08/22	3 días	$ 167,150,410.17	64	66
66	1.3.1.2.1.2.9	8007974-521789	jue 4/08/22	vie 5/08/22	2 días	$ 188,850,453.80	65	67
67	1.3.1.2.1.2.10	8007748-521781	lun 8/08/22	mar 9/08/22	2 días	$ 156,010,916.05	66	68
68	1.3.1.2.1.2.11	8007508-509023	mié 10/08/22	vie 12/08/22	3 días	$ 95,986,681.41	67	69
69	1.3.1.2.1.2.12	8007409-521733	mar 16/08/22	mié 17/08/22	2 días	$ 100,218,372.40	68	70
70	1.3.1.2.1.2.13	8014898-91060613	jue 18/08/22	lun 22/08/22	3 días	$ 117,953,471.22	69	71
71	1.3.1.2.1.2.14	8014415-91060614	mar 23/08/22	mar 23/08/22	1 día	$ 138,028,912.95	70	73
72	1.3.1.2.1.3	Tramo 3	mié 24/08/22	mié 19/10/22	40 días	$ 2,793,903,583.33		
73	1.3.1.2.1.3.1	8012656-508992	mié 24/08/22	lun 29/08/22	4 días	$ 91,848,539.69	71	74
74	1.3.1.2.1.3.2	8006748-509012	mar 30/08/22	vie 2/09/22	4 días	$ 321,394,994.38	73	75
75	1.3.1.2.1.3.3	8006342-521668	lun 5/09/22	vie 9/09/22	5 días	$ 373,492,334.34	74	76
76	1.3.1.2.1.3.4	8006237-24120017	lun 12/09/22	mar 13/09/22	2 días	$ 86,340,024.96	75	77
77	1.3.1.2.1.3.5	8005898-521654	mié 14/09/22	mié 21/09/22	6 días	$ 471,704,757.71	76	78
78	1.3.1.2.1.3.6	8005344-521634	jue 22/09/22	mar 27/09/22	4 días	$ 330,407,624.08	77	79
79	1.3.1.2.1.3.7	8005215-521623	mié 28/09/22	vie 30/09/22	3 días	$ 293,228,339.38	78	80
80	1.3.1.2.1.3.8	8012420-522013	lun 3/10/22	mar 4/10/22	2 días	$ 45,430,228.14	79	81
81	1.3.1.2.1.3.9	8004900-502720	mié 5/10/22	lun 10/10/22	4 días	$ 227,068,874.97	80	82
82	1.3.1.2.1.3.10	8004500-91026860	mar 11/10/22	mié 19/10/22	6 días	$ 552,987,865.68	81	84
83	1.3.1.2.1.4	Tramo 2	jue 20/10/22	jue 24/11/22	24 días	$ 1,127,116,927.27		
84	1.3.1.2.1.4.1	8014093-24122336	jue 20/10/22	lun 24/10/22	3 días	$ 142,271,107.66	82	86
85	1.3.1.2.1.4.2	8014092-24122332	mar 22/11/22	jue 24/11/22	3 días	$ 105,012,403.99	91;92	166FC-9 días;94
86	1.3.1.2.1.4.3	8003265-521579	mar 25/10/22	mié 26/10/22	2 días	$ 108,182,275.40	84	87
87	1.3.1.2.1.4.4	8013031-91020900	jue 27/10/22	vie 28/10/22	2 días	$ 120,966,519.14	86	88
88	1.3.1.2.1.4.5	8003096-521568	lun 31/10/22	mié 2/11/22	3 días	$ 125,450,867.33	87	89
89	1.3.1.2.1.4.6	8013022-91021133	jue 3/11/22	vie 4/11/22	2 días	$ 88,404,611.47	88	90
90	1.3.1.2.1.4.7	8013021-91021135	mar 8/11/22	jue 10/11/22	3 días	$ 126,095,831.97	89	91
91	1.3.1.2.1.4.8	8002710-521557	vie 11/11/22	mié 16/11/22	3 días	$ 148,828,268.74	90	92;85
92	1.3.1.2.1.4.9	8013012-91020901	jue 17/11/22	lun 21/11/22	3 días	$ 161,905,041.57	91	85
93	1.3.1.2.1.5	Tramo 1	vie 25/11/22	mar 20/12/22	17 días	$ 1,182,063,298.38		
94	1.3.1.2.1.5.1	8014088-24122379	vie 25/11/22	lun 28/11/22	2 días	$ 103,791,233.36	85	95
95	1.3.1.2.1.5.2	8013011-91020905	mar 29/11/22	mié 30/11/22	2 días	$ 123,597,724.57	94	96
96	1.3.1.2.1.5.3	8014052-24122372	jue 1/12/22	mié 7/12/22	5 días	$ 361,614,129.50	95	97
97	1.3.1.2.1.5.4	8014051-24122368	vie 9/12/22	mié 14/12/22	4 días	$ 287,669,194.87	96	98
98	1.3.1.2.1.5.5	8014050-24122364	jue 15/12/22	mar 20/12/22	4 días	$ 305,391,016.08	97	234

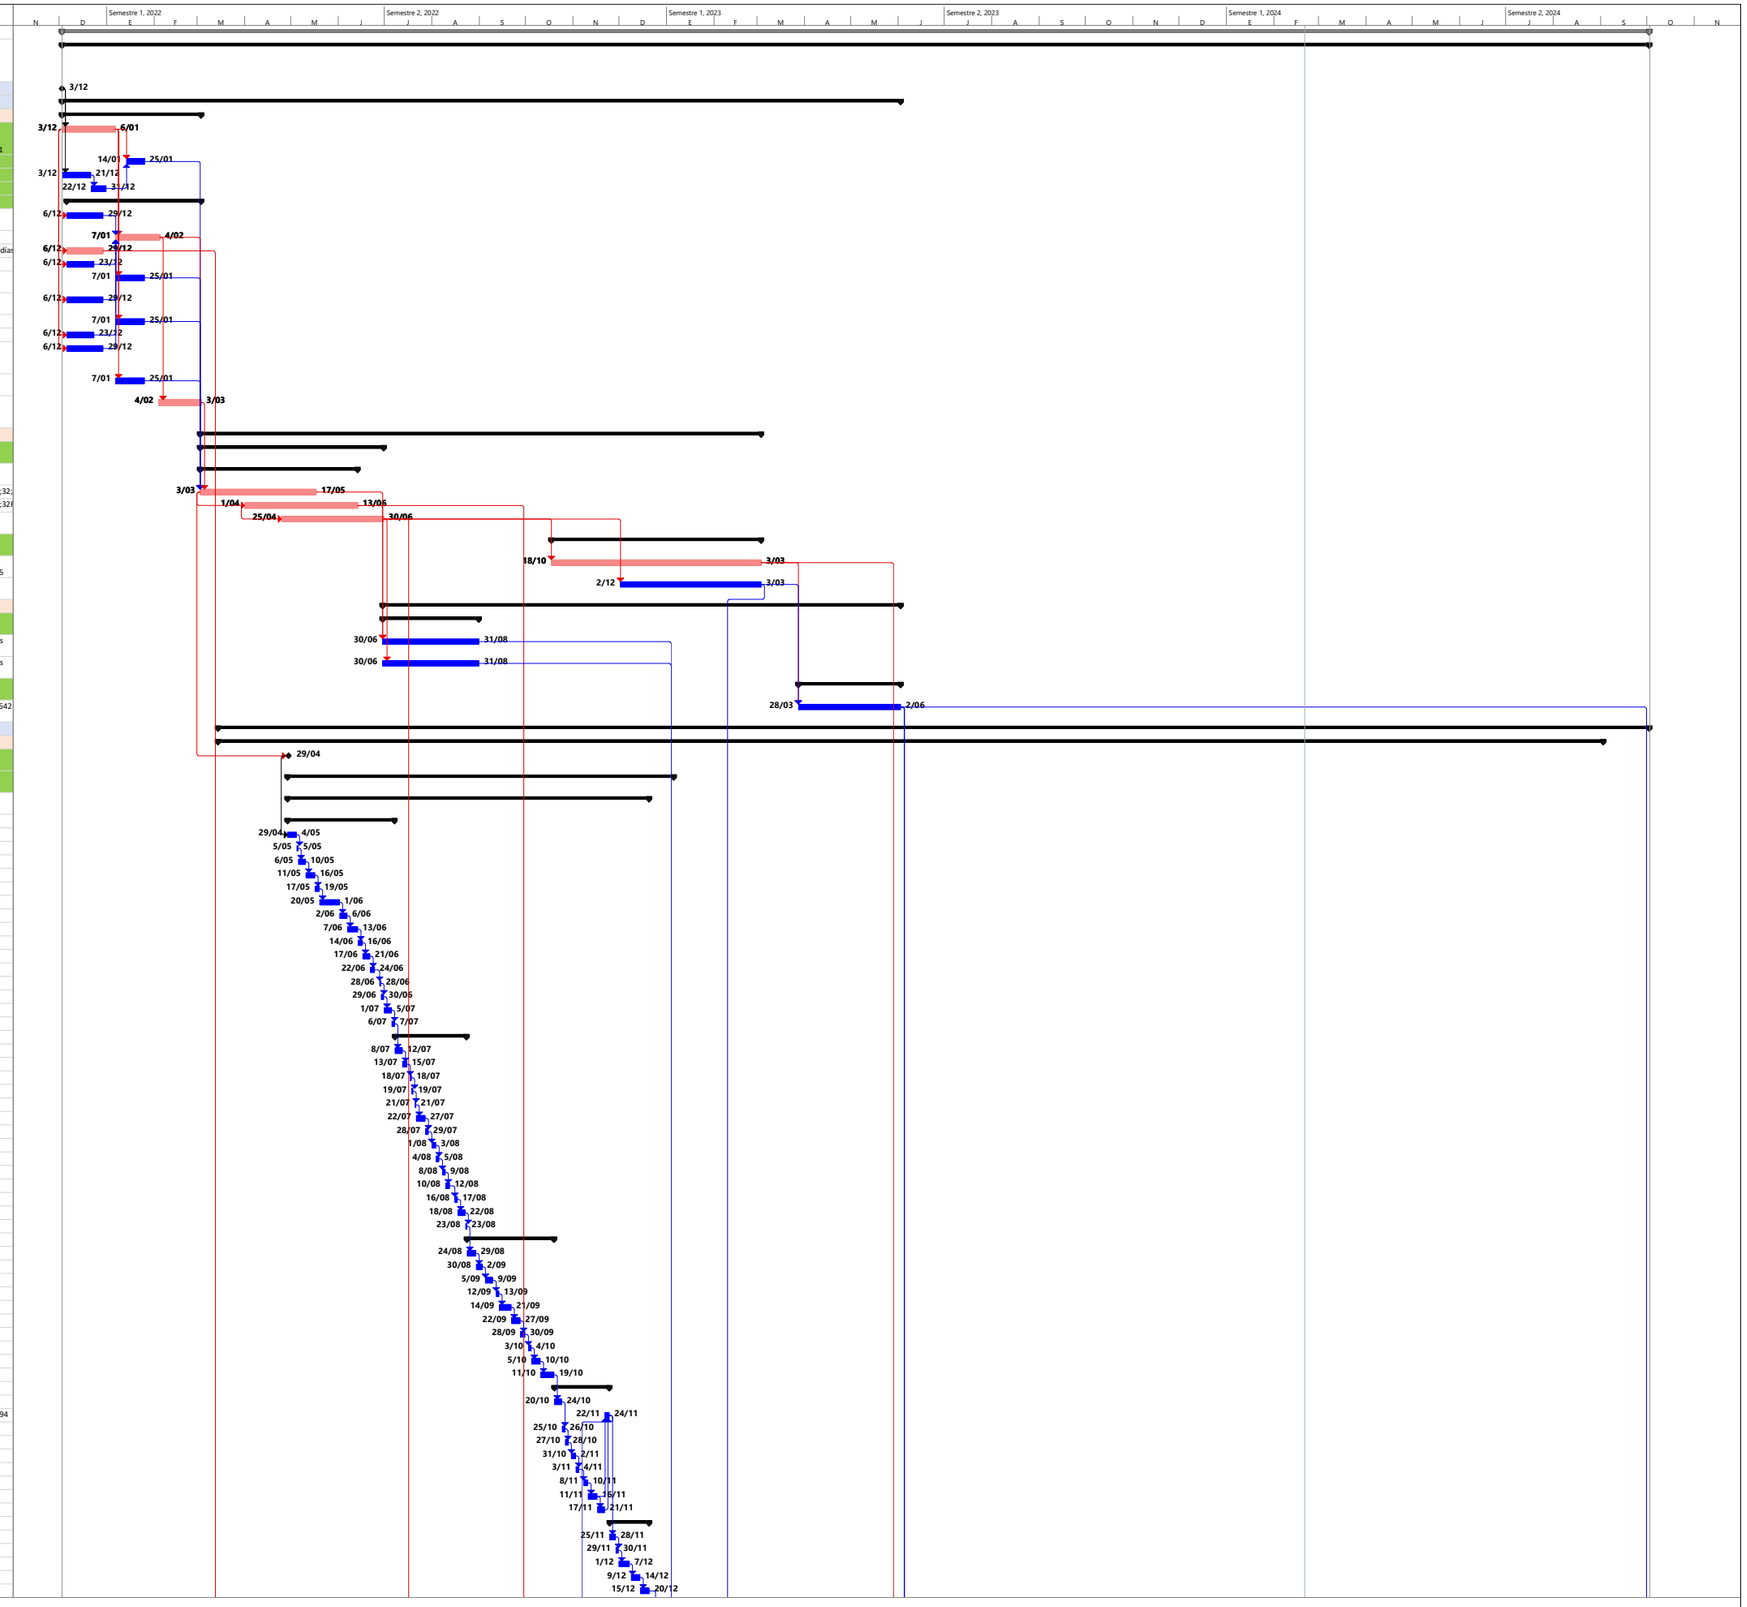


Proyecto: IDU-1714-2021-CON
Fecha: mié 21/02/24

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Tarea resumida · Hito resumido · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Tarea crítica · División crítica
División · Resumen · Agrupar por síntesis · Tarea crítica resumida · Progreso resumido · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Fecha límite · Tareas críticas · Progreso


Felipe Torres Alonso
Esp. Costos, Presupuestos y Programación
Consorcio CTUPT 013

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	Predecesoras	Sucesoras
99	1.3.1.2.2	Realizar Corredor AV Boyacá sur-norte Calzada Rápida. FRENTE No 5	vie 30/09/22	vie 23/12/22	57 días	$ 3,864,922,841.18		
100	1.3.1.2.2.1	Tramo 5	vie 30/09/22	mar 1/11/22	22 días	$ 1,523,716,086.36		
101	1.3.1.2.2.1.1	8014942-91024919	vie 30/09/22	mié 5/10/22	4 días	$ 342,853,434.85	25FC+73 días	102
102	1.3.1.2.2.1.2	8011524-521984	jue 6/10/22	lun 10/10/22	3 días	$ 190,273,089.30	101	103
103	1.3.1.2.2.1.3	8011511-521975	mar 11/10/22	mar 11/10/22	1 día	$ 41,791,638.40	102	104
104	1.3.1.2.2.1.4	8011492-521966	mié 12/10/22	jue 13/10/22	2 días	$ 149,965,184.63	103	105
105	1.3.1.2.2.1.5	8014329-24122057	vie 14/10/22	mié 19/10/22	3 días	$ 243,776,192.84	104	106
106	1.3.1.2.2.1.6	8014330-24122061	jue 20/10/22	vie 21/10/22	2 días	$ 203,223,010.67	105	107;169FC+5 días
107	1.3.1.2.2.1.7	8013257-91021546	lun 24/10/22	lun 24/10/22	1 día	$ 39,399,152.66	106	108
108	1.3.1.2.2.1.8	8011175-521933	mar 25/10/22	mar 25/10/22	1 día	$ 57,980,475.83	107	109
109	1.3.1.2.2.1.9	8011076-521922	mié 26/10/22	mié 26/10/22	1 día	$ 40,872,099.46	108	110
110	1.3.1.2.2.1.10	8011000-521913	jue 27/10/22	jue 27/10/22	1 día	$ 71,716,598.78	109	111
111	1.3.1.2.2.1.11	8013256-91021551	vie 28/10/22	vie 28/10/22	1 día	$ 46,553,365.20	110	112
112	1.3.1.2.2.1.12	8010746-521904	lun 31/10/22	lun 31/10/22	1 día	$ 60,823,225.07	111	113
113	1.3.1.2.2.1.13	8010647-521895	mar 1/11/22	mar 1/11/22	1 día	$ 34,488,618.67	112	115;170
114	1.3.1.2.2.2	Tramo 4	mié 2/11/22	vie 25/11/22	16 días	$ 1,024,192,202.53		
115	1.3.1.2.2.2.1	8009746-521846	mié 2/11/22	jue 3/11/22	2 días	$ 147,696,740.40	113	116
116	1.3.1.2.2.2.2	8009540-521835	vie 4/11/22	vie 4/11/22	1 día	$ 81,406,328.74	115	174
117	1.3.1.2.2.2.3	8008510-509048	mié 9/11/22	jue 10/11/22	2 días	$ 228,590,095.06	174	118
118	1.3.1.2.2.2.4	8008285-521802	vie 11/11/22	vie 11/11/22	1 día	$ 104,470,840.64	117	119
119	1.3.1.2.2.2.5	8007974-521791	mar 15/11/22	mié 16/11/22	2 días	$ 156,116,085.84	118	173;122
120	1.3.1.2.2.2.6	8007508-509025	mar 22/11/22	mié 23/11/22	2 días	$ 114,285,126.35	173;122	177FC+4 días;121
121	1.3.1.2.2.2.7	8014898-91060611	jue 24/11/22	vie 25/11/22	2 días	$ 104,017,658.41	120	175CC-2 días;179
122	1.3.1.2.2.2.8	8014415-91060612	jue 17/11/22	lun 21/11/22	3 días	$ 87,609,327.09	119	120
123	1.3.1.2.2.3	Tramo 2	lun 28/11/22	mar 6/12/22	7 días	$ 755,996,351.04		
124	1.3.1.2.2.3.1	8014093-24122337	lun 28/11/22	lun 28/11/22	1 día	$ 77,561,224.44	121	125
125	1.3.1.2.2.3.2	8003644-521588	mar 29/11/22	jue 1/12/22	3 días	$ 451,185,694.25	124	126
126	1.3.1.2.2.3.3	8013021-91021134	vie 2/12/22	lun 5/12/22	2 días	$ 111,027,780.40	125	127
127	1.3.1.2.2.3.4	8002710-521555	mar 6/12/22	mar 6/12/22	1 día	$ 116,221,651.95	126	188
128	1.3.1.2.2.4	Tramo 1	mar 13/12/22	vie 23/12/22	9 días	$ 561,018,201.25		
129	1.3.1.2.2.4.1	8014088-24122378	mar 13/12/22	mié 14/12/22	2 días	$ 102,355,871.96	188	130
130	1.3.1.2.2.4.2	8013011-91020898	jue 15/12/22	vie 16/12/22	2 días	$ 124,073,035.65	129	131;193FC+4 días
131	1.3.1.2.2.4.3	8014052-24122371	lun 19/12/22	vie 23/12/22	5 días	$ 334,589,293.64	130	234
132	1.3.1.2.3	Inicio de Intervención Av. Caracas	lun 18/07/22	lun 18/07/22	0 días	$ 0.00	26FC+11 días	135
133	1.3.1.2.4	Realizar Corredor AV Caracas FRENTE No 2	mar 19/07/22	jue 5/01/23	117 días	$ 4,476,710,911.99		
134	1.3.1.2.4.1	Tramo 2	mar 19/07/22	vie 16/12/22	103 días	$ 601,612,493.77		
135	1.3.1.2.4.1.1	5003474-297580	mar 19/07/22	mar 26/07/22	5 días	$ 204,854,073.69	132	136FC+10 días
136	1.3.1.2.4.1.2	5003993-298760	mié 10/08/22	jue 11/08/22	2 días	$ 90,584,018.23	135FC+10 días	138
137	1.3.1.2.4.1.3	5004150-299086	vie 16/12/22	vie 16/12/22	1 día	$ 4,707,622.64	155	235
138	1.3.1.2.4.1.4	5004412-299729	vie 12/08/22	vie 12/08/22	1 día	$ 59,330,180.53	136	139
139	1.3.1.2.4.1.5	5004421-299753	mar 16/08/22	mié 17/08/22	2 días	$ 62,243,715.24	138	140
140	1.3.1.2.4.1.6	5007691-306954	jue 18/08/22	lun 22/08/22	3 días	$ 115,087,264.14	139	141;144
141	1.3.1.2.4.1.7	5010280-901171	mar 23/08/22	mié 24/08/22	2 días	$ 64,805,619.30	140	143
142	1.3.1.2.4.2	Tramo 1	jue 25/08/22	jue 5/01/23	92 días	$ 3,875,098,418.22		
143	1.3.1.2.4.2.1	5009393-91031894	jue 25/08/22	mar 6/09/22	9 días	$ 422,152,132.42	141	144
144	1.3.1.2.4.2.2	5005631-302372	mié 7/09/22	mié 7/09/22	1 día	$ 47,032,732.76	140;143	145
145	1.3.1.2.4.2.3	5006176-303638	jue 8/09/22	jue 15/09/22	6 días	$ 376,105,954.43	144	146
146	1.3.1.2.4.2.4	5005951-303083	vie 16/09/22	vie 16/09/22	1 día	$ 44,919,417.92	145	147
147	1.3.1.2.4.2.5	5007941-533645	lun 19/09/22	mié 21/09/22	3 días	$ 155,118,444.41	146	148
148	1.3.1.2.4.2.6	5008236-533859	jue 22/09/22	vie 23/09/22	2 días	$ 82,455,711.47	147	149
149	1.3.1.2.4.2.7	5006234-303788	lun 26/09/22	jue 29/09/22	4 días	$ 182,836,183.88	148	150
150	1.3.1.2.4.2.8	5006310-303983	vie 30/09/22	vie 30/09/22	1 día	$ 66,346,644.44	149	151
151	1.3.1.2.4.2.9	5006342-304061	lun 3/10/22	lun 3/10/22	1 día	$ 19,547,482.01	150	152
152	1.3.1.2.4.2.10	5006393-304193	mar 4/10/22	mié 5/10/22	2 días	$ 34,348,801.15	151	153FC+4 días
153	1.3.1.2.4.2.11	5006676-304913	mié 12/10/22	mié 12/10/22	1 día	$ 24,670,648.60	152FC+4 días	154
154	1.3.1.2.4.2.12	5006766-305126	jue 13/10/22	vie 14/10/22	2 días	$ 66,733,393.67	153	156
155	1.3.1.2.4.2.13	5007694-306963	jue 15/12/22	jue 15/12/22	1 día	$ 38,572,199.08	159	137
156	1.3.1.2.4.2.14	5010067-91031275	mar 18/10/22	mar 6/12/22	34 días	$ 1,478,123,885.14	154	157
157	1.3.1.2.4.2.15	5007391-306473	mié 7/12/22	mié 7/12/22	1 día	$ 70,900,683.68	156	158
158	1.3.1.2.4.2.16	5007403-306490	vie 9/12/22	lun 12/12/22	2 días	$ 60,860,146.26	157	159
159	1.3.1.2.4.2.17	5007412-306510	mar 13/12/22	mié 14/12/22	2 días	$ 53,229,373.34	158	160;359;235;197
160	1.3.1.2.4.2.18	5007431-306551	jue 15/12/22	mar 20/12/22	4 días	$ 189,761,025.04	159	161
161	1.3.1.2.4.2.19	5007442-306565	mié 21/12/22	lun 26/12/22	4 días	$ 153,837,701.85	160	162
162	1.3.1.2.4.2.20	5007452-306573	mar 27/12/22	jue 5/01/23	8 días	$ 307,545,856.67	161	646
163	1.3.1.3	Realizar actividades de Mantenimiento Rutinario (vigencia 2021-2022) FRENTE No 4	lun 10/10/22	lun 26/12/22	52 días	$ 828,026,264.79		
164	1.3.1.3.1	Realizar Corredor AV Boyacá sur-norte Calzada Lenta.	vie 11/11/22	mié 16/11/22	3 días	$ 37,833,550.92		
165	1.3.1.3.1.1	Tramo 2	vie 11/11/22	mié 16/11/22	3 días	$ 37,833,550.92		
166	1.3.1.3.1.1.1	8003644-521590	vie 11/11/22	mié 16/11/22	3 días	$ 37,833,550.92	85FC-9 días	234
167	1.3.1.3.2	Realizar Corredor AV Boyacá sur-norte Calzada Rápida.	lun 31/10/22	jue 26/12/22	38 días	$ 613,580,074.35		
168	1.3.1.3.2.1	Tramo 5	lun 31/10/22	vie 4/11/22	5 días	$ 24,602,564.38		
169	1.3.1.3.2.1.1	8011358-521944	lun 31/10/22	mié 2/11/22	3 días	$ 12,577,147.92	106FC+5 días	234
170	1.3.1.3.2.1.2	8010562-521886	mié 2/11/22	jue 3/11/22	2 días	$ 2,120,476.24	113	171
171	1.3.1.3.2.1.3	8010453-521877	vie 4/11/22	vie 4/11/22	1 día	$ 9,904,940.22	170	234
172	1.3.1.3.2.2	Tramo 4	mar 8/11/22	mié 30/11/22	16 días	$ 288,662,910.64		
173	1.3.1.3.2.2.1	8007748-521783	jue 17/11/22	lun 21/11/22	3 días	$ 135,251,471.36	119	120
174	1.3.1.3.2.2.2	8009365-509003	mar 8/11/22	mar 8/11/22	1 día	$ 95,323,377.94	116	117;176FC+12 días
175	1.3.1.3.2.2.3	8010311-521868	mar 22/11/22	mié 23/11/22	2 días	$ 13,520,617.02	121CC-2 días	234
176	1.3.1.3.2.2.4	8009167-521813	lun 28/11/22	lun 28/11/22	1 día	$ 30,572,691.96	174FC+12 días	234
177	1.3.1.3.2.2.5	8007409-521735	mié 30/11/22	mié 30/11/22	1 día	$ 13,994,752.36	120FC+4 días	234
178	1.3.1.3.2.3	Tramo 3	jue 1/12/22	mar 13/12/22	8 días	$ 120,441,049.36		
179	1.3.1.3.2.3.1	8012656-508994	jue 1/12/22	jue 1/12/22	1 día	$ 5,471,050.80	121FC+3 días	180
180	1.3.1.3.2.3.2	8006748-509014	vie 2/12/22	vie 2/12/22	1 día	$ 21,008,851.52	179	181
181	1.3.1.3.2.3.3	8006342-521670	lun 5/12/22	lun 5/12/22	1 día	$ 1,909,752.54	180	182
182	1.3.1.3.2.3.4	8006237-521661	mar 6/12/22	mar 6/12/22	1 día	$ 5,210,752.30	181	183
183	1.3.1.3.2.3.5	8005898-521652	mié 7/12/22	mié 7/12/22	1 día	$ 36,547,171.23	182	184
184	1.3.1.3.2.3.6	8005344-521632	vie 9/12/22	vie 9/12/22	1 día	$ 36,547,171.23	183	185
185	1.3.1.3.2.3.7	8005215-521621	lun 12/12/22	lun 12/12/22	1 día	$ 13,192,429.48	184	186
186	1.3.1.3.2.3.8	8012420-522011	mar 13/12/22	mar 13/12/22	1 día	$ 553,870.26	185	189
187	1.3.1.3.2.4	Tramo 2	mié 7/12/22	vie 16/12/22	7 días	$ 163,439,281.05		
188	1.3.1.3.2.4.1	8013012-91021138	mié 7/12/22	lun 12/12/22	3 días	$ 140,051,619.72	127	129
189	1.3.1.3.2.4.2	8003265-521577	mié 14/12/22	mié 14/12/22	1 día	$ 6,814,056.15	186	190
190	1.3.1.3.2.4.3	8013031-91020904	jue 15/12/22	jue 15/12/22	1 día	$ 13,672,755.56	189	191
191	1.3.1.3.2.4.4	8003096-521566	vie 16/12/22	vie 16/12/22	1 día	$ 2,900,849.62	190	234
192	1.3.1.3.2.5	Tramo 1	vie 23/12/22	lun 26/12/22	2 días	$ 16,434,268.92		
193	1.3.1.3.2.5.1	8014051-24122367	vie 23/12/22	vie 23/12/22	1 día	$ 5,906,393.18	130FC+4 días	194
194	1.3.1.3.2.5.2	8014050-24122363	lun 26/12/22	lun 26/12/22	1 día	$ 10,527,875.74	193	234
195	1.3.1.3.3	Realizar Corredor AV Caracas	lun 10/10/22	vie 4/11/22	19 días	$ 176,612,639.52		
196	1.3.1.3.3.1	Tramo 2	jue 27/10/22	vie 4/11/22	7 días	$ 74,762,491.14		
197	1.3.1.3.3.1.1	5003509-297662	jue 27/10/22	jue 27/10/22	1 día	$ 15,436,806.06	159CC-30 días	198
198	1.3.1.3.3.1.2	5003556-297780	vie 28/10/22	vie 28/10/22	1 día	$ 14,792,606.48	197	199
199	1.3.1.3.3.1.3	5007895-471363	lun 31/10/22	lun 31/10/22	1 día	$ 15,051,972.40	198	200
200	1.3.1.3.3.1.4	5004048-298870	mar 1/11/22	mar 1/11/22	1 día	$ 9,603,846.78	199	201
201	1.3.1.3.3.1.5	5004079-298927	mié 2/11/22	mié 2/11/22	1 día	$ 12,345,384.82	200	202
202	1.3.1.3.3.1.6	5007890-471358	jue 3/11/22	jue 3/11/22	1 día	$ 5,401,052.96	201	203
203	1.3.1.3.3.1.7	5004257-299324	vie 4/11/22	vie 4/11/22	1 día	$ 2,130,821.64	202	205FC-19 días
204	1.3.1.3.3.2	Tramo 1	lun 10/10/22	mar 18/10/22	6 días	$ 101,850,148.38		
205	1.3.1.3.3.2.1	5006263-303866	lun 10/10/22	mar 11/10/22	2 días	$ 14,909,179.37	203FC-19 días	206
206	1.3.1.3.3.2.2	5006698-304970	mié 12/10/22	jue 13/10/22	2 días	$ 33,242,053.33	205	207;208CC
207	1.3.1.3.3.2.3	5007700-306981	vie 14/10/22	mar 18/10/22	2 días	$ 25,463,585.16	206	359;235
208	1.3.1.3.3.2.4	5005562-302225	mié 12/10/22	jue 13/10/22	2 días	$ 28,235,330.52	206CC	359;235
209	1.3.1.4	Realizar actividades Rehabilitación y/o Reconstrucción (vigencia 2021-2022) FRENTE No 6	mié 4/01/23	lun 3/04/23	62 días	$ 2,919,755,604.47		
210	1.3.1.4.1	Realizar Corredor AV Boyacá sur-norte	mié 4/01/23	mar 31/01/23	19 días	$ 302,497,848.17		
211	1.3.1.4.1.1	8014092-24122331	mié 4/01/23	mié 18/01/23	10 días	$ 191,727,148.42	32FC+85 días	212

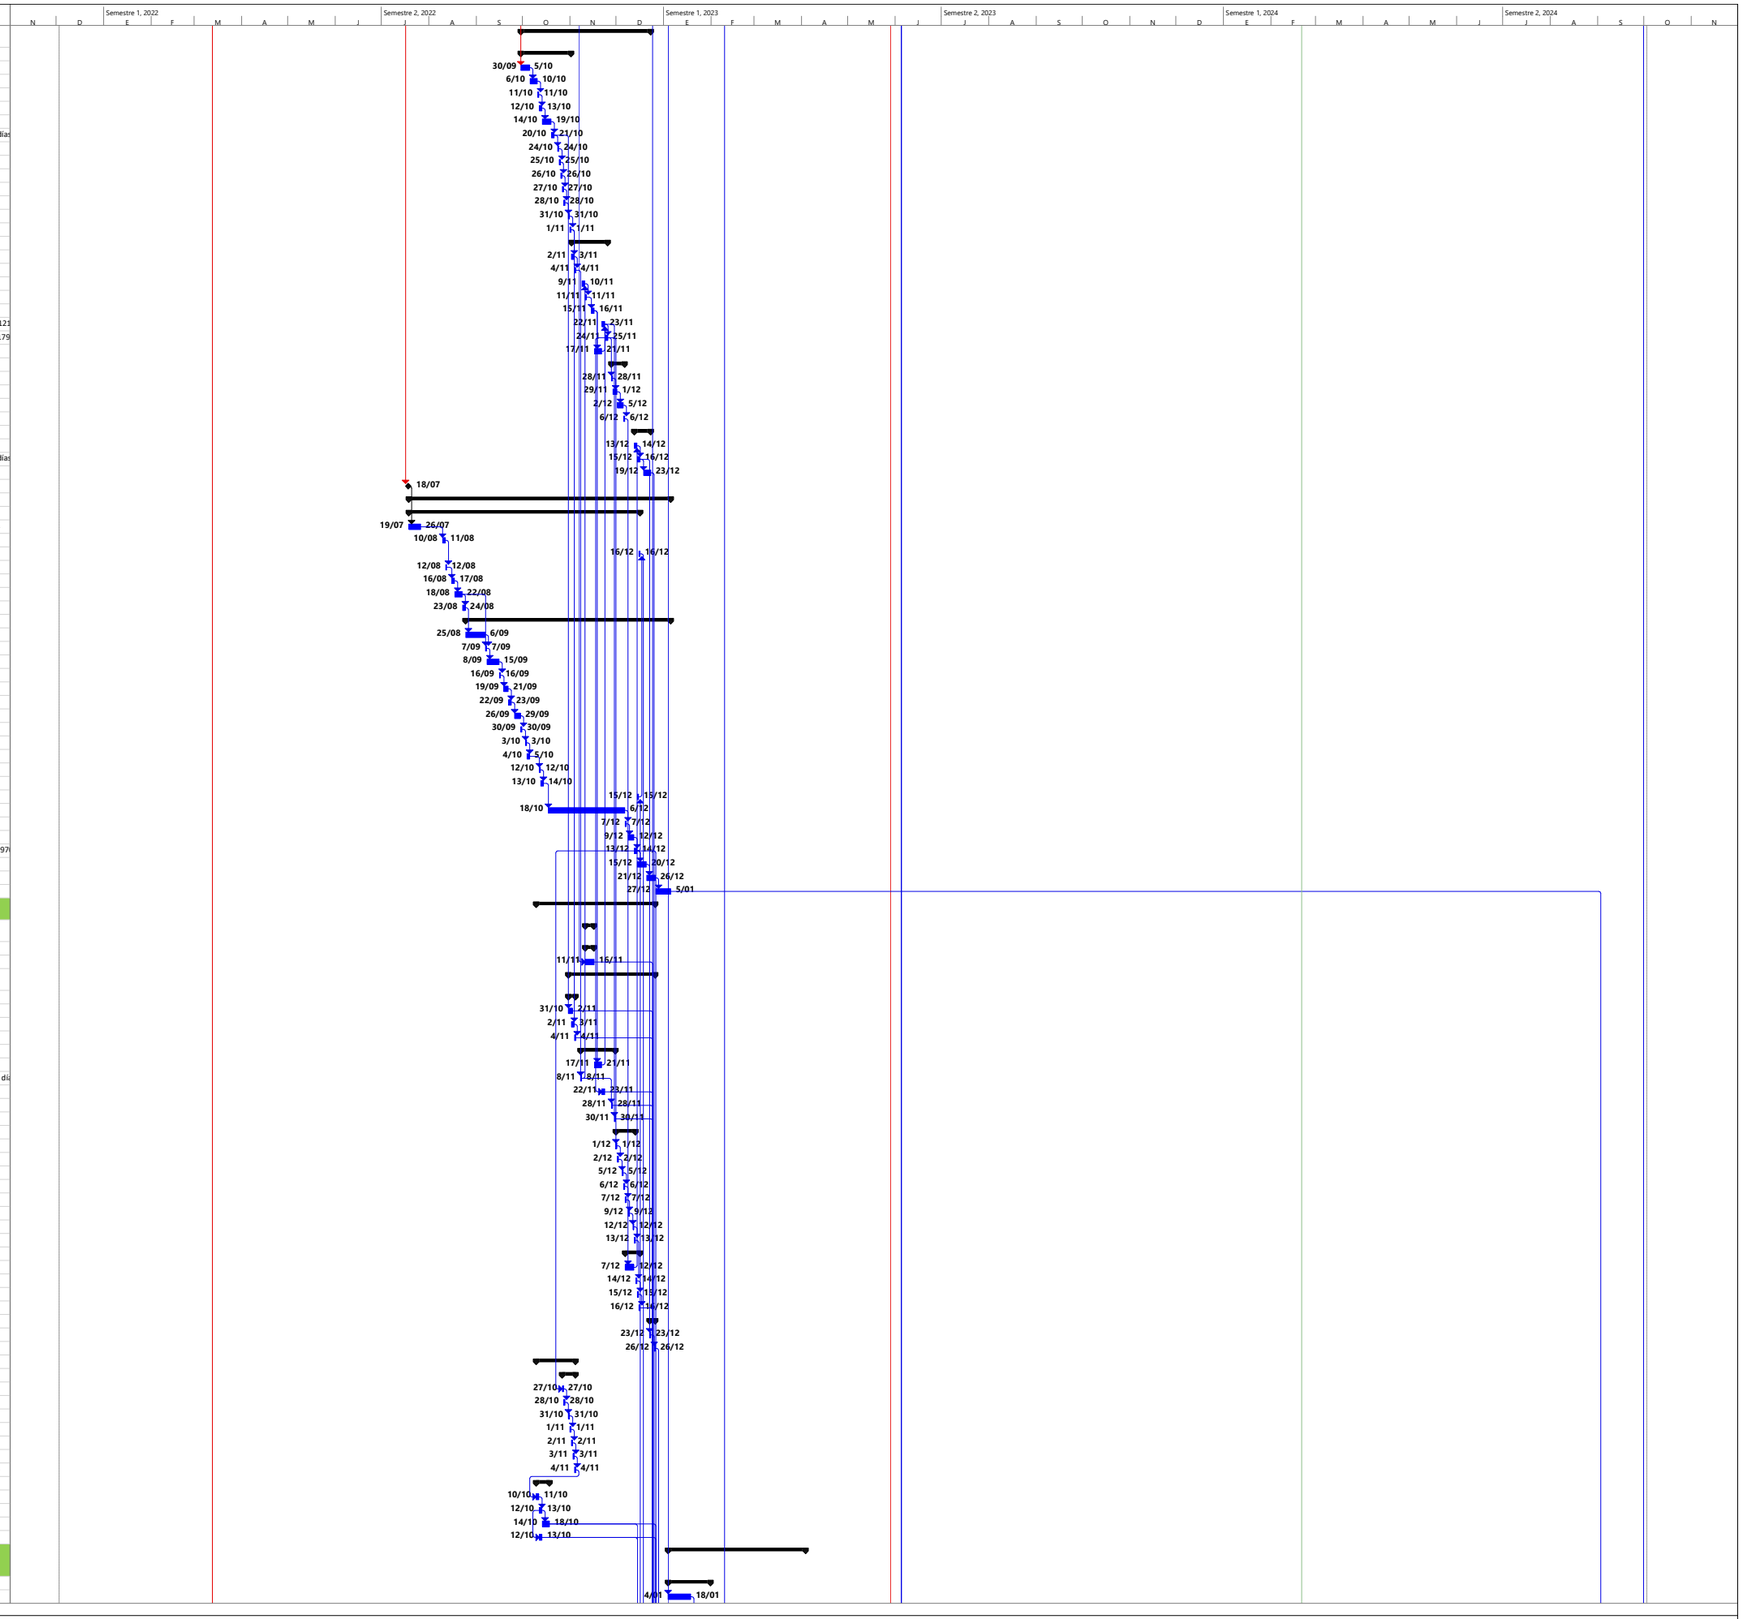

Felipe Torres Alonso
Esp. Costos, Presupuestos y Programación
Consorcio CTUPT 013

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	Predecesoras	Sucesoras
212	1.3.1.4.1.2	8013022-91021130	jue 19/01/23	mar 31/01/23	9 días	$ 110,770,699.75	211	646
213	1.3.1.4.2	Realizar Corredor AV Caracas	mié 4/01/23	lun 3/04/23	62 días	$ 2,617,257,756.30		
214	1.3.1.4.2.1	Tramo 2	jue 9/03/23	lun 3/04/23	17 días	$ 1,073,697,761.57		
215	1.3.1.4.2.1.1	5003581-297840	vie 17/03/23	lun 3/04/23	11 días	$ 157,939,152.08	216CC+1 día	462FC+70 días
216	1.3.1.4.2.1.2	5003643-297993	jue 16/03/23	lun 3/04/23	12 días	$ 195,174,048.13	217CC+1 día	215CC+1 día
217	1.3.1.4.2.1.3	5009293-91021832	mié 15/03/23	jue 30/03/23	11 días	$ 140,887,121.25	218CC+1 día	216CC+1 día
218	1.3.1.4.2.1.4	5003721-298164	mar 14/03/23	mié 29/03/23	11 días	$ 149,733,390.03	219CC+1 día	217CC+1 día
219	1.3.1.4.2.1.5	5003767-298272	lun 13/03/23	mié 29/03/23	12 días	$ 108,355,369.38	220CC	218CC+1 día
220	1.3.1.4.2.1.6	5003816-298373	lun 13/03/23	mié 29/03/23	12 días	$ 121,084,898.03	221CC+1 día	219CC
221	1.3.1.4.2.1.7	5003866-298478	vie 10/03/23	mar 28/03/23	12 días	$ 95,575,735.96	222CC+1 día	220CC+1 día
222	1.3.1.4.2.1.8	5003902-298553	jue 9/03/23	lun 27/03/23	12 días	$ 104,948,046.71	224	221CC+1 día
223	1.3.1.4.2.2	Tramo 1	mié 4/01/23	mié 8/03/23	45 días	$ 1,543,559,994.73		
224	1.3.1.4.2.2.1	5006375-304139	vie 3/03/23	mié 8/03/23	4 días	$ 70,084,830.89	225	222
225	1.3.1.4.2.2.2	5006415-304250	jue 23/02/23	jue 2/03/23	6 días	$ 69,132,156.45	226CC+1 día	224
226	1.3.1.4.2.2.3	5006439-304301	mié 22/02/23	mié 1/03/23	6 días	$ 78,505,973.22	227CC+1 día	225CC+1 día
227	1.3.1.4.2.2.4	5006473-304385	mar 21/02/23	mar 28/02/23	6 días	$ 96,383,187.01	228CC+1 día	226CC+1 día
228	1.3.1.4.2.2.5	5006497-304454	lun 20/02/23	lun 27/02/23	6 días	$ 89,291,791.08	231;230;229	227CC+1 día
229	1.3.1.4.2.2.6	5007947-533654	lun 6/02/23	vie 17/02/23	10 días	$ 210,075,982.76	231CC+3 días	228
230	1.3.1.4.2.2.7	5010057-24121782	vie 3/02/23	mar 14/02/23	8 días	$ 139,375,871.72	231CC+2 días	228
231	1.3.1.4.2.2.8	5010043-24121781	mié 1/02/23	mié 8/02/23	6 días	$ 97,175,675.59	232	228;229CC+3 días
232	1.3.1.4.2.2.9	5007701-306984	jue 19/01/23	mar 31/01/23	9 días	$ 396,794,259.66	233	231
233	1.3.1.4.2.2.10	5007702-306987	mié 4/01/23	mié 18/01/23	10 días	$ 296,740,266.35	33FC+85 días	232
234	1.3.1.5	Fin de intervención Av. Boyacá sentido Sur – Norte	lun 26/12/22	lun 26/12/22	0 días	$ 0.00	98;131;166;194;1359	
235	1.3.1.6	Fin de Intervención Av. Caracas	vie 16/12/22	vie 16/12/22	0 días	$ 0.00	207;137;159;208	359
236	1.3.1.7	Inicio de actividades de emergencia	lun 14/03/22	lun 14/03/22	0 días	$ 0.00	12FC+52 días	239
237	1.3.1.8	Realizar Actividades Especiales FRENTE No 3	mar 15/03/22	jue 4/05/23	280 días	$ 7,087,776,965.53		
238	1.3.1.8.1	Realizar Mantenimiento Periódico Flexible No 1	mar 15/03/22	mar 2/08/22	93 días	$ 816,460,561.76		
239	1.3.1.8.1.1	16000159-189101	mar 15/03/22	mié 6/04/22	16 días	$ 139,957,201.04	236	240;520CC;550CC
240	1.3.1.8.1.2	16000159-91011472	jue 7/04/22	mié 20/04/22	8 días	$ 49,542,967.26	239	241
241	1.3.1.8.1.3	16002480-91025721	jue 21/04/22	lun 2/05/22	8 días	$ 77,402,736.78	240	242
242	1.3.1.8.1.4	16002562-514113	mar 3/05/22	mar 17/05/22	11 días	$ 19,850,587.09	241	243
243	1.3.1.8.1.5	16002574-523969	mié 18/05/22	jue 19/05/22	2 días	$ 9,966,841.27	242	244
244	1.3.1.8.1.6	16002647-513579	vie 20/05/22	mar 24/05/22	3 días	$ 17,215,647.09	243	245
245	1.3.1.8.1.7	16004481-508895	mié 25/05/22	mar 31/05/22	4 días	$ 23,407,541.45	244	246
246	1.3.1.8.1.8	16004696-91022715	mié 1/06/22	vie 3/06/22	3 días	$ 136,003,527.80	245	247
247	1.3.1.8.1.9	16004920-24122002	lun 6/06/22	lun 6/06/22	1 día	$ 52,309,503.98	246	248
248	1.3.1.8.1.10	16004954-24121994	mar 7/06/22	vie 17/06/22	9 días	$ 93,272,277.25	247	249
249	1.3.1.8.1.11	16005008-24121996	mar 21/06/22	mié 6/07/22	10 días	$ 116,898,306.84	248	250
250	1.3.1.8.1.12	8014088-24122375	jue 7/07/22	lun 18/07/22	8 días	$ 6,514,664.46	249	251
251	1.3.1.8.1.13	16003919-524006	mar 19/07/22	mar 26/07/22	5 días	$ 30,113,510.41	250	252
252	1.3.1.8.1.14	16004952-24121986	mié 27/07/22	mar 2/08/22	5 días	$ 44,005,249.04	251	254
253	1.3.1.8.2	Realizar Mantenimiento Periódico Flexible No 2	mié 3/08/22	vie 4/11/22	66 días	$ 1,078,733,248.23		
254	1.3.1.8.2.1	6000022-320104	mié 3/08/22	vie 5/08/22	3 días	$ 24,108,019.50	252	255
255	1.3.1.8.2.2	6000022-320106	lun 8/08/22	mié 10/08/22	3 días	$ 48,864,894.28	254	256
256	1.3.1.8.2.3	6000036-320168	jue 11/08/22	mar 16/08/22	3 días	$ 48,516,381.19	255	257
257	1.3.1.8.2.4	6000036-320166	mié 17/08/22	vie 19/08/22	3 días	$ 53,322,653.38	256	258
258	1.3.1.8.2.5	6000059-320242	lun 22/08/22	mié 24/08/22	3 días	$ 54,340,306.63	257	259
259	1.3.1.8.2.6	6000059-320240	jue 25/08/22	lun 29/08/22	3 días	$ 41,675,082.00	258	260
260	1.3.1.8.2.7	6000081-320310	mar 30/08/22	jue 1/09/22	3 días	$ 46,696,401.85	259	261
261	1.3.1.8.2.8	6000081-320312	vie 2/09/22	mar 6/09/22	3 días	$ 50,618,377.32	260	262
262	1.3.1.8.2.9	6000102-320377	mié 7/09/22	vie 9/09/22	3 días	$ 46,239,483.62	261	263
263	1.3.1.8.2.10	6000102-320379	lun 12/09/22	mié 14/09/22	3 días	$ 65,077,479.55	262	264
264	1.3.1.8.2.11	6000121-320438	jue 15/09/22	lun 19/09/22	3 días	$ 47,531,037.40	263	265
265	1.3.1.8.2.12	6000121-320440	mar 20/09/22	jue 22/09/22	3 días	$ 60,957,845.96	264	266
266	1.3.1.8.2.13	6000147-320511	vie 23/09/22	mar 27/09/22	3 días	$ 55,430,666.50	265	267
267	1.3.1.8.2.14	6000147-320513	mié 28/09/22	vie 30/09/22	3 días	$ 44,721,937.74	266	268
268	1.3.1.8.2.15	6000176-320575	lun 3/10/22	mié 5/10/22	3 días	$ 44,946,938.97	267	269
269	1.3.1.8.2.16	6000176-320577	jue 6/10/22	lun 10/10/22	3 días	$ 49,966,271.15	268	270
270	1.3.1.8.2.17	6000217-320675	mar 11/10/22	jue 13/10/22	3 días	$ 39,406,298.10	269	271
271	1.3.1.8.2.18	6000217-320677	vie 14/10/22	mié 19/10/22	3 días	$ 46,795,672.19	270	272
272	1.3.1.8.2.19	6000269-320827	jue 20/10/22	lun 24/10/22	3 días	$ 71,944,974.51	271	273
273	1.3.1.8.2.20	6000269-320829	mar 25/10/22	jue 27/10/22	3 días	$ 64,799,975.16	272	274
274	1.3.1.8.2.21	6000324-320977	vie 28/10/22	mar 1/11/22	3 días	$ 26,585,537.36	273	275
275	1.3.1.8.2.22	6000324-320919	mié 2/11/22	vie 4/11/22	3 días	$ 46,187,013.87	274	278FC+15 días
276	1.3.1.8.3	Realizar Mantenimiento Periódico Flexible No 3	mié 30/11/22	lun 13/02/23	52 días	$ 2,726,310,012.92		
277	1.3.1.8.3.1	1 de Mayo Calzada Norte	mié 30/11/22	mar 20/12/22	14 días	$ 859,890,172.35		
278	1.3.1.8.3.1.1	15001429-514103	mié 30/11/22	mié 30/11/22	1 día	$ 78,323,991.82	275FC+15 días	279;290FC+3 días
279	1.3.1.8.3.1.2	15001498-531333	jue 1/12/22	jue 1/12/22	1 día	$ 124,374,128.08	278	280
280	1.3.1.8.3.1.3	18001000-412936	vie 2/12/22	vie 2/12/22	1 día	$ 91,868,770.84	279	281
281	1.3.1.8.3.1.4	18000963-412833	lun 5/12/22	lun 5/12/22	1 día	$ 91,868,770.84	280	282
282	1.3.1.8.3.1.5	18000739-412253	mar 6/12/22	mar 6/12/22	1 día	$ 38,792,957.68	281	283
283	1.3.1.8.3.1.6	18000579-411804	mié 7/12/22	mié 7/12/22	1 día	$ 157,223,857.46	282	284
284	1.3.1.8.3.1.7	18000349-411077	vie 9/12/22	vie 9/12/22	1 día	$ 88,657,934.80	283	285
285	1.3.1.8.3.1.8	18000290-410900	lun 12/12/22	lun 12/12/22	1 día	$ 34,033,589.76	284	286
286	1.3.1.8.3.1.9	18000227-410713	mar 13/12/22	vie 16/12/22	4 días	$ 11,709,122.20	285	287
287	1.3.1.8.3.1.10	18000173-410546	lun 19/12/22	lun 19/12/22	1 día	$ 65,559,261.14	286	288
288	1.3.1.8.3.1.11	15000655-513175	mar 20/12/22	mar 20/12/22	1 día	$ 77,477,787.73	287	647
289	1.3.1.8.3.2	1 de Mayo Calzada Sur	mar 6/12/22	jue 12/01/23	26 días	$ 669,673,996.90		
290	1.3.1.8.3.2.1	16004949-24121961	mar 6/12/22	mar 13/12/22	5 días	$ 93,176,508.86	278FC+3 días	291
291	1.3.1.8.3.2.2	16004948-24121963	mié 14/12/22	mié 14/12/22	1 día	$ 60,855,300.64	290	292
292	1.3.1.8.3.2.3	16003353-513564	jue 15/12/22	jue 15/12/22	1 día	$ 43,473,910.38	291	293
293	1.3.1.8.3.2.4	16005065-91034718	vie 16/12/22	mié 21/12/22	4 días	$ 47,461,194.70	292	294
294	1.3.1.8.3.2.5	15000320-513197	jue 22/12/22	vie 23/12/22	2 días	$ 63,270,173.20	293	295
295	1.3.1.8.3.2.6	1500655-513177	lun 26/12/22	jue 29/12/22	4 días	$ 182,377,840.72	294	296
296	1.3.1.8.3.2.7	18000963-412831	vie 30/12/22	mar 3/01/23	3 días	$ 63,842,408.32	295	297
297	1.3.1.8.3.2.8	18001000-412934	mié 4/01/23	mié 4/01/23	1 día	$ 26,656,575.22	296	298
298	1.3.1.8.3.2.9	18001094-413152	jue 5/01/23	jue 5/01/23	1 día	$ 26,621,210.28	297	299
299	1.3.1.8.3.2.10	18001117-900587	vie 6/01/23	vie 6/01/23	1 día	$ 3,923,189.60	298	300
300	1.3.1.8.3.2.11	15001413-514131	mar 10/01/23	mié 11/01/23	2 días	$ 25,670,378.80	299	301
301	1.3.1.8.3.2.12	15001498-531331	jue 12/01/23	jue 12/01/23	1 día	$ 32,345,306.18	300	303
302	1.3.1.8.3.3	Calle 13	vie 13/01/23	lun 13/02/23	22 días	$ 1,196,745,843.67		
303	1.3.1.8.3.3.1	9002873-387273	vie 13/01/23	vie 13/01/23	1 día	$ 151,003,336.62	301	304
304	1.3.1.8.3.3.2	9004999-24122913	lun 16/01/23	lun 16/01/23	1 día	$ 52,902,449.94	303	305
305	1.3.1.8.3.3.3	9003141-91031855	mar 17/01/23	mar 17/01/23	1 día	$ 25,675,477.50	304	306
306	1.3.1.8.3.3.4	9003474-91033309	mié 18/01/23	mié 18/01/23	1 día	$ 477,546,502.13	305	307
307	1.3.1.8.3.3.5	9003974-390196	jue 19/01/23	lun 23/01/23	3 días	$ 104,617,004.52	306	308
308	1.3.1.8.3.3.6	9004032-390422	mar 24/01/23	mar 24/01/23	1 día	$ 51,743,042.72	307	309
309	1.3.1.8.3.3.7	9004040-605141	mié 25/01/23	jue 26/01/23	2 días	$ 29,221,881.28	308	310
310	1.3.1.8.3.3.8	9004391-533665	vie 27/01/23	lun 30/01/23	2 días	$ 66,219,285.58	309	311
311	1.3.1.8.3.3.9	9004044-390494	mar 31/01/23	mié 1/02/23	2 días	$ 38,981,906.40	310	312
312	1.3.1.8.3.3.10	80126606-91035049	jue 2/02/23	vie 3/02/23	2 días	$ 61,833,094.56	311	313
313	1.3.1.8.3.3.11	16000092-520946	lun 6/02/23	lun 6/02/23	1 día	$ 30,608,534.68	312	314
314	1.3.1.8.3.3.12	16000135-520953	mar 7/02/23	mar 7/02/23	1 día	$ 17,224,732.46	313	315
315	1.3.1.8.3.3.13	16000135-520955	mié 8/02/23	jue 9/02/23	2 días	$ 56,834,475.40	314	316
316	1.3.1.8.3.3.14	16004696-91022718	vie 10/02/23	vie 10/02/23	1 día	$ 8,969,370.52	315	317
317	1.3.1.8.3.3.15	16000185-520973	lun 13/02/23	lun 13/02/23	1 día	$ 23,364,749.36	316	320
318	1.3.1.8.4	Realizar Mantenimiento Periódico Flexible No 4	mar 14/02/23	jue 4/05/23	54 días	$ 2,466,273,142.62		
319	1.3.1.8.4.1	1 de Mayo	mar 14/02/23	vie 17/03/23	24 días	$ 978,055,066.83		
320	1.3.1.8.4.1.1	16004950-24121959	mar 14/02/23	jue 16/02/23	3 días	$ 198,672,330.76	317	321
321	1.3.1.8.4.1.2	15000383-513180	vie 17/02/23	vie 17/02/23	1 día	$ 34,768,752.15	320	322
322	1.3.1.8.4.1.3	16004956-24121977	lun 20/02/23	mar 21/02/23	2 días	$ 103,833,333.92	321	323
323	1.3.1.8.4.1.4	18000651-412011	mié 22/02/23	vie 24/02/23	3 días	$ 163,656,494.66	322	324
324	1.3.1.8.4.1.5	15001423-514148	lun 27/02/23	lun 27/02/23	1 día	$ 22,546,265.98	323	325
325	1.3.1.8.4.1.6	18001094-413154	mar 28/02/23	jue 2/03/23	3 días	$ 167,290,305.62	324	326

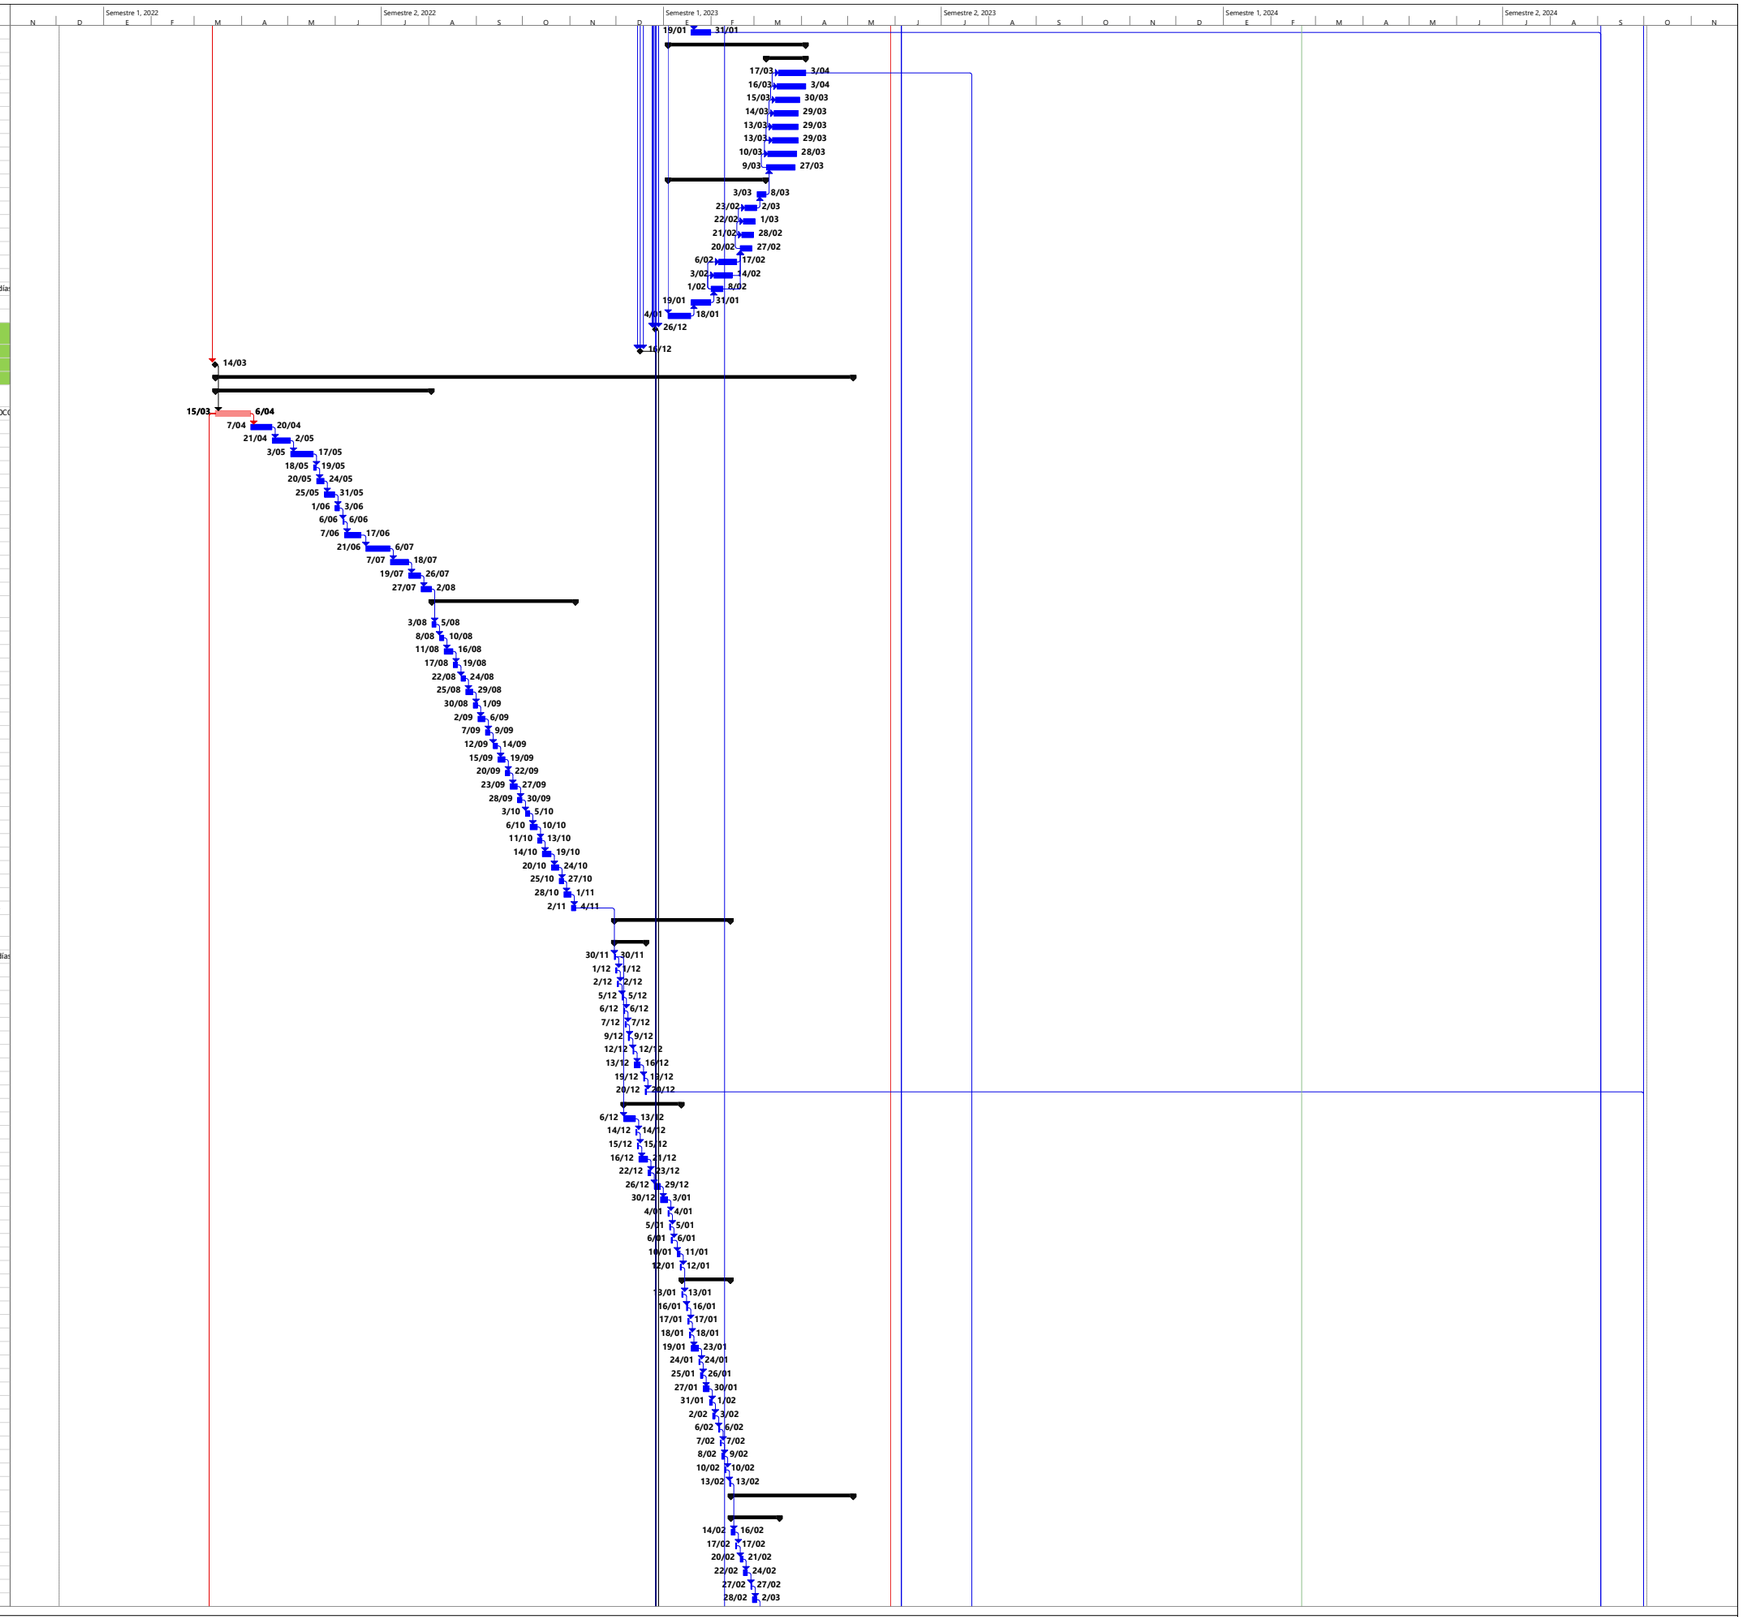


Proyecto: IDU-1714-2021-CON
Fecha: mié 21/02/24

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Tarea resumida · Hito resumido · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Tarea crítica · División crítica
División · Resumen · Agrupar por síntesis · Tarea crítica resumida · Progreso resumido · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Fecha límite · Tareas críticas · Progreso


Felipe Torres Alonso
Esp. Costos, Presupuestos y Programación
Consorcio CTUPT 013

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	Predecesoras	Sucesoras
326	1.3.1.8.4.1.7	15000248-513187	vie 3/03/23	vie 3/03/23	1 día	$ 58,830,494.34	325	327
327	1.3.1.8.4.1.8	18000349-411079	lun 6/03/23	lun 6/03/23	1 día	$ 12,724,279.62	326	328
328	1.3.1.8.4.1.9	18000173-410548	mar 7/03/23	mar 7/03/23	1 día	$ 28,742,089.64	327	329
329	1.3.1.8.4.1.10	18000425-411309	mié 8/03/23	mié 8/03/23	1 día	$ 42,795,734.04	328	330
330	1.3.1.8.4.1.11	18001155-413291	jue 9/03/23	jue 9/03/23	1 día	$ 4,796,956.34	329	331
331	1.3.1.8.4.1.12	15001407-514136	vie 10/03/23	vie 10/03/23	1 día	$ 6,442,983.21	330	332
332	1.3.1.8.4.1.13	15001411-514141	lun 13/03/23	lun 13/03/23	1 día	$ 44,278,513.27	331	333
333	1.3.1.8.4.1.14	15001423-514146	mar 14/03/23	mar 14/03/23	1 día	$ 17,334,195.30	332	334
334	1.3.1.8.4.1.15	16005005-24121982	mié 15/03/23	mié 15/03/23	1 día	$ 27,483,165.68	333	335
335	1.3.1.8.4.1.16	18000290-410898	jue 16/03/23	jue 16/03/23	1 día	$ 39,792,722.96	334	336
336	1.3.1.8.4.1.17	18000651-412009	vie 17/03/23	vie 17/03/23	1 día	$ 4,066,449.34	335	338
337	1.3.1.8.4.2	calle 13	mar 21/03/23	mié 19/04/23	20 días	$ 801,921,212.72		
338	1.3.1.8.4.2.1	9004997-24122915	mar 21/03/23	mar 21/03/23	1 día	$ 40,164,830.82	336	339
339	1.3.1.8.4.2.2	9003203-388093	mié 22/03/23	mié 22/03/23	1 día	$ 2,923,740.72	338	340
340	1.3.1.8.4.2.3	9003271-388267	jue 23/03/23	vie 24/03/23	2 días	$ 75,642,306.30	339	341
341	1.3.1.8.4.2.4	9003321-388389	lun 27/03/23	mar 28/03/23	2 días	$ 78,662,242.92	340	342
342	1.3.1.8.4.2.5	9003547-388922	mié 29/03/23	vie 31/03/23	3 días	$ 181,836,618.16	341	343
343	1.3.1.8.4.2.6	9003711-389322	lun 3/04/23	mar 4/04/23	2 días	$ 99,505,443.58	342	344
344	1.3.1.8.4.2.7	9003751-389466	mié 5/04/23	mié 5/04/23	1 día	$ 43,467,414.36	343	345
345	1.3.1.8.4.2.8	9003766-389518	lun 10/04/23	mar 11/04/23	2 días	$ 105,229,607.22	344	346
346	1.3.1.8.4.2.9	9003786-389577	mié 12/04/23	mié 12/04/23	1 día	$ 33,111,285.94	345	347
347	1.3.1.8.4.2.10	9003942-524211	jue 13/04/23	jue 13/04/23	1 día	$ 14,484,837.08	346	348
348	1.3.1.8.4.2.11	9004299-24190266	vie 14/04/23	vie 14/04/23	1 día	$ 47,792,836.94	347	349
349	1.3.1.8.4.2.12	9004747-91029420	lun 17/04/23	lun 17/04/23	1 día	$ 14,213,901.60	348	350
350	1.3.1.8.4.2.13	16005113-91060605	mar 18/04/23	mar 18/04/23	1 día	$ 5,594,488.58	349	351
351	1.3.1.8.4.2.14	9003352-91024726	mié 19/04/23	mié 19/04/23	1 día	$ 59,291,658.50	350	353
352	1.3.1.8.4.3	Carrera 60	jue 20/04/23	lun 24/04/23	3 días	$ 292,989,125.65		
353	1.3.1.8.4.3.1	16000125-189103	jue 20/04/23	lun 24/04/23	3 días	$ 292,989,125.65	351	355
354	1.3.1.8.4.4	Boyaca	mar 25/04/23	jue 4/05/23	7 días	$ 393,307,737.42		
355	1.3.1.8.4.4.1	6001962-2506303	mar 25/04/23	mar 25/04/23	1 día	$ 42,647,447.04	353	356
356	1.3.1.8.4.4.2	19012836-465631	mié 26/04/23	mié 26/04/23	1 día	$ 56,162,705.00	355	357
357	1.3.1.8.4.4.3	5009290-91021948	jue 27/04/23	jue 4/05/23	5 días	$ 294,497,585.38	356	358
358	1.3.1.9	Fin de actividades de emergencia	jue 4/05/23	jue 4/05/23	0 días	$ 0.00	357	646
359	1.3.1.10	Acta de recibo de anualidad 2021-2022	mar 27/12/22	mar 28/02/23	45 días	$ 0.00	207;234;235;159	646
360	1.3.1.11	Realizar actividades de Mantenimiento Periódico (vigencia 2023)	mar 14/02/23	vie 3/11/23	177 días	$ 8,800,888,311.30		
361	1.3.1.11.1	Realizar Corredor AV Gaitán Cortes	lun 29/05/23	vie 3/11/23	108 días	$ 6,530,310,553.42		
362	1.3.1.11.1.1	Mantenimiento Periódico Flexible	lun 29/05/23	vie 3/11/23	108 días	$ 6,530,310,553.42		
363	1.3.1.11.1.1.1	Tramo 1	lun 29/05/23	vie 7/07/23	27 días	$ 1,258,335,254.04		
364	1.3.1.11.1.1.1	18007072-530836	mar 4/07/23	vie 7/07/23	4 días	$ 119,607,515.90	368FC+5 días	371
365	1.3.1.11.1.1.1	18000130-410423	lun 29/05/23	jue 1/06/23	4 días	$ 232,531,772.58	28FC+5S días	366
366	1.3.1.11.1.1.1	18000138-410446	vie 2/06/23	mar 6/06/23	3 días	$ 121,720,365.01	365	367
367	1.3.1.11.1.1.1	18000202-410641	mié 7/06/23	mié 14/06/23	5 días	$ 275,900,428.90	366	368
368	1.3.1.11.1.1.1	18000284-410884	jue 15/06/23	vie 23/06/23	6 días	$ 401,256,123.60	367	369FC+5 días;364
369	1.3.1.11.1.1.1	18000294-410914	mar 4/07/23	mié 5/07/23	2 días	$ 107,319,048.05	368FC+5 días	371
370	1.3.1.11.1.2	Tramo 4	lun 10/07/23	vie 18/08/23	28 días	$ 1,532,843,532.59		
371	1.3.1.11.1.2.1	6001960-502990	lun 10/07/23	mié 12/07/23	3 días	$ 157,842,924.29	369;364	372
372	1.3.1.11.1.2.2	6002050-91023313	jue 13/07/23	jue 27/07/23	10 días	$ 584,006,114.44	371	373
373	1.3.1.11.1.2.3	6001961-502993	vie 28/07/23	vie 4/08/23	6 días	$ 326,089,437.42	372	374
374	1.3.1.11.1.2.4	6002087-91033871	mar 8/08/23	vie 18/08/23	9 días	$ 464,905,056.44	373	376
375	1.3.1.11.1.3	Tramo 5	mar 22/08/23	mar 5/09/23	11 días	$ 1,372,186,539.19		
376	1.3.1.11.1.3.1	19002087-91016798	mar 22/08/23	mar 22/08/23	1 día	$ 18,497,254.66	374	377
377	1.3.1.11.1.3.2	19002064-444696	mié 23/08/23	vie 25/08/23	3 días	$ 284,448,618.40	376	378
378	1.3.1.11.1.3.3	19002055-444677	lun 28/08/23	mié 30/08/23	3 días	$ 396,558,841.12	377	379
379	1.3.1.11.1.3.4	19002092-444736	jue 31/08/23	mar 5/09/23	4 días	$ 672,681,825.01	378	381
380	1.3.1.11.1.4	Tramo 10	mié 6/09/23	lun 25/09/23	14 días	$ 1,392,501,652.14		
381	1.3.1.11.1.4.1	19002092-444734	mié 6/09/23	mar 12/09/23	5 días	$ 548,135,849.46	379	382
382	1.3.1.11.1.4.2	19002055-444679	mié 13/09/23	mar 19/09/23	5 días	$ 473,864,947.51	381	383
383	1.3.1.11.1.4.3	19002064-444694	mié 20/09/23	vie 22/09/23	3 días	$ 345,710,227.56	382	384
384	1.3.1.11.1.4.4	19002087-91016803	lun 25/09/23	lun 25/09/23	1 día	$ 24,790,627.61	383	432FC+9 días
385	1.3.1.11.1.5	Tramo 13	lun 23/10/23	vie 3/11/23	10 días	$ 968,051,281.38		
386	1.3.1.11.1.5.1	18000294-410912	lun 23/10/23	lun 23/10/23	1 día	$ 43,983,049.23	426	387
387	1.3.1.11.1.5.2	18000284-410886	mar 24/10/23	vie 27/10/23	4 días	$ 499,109,866.18	386	388
388	1.3.1.11.1.5.3	18000202-410639	lun 30/10/23	mar 31/10/23	2 días	$ 153,774,445.65	387	389
389	1.3.1.11.1.5.4	18007082-24121499	mié 1/11/23	vie 3/11/23	3 días	$ 271,183,920.32	388	429;391CC
390	1.3.1.11.1.6	Tramo 12	mié 1/11/23	mié 1/11/23	1 día	$ 6,392,294.08		
391	1.3.1.11.1.1.6	6000706-322061	mié 1/11/23	mié 1/11/23	1 día	$ 6,392,294.08	389CC	429
392	1.3.1.11.2	Realizar Corredor AV Boyacá Norte - Sur	mar 14/02/23	lun 17/04/23	42 días	$ 2,270,577,757.88		
393	1.3.1.11.2.1	Realizar Corredor AV Boyacá sur-norte Calzada lenta.	mar 14/02/23	mié 29/03/23	31 días	$ 1,662,882,725.73		
394	1.3.1.11.2.1.1	Tramo 5	mar 14/02/23	mié 29/03/23	31 días	$ 1,662,882,725.73		
395	1.3.1.11.2.1.1	8011175-521937	mar 14/02/23	jue 16/02/23	3 días	$ 34,424,485.97	29FC-14 días	396
396	1.3.1.11.2.1.1	8013257-91021545	vie 17/02/23	lun 20/02/23	2 días	$ 88,115,505.43	395	397
397	1.3.1.11.2.1.1	8011358-521948	mar 21/02/23	vie 24/02/23	4 días	$ 319,924,600.58	396	398
398	1.3.1.11.2.1.1	8014330-24122063	lun 27/02/23	mié 1/03/23	3 días	$ 240,630,350.29	397	399
399	1.3.1.11.2.1.1	8014329-24122059	jue 2/03/23	mar 7/03/23	4 días	$ 247,917,922.36	398	400
400	1.3.1.11.2.1.1	8011492-521970	mié 8/03/23	jue 9/03/23	2 días	$ 81,808,891.92	399	401
401	1.3.1.11.2.1.1	8011511-521979	vie 10/03/23	vie 10/03/23	1 día	$ 55,748,379.18	400	402
402	1.3.1.11.2.1.1	8011524-2517879	lun 13/03/23	mié 15/03/23	3 días	$ 197,580,611.35	401	403
403	1.3.1.11.2.1.1	8014942-508687	jue 16/03/23	mar 21/03/23	3 días	$ 155,115,289.35	402	404
404	1.3.1.11.2.1.1	8011597-508678	mié 22/03/23	vie 24/03/23	3 días	$ 130,742,505.72	403	405
405	1.3.1.11.2.1.1	8012643-508989	lun 27/03/23	mié 29/03/23	3 días	$ 110,874,183.58	404	408
406	1.3.1.11.2.2	Realizar Corredor AV Boyacá sur-norte Calzada Rapida	jue 30/03/23	lun 17/04/23	11 días	$ 607,695,032.15		
407	1.3.1.11.2.2.1	Tramo 5	jue 30/03/23	lun 17/04/23	11 días	$ 607,695,032.15		
408	1.3.1.11.2.2.1	8011175-521935	jue 30/03/23	vie 31/03/23	2 días	$ 117,365,447.84	405	409
409	1.3.1.11.2.2.1	8013257-91021544	lun 3/04/23	mar 4/04/23	2 días	$ 87,998,504.63	408	410
410	1.3.1.11.2.2.1	8014330-24122062	mié 5/04/23	mar 11/04/23	3 días	$ 234,817,047.34	409	411
411	1.3.1.11.2.2.1	8011492-521968	mié 12/04/23	vie 14/04/23	3 días	$ 113,983,485.13	410	412
412	1.3.1.11.2.2.1	8011511-521977	lun 17/04/23	lun 17/04/23	1 día	$ 53,530,547.21	411	420;417
413	1.3.1.12	Realizar actividades Mantenimiento Rutinario (vigencia 2023)	mar 18/04/23	jue 27/04/23	8 días	$ 154,049,928.51		
414	1.3.1.12.1	Realizar Corredor AV Gaitán Cortes	mar 18/04/23	mar 18/04/23	1 día	$ 19,544,698.42		
415	1.3.1.12.1.1	Mantenimiento Rutinario Flexible	mar 18/04/23	mar 18/04/23	1 día	$ 19,544,698.42		
416	1.3.1.12.1.1.1	Tramo 1	mar 18/04/23	mar 18/04/23	1 día	$ 19,544,698.42		
417	1.3.1.12.1.1.1	18007107-24121500	mar 18/04/23	mar 18/04/23	1 día	$ 19,544,698.42	412	646
418	1.3.1.12.2	Realizar Corredor AV Boyacá Norte - Sur	mar 18/04/23	jue 27/04/23	8 días	$ 134,505,230.09		
419	1.3.1.12.2.1	Tramo 5	mar 18/04/23	jue 27/04/23	8 días	$ 134,505,230.09		
420	1.3.1.12.2.1.1	8011358-521946	mar 18/04/23	mié 19/04/23	2 días	$ 72,097,694.18	412	421
421	1.3.1.12.2.1.2	8014329-24122058	jue 20/04/23	vie 21/04/23	2 días	$ 60,358,535.91	420	422
422	1.3.1.12.2.1.3	58011524-521986	lun 24/04/23	mar 25/04/23	2 días	$ 1,024,500.00	421	423
423	1.3.1.12.2.1.4	8014942-508681	mié 26/04/23	jue 27/04/23	2 días	$ 1,024,500.00	422	646
424	1.3.1.13	Realizar actividades Rehabilitación y/o Reconstrucción (vigencia 2023)	mar 17/10/23	mar 21/11/23	24 días	$ 1,043,121,678.43		
425	1.3.1.13.1	Corredor Av Caracas	mar 17/10/23	vie 20/10/23	4 días	$ 359,931,007.67		
426	1.3.1.13.1.1	5005487-302060	mar 17/10/23	vie 20/10/23	4 días	$ 359,931,007.67	432	386
427	1.3.1.13.2	Corredor AV Gaitán Cortes	mar 7/11/23	mar 21/11/23	10 días	$ 683,190,670.76		
428	1.3.1.13.2.1	Tramo 13	mar 7/11/23	mar 21/11/23	10 días	$ 683,190,670.76		
429	1.3.1.13.2.1.1	18000138-410448	mar 7/11/23	mar 14/11/23	5 días	$ 229,390,564.49	389;391	430
430	1.3.1.13.2.1.2	18000130-410425	mié 15/11/23	mar 21/11/23	5 días	$ 453,800,106.27	429	454CC-1 día
431	1.3.1.14	Bacheo de Avenida Caracas	lun 9/10/23	vie 15/12/23	46 días	$ 1,893,988,906.80		
432	1.3.1.14.1	5006176-303638	lun 9/10/23	vie 13/10/23	5 días	$ 329,917,960.99	384FC+9 días	426
433	1.3.1.14.2	5005562-302225	vie 15/12/23	vie 15/12/23	1 día	$ 3,869,542.15	435CC	646
434	1.3.1.14.3	5005631-302372	vie 15/12/23	vie 15/12/23	1 día	$ 14,019,293.69	435CC	646
435	1.3.1.14.4	5005951-303083	vie 15/12/23	vie 15/12/23	1 día	$ 19,142,375.74	459CC	434CC;433CC
436	1.3.1.14.5	5006234-303788	mié 13/12/23	mié 13/12/23	1 día	$ 85,035,875.23	437CC	452CC
437	1.3.1.14.6	5006310-303983	mié 13/12/23	mié 13/12/23	1 día	$ 18,298,538.33	438	436CC
438	1.3.1.14.7	5006342-304061	mar 12/12/23	mar 12/12/23	1 día	$ 10,346,380.74	439CC	437
439	1.3.1.14.8	5006676-304913	mar 12/12/23	mar 12/12/23	1 día	$ 5,460,334.17	440CC	438CC

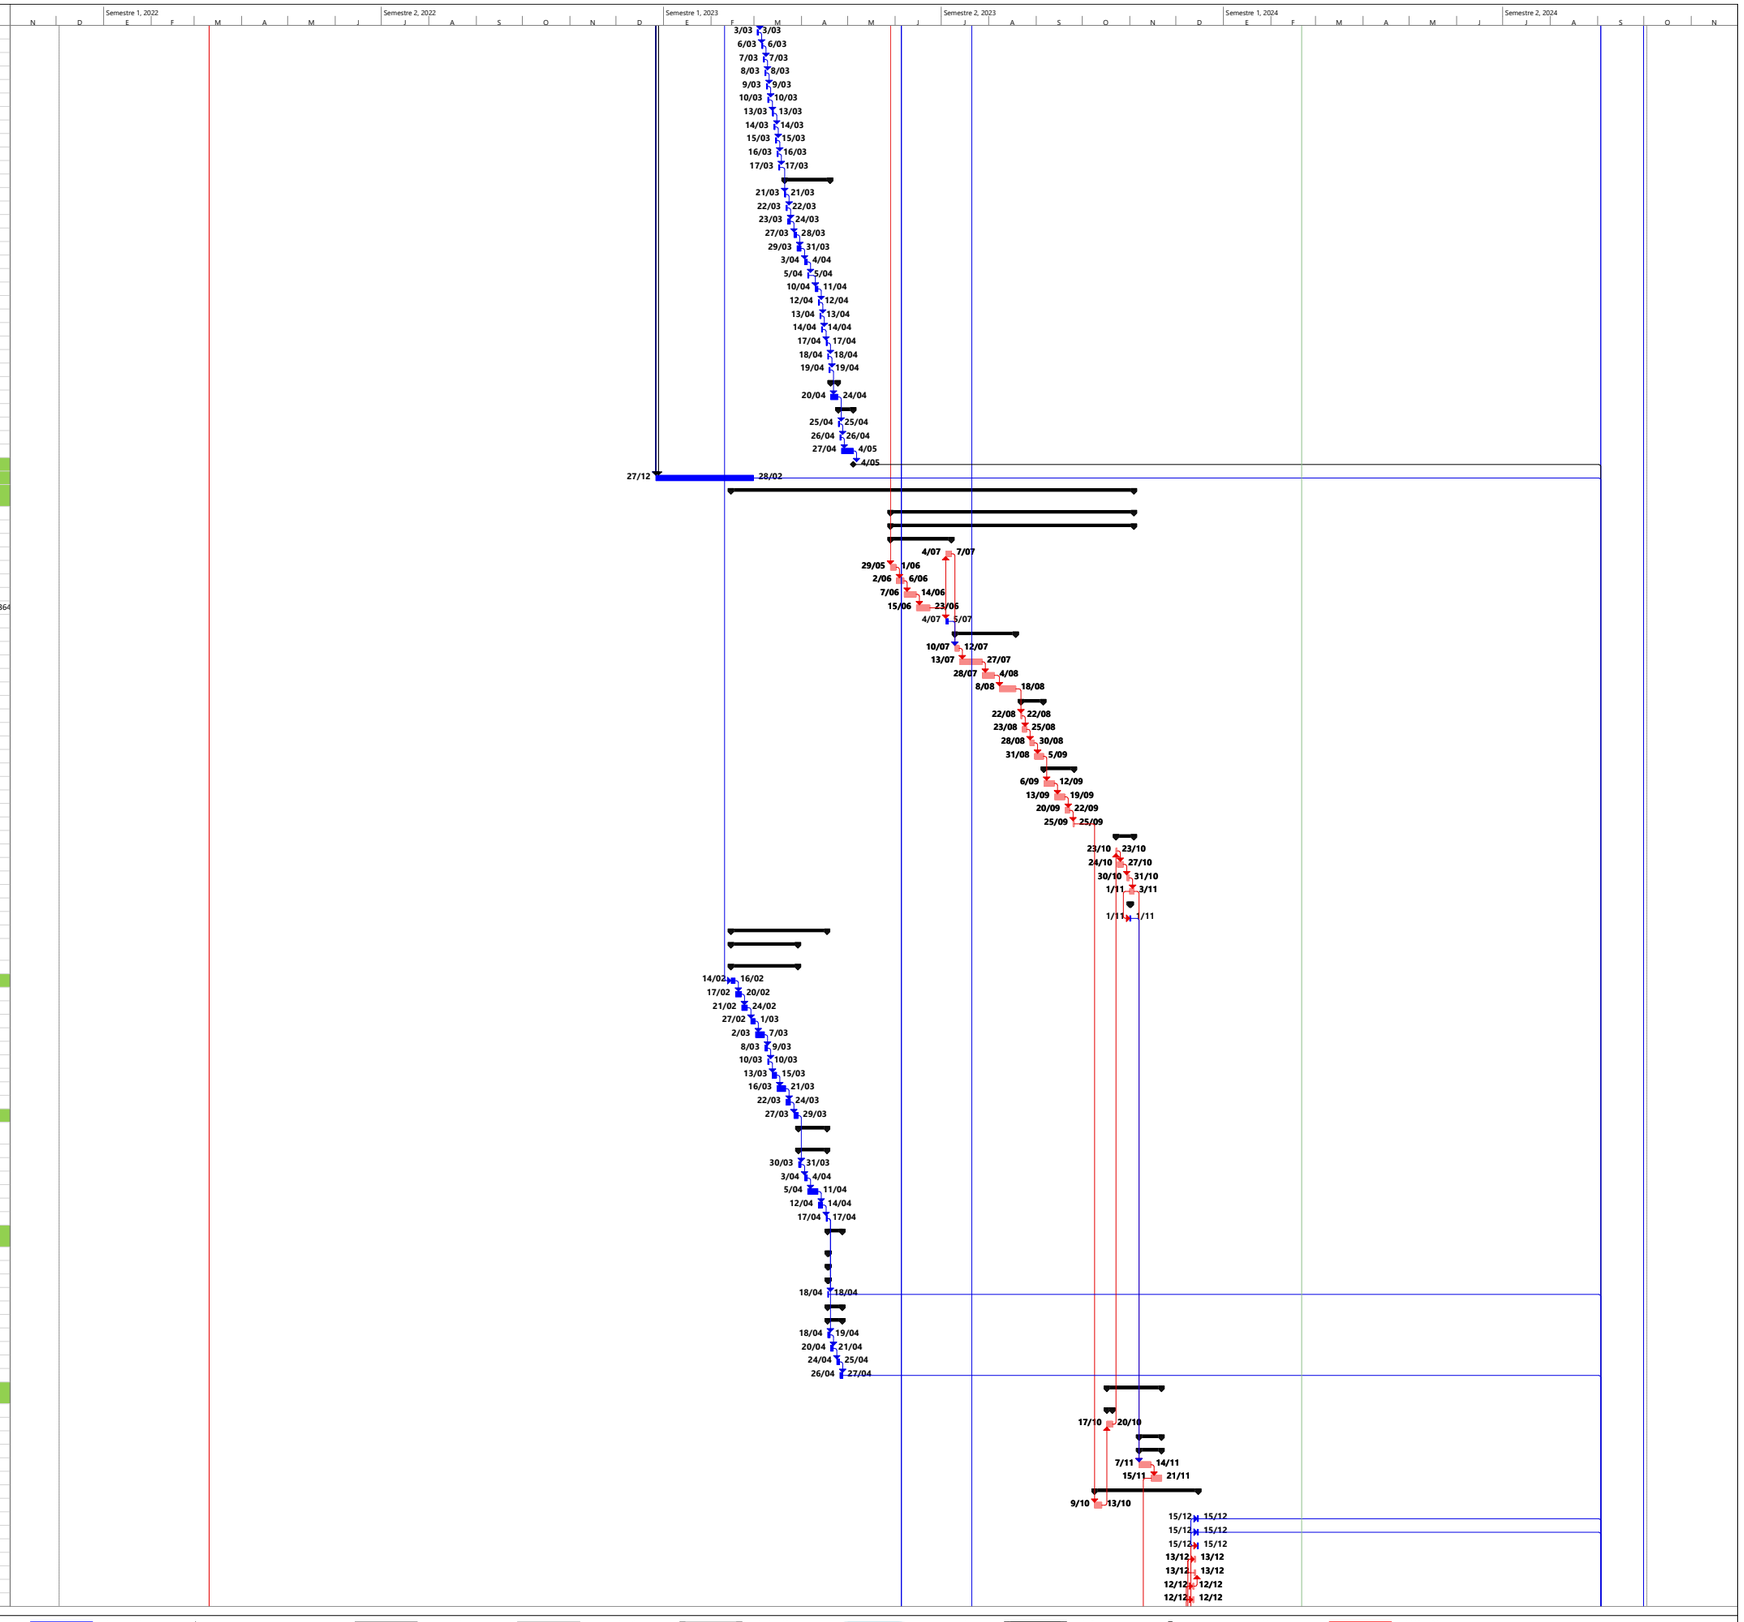

Felipe Torres Alonso
Esp. Costos, Presupuestos y Programación
Consorcio CTUPT 013

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	Predecesoras	Sucesoras
440	1.3.1.14.9	5006698-304970	mar 12/12/23	mar 12/12/23	1 día	$ 13,885,541.54	441CC	439CC
441	1.3.1.14.10	5006766-305126	mar 12/12/23	mar 12/12/23	1 día	$ 24,314,420.92	448CC	440CC
442	1.3.1.14.11	5007391-306473	jue 7/12/23	jue 7/12/23	1 día	$ 35,478,378.71	443CC	451
443	1.3.1.14.12	5007403-306490	jue 7/12/23	jue 7/12/23	1 día	$ 26,574,505.76	444CC	442CC
444	1.3.1.14.13	5007412-306510	jue 7/12/23	jue 7/12/23	1 día	$ 24,222,521.83	445	443CC
445	1.3.1.14.14	5007431-306551	mar 5/12/23	mié 6/12/23	2 días	$ 67,506,957.65	446	444
446	1.3.1.14.15	5007442-306565	lun 4/12/23	lun 4/12/23	1 día	$ 81,879,109.22	447	445
447	1.3.1.14.16	5007452-306573	mié 29/11/23	vie 1/12/23	3 días	$ 124,966,288.04	453	446
448	1.3.1.14.17	5007694-306963	mar 12/12/23	mar 12/12/23	1 día	$ 17,361,370.74	449	441CC
449	1.3.1.14.18	5007700-306981	lun 11/12/23	lun 11/12/23	1 día	$ 56,049,497.25	450CC	448
450	1.3.1.14.19	5007701-306984	lun 11/12/23	lun 11/12/23	1 día	$ 2,796,010.76	451CC	449CC
451	1.3.1.14.20	5007702-306987	lun 11/12/23	lun 11/12/23	1 día	$ 4,836,196.05	442	450CC
452	1.3.1.14.21	5008236-533859	mié 13/12/23	jue 14/12/23	2 días	$ 18,735,430.19	436CC	459
453	1.3.1.14.22	5010067-91031275	vie 17/11/23	mar 28/11/23	8 días	$ 637,870,262.62	458	447
454	1.3.1.14.23	5003581-297840	mar 14/11/23	mar 14/11/23	1 día	$ 13,639,871.99	430CC-1 día	455CC
455	1.3.1.14.24	5003993-298760	mar 14/11/23	mar 14/11/23	1 día	$ 9,170,669.38	454CC	456
456	1.3.1.14.25	5004079-298927	mié 15/11/23	mié 15/11/23	1 día	$ 17,025,470.08	455	457
457	1.3.1.14.26	5004150-299086	jue 16/11/23	jue 16/11/23	1 día	$ 4,840,214.32	456	458CC
458	1.3.1.14.27	5009393-91031894	jue 16/11/23	jue 16/11/23	1 día	$ 83,025,745.42	457CC	453
459	1.3.1.14.28	5007941-533645	vie 15/12/23	vie 15/12/23	1 día	$ 143,720,143.29	452	435CC;495FC+32
460	1.3.1.15	Obras de Drenaje	vie 21/07/23	jue 30/11/23	90 días	$ 883,302,145.74		
461	1.3.1.15.1	Box	vie 21/07/23	mié 15/11/23	79 días	$ 208,768,853.70		
462	1.3.1.15.1.1	5010067-91031275	vie 21/07/23	mié 15/11/23	79 días	$ 208,768,853.70	215FC+70 días	479CC+59 días;4
463	1.3.1.15.2	Cunetas	mar 17/10/23	jue 30/11/23	31 días	$ 512,140,091.72		
464	1.3.1.15.2.1	5010067-91031275	lun 30/10/23	lun 20/11/23	14 días	$ 272,060,283.84	472	473
465	1.3.1.15.2.2	5006176-303638	mié 22/11/23	vie 24/11/23	3 días	$ 68,116,820.16	473	474
466	1.3.1.15.2.3	5007452-306573	mar 17/10/23	mar 17/10/23	1 día	$ 10,454,837.36	462CC+59 días	467
467	1.3.1.15.2.4	5007442-306565	mié 18/10/23	mié 18/10/23	1 día	$ 16,362,619.52	466	468
468	1.3.1.15.2.5	5007431-306551	jue 19/10/23	vie 20/10/23	2 días	$ 22,270,522.56	467	469
469	1.3.1.15.2.6	5007412-306510	lun 23/10/23	lun 23/10/23	1 día	$ 8,861,733.68	468	470
470	1.3.1.15.2.7	5007403-306490	mar 24/10/23	mar 24/10/23	1 día	$ 10,454,837.36	469	471
471	1.3.1.15.2.8	5007391-306473	mié 25/10/23	mié 25/10/23	1 día	$ 11,815,685.20	470	472
472	1.3.1.15.2.9	5007702-306987	jue 26/10/23	vie 27/10/23	2 días	$ 41,587,093.60	471	464
473	1.3.1.15.2.10	5005951-303083	mar 21/11/23	mar 21/11/23	1 día	$ 8,568,564.84	464	465
474	1.3.1.15.2.11	5005631-302372	lun 27/11/23	lun 27/11/23	1 día	$ 8,861,733.68	465	475
475	1.3.1.15.2.12	5005562-302225	mar 28/11/23	mar 28/11/23	1 día	$ 12,047,941.04	474	476
476	1.3.1.15.2.13	5005487-302060	mié 29/11/23	jue 30/11/23	2 días	$ 20,677,418.88	475	646
477	1.3.1.15.3	Filtros	mar 17/10/23	jue 30/11/23	31 días	$ 97,507,904.00		
478	1.3.1.15.3.1	5010067-91031275	mar 31/10/23	mié 22/11/23	15 días	$ 56,254,560.00	479	480
479	1.3.1.15.3.2	5006176-303638	mar 17/10/23	lun 30/10/23	10 días	$ 30,002,432.00	462CC+59 días	478
480	1.3.1.15.3.3	5005951-303083	jue 23/11/23	vie 24/11/23	2 días	$ 3,750,304.00	478	481
481	1.3.1.15.3.4	5007941-533645	lun 27/11/23	mié 29/11/23	3 días	$ 6,563,032.00	480	482
482	1.3.1.15.3.5	5008236-533859	jue 30/11/23	jue 30/11/23	1 día	$ 937,576.00	481	646
483	1.3.1.15.4	Sardinel	lun 2/10/23	jue 9/11/23	27 días	$ 64,885,296.32		
484	1.3.1.15.4.1	5007442-306565	lun 2/10/23	jue 5/10/23	4 días	$ 6,586,372.80	462CC+49 días	485
485	1.3.1.15.4.2	5007431-306551	vie 6/10/23	mar 10/10/23	3 días	$ 5,122,734.40	484	486
486	1.3.1.15.4.3	5007412-306510	mié 11/10/23	jue 12/10/23	2 días	$ 2,195,457.60	485	487
487	1.3.1.15.4.4	5007403-306490	vie 13/10/23	mar 17/10/23	2 días	$ 2,195,457.60	486	488
488	1.3.1.15.4.5	5007391-306473	mié 18/10/23	jue 19/10/23	2 días	$ 2,927,276.80	487	489
489	1.3.1.15.4.6	5007702-306987	vie 20/10/23	mié 25/10/23	4 días	$ 9,513,649.60	488	490
490	1.3.1.15.4.7	5007701-306984	jue 26/10/23	mar 31/10/23	4 días	$ 9,513,649.60	489	491
491	1.3.1.15.4.8	5007700-306981	mié 1/11/23	jue 2/11/23	2 días	$ 5,122,734.40	490	492
492	1.3.1.15.4.9	5010067-91031275	vie 3/11/23	jue 9/11/23	4 días	$ 21,707,963.52	491	646
493	1.3.1.16	Realizar actividades de mantenimiento Periodico 2024	lun 5/02/24	lun 2/09/24	142 días	$ 5,402,891,748.00		
494	1.3.1.16.1	Avenida Jorge Gaitan Cortes	lun 5/02/24	lun 2/09/24	142 días	$ 5,402,891,748.00		
495	1.3.1.16.1.1	Tramo 11	lun 5/02/24	vie 15/03/24	30 días	$ 2,020,521,151.00	459FC+32 días	516CC;496
496	1.3.1.16.1.2	Tramo 2	lun 18/03/24	mar 9/04/24	14 días	$ 731,566,677.00	495	497;516CC
497	1.3.1.16.1.3	Tramo 3	mié 10/04/24	lun 29/04/24	14 días	$ 203,814,783.00	496	498
498	1.3.1.16.1.4	Tramo 12	mar 30/04/24	jue 23/05/24	16 días	$ 760,810,809.00	497	505;499
499	1.3.1.16.1.5	Tramo 6	vie 24/05/24	vie 14/06/24	15 días	$ 382,975,941.00	498	500
500	1.3.1.16.1.6	Tramo 7	lun 17/06/24	lun 29/07/24	30 días	$ 629,535,625.00	499	501
501	1.3.1.16.1.7	Tramo 9	mar 30/07/24	jue 22/08/24	16 días	$ 397,290,878.00	500	502
502	1.3.1.16.1.8	Tramo 8	vie 23/08/24	lun 2/09/24	7 días	$ 276,375,884.00	501	646
503	1.3.1.17	Realizar actividades de mantenimientos Rutinario 2024	vie 24/05/24	vie 7/06/24	11 días	$ 222,322,087.00		
504	1.3.1.17.1	Avenida Jorge Gaitan Cortes	vie 24/05/24	vie 7/06/24	11 días	$ 222,322,087.00		
505	1.3.1.17.1.1	Tramo 2	vie 24/05/24	mar 28/05/24	3 días	$ 65,267,152.00	498	506
506	1.3.1.17.1.2	Tramo 3	mié 29/05/24	mié 5/06/24	6 días	$ 143,199,916.00	505	507
507	1.3.1.17.1.3	Tramo 12	jue 6/06/24	vie 7/06/24	2 días	$ 13,855,019.00	506	511
508	1.3.1.18	Realizar actividades de mantenimientos Rehabilitacion 2024	mar 11/06/24	vie 9/08/24	42 días	$ 648,388,153.00		
509	1.3.1.18.1	Avenida Jorge Gaitan Cortes	mar 11/06/24	vie 9/08/24	42 días	$ 648,388,153.00		
510	1.3.1.18.1.1	Tramo 2	mié 10/07/24	vie 19/07/24	8 días	$ 162,954,000.00	511	512
511	1.3.1.18.1.2	Tramo 4	mar 11/06/24	mar 9/07/24	20 días	$ 330,070,955.00	507	510
512	1.3.1.18.1.3	Tramo 12	lun 22/07/24	vie 9/08/24	14 días	$ 155,363,198.00	510	513
513	1.3.1.19	Señalizacion Av Jorge Gaitan Cortes	lun 12/08/24	lun 2/09/24	15 días	$ 1,151,724,867.37	512	646
514	1.3.1.20	Actividades Especiales	lun 18/03/24	lun 2/09/24	112 días	$ 6,190,979,128.07		
515	1.3.1.20.1	Atencion de emergencias	jue 4/04/24	lun 2/09/24	102 días	$ 4,142,340,496.07	516CC+10 días	646
516	1.3.1.20.2	Calle 13	lun 18/03/24	lun 27/05/24	46 días	$ 2,048,638,632.00	496CC;495CC	646;515CC+10 di
517	1.3.2	Otros	mar 15/03/22	lun 2/09/24	604 días	$ 11,764,659,181.59		
518	1.3.2.1	Componentes	mar 15/03/22	lun 2/09/24	604 días	$ 570,337,015.00		
519	1.3.2.1.1	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	mar 15/03/22	lun 2/09/24	604 días	$ 236,508,169.00		
520	1.3.2.1.1.1	Mes 1	mar 15/03/22	vie 29/04/22	31 días	$ 24,835,130.00	239CC	521
521	1.3.2.1.1.2	Mes 2	lun 2/05/22	mar 31/05/22	21 días	$ 5,002,220.00	520	522
522	1.3.2.1.1.3	Mes 3	mié 1/06/22	jue 30/06/22	20 días	$ 5,330,626.00	521	523
523	1.3.2.1.1.4	Mes 4	vie 1/07/22	vie 29/07/22	19 días	$ 11,932,969.00	522	524
524	1.3.2.1.1.5	Mes 5	lun 1/08/22	mié 31/08/22	22 días	$ 1,188,022.00	523	525
525	1.3.2.1.1.6	Mes 6	jue 1/09/22	vie 30/09/22	22 días	$ 6,584,810.00	524	526
526	1.3.2.1.1.7	Mes 7	lun 3/10/22	lun 31/10/22	20 días	$ 10,607,792.00	525	527
527	1.3.2.1.1.8	Mes 8	mar 1/11/22	mié 30/11/22	20 días	$ 8,510,118.00	526	528
528	1.3.2.1.1.9	Mes 9	jue 1/12/22	vie 30/12/22	21 días	$ 6,101,891.00	527	529
529	1.3.2.1.1.10	Mes 10	lun 2/01/23	mar 31/01/23	21 días	$ 3,636,037.00	528	530
530	1.3.2.1.1.11	Mes 11	mié 1/02/23	mar 28/02/23	20 días	$ 22,890,279.00	529	531
531	1.3.2.1.1.12	Mes 12	mié 1/03/23	vie 31/03/23	22 días	$ 3,927,049.00	530	532
532	1.3.2.1.1.13	Mes 13	lun 3/04/23	mié 3/05/23	20 días	$ 4,869,671.00	531	533
533	1.3.2.1.1.14	Mes 14	jue 4/05/23	mié 31/05/23	19 días	$ 14,241,166.00	532	534
534	1.3.2.1.1.15	Mes 15	jue 1/06/23	vie 30/06/23	20 días	$ 2,165,243.00	533	535
535	1.3.2.1.1.16	Mes 16	mar 4/07/23	lun 31/07/23	19 días	$ 3,934,405.00	534	536
536	1.3.2.1.1.17	Mes 17	mar 1/08/23	jue 31/08/23	21 días	$ 6,194,324.00	535	537
537	1.3.2.1.1.18	Mes 18	vie 1/09/23	vie 29/09/23	21 días	$ 6,778,989.00	536	538
538	1.3.2.1.1.19	Mes 19	lun 2/10/23	mar 31/10/23	21 días	$ 6,802,869.00	537	539
539	1.3.2.1.1.20	Mes 20	mié 1/11/23	jue 30/11/23	20 días	$ 9,124,606.00	538	540
540	1.3.2.1.1.21	Mes 21	vie 1/12/23	vie 29/12/23	19 días	$ 3,105,400.00	539	541
541	1.3.2.1.1.22	Mes 22	mar 2/01/24	mié 31/01/24	21 días	$ 8,351,361.00	540	542
542	1.3.2.1.1.23	Mes 23	jue 1/02/24	jue 29/02/24	21 días	$ 8,105,400.00	541	543
543	1.3.2.1.1.24	Mes 24	vie 1/03/24	mié 27/03/24	18 días	$ 9,351,361.00	542	544
544	1.3.2.1.1.25	Mes 25	lun 1/04/24	mar 30/04/24	22 días	$ 10,802,869.00	543	545
545	1.3.2.1.1.26	Mes 26	jue 2/05/24	vie 31/05/24	21 días	$ 7,124,606.00	544	546
546	1.3.2.1.1.27	Mes 27	lun 3/06/24	vie 28/06/24	19 días	$ 7,778,989.00	545	547
547	1.3.2.1.1.28	Mes 28	mar 2/07/24	mié 31/07/24	22 días	$ 9,124,606.00	546	548
548	1.3.2.1.1.29	Mes 29	jue 1/08/24	lun 2/09/24	21 días	$ 8,105,361.00	547	646
549	1.3.2.1.2	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	mar 15/03/22	vie 30/08/24	603 días	$ 61,207,813.00		
550	1.3.2.1.2.1	Mes 1	mar 15/03/22	vie 29/04/22	31 días	$ 7,760,927.00	239CC	551
551	1.3.2.1.2.2	Mes 2	lun 2/05/22	mar 31/05/22	21 días	$ 1,596,131.00	550	552
552	1.3.2.1.2.3	Mes 3	mié 1/06/22	jue 30/06/22	20 días	$ 1,619,153.00	551	553
553	1.3.2.1.2.4	Mes 4	vie 1/07/22	vie 29/07/22	19 días	$ 1,974,640.00	552	554

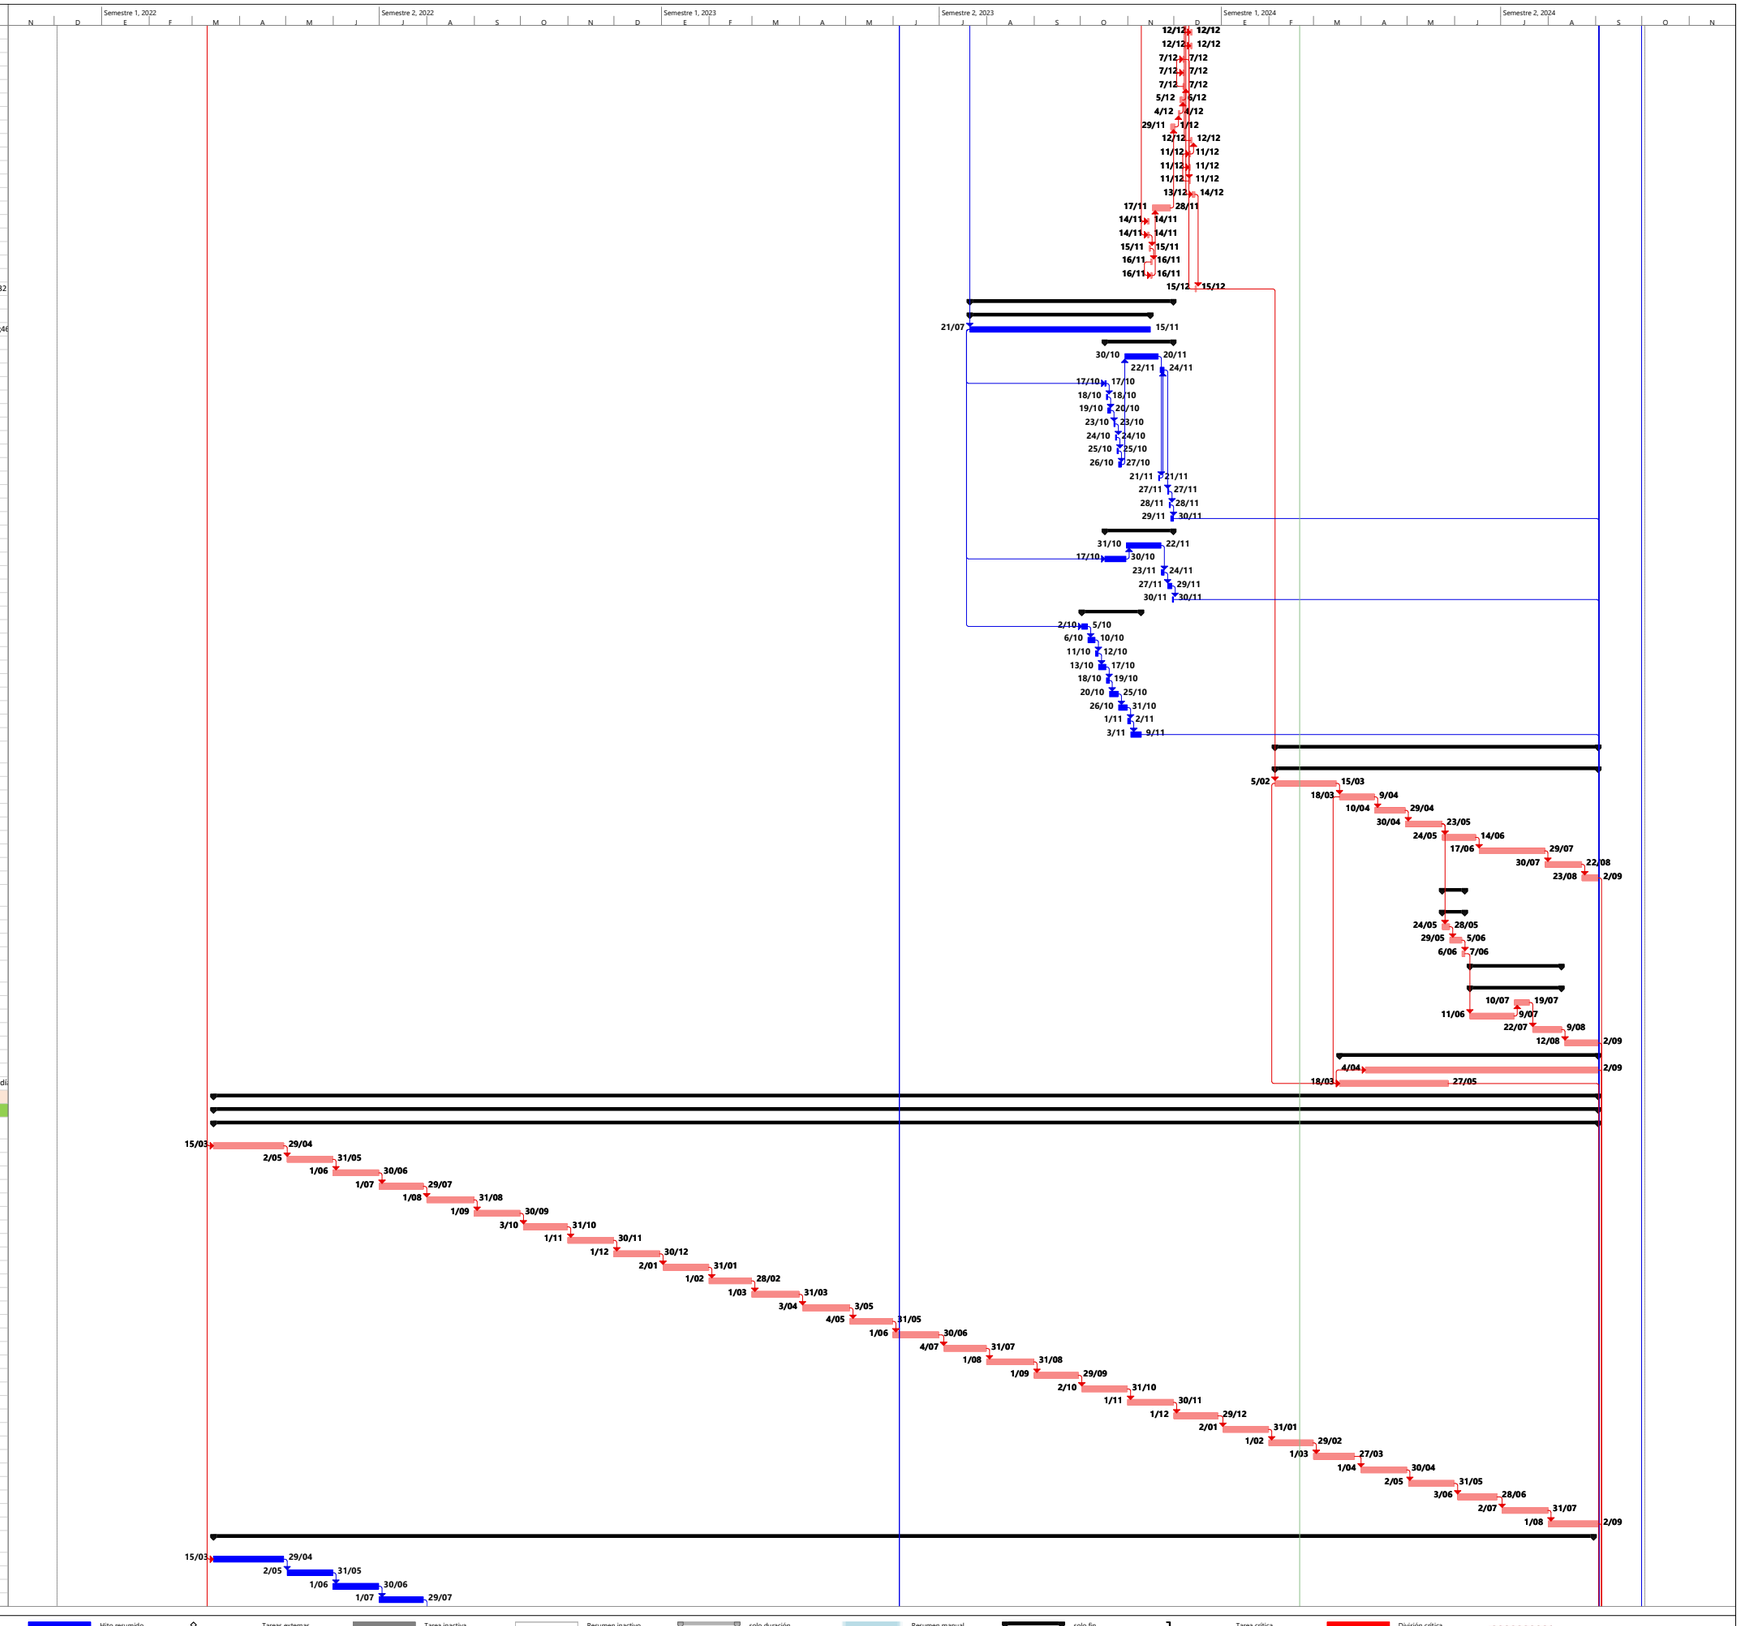


Proyecto: IDU-1714-2021-CON
Fecha: mié 21/02/24

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Tarea resumida · Hito resumido · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Tarea crítica · División crítica
División · Resumen · Agrupar por síntesis · Tarea crítica resumida · Progreso resumido · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Fecha límite · Tareas críticas · Progreso

Felipe Torres Alonso
Esp. Costos, Presupuestos y Programación
Consorcio CTUPT 013

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	Predecesoras	Sucesoras
554	1.3.2.1.2.5	Mes 5	lun 1/08/22	mié 31/08/22	22 días	$ 1,673,085.00	553	555
555	1.3.2.1.2.6	Mes 6	jue 1/09/22	vie 30/09/22	22 días	$ 3,196,879.00	554	556
556	1.3.2.1.2.7	Mes 7	lun 3/10/22	lun 31/10/22	20 días	$ 1,615,043.00	555	557
557	1.3.2.1.2.8	Mes 8	mar 1/11/22	mié 30/11/22	20 días	$ 1,623,868.00	556	558
558	1.3.2.1.2.9	Mes 9	jue 1/12/22	vie 30/12/22	21 días	$ 1,671,202.00	557	559
559	1.3.2.1.2.10	Mes 10	lun 2/01/23	mar 31/01/23	21 días	$ 1,696,871.00	558	560
560	1.3.2.1.2.11	Mes 11	mié 1/02/23	mar 28/02/23	20 días	$ 1,587,498.00	559	561
561	1.3.2.1.2.12	Mes 12	mié 1/03/23	vie 31/03/23	22 días	$ 1,753,196.00	560	562
562	1.3.2.1.2.13	Mes 13	lun 3/04/23	mié 3/05/23	20 días	$ 1,798,663.00	561	563
563	1.3.2.1.2.14	Mes 14	jue 4/05/23	mié 31/05/23	19 días	$ 1,812,990.00	562	564
564	1.3.2.1.2.15	Mes 15	jue 1/06/23	vie 30/06/23	20 días	$ 2,764,648.00	563	565
565	1.3.2.1.2.16	Mes 16	mar 4/07/23	lun 31/07/23	19 días	$ 1,648,198.00	564	566
566	1.3.2.1.2.17	Mes 17	mar 1/08/23	jue 31/08/23	21 días	$ 1,683,279.00	565	567
567	1.3.2.1.2.18	Mes 18	vie 1/09/23	vie 29/09/23	21 días	$ 1,654,018.00	566	568
568	1.3.2.1.2.19	Mes 19	lun 2/10/23	mar 31/10/23	21 días	$ 1,833,027.00	567	569
569	1.3.2.1.2.20	Mes 20	mié 1/11/23	jue 30/11/23	20 días	$ 1,713,040.00	568	570
570	1.3.2.1.2.21	Mes 21	vie 1/12/23	vie 29/12/23	19 días	$ 1,647,800.00	569	571
571	1.3.2.1.2.22	Mes 22	mar 2/01/24	mar 30/01/24	20 días	$ 2,764,648.00	570	572
572	1.3.2.1.2.23	Mes 23	mié 31/01/24	mié 28/02/24	21 días	$ 1,833,027.00	571	573
573	1.3.2.1.2.24	Mes 24	jue 29/02/24	mar 26/03/24	18 días	$ 1,713,040.00	572	574
574	1.3.2.1.2.25	Mes 25	mié 27/03/24	lun 29/04/24	22 días	$ 1,647,800.00	573	575
575	1.3.2.1.2.26	Mes 26	mar 30/04/24	jue 30/05/24	21 días	$ 2,764,648.00	574	576
576	1.3.2.1.2.27	Mes 27	vie 31/05/24	jue 27/06/24	19 días	$ 2,764,648.00	575	577
577	1.3.2.1.2.28	Mes 28	vie 28/06/24	mar 30/07/24	22 días	$ 1,648,198.00	576	578
578	1.3.2.1.2.29	Mes 29	mié 31/07/24	vie 30/08/24	21 días	$ 1,747,648.00	577	646
579	1.3.2.1.3	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	mar 15/03/22	vie 30/08/24	603 días	$ 272,621,033.00		
580	1.3.2.1.3.1	Mes 1	mar 15/03/22	vie 29/04/22	31 días	$ 3,003,670.00	239CC	581
581	1.3.2.1.3.2	Mes 2	lun 2/05/22	mar 31/05/22	21 días	$ 3,774,458.00	580	582
582	1.3.2.1.3.3	Mes 3	mié 1/06/22	jue 30/06/22	20 días	$ 3,264,666.00	581	583
583	1.3.2.1.3.4	Mes 4	vie 1/07/22	vie 29/07/22	19 días	$ 2,725,070.00	582	584
584	1.3.2.1.3.5	Mes 5	lun 1/08/22	mié 31/08/22	22 días	$ 5,818,021.00	583	585
585	1.3.2.1.3.6	Mes 6	jue 1/09/22	vie 30/09/22	22 días	$ 8,334,081.00	584	586
586	1.3.2.1.3.7	Mes 7	lun 3/10/22	lun 31/10/22	20 días	$ 9,556,597.00	585	587
587	1.3.2.1.3.8	Mes 8	mar 1/11/22	mié 30/11/22	20 días	$ 9,504,432.00	586	588
588	1.3.2.1.3.9	Mes 9	jue 1/12/22	vie 30/12/22	21 días	$ 9,721,349.00	587	589
589	1.3.2.1.3.10	Mes 10	lun 2/01/23	mar 31/01/23	21 días	$ 6,963,790.00	588	590
590	1.3.2.1.3.11	Mes 11	mié 1/02/23	mar 28/02/23	20 días	$ 8,723,748.00	589	591
591	1.3.2.1.3.12	Mes 12	mié 1/03/23	vie 31/03/23	22 días	$ 8,191,738.00	590	592
592	1.3.2.1.3.13	Mes 13	lun 3/04/23	mié 3/05/23	20 días	$ 5,158,513.00	591	593
593	1.3.2.1.3.14	Mes 14	jue 4/05/23	mié 31/05/23	19 días	$ 6,496,655.00	592	594
594	1.3.2.1.3.15	Mes 15	jue 1/06/23	vie 30/06/23	20 días	$ 1,672,146.00	593	595
595	1.3.2.1.3.16	Mes 16	mar 4/07/23	lun 31/07/23	19 días	$ 5,132,259.00	594	596
596	1.3.2.1.3.17	Mes 17	mar 1/08/23	jue 31/08/23	21 días	$ 15,166,353.00	595	597
597	1.3.2.1.3.18	Mes 18	vie 1/09/23	vie 29/09/23	21 días	$ 16,162,587.00	596	598
598	1.3.2.1.3.19	Mes 19	lun 2/10/23	mar 31/10/23	21 días	$ 14,642,573.00	597	599
599	1.3.2.1.3.20	Mes 20	mié 1/11/23	jue 30/11/23	20 días	$ 10,921,595.00	598	600
600	1.3.2.1.3.21	Mes 21	vie 1/12/23	vie 29/12/23	19 días	$ 11,743,152.00	599	601
601	1.3.2.1.3.22	Mes 22	mar 2/01/24	mar 30/01/24	20 días	$ 11,743,152.00	600	602
602	1.3.2.1.3.23	Mes 23	mié 31/01/24	mié 28/02/24	21 días	$ 15,166,353.00	601	603
603	1.3.2.1.3.24	Mes 24	jue 29/02/24	mar 26/03/24	18 días	$ 16,162,587.00	602	604
604	1.3.2.1.3.25	Mes 25	mié 27/03/24	lun 29/04/24	22 días	$ 14,642,573.00	603	605
605	1.3.2.1.3.26	Mes 26	mar 30/04/24	jue 30/05/24	21 días	$ 10,921,595.00	604	606
606	1.3.2.1.3.27	Mes 27	vie 31/05/24	jue 27/06/24	19 días	$ 11,743,152.00	605	607
607	1.3.2.1.3.28	Mes 28	vie 28/06/24	mar 30/07/24	22 días	$ 14,642,573.00	606	608
608	1.3.2.1.3.29	Mes 29	mié 31/07/24	vie 30/08/24	21 días	$ 10,921,595.00	607	646
609	1.3.2.2	Ajustes de Obra y Componentes	mar 15/03/22	vie 30/08/24	603 días	$ 10,848,398,774.59		
610	1.3.2.2.1	Mes 1	mar 15/03/22	vie 29/04/22	31 días	$ 696,885.00	239CC	611
611	1.3.2.2.2	Mes 2	lun 2/05/22	mar 31/05/22	21 días	$ 45,254,142.00	610	612
612	1.3.2.2.3	Mes 3	mié 1/06/22	jue 30/06/22	20 días	$ 72,015,191.00	611	613
613	1.3.2.2.4	Mes 4	vie 1/07/22	vie 29/07/22	19 días	$ 68,590,379.00	612	614
614	1.3.2.2.5	Mes 5	lun 1/08/22	mié 31/08/22	22 días	$ 133,419,844.00	613	615
615	1.3.2.2.6	Mes 6	jue 1/09/22	vie 30/09/22	22 días	$ 220,378,796.00	614	616
616	1.3.2.2.7	Mes 7	lun 3/10/22	lun 31/10/22	20 días	$ 318,971,293.00	615	617
617	1.3.2.2.8	Mes 8	mar 1/11/22	mié 30/11/22	20 días	$ 401,090,921.00	616	618;640;644
618	1.3.2.2.9	Mes 9	jue 1/12/22	vie 30/12/22	21 días	$ 646,374,643.00	617	619
619	1.3.2.2.10	Mes 10	lun 2/01/23	mar 31/01/23	21 días	$ 233,771,385.00	618	620
620	1.3.2.2.11	Mes 11	mié 1/02/23	mar 28/02/23	20 días	$ 618,244,399.00	619	621
621	1.3.2.2.12	Mes 12	mié 1/03/23	vie 31/03/23	22 días	$ 867,238,022.00	620	622
622	1.3.2.2.13	Mes 13	lun 3/04/23	mié 3/05/23	20 días	$ 323,691,185.00	621	623
623	1.3.2.2.14	Mes 14	jue 4/05/23	mié 31/05/23	19 días	$ 448,864,824.00	622	624
624	1.3.2.2.15	Mes 15	jue 1/06/23	vie 30/06/23	20 días	$ 243,567,850.00	623	625
625	1.3.2.2.16	Mes 16	mar 4/07/23	lun 31/07/23	19 días	$ 241,621,654.00	624	626
626	1.3.2.2.17	Mes 17	mar 1/08/23	jue 31/08/23	21 días	$ 246,868,242.00	625	627
627	1.3.2.2.18	Mes 18	vie 1/09/23	vie 29/09/23	21 días	$ 556,547,258.00	626	628
628	1.3.2.2.19	Mes 19	lun 2/10/23	mar 31/10/23	21 días	$ 567,603,410.00	627	629
629	1.3.2.2.20	Mes 20	mié 1/11/23	jue 30/11/23	20 días	$ 500,680,580.00	628	630
630	1.3.2.2.21	Mes 21	vie 1/12/23	vie 29/12/23	19 días	$ 388,251,326.00	629	631
631	1.3.2.2.22	Mes 22	mar 2/01/24	mar 30/01/24	20 días	$ 209,819,597.33	630	632
632	1.3.2.2.23	Mes 23	mié 31/01/24	mié 28/02/24	21 días	$ 456,547,258.00	631	633
633	1.3.2.2.24	Mes 24	jue 29/02/24	mar 26/03/24	18 días	$ 467,603,410.00	632	634
634	1.3.2.2.25	Mes 25	mié 27/03/24	lun 29/04/24	22 días	$ 400,680,580.00	633	635
635	1.3.2.2.26	Mes 26	mar 30/04/24	jue 30/05/24	21 días	$ 488,251,326.00	634	636
636	1.3.2.2.27	Mes 27	vie 31/05/24	jue 27/06/24	19 días	$ 561,644,990.76	635	637
637	1.3.2.2.28	Mes 28	vie 28/06/24	mar 30/07/24	22 días	$ 567,603,410.00	636	638
638	1.3.2.2.29	Mes 29	mié 31/07/24	vie 30/08/24	21 días	$ 552,505,973.50	637	646
639	1.3.2.3	Ensayos de laboratorio	jue 1/12/22	mar 27/06/23	140 días	$ 246,290,088.00		
640	1.3.2.3.1	Vigencia 2021-2022	jue 1/12/22	jue 22/12/22	15 días	$ 244,000,218.00	617	646
641	1.3.2.3.2	Vigencia 2023	lun 5/06/23	mar 27/06/23	15 días	$ 2,289,870.00	35	646
642	1.3.2.4	Bioseguridad	lun 5/06/23	mar 27/06/23	15 días	$ 8,362,164.00	35	646
643	1.3.2.5	Ajuste de diseños	jue 1/12/22	mar 27/06/23	140 días	$ 91,271,140.00		
644	1.3.2.5.1	Vigencia 2021-2022	jue 1/12/22	jue 22/12/22	15 días	$ 68,856,342.00	617	646
645	1.3.2.5.2	Vigencia 2023	lun 5/06/23	mar 27/06/23	15 días	$ 22,414,798.00	35	646
646	1.3.3	Recibo de Obra	mar 3/09/24	mié 2/10/24	22 días	$ 0.00	515;548;578;608	647
647	1.3.4	FIN DE OBRA	mié 2/10/24	mié 2/10/24	0 días	$ 0.00	646;288;35	

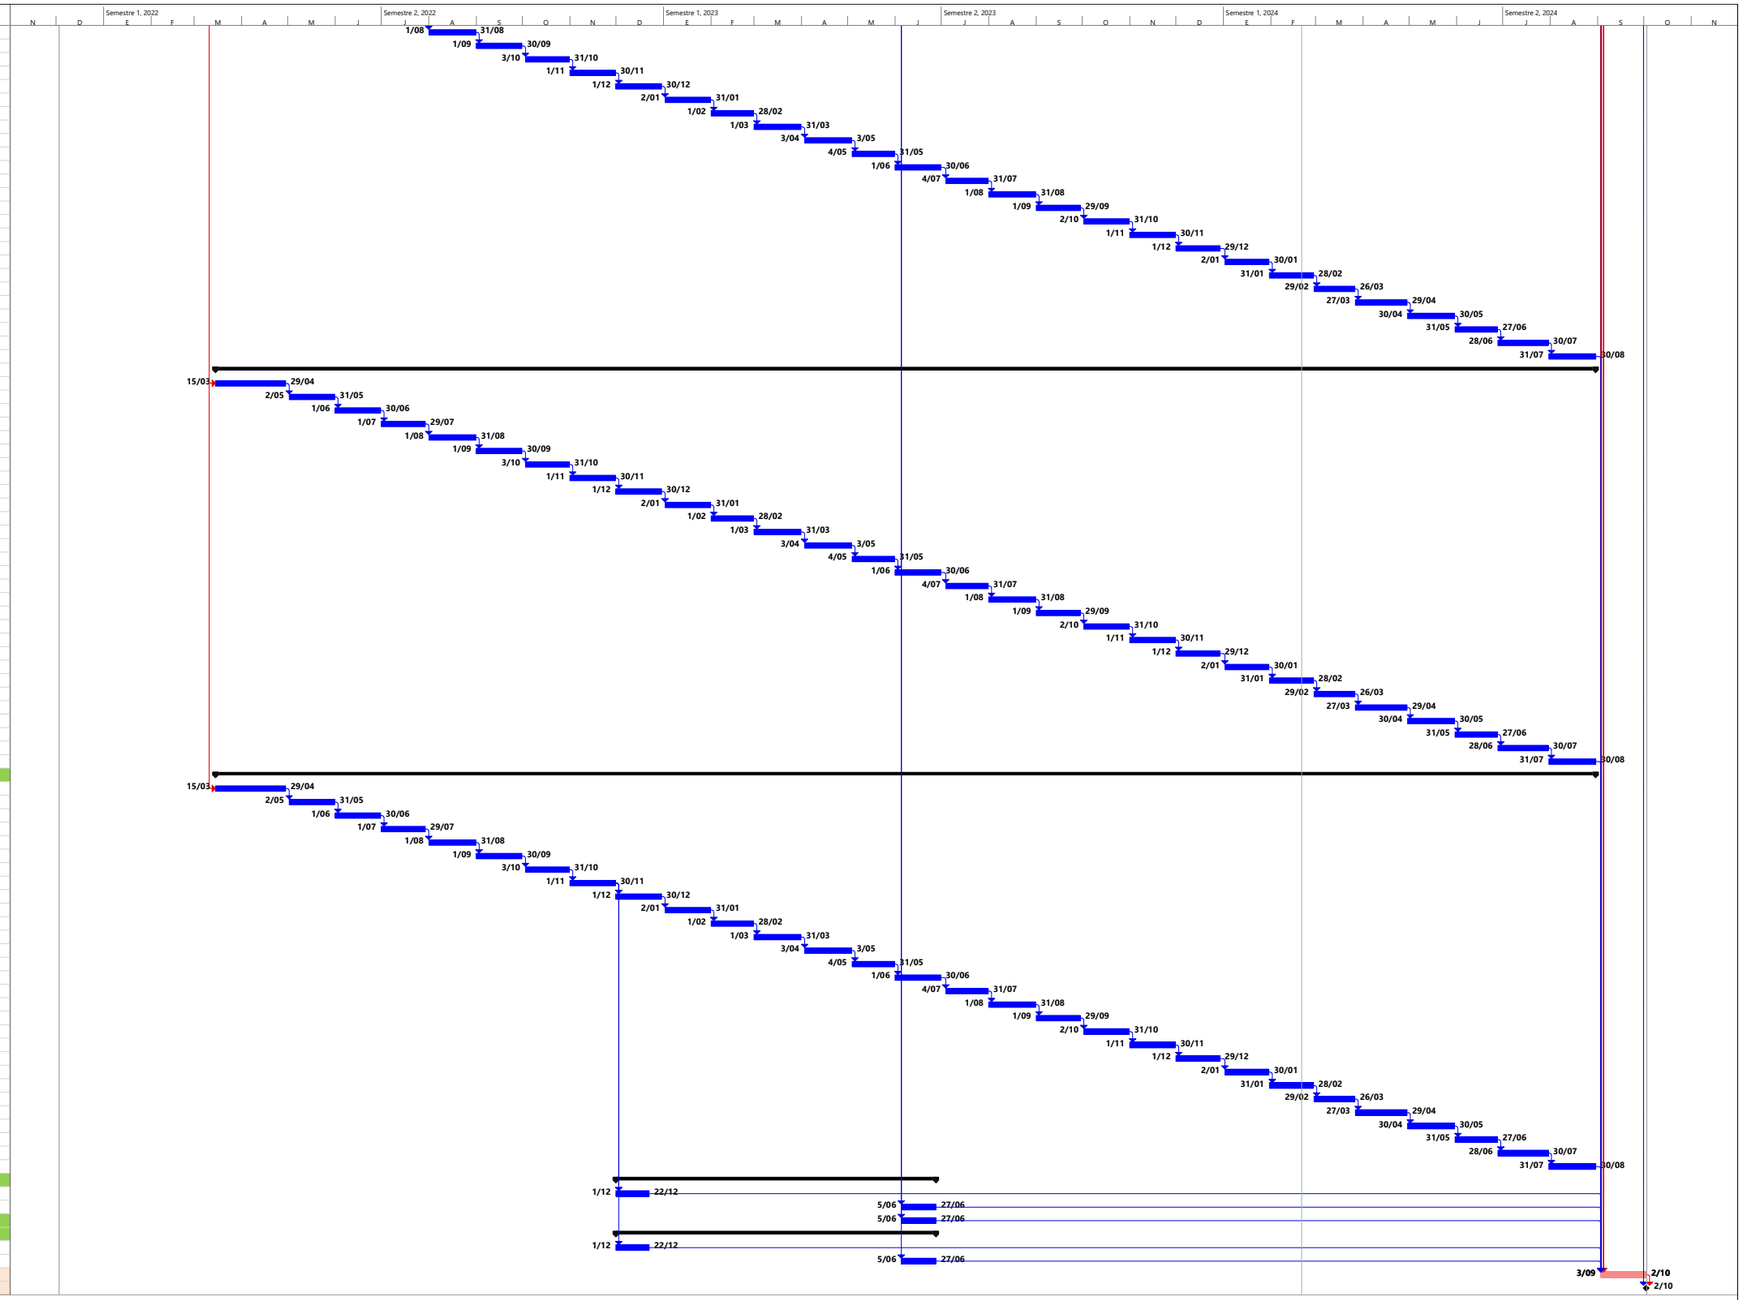

Proyecto: IDU-1714-2021-CON
Fecha: mié 21/02/24

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Tarea resumida · Hito resumido · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Tarea crítica · División crítica
División · Resumen · Agrupar por síntesis · Tarea crítica resumida · Progreso resumido · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Fecha límite · Tareas críticas · Progreso

Felipe Torres Alonso
Esp. Costos, Presupuestos y Programación
Consorcio CTUPT 013
