| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 12/03/2024 (Día / Mes / Año)

**ADICIÓN** | | **MODIFICACIÓ**| | **PRÓRROGA** |-|

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

**RESPONSABILIDAD**

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

**ANTECEDENTES**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4209 DE 2023 (Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL IPCC (Nombre o razón social del Interventor )

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES EN LOS PR0+0354 Y PR2+0200 EN ATENCIÓN EMERGENCIA, VÍA LETICIA – TARAPACÁ, MUNICIPIO LETICIA DEPARTAMENTO AMAZONAS.

**CONTRATO DE OBRA No.** 3832 DE 2023 (Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO PUENTES IPV

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** HASTA 31/12/2023 (Indique el plazo del contrato principal)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 12/12/2023 (Día / Mes / Año)

**MODIFICACIONES**

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| Uno (1) | 15/11/2023 | Aclarar el literal b) de la CLAUSULA SEPTIMA |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |

**PRÓRROGAS**

| Contrato Adicional No. | Periodo | |
|---|---|---|
| | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| 1 | | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 5/02/2024 | 6/02/2024 |
| 2 | | 7/02/2024 | 7/02/2024 | 7/03/2024 | 8/03/2024 |
| 2 | 1 | 8/03/2024 | 8/03/2024 | 17/03/2024 | 18/03/2024 |

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 22/03/2024 (Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 470.000.000,00 **50% EN SMMLV:** $ 202,59 (Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

**VALOR ADICIONES**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 470.000.000,00 (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

**OBJETO DE LA SOLICITUD**

Mediante comunicación escrita No. OF-INT-4209-029 de fecha 12/03/2024 el Interventor solicita lo siguiente:

Mediante la presente, la interventoría de la referencia se permite solicitar prórroga al contrato de interventoría 4209 de 2023 por cuatro (4) meses obteniendo nueva fecha de terminación del 22 de Julio de 2024, con el fin de, garantizar el seguimiento y control de las actividades que se ejecutarán por el contratista de obra CONSORCIO PUENTES IPV quien mediante oficio CP-IPV-018 DE 2024, realiza solicitud de prórroga al contrato de obra, teniendo en cuenta la siguiente consideración:

1). El término restante es insuficiente para la ejecución de la totalidad de las metas físicas contempladas en el presupuesto oficial de obra del contrato N° 3832 de 2023. Se presenta cuadro de resumen contractual de contrato de obra:

Contrato de obra No. 3832 DE 2023
Fecha de inicio 12/12/2023
Fecha inicial de terminación 31/12/2023
Fecha inicial de Suspensión No.1 26/12/2023
Fecha final de la suspensión No.1 5/02/2024
Fecha reanudación suspensión No.1 06/02/2024
Fecha inicial suspensión No.2 07/02/2024
Fecha final suspensión No.2 07/03/2024
Fecha inicial ampliación 1 suspensión No.2 08/03/2024
Fecha final ampliación 1 suspensión No.2 17/03/2024
Fecha de reanudación 18/03/2024
Fecha inicial prorroga No.1 22/03/2024
Nueva fecha de vencimiento 22/07/2024
Metas programadas iniciales 100%
Metas ejecutadas 0% del contrato
Estado actual Suspendido

Teniendo como referencia el cuadro resumen de lo contractual del contrato de obra, se hace necesario realizar la prórroga con el fin de dar finalidad en primera instancia, a la etapa de estudios y diseños la cual tiene una disposición de tiempo de 30 días calendario para su ejecución, desde la fecha de reanudación de la ampliación 1 de la suspensión No 2. Y seguido de este tiempo, se estipula la ejecución de actividades de obra con una duración de 03 meses.

2). Por lo anterior se considera necesario ampliar el plazo del contrato de interventoría N° 4209 de 2023 hasta el 22 de julio de 2024 y con ello garantizar la ejecución y recibo a satisfacción de las obras.
3). Esta interventoría emite concepto favorable a la solicitud de prorrogar el contrato de interventoría hasta el 22 de julio de 2024, puesto que, en la propuesta económica del contrato 4209 de 2023 se estima una duración de 4 meses.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

**ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

Control y Seguimiento a los ajustes y diseños presentados por el contratista, con el fin de dar aprobacion y continuidad a la ejecucion de las obras, garantizando cumplimiento de calidad en las actividades ejecutadas

Con los recursos disponibles se pretende atender las vias con el consiguiente bienestar para los usuarios reflejado en la seguridad y comodidad del desplazamiento, para lo cual se adelantarán las obras prioritarias de mejoramiento y mantenimiento, descritas de la siguiente manera:
- Fresado de pavimento asfáltico
- Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-0
- Mezcla densa en caliente tipo mdc-19 - compra de mezcla
- Línea de demarcación con pintura en frio
- Tacha reflectiva - adhesivo epóxico.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

**DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO**

| Formulario 1 | | Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____ | Valor solicitado | Valor actualizado presente solicitud |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Valor inicial | | | |
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | |
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | |
| Director de Interventoría | $ 28.080.000,00 | $ - | $ - | $ 28.080.000 |
| Ingeniero Residente de Interventoria | $ 21.700.000,00 | $ - | $ - | $ 21,700,000 |
| Profesional Social | $ 15.400.000,00 | $ - | $ - | $ 15,400,000 |
| Profesional Ambiental | $ 15.400.000,00 | $ - | $ - | $ 15,400,000 |
| Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad | $ 7.700.000,00 | $ - | $ - | $ 7.700.000 |
| Profesional Técnico Predial | $ 7.700.000,00 | $ - | $ - | $ 7,700,000 |
| Profesional Jurídico Predial | $ 7.700.000,00 | $ - | $ - | $ 7.700.000 |
| MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo) | $ 39.840.000,00 | $ - | $ - | $ 39,840,000 |
| Especialista en Pavimentos y/o vias | $ - | | | |
| Especialista en Estructuras | $ - | | | |
| Especialista en Geología y Geotecnia | $ - | | | |
| Especialista en Ambiental | $ - | | | |
| Especialista en Hidráulica e Hidrología | $ - | | | |
| PERSONAL TECNICO | | | | |
| Laboralista Inspector | $ 4.500.000,00 | $ - | $ - | $ 4,500,000 |
| Inspector SST | $ 8.680.000,00 | $ - | $ - | $ 8,680,000 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | |
| Secretaria | $ 4.680.000,00 | $ - | $ - | $ 4,680,000 |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ 161.380.000,00 | $ - | $ - | $ 161,380,000 |
| FACTOR MULTIPLICADOR | 2,36 | | | 2,36 |
| TOTAL DIRECTOS COSTOS DE PERSONAL (A) | $ 380.856.800,00 | $ - | $ - | $ 380,856,800 |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | |
| VIATICOS | | | | |
| Viaticos Director y/o Especialistas | $ 3.500.000 | $ - | $ - | $ - |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | |
| Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato. | $ 20.520.000 | $ - | $ - | $ 20,520,000 |
| Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y trnasporte) | $ 21.385.000 | $ - | $ - | $ 21,385,000 |
| Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | $ 2.200.000 | $ - | $ - | $ 2,200,000 |
| Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 4.800.000 | $ - | $ - | $ 4,800,000 |
| OTROS COSTOS | | | | |
| Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 6.055.000 | $ - | $ - | $ 6,055,000 |
| Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | $ 2.560.000 | $ - | $ - | $ 2,560,000 |
| Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | $ 2.560.000 | $ - | $ - | $ 2,560,000 |
| Veeduría Técnica Comunitaria | $ 600.000 | $ - | $ - | $ 600,000 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) | $ 64.180.000,00 | $ - | $ - | $ 64,180,000 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = C | $ 445.036.800,00 | $ - | $ - | $ 445,036,800 |
| PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D) | $ 24.963.200,00 | $ - | $ - | $ 24,963,200 |
| COSTO TOTAL = (C) + (D) = (E) | $ 470.000.000,00 | $ - | $ - | $ 470,000,000 |
| Valor Total | | | | |

**RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: (mes anterior a la presente solicitud) de (año) $ -

Último mes facturado: (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 470,000,000.00 (mes anterior a la presente solicitud)

**PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES**

NINGUNA.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

La supervisión de la interventoría acusa recibo de la solicitud mediante la cual solicita prorroga No. 1 del contrato de interventoría y considera que las causales expuestas son razón suficiente para que el mismo deba ser objeto de prorroga ya que los procesos de acompañamiento deben ser coincidientes con los tiempos que se le establezcan al contrato de obra.

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:**

OFICIO DE SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 1 PARA CONTRATO DE INTERVENTORIA - OF-INT-4209-029
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS - MEPI-MN1-IN-9-FR-1
PLAN CARGAS O REPROG PLAN CARGAS -MEPI-MN1-IN-9-FR-2
SEGUIMIENTO A GARANTIAS INTERVENTORIA - MEPI-MN1-IN-15-FR-13

**Notas:**

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

Nombre: PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matricula Profesional No. 01196-0427 CPITVC

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA

Firma

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoria
INVIAS
Matrícula Profesional No. 52202-46096 NRÑ

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA

Vo.Bo.Firma

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Director Territorial
Matricula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ

Vo.Bo.Firma

Nombre: IVAN DARIO GAMBOA CIFUENTES
Gestor Técnico de Proyecto
Matricula Profesional No.

Firmado digitalmente por PATRICIA INES MORALES PADRON

Firma

Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Subdirectora Vias Regionales INVIAS (E)
Matrícula Profesional No.

Vo.Bo.Firma

Nombre: LILIANA SASTOQUE BAUTISTA
Abogado Unidad Ejecutora

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

Duitama, 12 de marzo de 2024

**OF-INT-4209-029**

Señores:
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS**
**Ing. José Ricardo Burbano Barcenas**
Supervisor del Contrato
Calle 25 G # 73B – 90
Bogotá, D.C

**REF.:** CTO 4209 DE 2023, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES EN LOS PR0+0354 Y PR2+0200 EN ATENCIÓN EMERGENCIA, VÍA LETICIA - TARAPACÁ, MUNICIPIO LETICIA DEPARTAMENTO AMAZONAS".

**Asunto:** Solicitud de Prórroga N°1 – Contrato de Interventoría 4209 de 2023

Cordial saludo,

La interventoría del proyecto de la referencia, CONSORCIO INTERVIAL IPCC, contratada por INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS), en el marco de la ejecución del contrato de interventoría 4209 de 2023 se permite solicitar prórroga al contrato referenciado por un plazo inicial de 4 meses, con base en la propuesta económica presentada por el consorcio y que estima una duración de 4 meses planteada por la entidad contratante el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS), es por ello que, con base a la ampliación 1 de la suspensión 2, la fecha de reanudación de dicho contrato sería el próximo 18 de marzo de 2024 y la fecha de terminación el 22 de marzo de 2024, obteniendo una nueva fecha de terminación, de acuerdo a la presente solicitud, del 22 de julio de 2024, esto con el fin de garantizar apropiadamente el seguimiento y control de las actividades que ejecutará el contratista de obra CONSORCIO PUENTES IPV cuyo contrato es N°3832 de 2023 y objeto CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN LOS PR0+0354 Y PR2+0200 EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA, DE LA VÍA LETICIA – TARAPACÁ, EN EL MUNICIPIO DE LETICIA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

Es preciso señalar que el CONSORCIO PUENTES IPV manifiesta mediante oficio CP-IPV-018 DE 2024 con referencia "Solicitud prorroga No.1", la necesidad de conceder una prórroga a su contrato de obra, teniendo en cuenta la siguiente consideración:

> *"Dando cumplimento a las obligaciones contraídas por parte del contratista con relación al Contrato No. 3832 DE 2023, suscrito entre el **CONSORCIO PUENTES IPV** y el **INSTITUTO NACIONAL DE***

***VÍAS - INVIAS**, me dirijo a usted con el único propósito de solicitar la ampliación al plazo actual del contrato por un tiempo de cuatro (04) meses, toda vez que las condiciones actuales son insuficientes para la revisión, ajuste y/o actualización de los estudios y diseño, y la ejecución de la totalidad de las metas físicas contempladas en el presupuesto oficial de las obras derivadas y el recibo a satisfacción de las mismas.*

*En la finalidad de garantizar la ejecución y recibo a satisfacción de las obras, es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones.*

1. *El contrato de obra, regido por la ampliación No.1 de la suspensión No. 2, tiene establecido su fecha de reanudación el 18-03-2024 y su conclusión para el 22-03-2024. Sin embargo, el plazo contractual vigente es insuficiente para la ejecución completa y recepción definitiva de las obras derivadas.*
2. *Que previo al inicio formal de la ejecución de los trabajos, se requiere de un periodo de tiempo destinado a la revisión, ajuste y/o actualización de los estudios y diseños.*
3. *Que, una vez definidos los ajustes y aprobados por la interventoría, está programada la ejecución formal de las obras por un término de cuatro (04) meses.*

*Así las cosas, se procede a señalar los datos del contrato de obra:*

| | |
|---|---|
| *Contrato de obra No.* | *3832 DE 2023* |
| *Fecha de inicio* | *12/12/2023* |
| *Fecha inicial de terminación* | *31/12/2023* |
| *Fecha inicial de Suspensión No. 1* | *27/12/2023* |
| *Fecha final de la suspensión No. 1* | *05/02/2024* |
| *Fecha reanudación suspensión No. 1* | *06/02/2024* |
| *Fecha inicial suspensión No. 2* | *07/02/2024* |
| *Fecha final suspensión No. 2* | *07/03/2024* |
| *Fecha inicial ampliación 1 suspensión No. 2* | *08/03/2024* |
| *Fecha final ampliación 1 suspensión No. 2* | *17/03/2024* |
| *Fecha de reanudación* | *18/03/2024* |
| *Fecha inicial prorroga No. 1* | *22/03/2024* |
| *Nueva fecha de vencimiento* | *22/07/2024* |
| *Metas programadas iniciales* | *100%* |
| *Metas ejecutadas* | *0% del contrato* |
| *Estado actual* | *Suspendido* |

*En este sentido, es preciso informar que la presente solicitud se refiere a la ampliación del plazo del contrato de obra por cuatro (04) meses, y se aclara que no se requiere adición de recursos.*

Por lo expuesto anteriormente, es preciso informar que la interventoría **CONSORCIO INTERVIAL IPCC** considera viable la prórroga N°1 tanto del contrato de obra 3832 de 2023 como del contrato de interventoría 4209 de 2023, considerando que las condiciones actuales son insuficientes para la revisión, ajuste y/o actualización de los estudios y diseño, y la ejecución de la totalidad de las metas físicas contempladas en el presupuesto oficial de las obras derivadas y el recibo a satisfacción de las mismas. Obteniendo las siguientes condiciones para el contrato de Interventoría 4209 de 2023:

| | |
|---|---|
| *Contrato de interventoría No.* | *4209 de 2023* |
| *Fecha de inicio* | *12/12/2023* |
| *Fecha inicial de terminación* | *31/12/2023* |
| *Fecha inicial de Suspensión No. 1* | *26/12/2023* |
| *Fecha final de la suspensión No. 1* | *05/02/2024* |
| *Fecha reanudación suspensión No. 1* | *06/02/2024* |
| *Fecha inicial suspensión No. 2* | *07/02/2024* |
| *Fecha final suspensión No. 2* | *07/03/2024* |
| *Fecha inicial ampliación 1 suspensión No. 2* | *08/03/2024* |
| *Fecha final ampliación 1 suspensión No. 2* | *17/03/2024* |
| *Fecha de reanudación* | *18/03/2024* |
| *Fecha inicial prorroga No. 1* | *22/03/2024* |
| *Nueva fecha de vencimiento* | *22/07/2024* |

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

**SAMUEL FERNANDO RODRIGUEZ DUCÓN**
**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
**CONSORCIO INTERVIAL IPCC**

c.c.p Ing. Iván Darío Gamboa Cifuentes – Gestor Técnico
c.c.p Ing. Leidy Yhoana Ardila Rodriguez – Apoyo a Supervisión

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 12/03/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [I]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4209 DE 2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES EN LOS PR0+0354 Y PR2+0200 EN ATENCIÓN EMERGENCIA, VÍA LETICIA – TARAPACÁ, MUNICIPIO LETICIA DEPARTAMENTO AMAZONAS.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL IPCC
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 3832 DE 2023 CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES IPV

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2023 (1 meses según contrato princi)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 7/02/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 470.000.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 470.000.000,00

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 22/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 8/03/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

| No. de ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONCEPTO | | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | MODIFICACIONES CONDICIONES INICIALES TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | + - | MODIFICACIONES PRESENTES TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.____ de fecha _____ TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | CONDICIONES ACTUALIZADAS TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Director de Interventoría | $ 7.020.000,00 | $ - | 4,00 | $ 28.080.000,00 | | | 4,00 | $ 28.080.000,00 | | | $ - | | | 4,00 | $ 28.080.000,00 |
| | 1 | Ingeniero Residente de Interventoria | $ 5.425.000,00 | $ - | 4,00 | $ 21.700.000,00 | | | 4,00 | $ 21.700.000,00 | | | $ - | | | 4,00 | $ 21.700.000,00 |
| | 1 | Profesional Social | $ 3.850.000,00 | $ - | 4,00 | $ 15.400.000,00 | | | 4,00 | $ 15.400.000,00 | | | $ - | | | 4,00 | $ 15.400.000,00 |
| | 1 | Profesional Ambiental | $ 3.850.000,00 | $ - | 4,00 | $ 15.400.000,00 | | | 4,00 | $ 15.400.000,00 | | | $ - | | | 4,00 | $ 15.400.000,00 |
| | 1 | Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad | $ 3.850.000,00 | $ - | 2,00 | $ 7.700.000,00 | | | 2,00 | $ 7.700.000,00 | | | $ - | | | 2,00 | $ 7.700.000,00 |
| | 1 | Profesional Técnico Predial | $ 3.850.000,00 | $ - | 2,00 | $ 7.700.000,00 | | | 2,00 | $ 7.700.000,00 | | | $ - | | | 2,00 | $ 7.700.000,00 |
| | 1 | Profesional Juridico Predial | $ 3.850.000,00 | $ - | 2,00 | $ 7.700.000,00 | | | 2,00 | $ 7.700.000,00 | | | $ - | | | 2,00 | $ 7.700.000,00 |
| | | MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo) | ° | | | $ 39.840.000,00 | | | | $ 39.840.000,00 | | | | | | | $ 39.840.000,00 |
| | 1 | Especialista en Pavimentos y/o vias | $ 6.640.000,00 | $ - | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Especialista en Estructuras | $ 6.640.000,00 | $ - | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Especialista en Geologia y Geotecnia | $ 6.640.000,00 | $ - | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Especialista en Ambiental | $ 6.490.000,00 | $ - | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Especialista en Diseño Geométrico | $ 6.490.000,00 | $ - | | | | | | | | | | | | | |
| | | PERSONAL TÉCNICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Laboratista Inspector | $ 2.250.000,00 | $ - | 2,00 | $ 4.500.000,00 | | | 2,00 | $ 4.500.000,00 | | | $ - | | | 2,00 | $ 4.500.000,00 |
| | 1 | Inspector SST | $ 2.170.000,00 | $ - | 4,00 | $ 8.680.000,00 | | | 4,00 | $ 8.680.000,00 | | | $ - | | | 4,00 | $ 8.680.000,00 |
| | | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Secretaria | $ 1.170.000,00 | $ - | 4,00 | $ 4.680.000,00 | | | 4,00 | $ 4.680.000,00 | | | $ - | | | 4,00 | $ 4.680.000,00 |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | $ 161.380.000,00 | | | | $ 161.380.000,00 | | | $ - | | | | $ 161.380.000,00 |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2,36 | | | | 2,36 | | | 2,36 | | | | 2,36 |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)** | | | | $ 380.856.800,00 | | | | $ 380.856.800,00 | | | $ - | | | | $ 380.856.800,00 |

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VIATICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Viaticos Director y/o Especialistas | $ 175.000,00 | Dia | 20,00 | $ 3.500.000,00 | | | 20,00 | $ 3.500.000,00 | | | $ - | | | 20,00 | $ 3.500.000,00 |
| | | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato. | $ 5.130.000,00 | Mes | 4,00 | $ 20.520.000,00 | | | 4,00 | $ 20.520.000,00 | | | $ - | | | 4,00 | $ 20.520.000,00 |
| | | Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte) | $ 6.110.000,00 | Según comprobante por mes | 3,50 | $ 21.385.000,00 | | | 3,50 | $ 21.385.000,00 | | | $ - | | | 3,50 | $ 21.385.000,00 |
| | | Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | $ 550.000,00 | Según comprobante por mes | 4,00 | $ 2.200.000,00 | | | 4,00 | $ 2.200.000,00 | | | $ - | | | 4,00 | $ 2.200.000,00 |
| | | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 1.200.000,00 | Según comprobante por mes | 4,00 | $ 4.800.000,00 | | | 4,00 | $ 4.800.000,00 | | | $ - | | | 4,00 | $ 4.800.000,00 |
| | | OTROS COSTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 1.730.000,00 | Según comprobante por mes | 3,50 | $ 6.055.000,00 | | | 3,50 | $ 6.055.000,00 | | | $ - | | | 3,50 | $ 6.055.000,00 |
| | | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | $ 640.000,00 | Según comprobante por mes | 4,00 | $ 2.560.000,00 | | | 4,00 | $ 2.560.000,00 | | | $ - | | | 4,00 | $ 2.560.000,00 |
| | | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | $ 640.000,00 | Según comprobante por mes | 4,00 | $ 2.560.000,00 | | | 4,00 | $ 2.560.000,00 | | | $ - | | | 4,00 | $ 2.560.000,00 |
| | | Veeduría Técnica Comunitaria | $ 150.000,00 | Según comprobante por mes | 4,00 | $ 600.000,00 | | | 4,00 | $ 600.000,00 | | | $ - | | | 4,00 | $ 600.000,00 |
| | | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | $ 64.180.000,00 | | | | $ 64.180.000,00 | | | $ - | | | | $ 64.180.000,00 |
| | | * SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | | | | 445.036.800,00 | | | | $ 445.036.800,00 | | | $ - | | | | $ 445.036.800,00 |
| | | * PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D) | | | | $ 24.963.200,00 | | | | $ 24.963.200,00 | | | $ - | | | | $ 24.963.200,00 |
| | | * **COSTO TOTAL = (C) + (D) = (E)** | | | | $ 470.000.000,00 | | | | $ 470.000.000,00 | | | $ - | | | | $ 470.000.000,00 |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: | $ 470,000,000.00 | $ - | $ 470,000,000.00 |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) _____: | $ - | $ - | $ - |
| VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN): | $ - | $ - | $ - |
| SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: | $ 470,000,000.00 | $ - | $ 470,000,000.00 |

| PLAZO EN MESES | |
|---|---|
| INICIAL | 1 |
| ADICIONAL | |
| ACUMULADO | 1 |
| FALTANTE | |

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Se hace necesaria la prórroga No. 1 a la interventoria, para de esta manera, poder continuar con la supervisión del contrato de obra 3832-2023, cabe aclarar que esta modificación NO afecta el valor del contrato de interventoria inicialmente contratado debido a que es una redistribución de recursos iniciales los cuales estan en un plazo estipulado de cuatro (04) meses apartir del veintidos (22) de marzo de 2024. Por lo cual es necesario llevar a cabo la prorroga No. 1 obteniendo una nueva fecha de terminación del contrato con fecha del veintidos (22) de julio del 2024.

**NOTAS:**

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA

Firma

Nombre: PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 01196-0427 CPITVC

Firma

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ

Firma

Nombre: PATRICIA INES MORALES PADRON
Subdirectora Vías Regionales INVIAS (E)
Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA

Director Territorial — Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS — Matrícula Profesional No. 52202-46096 NRÑ — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: IVAN DARIO GAMBOA CIFUENTES — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO: REGIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MODELO DE ADMINISTRACIÓN VIAL PÚBLICA
**PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS**

| CÓDIGO | MEPI-MN1-R49-V00 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 10/02/2014 (Día/ Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

**PLAN DE CARGAS INICIAL** — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** = — **No.** 1
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

**PLAN DE CARGAS FINAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2035 DE 2023
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES EN LOS PR 0+534 Y PR 1+000 EN ATENCIÓN EMERGENCIA, VÍA LETICIA – TARAPACÁ, MUNICIPIO LETICIA DEPARTAMENTO AMAZONAS.
INTERVENTOR: CONSORCIO PUENTES RDC
SUPERVISOR DEL CONTRATO INTERVENTORIA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — DE (Nivel Jerárquico)
RESOLUCIÓN No.
CONTRATO DE OBRA No.: 2032 DE 2023 — CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES RTV

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2023 (Incluye Suspensión)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 17/03/2024 (Incluye la suspensión que corresponda con el cierre definitivo)
VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 470,000,000.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (CNA+B): $ 470,000,000.00

PLAZO ACUMULADO: (En meses según días, semanas o días calendario)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 22/03/2024 (Incluye las suspensiones, incluye Suspensión)
FECHA DE REANUDACIÓN: 8/04/2024 (Incluye Suspensión)
VALOR ACEICIONES (incluido IVA) (B): $

| No. de Orden | Cantidad | CARGO / OFICIO | CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES INICIALES | | 2023 DICIEMBRE DESDE 12/12/2023 SUSPENDIDO DESDE 26/12/2023 HASTA 31/12/2023 | | 2024 ENERO SUSPENDIDO | | 2024 FESRERO SUSPENDIDO | | 2024 MARZO REANUCACIÓN DE AMPLIZACIÓN N°1 DESDE 18/03/2024 INICIO DE PRORROGA N°1 DESDE 22/03/2024 | | 2024 ABRIL | | 2024 MAYO | | 2024 JUNIO | | 2024 JULIO HASTA 22/07/2024 | | MES | | MES | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Costos de Personal | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Horas/Mes) | Valor Total ($) | Costos de Personal | Prima Regional | Participación (H—mes) | Valor Total ($) | H-H | VALOR | H-H | VALOR | H-H | VALOR | H-H | VALOR | H-H | VALOR | H-H | VALOR | H-H | VALOR | H-H | VALOR | H-H | VALOR | H-H | VALOR | H-H | VALOR |
| | | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Director de Interventoría | $ 7,200,000.00 | $ - | 4.00 | $ 28,800,000.00 | | | 4.00 | $ 28,800,000.00 | 0.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.83 | $ 5,976,000.00 | 1.00 | $ 7,200,000.00 | 1.00 | $ 7,200,000.00 | 1.00 | $ 7,200,000.00 | 0.17 | $ 1,200,000.00 | | | | | 4.00 | $ 28,800,000.00 |
| | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 5,425,000.00 | $ - | 4.00 | $ 21,700,000.00 | | | 4.00 | $ 21,700,000.00 | 0.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.83 | $ 4,502,750.00 | 1.00 | $ 5,425,000.00 | 1.00 | $ 5,425,000.00 | 1.00 | $ 5,425,000.00 | 0.17 | $ 922,250.00 | | | | | 4.00 | $ 21,700,000.00 |
| | 1 | Profesional Social | $ 3,850,000.00 | $ - | 4.00 | $ 15,400,000.00 | | | 4.00 | $ 15,400,000.00 | 0.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.83 | $ 3,195,500.00 | 1.00 | $ 3,850,000.00 | 1.00 | $ 3,850,000.00 | 1.00 | $ 3,850,000.00 | 0.17 | $ 654,500.00 | | | | | 4.00 | $ 15,400,000.00 |
| | 1 | Profesional Ambiental | $ 3,850,000.00 | $ - | 4.00 | $ 15,400,000.00 | | | 4.00 | $ 15,400,000.00 | 0.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.83 | $ 3,195,500.00 | 1.00 | $ 3,850,000.00 | 1.00 | $ 3,850,000.00 | 1.00 | $ 3,850,000.00 | 0.17 | $ 654,500.00 | | | | | 4.00 | $ 15,400,000.00 |
| | 1 | Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad | $ 3,850,000.00 | $ - | 2.00 | $ 7,700,000.00 | | | 2.00 | $ 7,700,000.00 | 0.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.42 | $ 1,617,000.00 | 0.50 | $ 1,925,000.00 | 0.50 | $ 1,925,000.00 | 0.50 | $ 1,925,000.00 | 0.08 | $ 308,000.00 | | | | | 2.00 | $ 7,700,000.00 |
| | 1 | Profesional Técnico Predial | $ 3,850,000.00 | $ - | 2.00 | $ 7,700,000.00 | | | 2.00 | $ 7,700,000.00 | 0.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.42 | $ 1,617,000.00 | 0.50 | $ 1,925,000.00 | 0.50 | $ 1,925,000.00 | 0.50 | $ 1,925,000.00 | 0.08 | $ 308,000.00 | | | | | 2.00 | $ 7,700,000.00 |
| | 1 | Profesional Jurídico Predial | $ 3,850,000.00 | $ - | 2.00 | $ 7,700,000.00 | | | 2.00 | $ 7,700,000.00 | 0.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.42 | $ 1,617,000.00 | 0.50 | $ 1,925,000.00 | 0.50 | $ 1,925,000.00 | 0.50 | $ 1,925,000.00 | 0.08 | $ 308,000.00 | | | | | 2.00 | $ 7,700,000.00 |
| | | MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta tabla los especialistas de proyecto) | - | $ - | | $ 39,940,000.00 | | | | $ 39,940,000.00 | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ 8,300,000.00 | | $ 9,960,000.00 | | $ 9,960,000.00 | | $ 9,960,000.00 | | $ 1,660,000.00 | | | | | | $ 39,940,000.00 |
| | 1 | Especialista en Pavimentos y/o vías | $ 6,640,000.00 | | | | | | | | | | | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Especialista en Puentes | $ 6,640,000.00 | | | | | | | | | | | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Especialista en Geología y Geotecnia | $ 6,640,000.00 | | | | | | | | | | | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Especialista en Ambiental | $ 6,640,000.00 | | | | | | | | | | | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Especialista en Diseño Geométrico | $ 6,640,000.00 | | | | | | | | | | | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PERSONAL TÉCNICO | | | | | | | | | | | | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Laboratista Inspector | $ 2,200,000.00 | $ - | 2.00 | $ 4,200,000.00 | | | 2.00 | $ 4,200,000.00 | 0.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.42 | $ 840,000.00 | 0.50 | $ 1,125,000.00 | 0.50 | $ 1,125,000.00 | 0.50 | $ 1,125,000.00 | 0.08 | $ 187,500.00 | | | | | 2.00 | $ 4,200,000.00 |
| | 1 | Inspector SST | $ 2,170,000.00 | $ - | 4.00 | $ 8,680,000.00 | | | 4.00 | $ 8,680,000.00 | 0.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.83 | $ 1,801,100.00 | 1.00 | $ 2,170,000.00 | 1.00 | $ 2,170,000.00 | 1.00 | $ 2,170,000.00 | 0.17 | $ 368,900.00 | | | | | 4.00 | $ 8,680,000.00 |
| | | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Secretaria | $ 1,170,000.00 | $ - | 4.00 | $ 4,680,000.00 | | | 4.00 | $ 4,680,000.00 | 0.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.83 | $ 971,100.00 | 1.00 | $ 1,170,000.00 | 1.00 | $ 1,170,000.00 | 1.00 | $ 1,170,000.00 | 0.17 | $ 198,900.00 | | | | | 4.00 | $ 4,680,000.00 |
| SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | 1 | | | $ 167,360,000.00 | $ - | | | $ 167,360,000.00 | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ 33,960,350.00 | | $ 40,987,500.00 | | $ 40,987,500.00 | | $ 40,987,500.00 | | $ 6,976,250.00 | | | | | | $ 167,360,000.00 |
| FACTOR MULTIPLICADOR | | | | | 2.30 | | | 2.30 | | 2.30 | | | | | | | 2.30 | | 2.30 | | 2.30 | | 2.30 | | 2.30 | | | | | | | 2.30 |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A) | | | | | | $ 385,028,000.00 | $ - | | | $ 385,028,000.00 | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ 78,108,805.00 | | $ 94,271,250.00 | | $ 94,271,250.00 | | $ 94,271,250.00 | | $ 16,044,250.00 | | | | | | $ 385,028,000.00 |

| CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | Costos | | UNIDAD DE PAGO | Valor Total ($) | H-H | VALOR | H-H | VALOR | H-H | VALOR | H-H | VALOR | H-H | VALOR | H-H | VALOR | H-H | VALOR | H-H | VALOR | H-H | VALOR | H-H | VALOR | H-H | VALOR | H-H | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MATERIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Viáticos Director y/o Especialistas | $ 110,000.00 | Día | 30.00 | $ 3,300,000.00 | | | Día | $ 3,300,000.00 | 0.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 4.00 | $ 700,000.00 | 4.00 | $ 700,000.00 | 4.00 | $ 700,000.00 | 4.00 | $ 700,000.00 | 4.00 | $ 700,000.00 | | | | | 30.00 | $ 3,300,000.00 |
| | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vehículo tipo camper o camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato. | $ 5,150,000.00 | Mes | 4.00 | $ 20,600,000.00 | | | Mes | $ 20,600,000.00 | 0.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.83 | $ 4,257,950.00 | 1.00 | $ 5,150,000.00 | 1.00 | $ 5,150,000.00 | 1.00 | $ 5,150,000.00 | 0.17 | $ 892,100.00 | | | | | 4.00 | $ 20,600,000.00 |
| | Trabajo de topografía (incluye personal-equipo y transporte) | $ 6,110,000.00 | Según comprometa por mes | 3.50 | $ 21,385,000.00 | | | Según comprometa por mes | $ 21,385,000.00 | 0.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.74 | $ 4,521,400.00 | 0.87 | $ 5,315,700.00 | 0.87 | $ 5,315,700.00 | 0.87 | $ 5,315,700.00 | 0.15 | $ 916,500.00 | | | | | 3.50 | $ 21,385,000.00 |
| | Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | $ 550,000.00 | Según comprometa por mes | 4.00 | $ 2,200,000.00 | | | Según comprometa por mes | $ 2,200,000.00 | 0.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.83 | $ 456,500.00 | 1.00 | $ 550,000.00 | 1.00 | $ 550,000.00 | 1.00 | $ 550,000.00 | 0.17 | $ 93,500.00 | | | | | 4.00 | $ 2,200,000.00 |
| | Oficina/Campamento (incluye duración y servicios públicos) | $ 1,200,000.00 | Según comprometa por mes | 4.00 | $ 4,800,000.00 | | | Según comprometa por mes | $ 4,800,000.00 | 0.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.83 | $ 996,000.00 | 1.00 | $ 1,200,000.00 | 1.00 | $ 1,200,000.00 | 1.00 | $ 1,200,000.00 | 0.17 | $ 204,000.00 | | | | | 4.00 | $ 4,800,000.00 |
| | OTROS COSTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 1,730,000.00 | Según comprometa por mes | 3.50 | $ 6,055,000.00 | | | Según comprometa por mes | $ 6,055,000.00 | 0.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.74 | $ 1,280,200.00 | 0.87 | $ 1,505,100.00 | 0.87 | $ 1,505,100.00 | 0.87 | $ 1,505,100.00 | 0.15 | $ 259,500.00 | | | | | 3.50 | $ 6,055,000.00 |
| | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | $ 640,000.00 | Según comprometa por mes | 4.00 | $ 2,560,000.00 | | | Según comprometa por mes | $ 2,560,000.00 | 0.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.83 | $ 531,200.00 | 1.00 | $ 640,000.00 | 1.00 | $ 640,000.00 | 1.00 | $ 640,000.00 | 0.17 | $ 108,800.00 | | | | | 4.00 | $ 2,560,000.00 |
| | Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | $ 640,000.00 | Según comprometa por mes | 4.00 | $ 2,560,000.00 | | | Según comprometa por mes | $ 2,560,000.00 | 0.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.83 | $ 531,200.00 | 1.00 | $ 640,000.00 | 1.00 | $ 640,000.00 | 1.00 | $ 640,000.00 | 0.17 | $ 108,800.00 | | | | | 4.00 | $ 2,560,000.00 |
| | Veeduría Técnica Comunitaria | $ 150,000.00 | Según comprometa por mes | 4.00 | $ 600,000.00 | | | Según comprometa por mes | $ 600,000.00 | 0.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.83 | $ 124,500.00 | 1.00 | $ 150,000.00 | 1.00 | $ 150,000.00 | 1.00 | $ 150,000.00 | 0.17 | $ 25,500.00 | | | | | 4.00 | $ 600,000.00 |
| Ajustar al peso y/o valor nominal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) | | | | | $ 64,180,000.00 | | | | $ 64,180,000.00 | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ 13,396,900.00 | | $ 15,826,800.00 | | $ 15,826,800.00 | | $ 15,826,800.00 | | $ 2,698,700.00 | | | | | | $ 64,180,000.00 |
| + SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A) Y (B) = (C) | | | | | $ 449,208,000.00 | | | | $ 449,208,000.00 | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ 92,057,319.00 | | $ 110,240,250.00 | | $ 110,240,250.00 | | $ 110,240,250.00 | | $ 18,930,262.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ 449,208,000.00 |
| + PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D) | | | | | $ 24,083,000.00 | | | | $ 24,083,000.00 | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ 5,936,668.07 | | $ 6,240,000.00 | | $ 6,240,000.00 | | $ 6,240,000.00 | | $ 1,045,103.35 | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ 24,083,000.00 |
| = COSTO TOTAL = (C) + (D) = (E) | | | | | $ 473,291,000.00 | | | | $ 473,291,000.00 | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ 97,993,987.07 | | $ 117,280,800.00 | | $ 117,280,800.00 | | $ 117,280,800.00 | | $ 19,974,966.33 | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ 473,291,000.00 |

* Estos conceptos deben corresponder a los ofertados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

**CAUSALES DE LA PROPUESTA:** Marque con una(x) en la casilla correspondiente, Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o suspensión de contrato, diligencie además el número de días, prórroga o suspensión y la fecha de suspensión.
De forma excepcional la prórroga No. 1 de Interventoría, para este mismo, podrá contener con la suspensión del contrato de obra 2032-2023, cuyo objeto es dar una solución definitiva a los deslizamientos ocurridos sobre el eje vial del contrato de interventoría del mismo contrato debido a que es una solución de recursos limitados los cuales están en un plazo estipulado de cuatro (04) meses a partir del 22 de enero de 2024. Con dicha solicitud, se tiene fecha de finalización del contrato del asentimos (22) de julio de 2024.

**NOTAS:**

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con los actos de costos tomados para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La dedicación del personal y otros costos registrados es corregible e incorporada al siguiente previa aprobación del Supervisor del contrato de Interventoría.

4. Si los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo medio suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.

5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

**Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas**

Firma:
Nombre: PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA
Representante Legal Consorcio Ayudantía Ambiental
Matrícula Profesional No. 311564437 CNTVC

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 52263-86656 NRR

Original: Archivo de Gestión del PMA.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INVIAS
Patricia Inés Morales Padron,SUBDIRECTORA DE VI
2023-12-11T09:25:46-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

**Al contestar cite este radicado:** 2023S-VBOG-027138
**Fecha: 2023-12-11 09:25:41**

Señor (a):
CONSORCIO INTERVIAL IPCC
Att. PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA
Representante Legal
Carrera 15 # 16 A - 14 Oficina 408
6087651948
consorciointervialipcc@gmail.com
DUITAMA BOYACA

**Asunto:** Orden de Inicio Contrato de Interventoría No. 4209 - 2023, Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-1.

Respetado Señor Corredor Becerra:

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del Contrato de Interventoría No. 4209 de 2023 que tiene por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES EN LOS PR0+0354 Y PR2+0200 EN ATENCIÓN EMERGENCIA, VÍA LETICIA - TARAPACÁ, MUNICIPIO LETICIA DEPARTAMENTO AMAZONAS", la fecha de inicio de ejecución del mismo es la fecha del cambio de estado a ejecución que registra la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente, la cual corresponderá al día 12 de Diciembre de 2023.

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 1269223 de fecha 17 de Noviembre de 2023; Acta de Aprobación de las Garantías exigidas de fecha 30 de Noviembre de 2023.

Para el control y vigilancia el INVIAS designara como Supervisor del Contrato en la Dirección Territorial Caquetá al profesional que se encargara de dicha labor y del que se le comunicara una vez sea escogido, con quien debe coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual; Dirección: Trans. 11 No 19-34/48 B. La inmaculada Florencia (Florencia – Caquetá), Teléfono fijo/celular: (058) 4353324 – 4357470 / 3134940919 y correo electrónico: jburbano@invias.gov.co

INVIAS
Patricia Inés Morales Padron,SUBDIRECTORA DE VI
2023-12-11T09:25:46-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

El INVÍAS designara a: IVAN DARIO GAMBOA como Gestor Técnico de Proyecto, mediante oficio. teléfono fijo / celular: (1) 3770600 Ext. 1892 / 300 4811419, correo electrónico: igamboa@invias.gov.co

Por lo anterior, se solicita coordinar con el Contratista el procedimiento establecido en el Manual de Interventoría instructivo MEPI-MN1-IN-1 PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA cumpliendo con los plazos establecidos en el mismo.

Sin otro en particular,

Patricia Inés Morales Padrón
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES (E)

Proyectado Por: IVAN DARIO GAMBOA CIFUENTES
Revisado Por: DAJAHIRA CASTILLO HURTADO
Aprobado Por:

Copia Interna a: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS (1000021), JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS (1000007), JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO (1110500)
Copia Externa a: CONSORCIO PUENTES IPV ()

INVIAS

Patricia Inés Morales Padrón,SUBDIRECTORA DE VI
2023-12-11T09:25:46-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanie el Codigo QR Para Validario

# REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



Fecha: 2023-12-11T09:25:47-05:00
Patricia Inés Morales Padrón
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES (E)
1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
INVIAS

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 12/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4209 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONOSORCIO INTERVIAL IPCC

**OBJETO DEL CONTRATO:**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES EN LOS PR0+0354 Y PR2+0200 EN ATENCIÓN EMERGENCIA, VÍA LETICIA – TARAPACÁ, MUNICIPIO LETICIA DEPARTAMENTO AMAZONAS.

**FECHA DE INICIO:** 12/12/2023

**PLAZO INICIAL:** HASTA 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 22/03/2024 (Incluye prorrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 470.000.000,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 470.000.000,00 (Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 47.000.000,00 | 2 | 11 | 2023 | 5 | 7 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 235.000.000,00 | 2 | 11 | 2023 | 5 | 7 | 2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 94.000.000,00 | 2 | 11 | 2023 | 5 | 1 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 141.000.000,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 51-44-101025096

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/11/2023

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01196-0427 CPITVC

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MINISTERIO DE TRANSPORTE**<br>**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS** | CÓDIGO | | | |
| | **DIRECCIÓN JURIDICA - SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES** | VERSIÓN | | | |
| | **GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE VIAS REGIONALES | | 16 | 11 | | 2023 |

**CONTRATO No. 4209 DE 2023**

CONSORCIO INTERVIAL IPCC con Nit 901765655-5

OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES EN LOS PR0+0354 Y PR2+0200 EN ATENCIÓN EMERGENCIA, VÍA LETICIA - TARAPACÁ, MUNICIPIO LETICIA DEPARTAMENTO AMAZONAS.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 2 de noviembre del 2023

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2023

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $470.000.000

No. REGISTRO PRESUPUESTAL: 1269223 del 17 de noviembre del 2023 por valor de $ 470.000.000,00

DOCUMENTO QUE AMPARA

- Contrato principal número 4209 de fecha 02 de noviembre del 2023.

**VIGENCIA DE LA PÓLIZA**

| **1. Póliza Única de Cumplimiento No: 51-44-101025096** | | **Anexo No:** 1 | | **FECHA 28/11/2023** | **Aseguradora:** | **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **a).** Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan | DESDE: | 02/11/2023 | HASTA: | 05/07//2024 | VALOR: | $47.000.000,00 |
| b). Buen manejo y correcta inversión del anticipo | DESDE: | 02/11/2023 | HASTA: | 05/07//2024 | VALOR: | $235,000,000.00 |
| **c).** Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato | DESDE: | 02/11/2023 | HASTA: | 05/01/2027 | VALOR: | $94,000,000.00 |
| **d).** Calidad del Servicio | DESDE: | 31/12/2023 | HASTA: | 31/12/2028 | VALOR: | $141,000,000.00 |

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| SOGAMOSO | AGENCIA SOGAMOSO | 51 | 51-44-101025096 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 11 | 2023 | 02 | 11 | 2023 | 00:00 | 31 | 12 | 2028 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | CONSORCIO INTERVIAL IPCC | NIT: 901.765.655-5 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 15 NRO. 16 A - 14 408 | DUITAMA, BOYACA | 3144119353 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | NIT: 800.215.807-2 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CARRERA 59 NO.26-60 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 7056000 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 4209 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION PUENTES VEHICULARES EN LOS PR0+0354 Y PR2+0200 EN ATENCION EMERGENCIA, VIA LETICIA - TARAPACA, MUNICIPIO LETICIA DEPARTAMENTO AMAZONAS.

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **02/11/2023** | **05/07/2024** | **$47,000,000.00** |
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO** | **02/11/2023** | **05/07/2024** | **$235,000,000.00** |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **02/11/2023** | **05/01/2027** | **$94,000,000.00** |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | **31/12/2023** | **31/12/2028** | **$141,000,000.00** |

### ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| CORREDOR BECERRA PEDRO JOSE | 7227602 | 40.00 |
| PUENTES GORDO GERMAN ALONSO | 7162821 | 30.00 |
| CORZO GARCIA JORGE WILLAN | 5689243 | 20.00 |
| INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 900869939-5 | 10.00 |

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***2,389,145.00 | $ ******20,000.00 | $ *****457,737.00 | $ *********2,866,882.00 | $ ******517,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA | 153578 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO***

51-44-101025096

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Datos de la póliza

**Estado:**
Vigente

**Número de póliza:**
51-44-101025096

**Número de anexo:**
1

**Fecha de expedición:**
martes, 28 de noviembre de 2023

**Ramo:**
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

**Asegurado:**
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

**Tomador:**
CONSORCIO INTERVIAL IPCC

**Inicio de vigencia:**
jueves, 2 de noviembre de 2023

**Fin vigencia:**
domingo, 31 de diciembre de 2028

**Valor total asegurado:**
$ 517.000.000

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

· Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com * Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
· Pólizas ramo **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 - Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
· Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
· Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
· Pólizas ramo **Vida**: (601) 218 6977 - Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com
· Pólizas ramo **SOAT**: (601) 650 0856 a nivel nacional - Email: operacionsoat@segurosdelestado.com

- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Regresar

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados por **Seguros del Estado**

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

## Flujo de aprobación

Documentos (2)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

### Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

**Aprobar garantía**

Nivel 1 - Con orden

| | Asunto | Estado | Asignado a | Realizado por | Fecha del estado |
|---|---|---|---|---|---|
| .1 | Revisor | Aprobado | Revisión Garantías SPSC :: Revisión Garantías SPSC | VILMA YANETH MALDONADO FIGUEREDO | 26 días de tiempo transcurrido *(30/11/2023 7:17:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| .2 | COORDINADOR | Aprobado | YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA | YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA | 26 días de tiempo transcurrido *(30/11/2023 8:04:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| .3 | ORDENADOR DEL GASTO | Aprobado | Subdirector (a) de Procesos de Selección Contractuales :: Subdirector (a) de Procesos de Selección C | Ruby Amparo Malaver Montaña | 25 días de tiempo transcurrido *(30/11/2023 9:37:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Id de la garantía** CO1.WRT.13056634

**Referencia de la garantía** 51-44-101025096

**Estado** Aprobado

**Justificación**
- [x] Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio

**Tipo de garantía**
- [ ] Contrato de seguro

○ Patrimonio autónomo

◉ Garantía bancaria

**Garante** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Sub-tipo de garantía** Garantía bancaria

| Justificación | Valor del amparo | Vigencia |
|---|---|---|
| Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 235.000.000,00 COP | 5/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | 47.000.000,00 COP | 5/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Cumplimiento - Pago de salarios | 94.000.000,00 COP | 5/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Cumplimiento - Calidad del servicio | 141.000.000,00 COP | 31/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

| | Descripción | Nombre del documento | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | POLIZA_51_44_101025096_ANEXO_1.pdf | POLIZA_51_44_101025096_ANEXO_1.pdf | Descargar | Detalle |

**Creado por:** *PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA* 28/11/2023 10:33 AM *(UTC -5 horas)*

---

Cancelar

Cumplimiento: Sí / No

- Buen manejo y correcta inversión del anticipo
  - % del anticipo: 100,00 — Fecha de vigencia (desde): 13/10/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/06/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- Cumplimiento del contrato
  - % del valor del contrato: 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 13/10/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/06/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- Pago de salarios
  - % del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 13/10/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 31/12/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- Calidad del servicio
  - % del valor del contrato: 30,00 — Fecha de vigencia (desde): 13/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 31/12/2028 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Responsabilidad civil extra contractual:** Sí / No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 7/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 19 días de tiempo transcurrido *(28/11/2023 10:37:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.13056634 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠ | Garantía bancaria | 517.000.000,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado | Detalle |
| CO1.WRT.13029106 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠ | Garantía bancaria | 517.000.000,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Pendiente | Detalle |
| CO1.WRT.12683203 | Seriedad de la oferta | - | 47.000.000,00 COP | - | 5 días de tiempo transcurrido *(12/12/2023 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Caducado | Detalle |

**OBJETO:** **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES EN LOS PR0+0354 Y PR2+0200 EN ATENCIÓN EMERGENCIA, VÍA LETICIA - TARAPACÁ, MUNICIPIO LETICIA DEPARTAMENTO AMAZONAS.**

**PLAZO:** **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**VALOR:** **CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($470.000.000) EXENTO DE IVA**

**INTERVENTOR:** **CONSORCIO INTERVIAL IPCC con Nit 901765655-5, integrado por PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA identificado con el CC: 7.227.602 con una participación del 40%, JORGE WILLAN CORZO GARCIA identificado con la cedula de ciudadanía CC: 5.689.243 con una participación del 20%, GERMAN ALONSO PUENTES GORDO identificado con la cedula de ciudadanía CC: 7.162.821 con una participación del 30% y la sociedad INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-INCORDIS SAS identificado con el NIT:900.869.939-5, con un participación del 10%**

**CONTRATO NÚMERO 4209 DE 2023** Entre los suscritos, **RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA**, identificada con cédula de ciudadanía número 51.975.533 quien obra en su calidad de **SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES (E)**, encargo efectuado mediante Resolución No. 3931 del 30 de octubre de 2023 y posesionada mediante Acta No. 000092 del 31 de octubre de 2023, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre del 2021, 3343 del 02 de noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre del 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará **EL INSTITUTO** por una parte y por la otra, r **PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA** identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.227.602 expedida en Bogotá D.C. en nombre y representación del **CONSORCIO INTERVIAL IPCC,** en su calidad de representante según carta de información del Consorcio (anexa), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni ella, ni los integrantes del Consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará **EL INTERVENTOR**, hemos convenido celebrar el presente contrato que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución Número **3628 del 11 de octubre de 2023**, previo Concurso de Méritos No. **CMA-DEO-SVR-062-2023,** contrato que se regirá por las estipulaciones de la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia y las siguientes

## CLÁUSULAS

**CLÁUSULA PRIMERA**: **DEFINICIONES. -** Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 del 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría.

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.- EL INTERVENTOR se obliga para con EL INSTITUTO a realizar la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA**

**Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES EN LOS PR0+0354 Y PR2+0200 EN ATENCIÓN EMERGENCIA, VÍA LETICIA - TARAPACÁ, MUNICIPIO LETICIA DEPARTAMENTO AMAZONAS,** de conformidad con el respectivo Pliego de Condiciones, el Manual de Interventoría y la propuesta técnica y económica presentada por EL INTERVENTOR revisada y aprobada por EL INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato.

**CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. –** EL INTERVENTOR deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato. EL INTERVENTOR se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.

**PARÁGRAFO:** Las actividades son aproximadas y están determinadas según las necesidades del presente concurso de méritos, por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la INTERVENTORÍA y sus variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto de este concurso de méritos. El Interventor está obligado a ejecutar las mayores actividades de interventoría que resulten a los mismos precios de la propuesta económica.

**CLÁUSULA CUARTA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. –** El INTERVENTOR y EL INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de su propuesta.

**CLÁUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA. –** En los términos de los Artículos 471 y 474 del Código de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del INTERVENTOR, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripción del Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripción y ejecución del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecución del mismo y un (1) año más, según se establece en su Sección 1.01. La sucursal se deberá establecer de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley Comercial. El incumplimiento de estos compromisos será considerado como incumplimiento contractual y dará lugar a la imposición de multas y/o cláusula penal en los términos del Contrato.

**CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO**. - Para los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se estima en la suma de **CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($470.000.000) MONEDA CORRIENTE EXENTO DE IVA,** equivalentes a **405,1724137931034** salarios mínimos legales mensuales vigentes.

.

**PARÁGRAFO PRIMERO: AJUSTES. –** El contrato de interventoría si se encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el Formulario No. 1, el cual hace parte integral del Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** EL INTERVENTOR con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.

**CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. -** El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de **CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($470.000.000) MONEDA CORRIENTE EXENTO DE IVA** discriminados de la siguiente manera: **a) CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($445.036.800) MONEDA CORRIENTE,** para el pago del valor básico de la interventoría. **b) VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS ($24.936.200) MONEDA CORRIENTE,** provisión para ajustes y/o frente adicional.

**PARÁGRAFO:** Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número **109623** del 24 de mayo del 2023 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSITITUTO, del cual se reservará a suma de 287.770.322 correspondiente al rubro C-2402-0600-13-0-2402119-02, Fuente Nación, Recurso 11.

**CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. -** El plazo para la ejecución del presente contrato será **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**, a partir de la fecha de la orden de inicio que impartirá el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y la aprobación de las hojas de vida del personal que conformará su equipo de trabajo, en los términos previstos en el Pliego de Condiciones.

**PARÁGRAFO:** Mediante comunicación escrita, el funcionario competente del Instituto, informará al interventor la fecha a partir de la cual debe iniciar la ejecución del contrato. La ejecución del contrato de Interventoría está ligada a la ejecución del contrato de obra, de tal manera que, si éste no se suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato de Interventoría será liquidado por terminación de su objeto sin lugar a indemnización.

**CLÁUSULA NOVENA: GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO. -** El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR los costos directos por salarios del personal vinculado al proyecto, afectados por un factor multiplicador, así como los costos directos distintos a los anteriores, de acuerdo con lo estipulado en su propuesta, a saber: **1). COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL: a).** Sueldos efectivamente pagados al personal utilizado en desarrollo del contrato de conformidad con el personal aprobado por el INSTITUTO. **b).** Un Factor Multiplicador de **2,36 aplicable** a los costos de personal que involucra el valor de las prestaciones sociales que deben ser reconocidas al personal empleado en los trabajos, los gastos generales y de administración, los costos indirectos y los honorarios del INTERVENTOR. **2). OTROS COSTOS DIRECTOS**: Aprobados de acuerdo con la propuesta presentada por el INTERVENTOR.

**PARÁGRAFO: CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTADÍSTICAS. -** El INSTITUTO tendrá acceso a la Contabilidad de Costos y a la información estadística que lleve el INTERVENTOR en relación con la Interventoría contratada.

**CLÁUSULA DÉCIMA: FORMA DE PAGO**. - El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor del Contrato, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar. Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor del Contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los recursos realmente invertidos por el INTERVENTOR en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO. Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de los trabajos, EL INTERVENTOR deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las glosas que formule el INSTITUTO. En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocerá al INTERVENTOR un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto No. 1082 del

2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinará según lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC. El Instituto podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos de interventoría según el avance de la obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por la Interventoría. Así mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no darán derecho al INTERVENTOR para elevar ningún reclamo contra el Instituto. EL INSTITUTO hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

**PARÁGRAFO PRIMERO**: En el evento de que EL INTERVENTOR esté obligado a facturar electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo del 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo del 2020, situación que deberá ser controlada por el supervisor del contrato y/o el ordenador del pago.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 del 2022, si EL INTERVENTOR no presenta la facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicará una multa diaria y sucesiva en el porcentaje que corresponda conforme lo establece la mencionada resolución.

**PARÁGRAFO TERCERO**: **CUENTA BANCARIA**. - Para el pago de las Actas mensuales de costos, EL INTERVENTOR presentó certificación del 25 de octubre de 2023 expedida por Banco de Bogotá, con la siguiente información bancaria: Cuenta ahorros No. 282567270, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.

**PARÁGRAFO CUARTO: APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.** - El INTERVENTOR se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. Corresponderá al Supervisor del contrato durante la ejecución del mismo y en el momento de su liquidación, efectuar el control de las obligaciones contraídas por el Interventor en la forma establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y Artículo 25 de la Ley 1607 del 2012. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el Artículo 23 de la Ley 1150 del 2007.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: ANTICIPO**. - Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el **cincuenta por ciento (50%) del valor básico del contrato**, el cual se tramitará previa solicitud del INTERVENTOR y aceptación de las condiciones del Instituto para su entrega, para lo cual, el Ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se radicará por EL INTERVENTOR para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

**PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO**. - Los dineros provenientes del anticipo sólo serán invertidos de acuerdo al Plan de inversión mensualizado de anticipo y éstos no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y cumplimiento del contrato. Tienen la condición de fondos públicos hasta el momento en que sean amortizados mediante la facturación mensual; su mal manejo, el cambio de destinación o su indebida apropiación dará lugar a las responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales correspondientes. El INTERVENTOR junto con el Supervisor del contrato abrirán una cuenta bancaria conjunta que genere rendimientos a nombre del contrato para manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos que se giren con cargo a ella necesiten para ser pagados las firmas del INTERVENTOR o quien este delegue y la del Supervisor. Dicha cuenta será vigilada por este último. La certificación bancaria para el giro del anticipo debe ser solicitada por EL INTERVENTOR y deberá contener: el número del contrato, objeto, NIT del Interventor, nombre del interventor y sus representantes. Además, deberá indicar que dicha cuenta genera rendimientos financieros. Cumplidos los pasos anteriores, el Jefe de la Unidad Ejecutora suscribirá la autorización

del pago del anticipo, la cual se radicará, acompañada de los soportes necesarios vigentes (fotocopias del contrato, oficio aprobación de la garantía única, certificación bancaria).

**PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. -** Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al INTERVENTOR, serán reintegrados por este mensualmente a la Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos nación, en la forma prevista por el Artículo 33 del Decreto No. 4730 del 2005 y el Decreto No. 1853 del 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del INTERVENTOR. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

**PARÁGRAFO TERCERO:** La constitución y aprobación de la garantía son requisitos indispensables para la entrega del anticipo. La iniciación de las actividades de la Interventoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se halla supeditada, en ningún caso, al recibo del anticipo.

**PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN.** - El anticipo deberá ser amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de costos, situación que deberá ser controlada por el Supervisor. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, EL INTERVENTOR podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por el supervisor del contrato.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, EL INTERVENTOR y el Supervisor del Contrato deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y harán el reintegro al Instituto del saldo si lo hay, en la cuenta que indique la Subdirección Financiera del INSTITUTO. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera del INSTITUTO y a la Unidad ejecutora indicando con precisión el valor correspondiente a rendimientos y el valor correspondiente a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del Interventor. Es responsabilidad de la supervisión del contrato verificar el cumplimiento de esta obligación.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR. -** Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso de Selección, durante la ejecución del contrato, EL INTERVENTOR se obliga a: **1).** Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. **2).** Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación. **3).** Garantizar un trabajo acorde con la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y del contrato. Para lograr este objetivo, ejecutará y controlará los trabajos bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 del 2000 y NTC-ISO 9001 versión 2008. **4).** Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. **5).** Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). **6).** Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. Para lo cual podrá vincular laboralmente a personas adscritas a los procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalidad – ARN. **7).** Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. **8).** Informar cualquier cambio en la composición del capital social del interventor, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. **9).** Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería

el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. **10).** Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. **11).** Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). **12).** Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. **13).** EL INTERVENTOR deberá cumplir con la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Artículo 27 del Decreto No. 1443 del 2014), situación que deberá ser controlada por el Supervisor del Contrato, así como el cumplimiento de la Resolución 312 del 2019 la Resolución No. 223 del 2021 y la Resolución No. 392 del 2021 o aquellas que la reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. **14).** EL INTERVENTOR deberá vincular laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069 del 2020, siempre que lo oferten en su propuesta, y aún más cuando sea determinante respecto de los criterios establecidos en la mencionada ley para el desempate de las propuestas. No obstante, en el evento en que EL INTERVENTOR no ofertara en su propuesta los factores de desempate descritos en la Ley 2069 del 2020, éste podrá vincular, si así lo considera a madres cabeza de familia y víctimas de violencia y/o discriminación, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1232 del 2008 y el Artículo 23 de la Ley 1257 del 2008, respectivamente, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. **15).** EL INTERVENTOR para la ejecución del contrato podrá vincular y generar empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1780 del 2016, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. **16).** El INTERVENTOR, deberá realizar el acta de liquidación del contrato objeto de supervisión del presente proceso y prestar su acompañamiento a la Entidad contratante hasta la suscripción de la citada Acta de Liquidación. **17).** EL INTERVENTOR dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, de acuerdo en lo establecido en la ley y en lo dispuesto en las Circulares que para el efecto haya expedido y/o expida EL INSTITUTO. **18).** Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato **19).** Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad. **20).** Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a **tres (03) días hábiles** días hábiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la "Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal" y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. **21).** Toda vez que el proceso de selección del cual se derivó el presente contrato se adelantó a través de la plataforma transaccional SECOP II, EL INTERVENTOR se obliga a adelantar todos los trámites derivados del perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como de su liquidación, a través de la mencionada plataforma. **22).** EL INTERVENTOR cumplirá con las demás obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de éste y de aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones y los documentos que hagan parte integral de éste.

**PARAGRAFO:** EL INTERVENTOR deberá incluir el personal de que trata el Decreto No. 680 del 2021 y la Resolución No. 304 del 2021, para lo cual se tendrá en cuenta el formato que haya escogido el adjudicatario, es decir el Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional o el Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, de acuerdo a lo estipulado en el Estudio Previo y Análisis del Sector del Pliego de condiciones y la respectiva Resolución de Adjudicación del Concurso de Méritos, situación que deberá verificar el supervisor del contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. -** El personal mínimo propuesto por el INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO, no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual deberá presentarse comunicación suscrita por el profesional en la que conste la justificación de su retiro. En caso de aprobarse el cambio por parte del INSTITUTO, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el exigido en los Pliegos de Condiciones. Los otros empleados asignados al proyecto serán nombrados y removidos por el INTERVENTOR. El INTERVENTOR se obliga, en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda vez que el personal que vincula el INTERVENTOR no tiene carácter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador - empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DERECHOS DEL INTERVENTOR. –** Además de los derechos que por Ley le corresponden al INTERVENTOR, éste tiene derecho a recibir una remuneración por la ejecución de las actividades ejecutadas en los términos pactados en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. –** EL INSTITUTO se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación, así como, a pagar la remuneración por la ejecución de las actividades ejecutadas en los términos pactados en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD. –** EL INTERVENTOR es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace responsable por los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del presente Contrato por hechos u omisiones del INTERVENTOR o sus empleados, o los empleados o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA Y AMBIENTAL. –** De conformidad con los Pliegos de Condiciones, EL INTERVENTOR mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. De conformidad con el Pliego de Condiciones, EL INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. EL INTERVENTOR deberá asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Área de influencia. El interventor dará cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el manual de interventoría y en los apéndices del pliego de condiciones del contrato de obra objeto de la presente interventoría.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. -** Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL INTERVENTOR se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantías permitidas por el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a saber: **(i).** Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales. **(ii).** Patrimonio autónomo. **(iii).** Garantía Bancaria, que ampare lo siguiente:

**a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan**, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.

**b). Buen manejo y correcta inversión del anticipo**, por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL INTERVENTOR reciba en dinero o en especie, a título de anticipo, para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo. En todo caso, la Unidad Ejecutora encargada deberá informar por escrito al INTERVENTOR, previo a la expedición de la garantía única de cumplimiento, el porcentaje a otorgar en calidad de anticipo, que estará sujeto a la disponibilidad del PAC, situación que la Unidad Ejecutora deberá certificar a la Subdirección de procesos de selección contractuales para la aprobación de la garantía única de cumplimiento del contrato.

**C). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el INTERVENTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato**, por el equivalente al Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más.

**d). Calidad del servicio**, con una vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato principal y por una cuantía equivalente al Treinta por ciento (30%) del valor total del contrato.

**PARÁGRAFO PRIMERO**: Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO. En todo caso, EL INTERVENTOR deberá publicar la garantía única de cumplimiento en la plataforma transaccional SECOP II.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL INTERVENTOR deberá ajustar la Garantía Única, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

**PARÁRAFO TERCERO**: **INDEMNIDAD**. - EL INTERVENTOR se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del INTERVENTOR, sus subcontratistas o dependientes.

**PARÁGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. -** EL INTERVENTOR está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga y/o suspensión del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del INTERVENTOR o su no adición o prórroga o suspensión, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

**PARÁGRAFO QUINTO: GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO. -** EL INTERVENTOR será responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis: **(i).** Mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y **(ii).** Mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de igual al plazo de garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del Artículo 85 de la Ley 1474 del 2011.

**PARÁGRAFO SEXTO: REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS. -** Con respecto a cualquiera de las clases de garantías permitidas por el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: • El tomador debe ser EL INTERVENTOR. • Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión Temporal), la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. • Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías 800.215.807-2 y el NIT del INTERVENTOR, Incluir dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. • Cuando el INTERVENTOR sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón

social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Debe incluir claramente el número y año del contrato. • Debe incluir el objeto del contrato. • Las garantías y el seguro deben ser firmados por el representante legal del INTERVENTOR. • La fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la fecha de suscripción del contrato. No obstante, una vez impartida la orden de inicio de ejecución del contrato de obra, la vigencia final de las garantías y del seguro se ajustará de conformidad con la fecha de inicio de la ejecución del plazo contractual. • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. • Las garantías deben venir en original. • Anexar el comprobante de pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil extracontractual.

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: VIGILANCIA.** - La vigilancia del presente contrato será realizada por el funcionario competente de conformidad con la resolución de delegación de funciones vigente del INSTITUTO o por el funcionario designado por éste, quien ejercerá las funciones de supervisor del contrato de interventoría.

**PARÁGRAFO**: El Jefe de la Unidad Ejecutora en la sede central del INSTITUTO designará un Gestor Técnico del Proyecto, de acuerdo a la normatividad interna del INSTITUTO.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: MULTAS. -** En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al INTERVENTOR, EL INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en la **Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022**. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposición de las multas será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se impongan al INTERVENTOR, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

**PARÁGRAFO:** En el evento en que EL INTERVENTOR incumpla las obligaciones derivadas de la vinculación del personal de acuerdo al porcentaje ofrecido en su propuesta a través del Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional o el Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, se aplicarán las multas en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022, o aquellas que la reemplacen, aclaren, adicionen o complementen.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA**: **CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.** - En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de las actividades de interventoría. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y la consecuente imposición de la cláusula penal será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al INTERVENTOR, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

**PARÁGRAFO:** EL INTERVENTOR que no informe oportunamente al INSTITUTO de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar al INSTITUTO el diez por ciento (10%) de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de la pena, es compatible con la indemnización de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el Artículo 1600 del Código Civil.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA**: **INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR. -** El Interventor es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, el Interventor no es su representante, agente o mandatario. El INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA**: **INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR**. - EL INTERVENTOR ejecutará el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de contratación. Entre EL INTERVENTOR, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, EL INTERVENTOR responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, EL INTERVENTOR deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA**: **CESIÓN Y SUBCONTRATOS. -** El INTERVENTOR no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. Para la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor eficacia, rapidez o economía por personal especializado, el INTERVENTOR puede subcontratarlos con la autorización previa del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevará al INTERVENTOR de las responsabilidades que asume por las labores de la Interventoría y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. El INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de las actividades que éstos ejecuten seguirá a cargo del INTERVENTOR. El INSTITUTO podrá exigir al INTERVENTOR la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. –** Cuando se configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión de la ejecución del mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoría y de Contratación vigentes.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.** - Las divergencias que ocurran entre el supervisor y EL INTERVENTOR, relacionadas con la supervisión, control y dirección del contrato, serán dirimidas por el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudirá al Director de Ejecución y Operación, cuya decisión será definitiva. Las controversias o diferencias que surjan entre EL INTERVENTOR y EL INSTITUTO con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, podrán resolverse empleando las instancias, procedimientos y mecanismos contemplados en la normatividad vigente para tales efectos, entre otros, como la conciliación y la transacción.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN.** - El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 del 2007 y el Artículo 217 del Decreto Ley No. 019 del 2012, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso.

**PARAGRAFO PRIMERO:** Para la liquidación se exigirá al INTERVENTOR la ampliación de las garantías, si es del caso, con el fin de avalar las obligaciones que este deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

**PARAGRAFO SEGUNDO**: Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la liquidación del Contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el Artículo 11 de la Ley 1150 del 2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. -** Una vez vencidas las garantías de calidad del servicio de interventoría, estabilidad de las obras y calidad de estudios y diseños, según el caso, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedirá la constancia de cierre del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. -** El INTERVENTOR se obliga a diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para el control financiero y contable de identificación de ejecución contractual.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. –** Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del proceso de selección. El domicilio contractual será la ciudad sede del INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS. –** Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: • Estudios y documentos previos. • Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. • Propuesta presentada por EL INTERVENTOR. • Las garantías debidamente aprobadas. • Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO. -** Las partes de común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra en SECOP II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen parte integral del mismo.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**. – El presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las garantías presentadas por EL INTERVENTOR.

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5454329 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 21 días de tiempo transcurrido *(12/10/2023 8:38:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 4209-2023 |
| **Objeto del contrato** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES EN LOS PR0+0354 Y PR2+0200 EN ATENCIÓN EMERGENCIA, VÍA LETICIA - TARAPACÁ, MUNICIPIO LETICIA DEPARTAMENTO AMAZONAS |
| **Tipo de Contrato** | Interventoría |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 61 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | * |
| **Fecha de terminación del contrato** | 31/12/2022 11:59 PM * |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 1/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**INVIAS**

COLOMBIA, Bogotá

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**CONSORCIO INTERVIAL IPCC**

COLOMBIA, Duitama
Número de documento GB0022023

## Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO INTERVIAL IPCC | Banco de Bogotá | Ahorros | 282567270 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA* ***Fecha de aprobación:*** *2/11/2023 9:55:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Ruby Amparo Malaver Montaña* ***Fecha de aprobación:*** *2/11/2023 2:19:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | Sí | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |
| **Sector:** | Infraestructura de transporte (interventoría de obra pública) | |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** Como acordado previamente

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☐No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☑Sí ☐No

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | | 10,00 | |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | | |
| | ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | |
| | ☑% del anticipo | 100,00 | Fecha de vigencia (desde) | 20 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 20 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☑ Pago de salarios | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 20 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☑ Calidad del servicio | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 30,00 | Fecha de vigencia (desde) | 19 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2028 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha limite para entrega de garantías:** 5 días para terminar *(7/11/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.12683203 | Seriedad de la oferta | - | 47.000.000,00 COP | - | 12/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5454329
**Proveedor** CONSORCIO INTERVIAL IPCC
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 25 G No. 73B-90
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** Calle 25 G No. 73B-90
**Código postal** 110931

| | Grados (°) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | 0 | 0 | 0 |
| **Longitud:** | 0 | 0 | 0 |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | VÍA LETICIA - TARAPACÁ, MUNICIPIO LETICIA DEPARTAMENTO AMAZONAS | COLOMBIA > Amazonas > Leticia |

1 CO1.PCCNTR.5454329

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 470.000.000,00 | 470.000.000,00 |
| **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 1 | 81101500 | INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA | 1,00 | UN | 470.000.000,00 | 470.000.000,00 | 470.000.000,00 | 470.000.000,00 |

## Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| ☐ | CTO 4209 DE 2023 - Anexo 5 Minuta ajustada CMA-062.pdf | CTO 4209 DE 2023 - Anexo 5 Minuta ajustada CMA-062.pdf | (detalle) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | Documentos del proceso.pdf | Documentos del proceso.pdf | (detalle) |
| ☐ | Documentos Interventor.pdf | Documentos Interventor.pdf | (detalle) |
| ☐ | Historial.pdf | Historial.pdf | (detalle) |
| ☐ | ANTECEDENTES.pdf | ANTECEDENTES.pdf | (detalle) |

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Ruby Amparo Malaver M | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 51975533 | Guardar y notificar |
| Supervisor | | Tipo de documento | | Número de documento | | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Ruby Amparo Malaver Montaña | 2/11/2023 2:19:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Ruby Amparo Malaver Montaña |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Funcionamiento

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| | **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 470.000.000 |
| | **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| | **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| | **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| | **Recursos de Crédito** | 0 |
| | **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| | **Total** | 470.000.000 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☑Sí ☐No

**Código de autorización**:

**Código unidad/subunidad ejecutora**: 24-02-00

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 109623 | CDP | No validado | 470.000.000 COP | 470.000.000 COP | 24-02-00 | Editar |

**Saldo de CDP**: 470.000.000 COP

**Saldo de vigencias futuras**: 0 COP

**Saldo total a comprometer**: 470.000.000 COP

**Última consulta a SIIF**:

**Fecha de consulta SIIF**: -

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Saldo de compromisos CDP**:

**Saldo de compromisos AVF**:

**Saldo total comprometido**:

**Última consulta a SIIF**:

**Fecha de consulta SIIF**: -

**CONTRATO NÚMERO 4209-2023**
**ACLARACIÓN NUMERO UNO (01) DE 2023**

**OBJETO:** **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES EN LOS PR0+0354 Y PR2+0200 EN ATENCIÓN EMERGENCIA, VÍA LETICIA - TARAPACÁ, MUNICIPIO LETICIA DEPARTAMENTO AMAZONAS."**

**INTERVENTOR:** **CONSORCIO INTERVIAL IPCC con Nit 901.765.655-5, integrado por PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA identificado con el CC: 7.227.602 con una participación del 40%, JORGE WILLAN CORZO GARCIA identificado con la cedula de ciudadanía CC: 5.689.243 con una participación del 20%, GERMAN ALONSO PUENTES GORDO identificado con la cedula de ciudadanía CC: 7.162.821 con una participación del 30% y la sociedad INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-INCORDIS SAS con NIT:900.869.939-5, con una participación del 10%**

**RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA**, identificada con cédula de ciudadanía número 51.975.533 quien obra en su calidad de **SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES (E),** nombrada mediante Resolución No. 4017 del 07 de noviembre del 2023 y posesionada mediante Acta No. 000096 del 08 de noviembre del 2023,obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre del 2021, 3343 del 02 de noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre del 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará **EL INSTITUTO** por una parte y por la otra, **PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA** identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.227.602 expedida en Bogotá D.C., obrando en nombre y representación del **CONSORCIO INTERVIAL IPCC**, tal y como consta en carta de información del Consorcio (anexa), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni el, ni los integrantes del **CONSORCIO** que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará **EL INTERVENTOR**, hemos convenido aclarar el Contrato No 4209 de 2023 previo las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. Que el día 02 de noviembre de 2023 las partes suscribieron el Contrato No 4209 de 2023, a través de la plataforma transaccional SECOP II.

2. Que en el literal b) de la cláusula séptima, "APROPIACIÓN PRESUPUESTAL" del Contrato 4209 - 2023 quedó consignado un valor en letras distinto del valor en números como se describe a continuación: "b) VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS ($24.936.200) MONEDA CORRIENTE, provisión para ajustes y/o frente adicional". Siendo lo correcto VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MTCE ($24.963.200)

3. Que, en el parágrafo de la cláusula séptima, "APROPIACIÓN PRESUPUESTAL" del Contrato 4209 -2023, por error de digitación se consignó el valor de la reserva en la suma de $287.770.322, siendo correcto la suma de $470.000.000.00 correspondiente al rubro C-2402-0600-13-0-2402119-02, Fuente Nación, Recurso 11.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento aclaratorio, así:

**CLAUSULAS:**

**CLÁUSULA PRIMERA: ACLARAR** el literal b) de la CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL del Contrato 4209 -2023 el cual quedará así:

*"(...) b) VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS ($24.963.200) MONEDA CORRIENTE, provisión para ajustes y/o frente adicional"*

**CLÁUSULA SEGUNDA: ACLARAR** el PARÁGRAFO de la CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL del Contrato 4209-2023, el cual quedará así:

*"(...)* ***PARÁGRAFO:*** *Para respaldar las obligaciones contraídas,* ***EL INSTITUTO*** *cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 109623 del 24 de mayo del 2023 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del* ***INSITITUTO****, del cual se reservará a suma de $470.000.000.00 correspondiente al rubro C-2402-0600-13-0-2402119- 02, Fuente Nación, Recurso 11".*

**CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del Contrato No 4209 de 2023 que no se hayan sido objeto de aclaración mediante el presente documento.

**CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. -** El presente acuerdo se perfecciona con la suscripción por las partes.

Para constancia se firma a los quince (15) días del mes de noviembre de 2023.

**POR EL INSTITUTO:**

Ruby Malaver

Firmado digitalmente por RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA

**RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA**
SUBDIRECTORA DE SELECCIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES (E )

**POR EL CONTRATISTA**

**PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA**
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVIAL IPCC

Vo.Bo.: Vila Yaneth Maldonado Figueredo
VoBo: Erika Arcila Vásquez
Vo.Bo: Yavira Esperanza Florián Castañeda – Coordinadora

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-11-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

**ACTA DE SUSPENSIÓN No.** 1
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,..., etc.)

**AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.**
(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,..., etc.)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

**RESPONSABILIDAD**

1. Mediante la suscripción de la presente Acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.
- Periodo solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

2. El Interventor suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.
3. El Supervisor del contrato de interventoría debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de interventoría, lo cual refrenda con su firma.
4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.
5. En el evento de que el representante legal del Interventor otorgue poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4209 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONOSORCIO INTERVIAL IPCC
(Nombre o razón social del Interventor )

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES EN LOS PR0+0354 Y PR2+0200 EN ATENCIÓN EMERGENCIA, VÍA LETICIA - TARAPACÁ, MUNICIPIO LETICIA DEPARTAMENTO AMAZONAS

**CONTRATO DE OBRA No.** 3832 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA DE OBRA:** CONSORCIO PUENTES IPV

**CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** 12/12/2023
Indicar (Día/Mes/Año)

**RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 470,000,000.00

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL :** 31/12/2023
(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión) Indicar Día/Mes/Año

**CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:**
(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Interventor y aprobadas por el Supervisor del contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean imputables a las partes contratantes).

La solicitud de suspensión N° 1 que realiza el CONSORCIO INTERVIAL IPCC al contrato de interventoría se basa en las siguientes situaciones:
El contratista de obra manifiesta en su oficio CP-IPV-009 DE 2023 que, debido a las festividades las empresas de transporte están experimentando problemas logísticos que afectan la disponibilidad para transportar los equipos de laboratorio al sitio de la obra. En conversacion con el supervisor del contrato, el ingeniero Ricardo Burbano, se menciona que sus compromisos le impiden viajar al municipio de Leticia en estas fechas para supervisar las actividades iniciales del contrato de obra, ademas, el personal profesional tampoco tiene disponibilidad para desplazarse a Leticia durante las festividades para iniciar las actividades contractuales, por lo tanto, se requiere la presente suspension para garantizar el inicio oportuno de las actividades del contrato de obra.

**Imposibilidad de transporte de material**
Además, el IDEAM en su boletín de predicción climática y recomendación sectorial para planear y decidir para el periodo diciembre 2023 – febrero 2024, informa una disminución aproximada de 2.5 metros en la profundidad del lecho del rio Amazonas durante el mes de diciembre. Esta disminución ha provocado una reducción en la capacidad de carga de los barcos, lo que ha tenido un impacto significativo en el servicio regular de transporte. Este impacto, sin embargo, es temporal y se espera que se resuelva a medida que cambien las condiciones del rio.

**Trámite de permiso ambiental**
El ingeniero ambiental, Luis Miguel Luna, ha sido designado por la Alcaldía de Leticia para gestionar el tramite del permiso ambiental del proyecto. Aunque la solicitud se presento en noviembre, hasta la fecha la corporación no ha programado la visita de campo. Por lo tanto, el trámite no ha avanzado.

Con base en lo expresado por el contratista de obra, la interventoría del proyecto CONSORCIO INTERVIAL IPCC considera viable la suspensión tanto del contrato de obra como el de interventoría, al no poder realizar con inmediatez la reunión tecnica inicial de obra de las partes involucradas en el proyecto, segun lo establecido en el manual de interventoría, además de no ser posible ejecutar el contrato hasta la fecha contractual prevista del 31/12/2023.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-11-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

Se considera procedente la Suspensión Nº1 del Contrato de Interventoría Nº4209 de 2023, debido a los hechos sobrevinientes presentados por el contratista de obra, avalados por el interventor, que impiden el inicio de la ejecución de las actividades del Contrato de Obra Nº3832 y por ende el adecuado seguimiento y control integral de la interventoría.

**NOTAS:**

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal, el normal desarrollo del contrato, no son imputables a las partes contratantes.
2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado de modificación de la garantía única constituída, en la cual se tenga en cuenta la presente suspensión y/o ampliación de la suspensión. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.
3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.
4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-4 Acta de Reanudación del Contrato de Interventoría.
5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones vigente.

**NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO**

**FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL:** 26 (Dia) de 12 (Mes) de 2023 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

**FECHA DE REANUDACIÓN** 6 (Dia) de 2 (Mes) de 2024 (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

**NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO:** 11 (Dia) de 2 (Mes) de 2024 (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente IV-8.)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL INTERVENTOR DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: STAND BY DE EQUIPOS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE EQUIPOS O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL INTERVENTOR ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron:

**FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP**
Nombre: PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA
Representante legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 01196-0427 CPITVC

**FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP**
Nombre: PATRICIA INES MORALES PADRON
Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la delegación de funciones.


Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del contrato de interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-11-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

**ACTA DE SUSPENSIÓN No.** 2
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…. etc.)

**AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.** -
(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

## RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente Acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.
- Periodo solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.
2. El Interventor suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.
3. El Supervisor del contrato de interventoría debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de interventoría, lo cual refrenda con su firma.
4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.
5. En el evento de que el representante legal del Interventor otorgue poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4209 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL IPCC
(Nombre o razón social del Interventor )

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES EN LOS PR0+0354 Y PR2+0200 EN ATENCIÓN EMERGENCIA, VÍA LETICIA - TARAPACÁ, MUNICIPIO LETICIA DEPARTAMENTO AMAZONAS

**CONTRATO DE OBRA No.** 3832 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA DE OBRA:** CONSORCIO PUENTES IPV

## CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**FECHA DE INICIO DEL CONTRAT(** 12/12/2023
Indicar (Día/Mes/Año)

**RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| 1 | - | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 5/02/2024 | 6-feb-24 |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 470.000.000,00

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL :** 11/02/2024
(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión) Indicar Día/Mes/Año

**CAUSAS QUE DAN ORIGEN A LA SUSPENSIÓN:**
(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Interventor y aprobadas por el Supervisor del contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean imputables a las partes contratantes).

La solicitud de la suspensión No. 2 que realiza el CONSORCIO INTERVIAL IPCC al contrato de interventoría se basa teniendo en cuenta lo expuesto por el contratista de obra, el cual manifiesta en su oficio CP-IPV-012 DE 2023 que que no se han podido iniciar actividades de pre construcción, esto debido a que se ha dificultado el desplazamiento de los equipos necesarios para llevar a cabo la verificación de los estudios suministrados por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, puesto que las condiciones climáticas de la región en la que se desarrollará el proyecto son complejas, y esto ha generado inconvenientes con el transporte fluvial de los equipos. Esta situación ha generado retrasos en la toma de ensayos y demas pruebas necesarias, y por ende, no se ha podido dar continuidad a las demas actividades, ya que estas estan directamente relacionadas al resultado de los ensayos en mención.

Por lo anterior, el CONSORCIO INTERVIAL IPCC considera pertinente la suspensión No. 2 del contrato de interventoría No. 4209 de 2023, en un termino de TREINTA (30) días calendario, teniendo en cuenta el motivo expuesto, que impiden una adecuada ejecución del contrato de las actividades constructivas de las obras, el seguimiento y control integral de las mismas por parte de la Interventoría.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-11-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

La supervisión de la Interventoría acusa recibo de la solicitud mediante la cual solicita la suspensión No. 2 del Contrato de Interventoría y considera que las causales expuestas son razón suficiente para que el mismo deba ser objeto de suspensión ya que los procesos de acompañamiento deben ser coincidentes con los tiempos de ejecución que se le establezcan al contrato de obra.

**NOTAS:**

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal, el normal desarrollo del contrato, no son imputables a las partes contratantes.
2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado de modificación de la garantía única constituída, en la cual se tenga en cuenta la presente suspensión y/o ampliación de la suspensión. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.
3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.
4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-4 Acta de Reanudación del Contrato de Interventoría.
5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones vigente.

**NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO**

**FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL:** 7 (Día) de FEBRERO (Mes) de 2024 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

**FECHA DE REANUDACIÓN** 8 (Día) de MARZO (Mes) de 2024 (Año)


La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

**NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO:** 12 (Día) de MARZO (Mes) de 2024 (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente IV-8.)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL INTERVENTOR DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: STAND BY DE EQUIPOS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE EQUIPOS O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL INTERVENTOR ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron:



Nombre: PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA
Representante legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 01196-0427 CPITVC



Firmado digitalmente por JUAN JOSE OYUELA SOLER

Nombre: JUAN JOSE OYUELA SOLER
Director de Ejecución y Operación
Instituto Nacional de Vías - INVIAS



Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA

Firma

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del contrato de interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Interventor y Dirección Territorial.

**CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS**

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

**No. De Contrato y/o Convenio:** 4209 de 2023

**Objeto:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES EN LOS PR0+0354 Y PR2+0200 EN ATENCIÓN EMERGENCIA, VÍA LETICIA - TARAPACÁ, MUNICIPIO LETICIA DEPARTAMENTO AMAZONAS.

Se con marca una (X)

| | **ACTUALIZADO** | |
|---|---|---|
| **APLICATIVO** | **SI** | **NO APLICA** |
| **SECOP:** | X | |
| **SICO:** | X | |
| **SEPRO:** | X | |
| **CIFRA:** | | X |
| **GESPROY:** | | X |

**Nota:** Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 12 días del mes de Marzo del año 2024.

Nombre: **PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN**
**Ordenador (e) del Pago**
Subdirección: VÍAS REGIONALES
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: **DAJAHIRA CASTILLO HURTADO**
**Coordinadora del Proyecto**
Subdirección: VÍAS REGIONALES
Instituto Nacional de Vías – INVIAS



Nombre: **IVAN DARIO GAMBOA CIFUENTES**
**Gestor Técnico del Proyecto**
Subdirección: VÍAS REGIONALES
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5454329 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 21 días de tiempo transcurrido *(12/10/2023 8:38:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 4209-2023 |
| **Objeto del contrato** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES EN LOS PR0+0354 Y PR2+0200 EN ATENCIÓN EMERGENCIA, VÍA LETICIA - TARAPACÁ, MUNICIPIO LETICIA DEPARTAMENTO AMAZONAS |
| **Tipo de Contrato** | Interventoría |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 61 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | * |
| **Fecha de terminación del contrato** | 31/12/2022 11:59 PM * |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 1/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**INVIAS**

COLOMBIA, Bogotá

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**CONSORCIO INTERVIAL IPCC**

COLOMBIA, Duitama
Número de documento GB0022023

## Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO INTERVIAL IPCC | Banco de Bogotá | Ahorros | 282567270 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA* ***Fecha de aprobación:*** *2/11/2023 9:55:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Ruby Amparo Malaver Montaña* ***Fecha de aprobación:*** *2/11/2023 2:19:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | Sí | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |
| **Sector:** | Infraestructura de transporte (interventoría de obra pública) | |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** Como acordado previamente

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☐No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☑Sí ☐No

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | | 10,00 | |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | | |
| | ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | |
| | ☑% del anticipo | 100,00 | Fecha de vigencia (desde) | 20 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 20 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☑ Pago de salarios | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 20 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☑ Calidad del servicio | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 30,00 | Fecha de vigencia (desde) | 19 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2028 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☐Sí ☑No | | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 5 días para terminar *(7/11/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | | Fecha de entrega de garantías: - | |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.12683203 | Seriedad de la oferta | - | 47.000.000,00 COP | - | 12/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5454329
**Proveedor** CONSORCIO INTERVIAL IPCC
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 25 G No. 73B-90
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** Calle 25 G No. 73B-90
**Código postal** 110931

| | Grados (°) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | 0 | 0 | 0 |
| **Longitud:** | 0 | 0 | 0 |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | VÍA LETICIA - TARAPACÁ, MUNICIPIO LETICIA DEPARTAMENTO AMAZONAS | COLOMBIA > Amazonas > Leticia |

1 CO1.PCCNTR.5454329

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 470.000.000,00 | 470.000.000,00 |
| **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 1 | 81101500 | INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA | 1,00 | UN | 470.000.000,00 | 470.000.000,00 | 470.000.000,00 | 470.000.000,00 |

## Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| ☐ | CTO 4209 DE 2023 - Anexo 5 Minuta ajustada CMA-062.pdf | CTO 4209 DE 2023 - Anexo 5 Minuta ajustada CMA-062.pdf | (detalle) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | Documentos del proceso.pdf | Documentos del proceso.pdf | (detalle) |
| ☐ | Documentos Interventor.pdf | Documentos Interventor.pdf | (detalle) |
| ☐ | Historial.pdf | Historial.pdf | (detalle) |
| ☐ | ANTECEDENTES.pdf | ANTECEDENTES.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Ruby Amparo Malaver M | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 51975533 | Guardar y notificar |
| Supervisor | | Tipo de documento | | Número de documento | | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Ruby Amparo Malaver Montaña | 2/11/2023 2:19:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Ruby Amparo Malaver Montaña |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Funcionamiento

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| | **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 470.000.000 |
| | **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| | **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| | **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| | **Recursos de Crédito** | 0 |
| | **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| | **Total** | 470.000.000 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☑Sí ☐No

**Código de autorización**:

**Código unidad/subunidad ejecutora**: 24-02-00

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 109623 | CDP | No validado | 470.000.000 COP | 470.000.000 COP | 24-02-00 | Editar |

**Saldo de CDP**: 470.000.000 COP

**Saldo de vigencias futuras**: 0 COP

**Saldo total a comprometer**: 470.000.000 COP

**Última consulta a SIIF**:

**Fecha de consulta SIIF**: -

## Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Saldo de compromisos CDP**:


**Saldo de compromisos AVF**:


**Saldo total comprometido**:

**Última consulta a SIIF**:


**Fecha de consulta SIIF**: -

**ACTUALIZACIÓN APLICATIVO SICO**

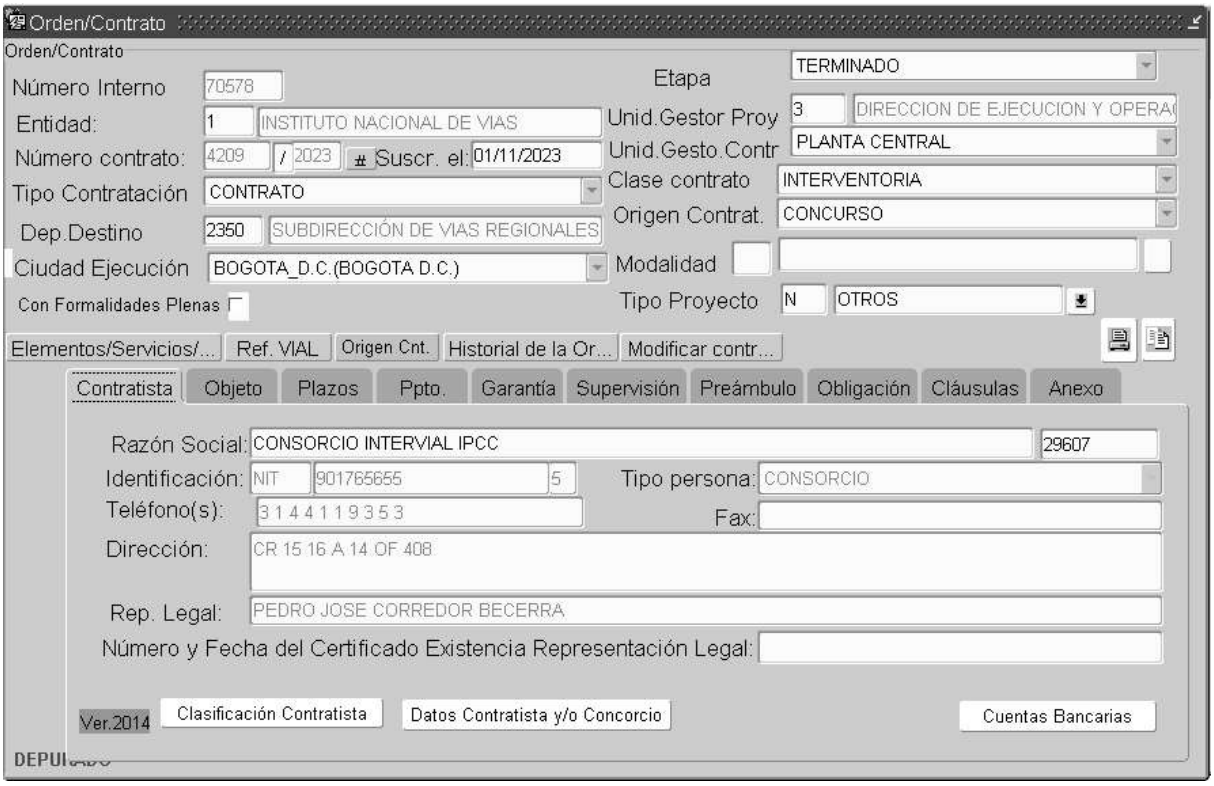
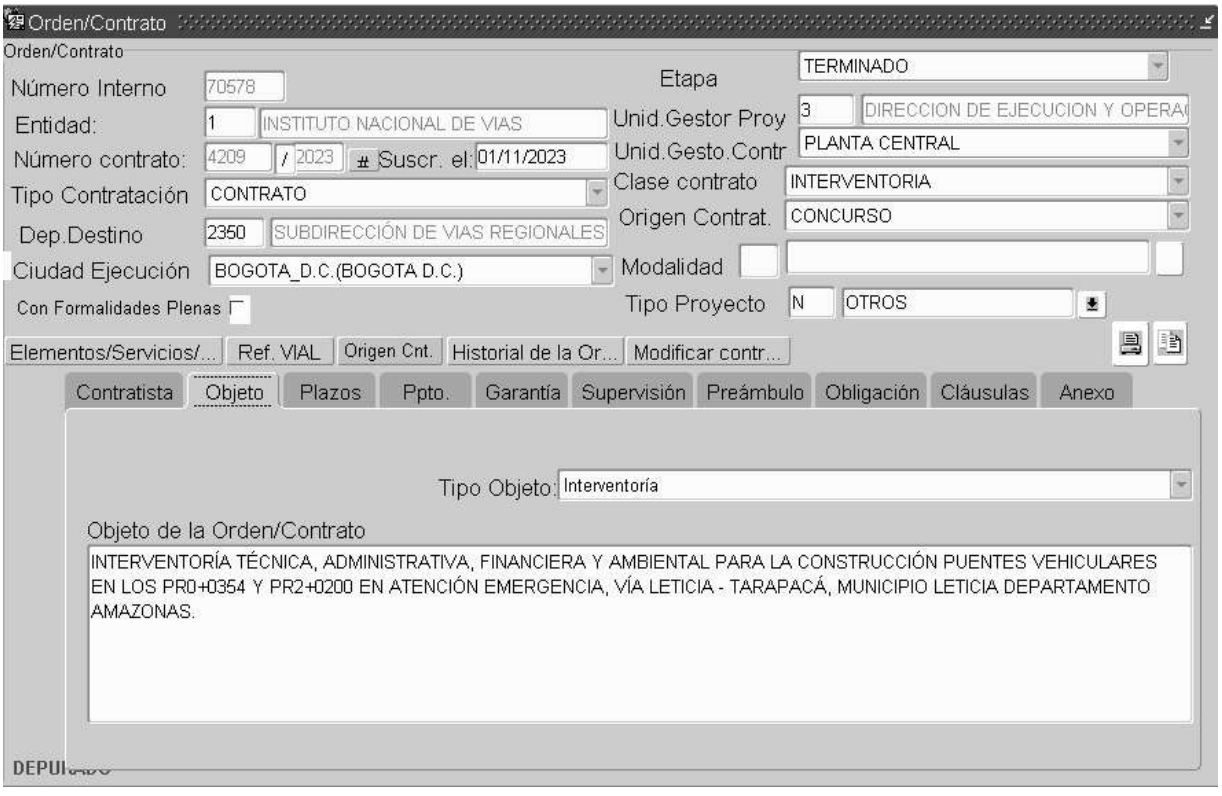
## ACTUALIZACIÓN APLICATIVO SEPRO

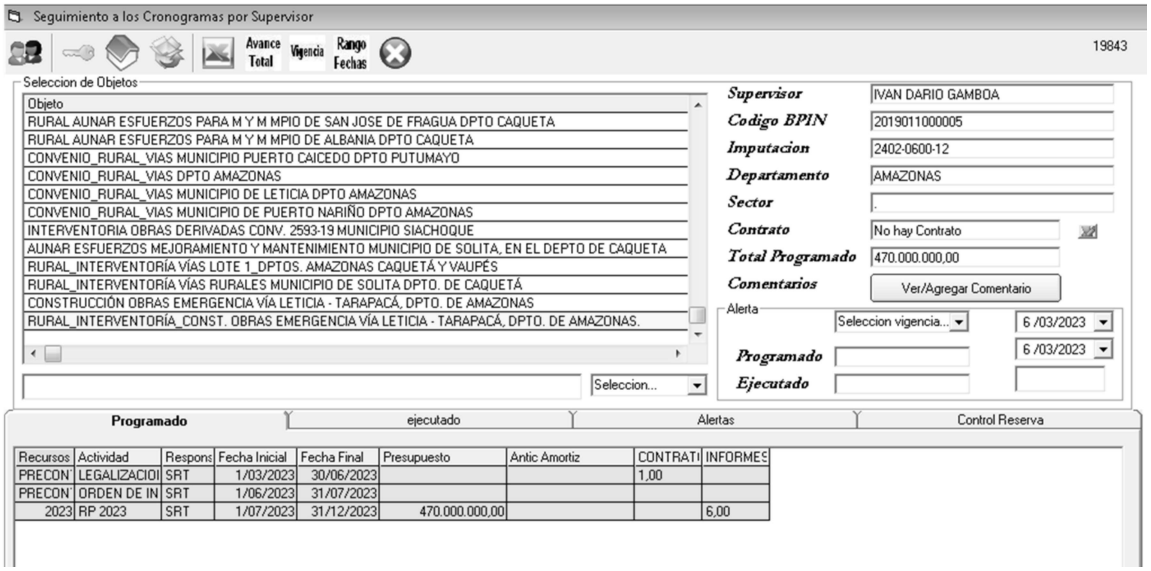

Fecha: 2024-03-14 11:26:42
Radicado: 2024I-VBOG-014029
Destino: Adriana Diaz Izquierdo
Anexos: 0

**MEMORANDO INDIVIDUAL**

**No. Radicado: 2024I-VBOG-014029**
**Fecha: 2024-03-14 11:26:42**

**Para**: Adriana Diaz Izquierdo
1130200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
**De**: Patricia Inés Morales Padrón
1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

**Asunto:** Contrato de Interventoría No. 4209 de 2023, Programa CONECTAR TERRITORIOS Departamento de Amazonas. Remito Documentos para la Aprobación de Póliza, Orden de Inicio del Contrato.

Respetada Doctora:

Atentamente me permito remitir la Póliza de Cumplimiento No. 51-44-101025096 Anexo No 2, expedida el día 12 de Diciembre de 2023, por la Compañía Seguros del Estado S.A., para la ampliación de las garantías de acuerdo con la Orden de Inicio del Contrato de Interventoría cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES EN LOS PR0+0354 Y PR2+0200 EN ATENCIÓN EMERGENCIA, VÍA LETICIA - TARAPACÁ, MUNICIPIO LETICIA DEPARTAMENTO AMAZONAS, suscrito el día 2 de Noviembre de 2023 con la firma CONSORCIO INTERVIAL IPCC y NIT. No. 901.765.655-5.

Adicionalmente me permito informarle que los documentos antecedentes del contrato en mención, se envía adjuntos al memorando, pero se encuentran cargados en el aplicativo SECOP II, lo anterior para los trámites pertinentes.


Cordialmente,

Patricia Inés Morales Padrón
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES (E)

Proyectado Por: IVAN DARIO GAMBOA CIFUENTES
Revisado Por: DAJAHIRA CASTILLO HURTADO
Aprobado Por:

Copia Interna a:


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
7.227.602
NUMERO
CORREDOR BECERRA
APELLIDOS
PEDRO JOSE
NOMBRES
FIRMA

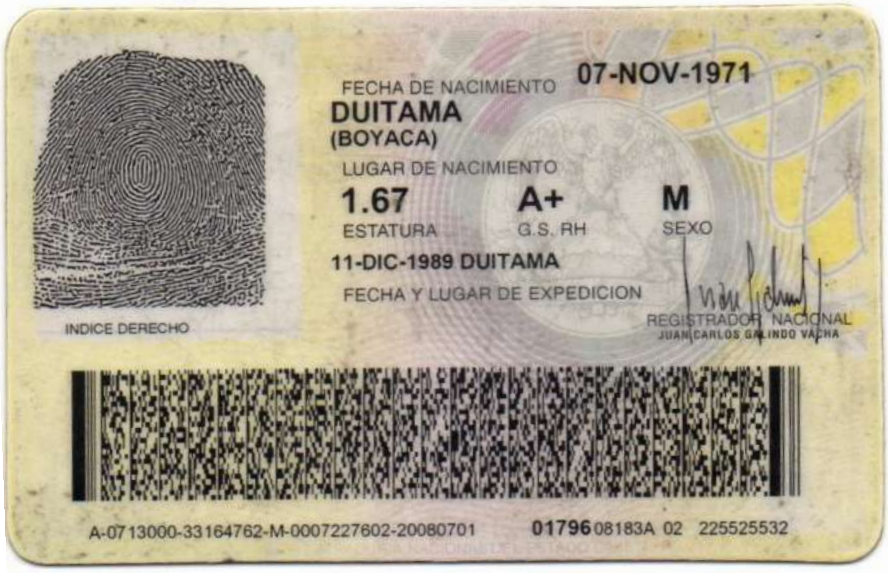
INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 07-NOV-1971
DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
11-DIC-1989 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
A-0713000-33164762-M-0007227602-20080701
01796 08183A 02 225525532

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 15 de marzo de 2024, a las 17:40:13, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación | 7227602 |
| Código de Verificación | 7227602240315174013 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO No. 243545260

PIB
17:47:01


Bogotá DC, 15 de marzo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 7227602:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

Policía Nacional de Colombia

(https://www.policia.gov.c

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/03/2024 05:52:10 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **7227602** y Nombre: **PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **87805410** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Información 515 9000

Dios y Patria

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 Nº 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

GOV.CO

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**
Que siendo las 05:48:10 PM horas del 15/03/2024, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **7227602**
Apellidos y Nombres: **CORREDOR BECERRA PEDRO JOSE**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

## MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

## CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 7227602 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 28/02/2024 08:46 AM

Código Verificación: **B7AEFW6SU8**

Válida hasta: **28/05/2024**

---

**Dirección de Gobierno Digital**

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC**
