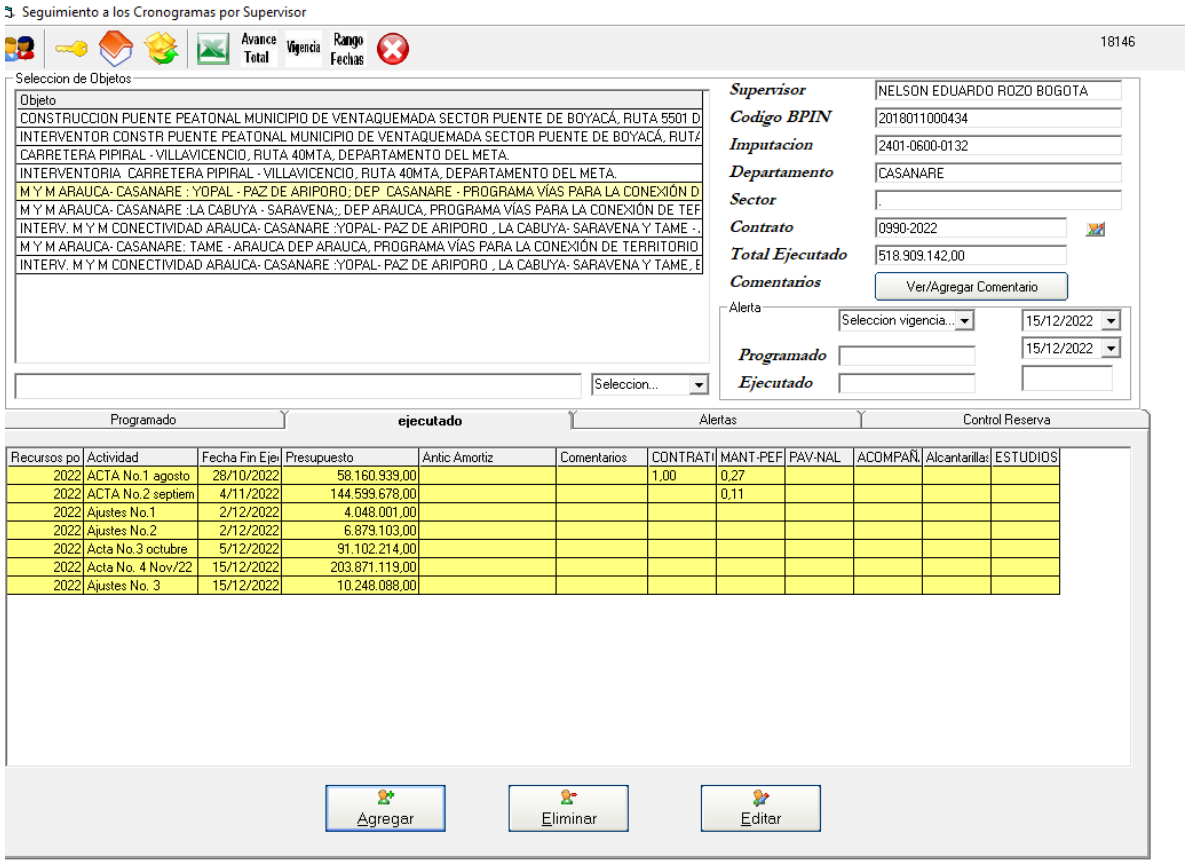

Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor
Avance Total
Vigencia
Rango Fechas
18146
Seleccion de Objetos
Objeto
CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA SECTOR PUENTE DE BOYACÁ, RUTA 5501 D
INTERVENTOR CONSTR PUENTE PEATONAL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA SECTOR PUENTE DE BOYACÁ, RUTA
CARRETERA PIPIRAL - VILLAVICENCIO, RUTA 40MTA, DEPARTAMENTO DEL META.
INTERVENTORIA CARRETERA PIPIRAL - VILLAVICENCIO, RUTA 40MTA, DEPARTAMENTO DEL META.
M Y M ARAUCA- CASANARE : YOPAL - PAZ DE ARIPORO; DEP CASANARE - PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN D
M Y M ARAUCA- CASANARE :LA CABUYA - SARAVENA;, DEP ARAUCA, PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TEF
INTERV. M Y M CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME -
M Y M ARAUCA- CASANARE: TAME - ARAUCA DEP ARAUCA, PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIO
INTERV. M Y M CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME, E
Seleccion...
Supervisor
NELSON EDUARDO ROZO BOGOTA
Codigo BPIN
2018011000434
Imputacion
2401-0600-0132
Departamento
CASANARE
Sector
.
Contrato
0990-2022
Total Ejecutado
518.909.142,00
Comentarios
Ver/Agregar Comentario
Alerta
Seleccion vigencia...
15/12/2022
Programado
15/12/2022
Ejecutado
Programado
ejecutado
Alertas
Control Reserva
Recursos po
Actividad
Fecha Fin Eje
Presupuesto
Antic Amortiz
Comentarios
CONTRATI
MANT-PEF
PAV-NAL
ACOMPAÑ.
Alcantarillas
ESTUDIOS
2022 ACTA No.1 agosto 28/10/2022 58.160.939,00 1,00 0,27
2022 ACTA No.2 septiem 4/11/2022 144.599.678,00 0,11
2022 Ajustes No.1 2/12/2022 4.048.001,00
2022 Ajustes No.2 2/12/2022 6.879.103,00
2022 Acta No.3 octubre 5/12/2022 91.102.214,00
2022 Acta No. 4 Nov/22 15/12/2022 203.871.119,00
2022 Ajustes No. 3 15/12/2022 10.248.088,00
Agregar
Eliminar
Editar
