SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(Alcaldía Local de San Cristóbal)

Fecha de Solicitud: 16/04/2024	**Área de Origen:** Gestión para el Desarrollo Local

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 940-2023	**Fecha de Suscripción**: 29 de diciembre de 2023	**Tipo de Contrato: Compraventa**
Plazo Inicial: 3 meses	**Fecha de Inicio:** 17/01/2024	**Fecha de Terminación Inicial:** 16/04/2024
Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS, AVALADOS POR EL IDRD Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN EL MARCO DEL PROYECTO 1801, SAN CRISTÓBAL ES DEPORTE		
Contratista: ABOVE COLOMBIA SAS		
Interventor/ Supervisor: JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO		**Valor Inicial:** $557.730.697

Número del proceso SECOP I o II: FDLSC-SASI-005-2023	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 9/11/2023	**Link del proceso en el SECOP I o II:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5214590&isFromPublicArea=True&isModal=False

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 1**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$ 0	**Tiempo**: 2 meses **Fecha Terminación Final**: 16/06/2024	Prórroga No. 1 del contrato de compraventa 940-2023.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No._____

Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$ 0** CDP No.: N/A	Tiempo: N/A Fecha Terminación Final: N/A	N/A

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	**$** 557.730.697
Valor ejecutado:	**$** 0
Valor Pagado:	**$** 0

Valor a Adicionar: **$** 0
Valor total (incluyendo la adición solicitada): **$** 557.730.697


CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:


Mediante solicitud del contratista bajo radicado Orfeo No. 20244211255322, se solicita la prórroga por el plazo de 2 meses manifestando la necesidad de realizar esta modificación debido a circunstancias imprevistas relacionadas con la importación de elementos vinculados con la disciplina del ciclismo y la dificultad para la adquisición de estos, además de otras situaciones que han conllevado al atraso en la ejecución y entrega de los elementos deportivos.

Bajo esta premisa, y en mi calidad de apoyo a la supervisión del contrato de compraventa 940-2023 cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS, AVALADOS POR EL IDRD Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN EL MARCO DEL PROYECTO 1801, SAN CRISTÓBAL ES DEPORTE" considero justificada la necesidad de la prórroga, en razón a que una vez revisado el contrato y los elementos de ciclismo que se requieren adquirir por ser destinados para el alto rendimiento deportivo, obligan a cumplir las especificaciones técnicas de calidad. En vista de lo anterior, y al imprevisto frente a la adquisición de los mismos en el mercado se solicita la presente modificación con el fin de permitirle al contratista realizar la adecuada entrega de los elementos y demás actividades propias de la ejecución del contrato.

Lo anterior, atendiendo lo dispuesto por el Art. 40 de la Ley 80 de 1993, la cual señala *"Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración".*

Actualmente el contrato cuenta con 28 elementos de 33 aprobados y con el siguiente cronograma de ejecución propuesto por el contratista:

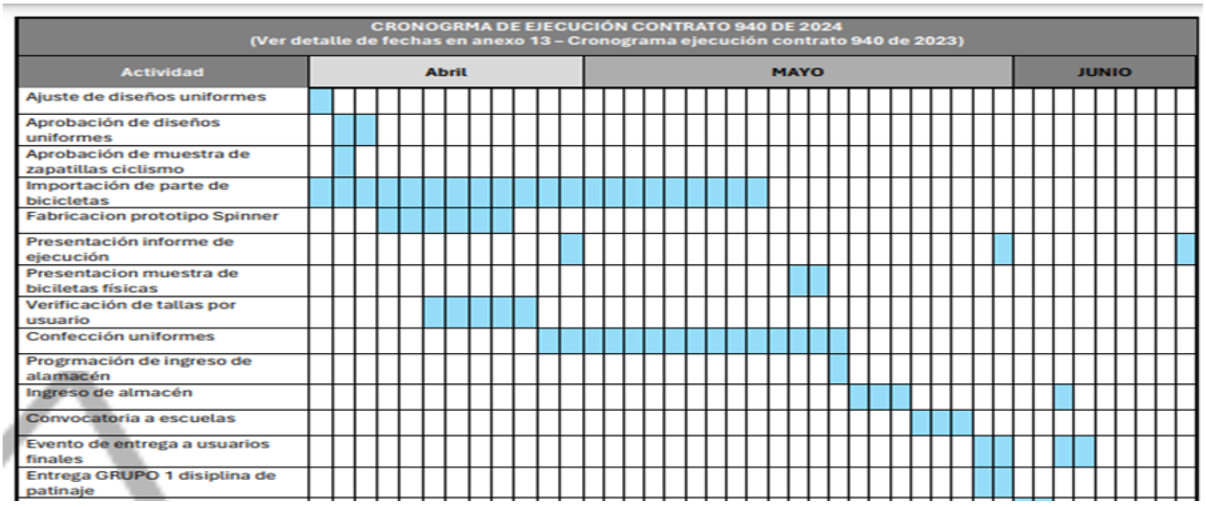


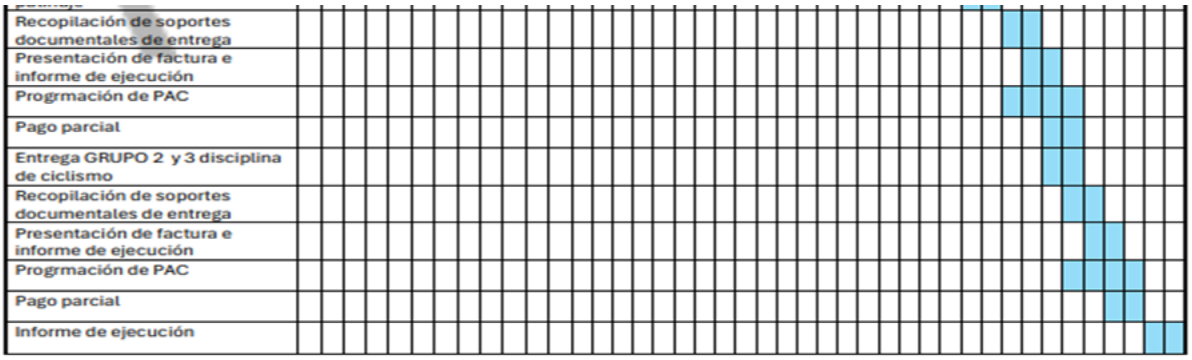

Adicionalmente, se detalla el estado de las muestras:

Resumen estado de muestras

Resumen	Cantidad	% de los ítems	Valor que representa	% del valor
Muestras a presentar	**33**	100,00%	533.781.218	100,0%
Presentadas	**31**	93,94%	416.463.213	78,0%
Por Presentar	**2**	6,06%	117.318.006	22,0%
Aprobadas	**31**	93,94%	416.463.213	78,0%
Aprobadas pendiente diseños	**5**	15,15%	76.315.271	14,3%
Por aprobar	**7**	21,21%	193.633.277	36,3%
Ítem no disponible mercado	**1**	3,03%	1.461.601,68	0,3%

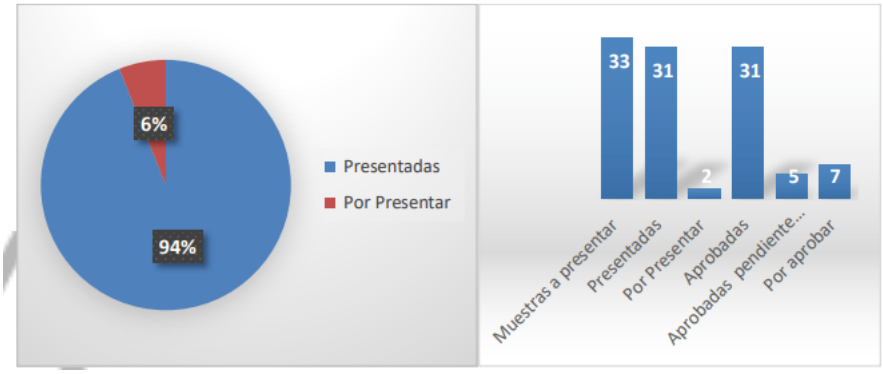

Estando así las cosas, y dado que esta modificación no afecta en sentido alguno a la entidad, no afecta el equilibrio económico del contrato y es de común acuerdo entre las partes se considera viable, pertinente y conducente.

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV, cuando aplique:

Valor contrato en SMLV:429.02
Valor máximo para adición en SMLV: 214,51

Valor adición solicitada en SMLV: N/A

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión solicito la aprobación de la modificación Prórroga del Contrato de compraventa 940 de 2023

Supervisor
JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

Apoyo a la Supervisión
FREDDY ALBERTO HERNANDEZ PAEZ
Profesional de Apoyo – CPS -296-2024

Proyecto: Anngie Alejandra Soto León - Contratista FDLSC - CPS 151-2024
Reviso Freddy Alberto Hernández Páez - Contratista FDLSC - CPS 296-2024
Proyectó: Maria Fernanda Gómez Cardona-Abogada CPS-360-2024
Revisó: Luz Nelly Carreño Pérez-Abogada CPS-252-2024
Aprobó: Jose Luis Parra - Contratista CPS-054-2024
