CONTRATO DE OBRA No. 377 DE 2023

OBJETO: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META"



INFORME MENSUAL DE OBRA No. 2

ETAPA II – EJECUCIÓN DE OBRA

31 DE ENERO DEL 2024

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

CONTROL DE CAMBIOS	
Objeto del Contrato:	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".
Tipo de Documento:	Informe Mensual de Obra No. 2
Etapa:	Ejecución de obra
Versión No.	01
APROBACIÓN	
Nombre:	ING. ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
Cargo:	Representante Legal CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023
Fecha:	31/01/2024
Firma:	
APROBACIÓN INTERVENTORÍA	
Firma:	

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 6
2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 7
3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 8
4 ASPECTOS TÉCNICOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 9
1.1 AVANCE EN TIEMPO 9
1.2 ACTAS GENERADAS 9
1.3 FORMA DE PAGO 10
1.4 CONTROL DE PÓLIZAS 12
1.4.1 PÓLIZAS INICIALES DEL CONTRATO 12
1.4.2 POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO 13
5 ALCANCE DEL PROYECTO 14
1.5 PRESUPUESTO DE OBRA 16
1.6 CRONOGRAMA DE OBRA 16
1.7 INFORME DE MANEJO AMBIENTAL 17
1.8 INFORME GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 17
1.9 PERMISOS Y/O LICENCIAS 17
6 AVANCE DE OBRA 18
6.1 PRESUPUESTO CANTIDADES EJECUTADAS 18
6.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 19
6.3 RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 24
7 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONAL DE OBRA 27
7.1 PERSONAL DIRECTIVO Y/O ADMINISTRATIVO 27
7.2 PERSONAL OPERATIVO 27
8 ASPECTOS LOGÍSTICOS 28
8.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O DIRECTIVO 28
8.2 INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS 28
9 CONCLUSIONES 29
10 ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO 30

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Información general del contrato. Fuente: Propia 7

Tabla 2 Actas generadas. Fuente: Propia 9

Tabla 3 Póliza inicial del contrato – De cumplimiento. Fuente: Propia 12

Tabla 4 Póliza inicial del contrato – Responsabilidad Civil Extracontractual. Fuente: Propia 13

Tabla 5 Pólizas contractuales actualizadas – De cumplimiento. Fuente: Propia 13

Tabla 6 Pólizas contractuales actualizadas - Responsabilidad civil extracontractual. Fuente: Propia 13

Tabla 7 Presupuesto - Cantidades ejecutadas mensual. Fuente: Propia 19

Tabla 8 Avance programado mensual. Fuente: Propia 24

Tabla 9 Avance mensual acumulado. Fuente: Propia 24

Tabla 10 Resumen de avance o atraso. Fuente: Propia 25

Tabla 11 Estado Financiero del Proyecto. Fuente: Propia 25

Tabla 12 Resumen estado financiero del proyecto. Fuente: Propia 25

Tabla 13 Flujo de desembolsos Orden 1 al 3 - Anticipo. Fuente: Propia 26

Tabla 14 Flujo de desembolsos Orden 4 al 6 - Anticipo. Fuente: Propia 26

Tabla 15 Resumen desembolsos anticipo. Fuente: Propia 26

Tabla 16 Relación seguridad social personal administrativo. Fuente: Propia 27

Tabla 17 Relación seguridad social personal operativo. Fuente: Propia 28

Tabla 18 Relación personal administrativo y/o directivo. Fuente: Propia 28

Tabla 19 Evidencia fotográfico - Avance de obra (Mes enero 2024). Fuente: Propia ... 30

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización geográfica general. Fuente: Propia 8

Ilustración 2 Localización del área a intervenir. Fuente: Propia..... 8

Ilustración 3 Implantación general del proyecto. Fuente: Propia 15

Ilustración 4 Resumen datos generales del presupuesto de obra. Fuente: Propia 16

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

1 INTRODUCCIÓN

El Municipio de Acacias-Meta mediante Decreto N° 001 del 01 de enero de 2022 y posesionado mediante Acta N° 002 del 04 de enero de 2022, delegado para celebrar contratos mediante el Decreto No. 257 del 31 de diciembre de 2014, y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.122.143.748 expedida en Acacias - Meta, en su calidad de representante legal del **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023** con NIT No. 901.699.813-1, conformado por las empresas BIMCON S.A.S identificada con NIT No. 901.253.373-6, con participación del 70% y por OMICRON DEL LLANO S.A.S, identificada con NIT No. 900.204.854-4, con participación del 30%, con domicilio principal e igualmente para efectos de notificaciones en la Carrera 14 No. 13 -76 Acacias, Meta, y quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, presentado dentro de la convocatoria el proceso de licitación obra pública en modalidad llave en mano No. OCA-LP-002-2023 cuyo objeto es "**ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META**", suscribiendo para ello el CONTRATO DE OBRA No. 377 del 2023 el día 10 de abril de 2023.

En el presente informe se describen las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido entre la fecha del 1 de enero hasta el 31 de enero del 2024, lo anterior con el fin de presentar el **INFORME MENSUAL No. 2** que hace parte de la ejecución de la Etapa II correspondiente a la Ejecución de Obra, en cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra N° 377 de 2023 suscrito con el Municipio de Acacias Meta, en donde esta segunda etapa a la presente fecha tiene un valor inicial contratado de ONCE MIL NOVECIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (**$11.912.622.964**).

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

En el siguiente cuadro se relacionan los aspectos más importantes del contrato de obra:

OBJETO DEL CONTRATO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META."
No. DE CONTRATO	377 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO POLICIA – ACACIAS 2023 NIT: 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
VALOR TOTAL INICIAL DEL CONTRATO	$12.575.546.216,00
VALOR ETAPA I DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$662.923.252,00
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	10 DE ABRIL DEL 2023
FECHA ACTA DE INICIO ETAPA I - ESTUDIOS Y DISEÑOS	27 DE ABRIL DEL 2023
PLAZO INICIAL ETAPA I – ESTUDIOS Y DISEÑOS	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA I – ESTUDIOS Y DISEÑOS	27 DE JUNIO DEL 2023
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ETAPA I – ESTUDIOS Y DISEÑOS	100%
VALOR INICIAL – ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRA	$11.912.622.964,00
FECHA DE INICIO ETAPA II - EJECUCIÓN DE OBRA	11 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL ETAPA II - EJECUCIÓN	24 DE MARZO DEL 2024
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ETAPA II – EJECUCIÓN DE OBRA	0.86%
PLAZO TOTAL INICIAL	DOCE (12) MESES SIN EXCEDER 24 DE MARZO DE 2024

Tabla 1 Información general del contrato. Fuente: Propia

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en el municipio de Acacias, departamento del Meta, el cual está ubicado en la llanura oriental, zona adyacente al piedemonte de la cordillera oriental, en la región Orinoquía.

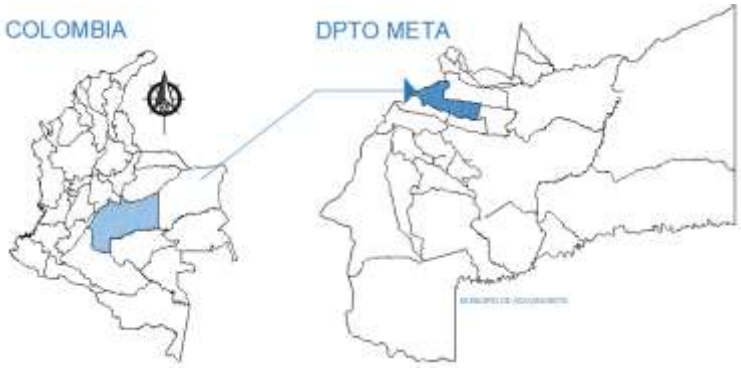


Ilustración 1 Localización geográfica general. Fuente: Propia

La zona en la cual se desarrolla el proyecto se encuentra ubicada en área urbana del Municipio de Acacias, específicamente frente a la plaza de mercado acacias centenaria sobre la carrera 41, en el predio denominado Lote A Escuela Carabineros, en el barrio San Isidro.

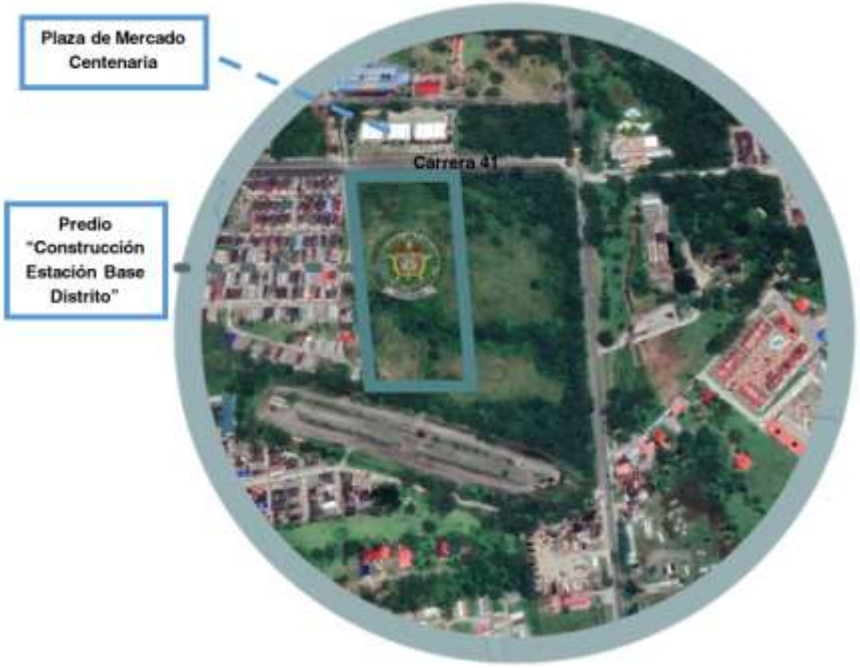


Ilustración 2 Localización del área a intervenir. Fuente: Propia

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

4 ASPECTOS TÉCNICOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

1.1 AVANCE EN TIEMPO

Se relacionan los avances en tiempo teniendo en cuenta el plazo de ejecución para la etapa en la que se encuentra el proyecto ETAPA II – EJECUCIÓN DE OBRA:

No. CONTRATO	PLAZO INICIAL CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO	FECHA INFORME MENSUAL No.	DIAS DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE TIEMPO TRANSCURRIDO
377 DE 2023	DIEZ (10) MESES	11-12-2023	31-01-2024	50 DIAS	18%

Nota: La fecha de inicio relacionada se establece teniendo en cuenta el oficio No. 0622 remitido por la Secretaría de Infraestructura en el ejercicio de sus funciones como supervisión del contrato, mediante el cual autoriza el inicio las actividades de obra; luego del cumplimiento de los requisitos establecidos para dar inicio y previa acta de aprobación por parte del Ministerio del Interior, con fecha del 11 de diciembre del 2023, documento que hace parte del presente informe como anexo.

1.2ACTAS GENERADAS

Desde la suscripción del contrato hasta la fecha de corte se han generado por parte del contratista, la interventoría y la supervisión las siguientes actas:

ACTA	FECHA
ANEXO 22 – ACTA DE ENTREGABLES ESTUDIOS Y DISEÑOS MINISTERIO DEL INTERIOR	20/11/2023
OFICIO No. 0622 – AUTORIZACIÓN INICIO ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRA	29/11/2023
VISITA PREVIA – INICIO DE OBRA	7/12/2023
INICIO ETAPA II - EJECUCIÓN DE OBRA	11/12/2023
ACTA - COMITÉ VIRTUAL DE SEGUIMIENTO No. 1	11/12/2023
ACTA - COMITÉ VIRTUAL DE SEGUIMIENTO No. 2	18/12/2023
ACTA - COMITÉ VIRTUAL DE SEGUIMIENTO No. 3	26/12/2023
ACTA – COMITÉ PRESENCIAL DE OBRA No. 1	15/01/2024
ACTA – COMITÉ VIRTUAL DE SEGUIMIENTO No. 4	18/01/2024
ACTA – COMITÉ PRESENCIAL DE SEGUIMIENTO No. 5	24/01/2024

Tabla 2 Actas generadas. Fuente: Propia

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

1.3 FORMA DE PAGO

ETAPA II – EJECUCIÓN DE LA OBRA:

UN ANTICIPO: Un anticipo equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total correspondiente a la etapa II de ejecución de la obra del Contrato Llave en mano, el anticipo que se concederá al CONTRATISTA, será para cubrir aquellas obligaciones que tienen relación directa con las obligaciones especiales que se involucran dentro de la etapa de ejecución de la obra del Contrato Llave en mano, es decir con la cabal ejecución del objeto contractual; La Entidad entregará el Anticipo bajo las siguientes condiciones:

El Anticipo se tramitará previa firma del Contrato Llave en mano, la aprobación de las Garantías exigidas en el Proceso de Contratación, suscripción del acta de inicio de la etapa de ejecución de la obra del Contrato Llave en mano.

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas, en ningún caso, a la entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del Anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de Anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo beneficiario sea EL Municipio de Acacias - Meta, el cual será vigilado por el Interventor. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el Anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del Anticipo corresponda a gastos del Contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del Anticipo aprobado. El costo de la comisión fiduciaria será asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del Contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el número, año del Contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de estos en la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del Contrato de Llave en mano, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del Anticipo.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

A. PAGOS MEDIANTE ACTAS PARCIALES:

El Municipio pagará al CONTRATISTA hasta acumular el OCHENTA POR CIENTO (80%) del valor correspondiente a la etapa II de ejecución de la obra del Contrato Llave en mano mediante la presentación de actas de cobro parcial de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el interventor, dichas actas corresponden al avance de obra del objeto contractual y deberán presentarse al Municipio.

El valor del acta parcial es el resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en la fecha a liquidar, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de Ajuste, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la interventoría, previa presentación de los siguientes documentos:

- Reconocimiento y pago
- Certificación de cumplimiento a satisfacción por la interventoría
- Informe de interventoría
- Informe del contratista con sus respectivos soportes:
  - ✓ Avance físico y financiero de cada una de las actividades programadas
  - ✓ Cantidades de obra ejecutadas,
  - ✓ Memorias de cálculo de cantidades de obra ejecutadas
  - ✓ Descripción de los problemas existentes, en caso de existir y las posibles soluciones.
  - ✓ Registro fotográfico con fecha y descripción
  - ✓ Copia de la bitácora de obra firmada
  - ✓ Resumen de las actividades realizadas
  - ✓ Relación del personal empleado en la ejecución de la obra, soportes de pago de seguridad
  - ✓ social y riesgos profesionales de todo el personal.
  - ✓ Ensayos de laboratorios
  - ✓ Informe del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, registro de capacitaciones, inducciones,
  - ✓ entrega de elementos de protección personal, informe y demás gestión relacionada con la
  - ✓ seguridad industrial y salud ocupacional de los trabajadores
  - ✓ Informe de inversión del anticipo y sus soportes
  - ✓ Informe Plan de Manejo Ambiental
  - ✓ Así como todos los demás determinados por la secretaria de Infraestructura
- Factura original o documento equivalente.

B. PAGO FINAL

La Entidad realizará al Contratista el último pago, equivalente como mínimo al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor correspondiente a la etapa II de ejecución de la obra del

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

Contrato Llave en mano a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción por parte de la Entidad, previa suscripción del acta de recibo y acta de liquidación aprobadas por el interventor designado y actualización de las pólizas correspondientes; no obstante, además se requerirán los mismos documentos actualizados y solicitados para las actas parciales.

Parágrafo 1. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

Parágrafo 2. Los desembolsos antes señalados en la forma de pago se realizarán con sujeción a los giros que realice al Municipio el Ministerio del Interior.

1.4 CONTROL DE PÓLIZAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el contrato de obra No. 377 de 2023:

1.4.1 PÓLIZAS INICIALES DEL CONTRATO

Póliza de Cumplimiento	CV-100032073		
Expedida por:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
Fecha de expedición	25/04/2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Cumplimiento	24/03/2023	24/09/2025	$2.515.109.243,20
Buen manejo del anticipo	24/03/2023	24/09/2025	$5.030.218.486,40
Prestaciones sociales	24/03/2023	24/03/2027	$628.77.310,80
Calidad del servicio	24/03/2023	24/03/2027	$1.257.554.621,00
Estabilidad de obra	24/03/2023	24/03/2029	$1.257.554.621,00

Tabla 3 Póliza inicial del contrato – De cumplimiento. Fuente: Propia

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	CV-100008254		
Expedida por:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
Fecha de expedición	24/03/2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Amparo básico – predios, labores y operaciones	24/03/2023	24/03/2024	$628.782.310,00
Patronal	24/03/2023	24/03/2024	$188.634.693,00
Contratistas y subcontratistas	24/03/2023	24/03/2024	$188.634.693,00
Vehículos propios y no propios	24/03/2023	24/03/2024	$188.634.693,00

Tabla 4 Póliza inicial del contrato – Responsabilidad Civil Extracontractual. Fuente: Propia

1.4.2 POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO

Póliza de Cumplimiento	CV-100032073		
Expedida por:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
Fecha de expedición	29/05/2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Cumplimiento	27/04/2023	24/09/2025	$2.515.109.243,20
Buen manejo del anticipo	27/04/2023	24/09/2025	$5.030.218.486,40
Prestaciones sociales	27/04/2023	24/03/2027	$628.77.310,80
Calidad del servicio	27/04/2023	24/03/2027	$1.257.554.621,00
Estabilidad de obra	27/04/2023	24/03/2029	$1.257.554.621,00

Tabla 5 Pólizas contractuales actualizadas – De cumplimiento. Fuente: Propia

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	CV-100008254		
Expedida por:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
Fecha de expedición	27/05/2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Amparo básico – predios, labores y operaciones	24/03/2023	25/03/2024	$628.782.310,00
Patronal	24/03/2023	25/03/2024	
Contratistas y subcontratistas	24/03/2023	25/03/2024	
Vehículos propios y no propios	24/03/2023	25/03/2024	

Tabla 6 Pólizas contractuales actualizadas - Responsabilidad civil extracontractual. Fuente: Propia

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

5 ALCANCE DEL PROYECTO

El contrato de obra No. 377 de 2023 cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META", tiene como alcance de acuerdo a lo contemplado durante la ejecución de la Etapa I – Estudios y Diseños, la construcción de una infraestructura policial categorizada como Distrito de Policía Tipo A con capacidad para 115 funcionarios (103 hombres + 12 mujeres), la cual a su vez se dispuso de conformidad con el "programa arquitectónico y cuadro de áreas mínimas de acuerdo a las instalaciones policiales" estipulado por la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional – DIRAF, resultando así las siguientes zonas:

Zona Administrativa: Es una estructura de dos niveles, en la cual se encontrarán las diferencias oficinas o dependencias que se requieren para el funcionamiento y operación del Distrito de Policía, así como también se dispondrá de una sala múltiple y zona de oratorio.

Zona Servicios y Celdas: Es una estructura de un nivel en la cual se encuentra las celdas para retenidos, zona de seguridad, bodega de intendencia, cuarto de máquinas y técnico para el componente eléctrico y RCI.

Zona Social: Es una estructura de dos niveles, en la cual se encontrará la cocina, comedor, despensas, lavado de vajillas, zona de ropas, zona de residuos cuarto de aseo, baños sociales para hombres y mujeres, zonas de tv y descanso, sala policafe y cafetería.

Zona Armerillo: Es una estructura de un nivel en la cual se encontrará el almacenamiento del armamento, como también el puesto de trabajo y habitación con baño para el armero.

Zona Alojamientos: Se proyectan 3 bloques para alojamientos colectivos, el primero de ellos para mujeres de un nivel con sus respectivos aparatos sanitarios, los dos restantes contarán con dos niveles y estos son destinados para hombres, de acuerdo a la capacidad para el tipo de instalación policial categorizada.

Zona Apartamento Fiscal: Es una estructura de un nivel con destinación para alojamiento del comandante y familiares al interior del Distrito de Policía.

Garitas y shut de basuras: Se proyecta una estructura de un nivel para la disposición final de los diferentes residuos que se generen en las instalaciones. Por otra parte, se disponen garitas de vigilancia de acuerdo a las especificaciones técnicas correspondientes al tipo de instalación policial categorizada.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

Urbanismo y Paisajismo: Se contemplan las áreas construidas descubiertas y obras exteriores tales como andenes, la plaza de formación, parqueadero para vehículos institucionales, visitantes, C.A.I. móvil, camión tipo NPR, motocicletas institucionales y de funcionarios, acceso vehicular, peatonal así mismo se tienen en cuentan las demás circulaciones internas y externas que integran según el diseño arquitectónico y paisajístico del proyecto.

Cerramiento Perimetral: Se contemplan dos tipos de construcciones siguiendo las recomendaciones generales para el diseño respecto a los niveles de seguridad para la instalación policial correspondiente donde se indica que deberá ser en ladrillo tolete o bloque macizo espesor de 20 a 25 cm altura 2 metros hasta longitud que se considere o recomiende y el restante se encerrará en cerca viva, donde su principal característica es brindar seguridad a la infraestructura total.



Ilustración 3 Implantación general del proyecto. Fuente: Propia

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

1.5 PRESUPUESTO DE OBRA

El presupuesto de obra detallado se conforma de los análisis de precios unitarios, los cuales son soportados teniendo en cuenta la Resolución No. 392 de abril 21 del 2023 de la Alcaldía Municipal de Acacías, por medio de la cual se adoptan y actualizan los listados de precios de referencias para la contratación de obras civiles en el Municipio, establecidos por Resolución 100-37-088 de 2023 de la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM. Así mismo, aquellos precios que no están contemplados dentro del listado se soportarán mediante estudio de mercado que a su vez se compone de 3 cotizaciones con precios del mercado.

Como también, dentro de este componente se relacionarán la discriminación del AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) que para el Municipio de Acacías corresponde a un 35%, las memorias de cantidades de obra y especificaciones técnicas de construcción para cada uno de los ítems que hacen parte integral del presupuesto de obra.

Una vez obtenida el acta de aprobación emitida el 28 de agosto del 2023 por parte de la Dirección Administrativa y Financiera – DIRAF, y el acta de aprobación emitida por el Ministerio del Interior el día 20 de noviembre del 2023, los cuales realizan la correspondiente verificación del Anexo 24 B – Entregables mínimos Estudios, Diseños y Construcción Estación de Policía, se obtiene el presupuesto de obra definitivo:

(4). VALOR TOTAL DE LA OBRA INCLUIDO A.I.U. DEL 35 %	$15.823.148.516,13
(5). VALOR TOTAL INTERVENTORIA DE OBRA	$1.208.099.229,61
(6). PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO TRÁNSITO	$44.230.989,72
(7). PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$76.502.537,38
(8). COSTO CERTIFICACION RETIE Y RETILAP	$44.589.391,01
(9). COSTO CERTIFICACION PUNTOS VOZ Y DATOS	$10.580.523,87
(10). VALOR TOTAL PROYECTO.	$17.207.151.187,72

Ilustración 4 Resumen datos generales del presupuesto de obra. Fuente: Propia

1.6 CRONOGRAMA DE OBRA

El cronograma de obra se desarrolla en Microsoft Project, teniendo en cuenta rendimientos, recursos, holguras e hitos de seguridad que permitan determinar el plazo de ejecución lo más cercano a la realidad de la obra. Adicional a ello, se presenta el flujo de caja en el cual se evidencia el comportamiento de los costos a lo largo del tiempo de ejecución de obra proyectado.

Como resultado de dicho cronograma, a la adición y prorroga solicitada mediante Oficio No. 44, se tiene que el plazo de ejecución de obra corresponde a once (11) meses con fecha proyectada de terminación al 31 de octubre del 2024.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

1.7 INFORME DE MANEJO AMBIENTAL

En este informe se establecen de manera detallada, las acciones que se implementaron para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo del proyecto, obra o actividad.

Nota: Este documento es un entregable que hace parte integral del desarrollo etapa II – Ejecución de obra del presente contrato, el cual será remitido mediante correo.

1.8 INFORME GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En este plan se establecen de manera detallada, las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo del proyecto, obra o actividad.

Nota: Este documento es un entregable que hace parte integral del desarrollo etapa II – Ejecución de obra del presente contrato, el cual será remitido mediante correo.

1.9 PERMISOS Y/O LICENCIAS

En cumplimiento de las obligaciones específicas estipuladas en la minuta del contrato, se presenta un informe en donde se hace la relación de permisos y licencias requeridas y/o aplicables para el desarrollo y ejecución del proyecto, las cuales se tramitaron ante las entidades competentes respectivamente:

Certificación para disposición final de escombros y material sobrante: Se presenta la solicitud ante la Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible del Municipio de Acacías, Meta con el fin de conocer el sitio autorizado para llevar a cabo el transporte de material sobrantes y/o escombros que resulten de las actividades de obra.

Dicha solicitud fue respondida con fecha del 28 de junio del 2023 mediante concepto técnico de relleno y nivelación, anexando a su vez el permiso para disposición de escombros y sobrantes en predio autorizado, como se evidencia en los anexos del presente informe mensual.

Licencia de construcción: El proyecto cuenta con **licencia de construcción** bajo la Resolución No. 377 del 29 de agosto del 2023 expedida por la Secretaría de Planeación y Vivienda, la cual se anexa como parte integral del presente informe.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

6 AVANCE DE OBRA

El avance obtenido en el mes de enero del 2024 se refiere a la realización de actividades tales como excavaciones, rellenos con su respectivo transporte y disposición correspondiente a la zona administrativa y alojamientos, con el fin de remover el material proveniente en el terreno que permita la conformación de los elementos estructurales para la cimentación de conformidad con los diseños del proyecto. Por otra parte, se inicia con el pedido del acero de refuerzo correspondiente para la cimentación de la zona administrativa y alojamientos con el fin de avanzar el proceso constructivo para la ejecución eficiente del proyecto.

Así mismo, se realiza la localización, replanteo y nivelación del bloque "Servicios Generales y Celdas", como también dando continuidad en el área de urbanismo general del proyecto. De esta manera, el porcentaje mensual de avance obtenido para el periodo del presente informe alcanza un 1.52% y el avance mensual acumulado corresponde a 2.34% del presupuesto actual del proyecto.

6.1 PRESUPUESTO CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRACTUAL	VALOR UNIT. INC. AIU	VALOR TOTAL	CANT. EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO
1.0	ZONA ADMINISTRATIVA							
1.1	PRELIMINARES							
1.1.1.	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	419.22	$ 6,620.62	$ 2,775,496.32	419.22	$ 2,775,496.32	100%
1.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS							
1.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0-2.00M INCLUYE CARGUE	M3	467.90	$ 113,807.32	$ 53,250,445.03	233.95	$ 53,250,445.03	100%
1.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO	M3	395.06	Z$ 48,905.05	$ 19,320,429.05	59.259	$ 19,320,429.05	100%
1.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	3674.06	$ 2,028.72	$ 7,453,639.00	1837.03	$ 7,453,639.00	100%
1.2.4	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	1684.44	$ 2,028.72	$ 3,417,257.12	842.22	$ 3,417,257.12	100%
1.4	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS							
1.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	43703.02	$ 11,120.63	$ 486,005,115.30	4370.302	$48,600,511.53	10%
2.0	ZONA DE SERVICIOS Y CELDAS							
2.1	PRELIMINARES							
2.1.1.	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	186.94	$ 6,620.62	$ 1,237,658.70	186.94	$ 1,237,658.70	100%
5.0	ZONA ALOJAMIENTOS							
5.1	PRELIMINARES							
5.1.1.	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	786.13	$ 6,620.62	$ 5,204,668.00	786.13	$ 5,204,668.00	100%
5.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS							
5.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0-2.00M INCLUYE CARGUE	M3	1016.88	$ 113,807.32	$ 115,728,387.56	508.44	$ 115,728,387.56	100%
5.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO	M3	779.54	$ 48,905.05	$ 38,123,442.68	389.77	$ 38,123,442.68	1000 %
5.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	7249.72	$ 2,028.72	$ 14,707,651.96	3624.86	$ 14,707,651.96	100%
5.2.4	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	3660.77	$ 2,028.72	$ 7,426,677.31	1830.385	$ 7,426,677.31	100%
5.4	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS							

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

5.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	47301.57	$ 11,120.63	$ 526,023,258.39	2365.0785	$26,301,162.92	5%
8.0	**URBANISMO Y PAISAJISMO**							
8.1	**PRELIMINARES**							
8.1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	2843.66	$ 6,620.62	$ 18,826,792.27	1279.647	$8,472,056.52	45%
8.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**							
8.2.1.	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0-2.00M INCLUYE CARGUE.	M3	1308.72	$ 113,807.32	$ 148,941,915.83	65.436	$7,447,095.79	5%
8.10	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**							
8.10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	120.39	$ 107,621.85	$ 12,956,594.52	120.39	$12,956,594.52	100%

Tabla 7 Presupuesto - Cantidades ejecutadas mensual. Fuente: Propia

6.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se relacionan las actividades de obra ejecutadas para el periodo del presente informe:

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
1.0	**ZONA ADMINISTRATIVA**							
1.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**							
1.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	467.90	233.95	233.95	$26,625,222.52	$ 53,250,445.03	100%
1.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	395.06	59.259	335.801	$2,898,064.36	$ 19,320,429.05	100%
1.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/ KM	3674.06	1837.03	1837.03	$3,726,819.50	$ 7,453,639.00	100%
1.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/ KM	1684.44	842.22	842.22	$1,708,628.56	$ 3,417,257.12	100%





Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

Se realizan trabajos de excavación en la zona correspondiente al bloque administrativo, se realiza su respectivo retiro de material excavado para proseguir con el suministro de relleno su seriado y compactación, para la respectiva conformación de los elementos de cimentación (zapatas).

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
1.0	ZONA ADMINSTRATIVA							
1.4	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS							
1.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	43703.02	0.00	4370.302	$48,600,511.53	$48,600,511.53	10%







Se realiza el pedido de acero de refuerzo correspondiente a las zapatas, con ello se da inicio a las actividades de armado, colocación y amarre del mismo.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
2.0	ZONA DE SERVICIOS Y CELDAS							
2.1	PRELIMINARES							
2.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	186.94	0.00	186.94	$ 1,237,658.70	$ 1,237,658.70	100%



De acuerdo con el levantamiento topográfico del predio, se determina la cota cero del proyecto para así limitar las áreas en este caso la zona de servicios generales y celdas, de esta manera se realiza el replanteo, localización y se determina el nivel de esta zona en el proyecto.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
5.0	ZONA ALOJAMIENTOS							
5.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS							
5.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	1016.88	508.44	508.44	$57,864,193.78	$115,728,387.56	100%
5.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	779.54	389.77	389.77	$19,061,721.34	$38,123,442.68	100%
5.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	7249.72	3624.86	3624.86	$7,353,825.98	$14,707,651.96	100%
5.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL	M3/KM	3660.77	1830.385	1830.385	$3,713,338.66	$7,426,677.31	100%

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

	DE ESCOMBROS Y SOBRANTES							




Se realizan trabajos de excavación en la zona de alojamientos, con su respectivo retiro de material excavado para proseguir con la respectiva conformación de los elementos de cimentación (zapatas).

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
5.0	ZONA ALOJAMIENTOS							
5.4	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS							
5.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	47301.57	0.00	2365.0785	$26,301,162.92	$26,301,162.92	5%




Se realiza el pedido de acero de refuerzo correspondiente a una parte de las zapatas, con ello se da inicio a las actividades de armado, colocación y amarre del mismo.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
8.0	URBANISMO Y PAISAJISMO							
8.1	PRELIMINARES							
8.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	2843.66	0.00	1279.647	$8,472,056.52	$8,472,056.52	45%



De acuerdo con el levantamiento topográfico del predio, se determina la cota cero del proyecto para así limitar las áreas en este caso del urbanismo general, de esta manera se realiza el replanteo, localización y se determina el nivel de esta zona en el proyecto.

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
8.0	URBANISMO Y PAISAJISMO							
8.2	PRELIMINARES							
8.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	1308.72	0.00	65.436	$7,447,095.79	$7,447,095.79	5%





Se realizan trabajos de excavación en la zona correspondiente al urbanismo del proyecto, con su respectivo retiro de material excavado.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT. CONTRATADA	CANT. ACUMULADA	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO
8.0	URBANISMO Y PAISAJISMO							
8.10	RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS							
8.10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	120.39	0.00	120.39	$12,956,594.52	$12,956,594.52	100%
 								
Se finaliza la instalación de la tubería de alcantarillado de 6", tramo que constituye la acometida del punto existente hacia el punto del proyecto.								

6.3 RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Se relacionan los avances en físico teniendo en cuenta las cantidades de obra ejecutadas para la Etapa II – Ejecución de obra y las programaciones semanales:

- ENERO 2024:

% PROGRAMADO MENSUAL	% EJECUTADO MENSUAL	ATRASO (-) O ADELANTO (+)
1.52%	1.52%	0%

Tabla 8 Avance programado mensual. Fuente: Propia

% PROGRAMADO MENSUAL ACUMULADO	% EJECUTADO MENSUAL ACUMULADO	ATRASO (-) O ADELANTO (+)
2.34%	2.34%	0%

Tabla 9 Avance mensual acumulado. Fuente: Propia

RESUMEN DE AVANCE O RETRASO	
DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total inicial – Etapa II Ejecución de obra	$11.912.622.964,00
Plazo de ejecución inicial	Diez (10) Meses

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

Valor total ajustado[1] – Etapa II Ejecución de obra	$15.999.051.958,11
Plazo de ejecución ajustado	Once (11) Meses
Valor ejecutado – Etapa II Ejecución de obra	$ 372.423.174,01
Porcentaje mensual ejecutado	1.52%
Porcentaje mensual acumulado ejecutado	2.34%

Tabla 10 Resumen de avance o atraso. Fuente: Propia

Para el mes de diciembre de 2023 se adelantó la elaboración y presentación del cobro correspondiente al anticipo destinado para la Etapa II – Ejecución de obra, en consecuencia, el único cobro realizado a la fecha es el correspondiente al cobro del anticipo por un valor de $4.765.049.185,60 equivalente al 40% del valor inicial del contrato.

VALOR PROYECTO INICIAL		$11.912.622.964,00	
VALOR PROYECTO AJUSTADO[1]		$15.999.051.958,11	
PAGOS REALIZADOS	VALOR	ACUMULADOS PAGOS REALIZADOS	
		$	%
ANTICIPO	$4.765.049.185,60	$4.765.049.185,60	40%

Tabla 11 Estado Financiero del Proyecto. Fuente: Propia

CONTRATO No. 377 DE 2023	VALOR	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$11.912.622.964,00	100%
VALOR DEL PROYECTO AJUSTADO[1]	$15.999.051.958,11	100%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 372.423.174,01	2.34%
VALOR POR EJECUTAR	$11.540.199.789,99	97.66%

Tabla 12 Resumen estado financiero del proyecto. Fuente: Propia

Por otra parte, se relacionan las ordenes de desembolsos y/o reembolsos gestionados ante la Fiduciaria para el periodo del presente informe, mediante las siguientes tablas de flujo:

No	DESCRIPCIÓN	VALOR ASIGNADO	%	ORDEN No. 1	ORDEN No. 2	ORDEN No. 3
1	Pago de subcontratos, salarios y	$1.584.378.664,96	35%	$412.808.177,00	$556.233.178,04	-

[1] *Nota: El valor del proyecto ajustado es resultado de la Etapa I – Estudios y Diseños, donde se evidenció que el valor inicial contratado no sería suficiente para contemplar componentes necesarios para la entrega integral y funcional de la instalación policial tales como el cerramiento perimetral, obras exteriores de urbanismo, aires acondicionados, dotación de closets para alojamientos colectivos, muebles altos y bajos para cocina del apartamento fiscal.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

	costos directos del personal					
2	Alquiler de equipos y maquinaria	$452.679.618,56	10%	-	-	-
3	Compra y transporte de materiales para la construcción	$2.489.737.902,08	55%	-	-	$400.000.000,00
TOTAL		$ 4.526.796.185,60	100%			

Tabla 13 Flujo de desembolsos Orden 1 al 3 - Anticipo. Fuente: Propia

No	DESCRIPCIÓN	VALOR ASIGNADO	%	ORDEN No. 4	ORDEN No. 5	ORDEN No. 6
1	Pago de subcontratos, salarios y costos directos del personal	$1.584.378.664,96	35%	-	-	-
2	Alquiler de equipos y maquinaria	$452.679.618,56	10%	-	-	-
3	Compra y transporte de materiales para la construcción	$2.489.737.902,08	55%	$500.000.006,00 La presente orden fue cancelada, sin alterar la continuidad en los consecutivos de las órdenes.	$81.920.000,00	$253.950.000,00
TOTAL		$ 4.526.796.185,60	100%			

Tabla 14 Flujo de desembolsos Orden 4 al 6 - Anticipo. Fuente: Propia

No	DESCRIPCIÓN	VALOR ASIGNADO	%	TOTAL DESEMBOLSO	SALDO	PORCENTAJE %
1	Pago de subcontratos, salarios y costos directos del personal	$1.584.378.664,96	35%	$969.041.355,04	$615.337.309,92	21.41%
2	Alquiler de equipos y maquinaria	$452.679.618,56	10%	$253.950.000,00	$198.729.618,56	5.61%
3	Compra y transporte de materiales para la construcción	$2.489.737.902,08	55%	$581.920.006,00	$1.907.817.896,08	10.65%
TOTAL		$ 4.526.796.185,60	100%	$ 1,704,911,355.04	$ 2,821,884,830.56	37.67%

Tabla 15 Resumen desembolsos anticipo. Fuente: Propia

De esta manera, se evidencia que se ha manejado al 37.67% del desembolso correspondiente al valor total del anticipo para el contrato No. 377 de 2023, según la

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

actualización de Apropiación Presupuestal que presentó para el desarrollo de las actividades contractuales, el presente flujo de desembolsos del anticipo se proporciona con el propósito de conservar una transparencia y claridad en la gestión de los recursos financieros relacionados, puesto que estos permiten contar con un musculo financiero y por consiguiente mantener en progreso las actividades de obra.

7 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONAL DE OBRA

El **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023** garantizó los respectivos pagos al sistema de seguridad social y parafiscales del personal profesional directivo, técnico administrativo y operativo, el cual describimos a continuación y se adjunta soporte de planillas del periodo de tiempo para el presente informe.

7.1 PERSONAL DIRECTIVO Y/O ADMINISTRATIVO

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL
1	Pedro Alexander Gutiérrez Aguilera	86.050.324	Director de obra	Sanitas	Protección	Positiva
2	Yubert Betancourt Cepeda	6.770.732	Residente de obra	Nueva EPS	Porvenir	Sura
3	Silvestre Ariza Angulo	9.527.938	Profesional en SST	Compensar	Colpensiones	Sura
S	Andres Camilo Guarnizo Rodríguez	1.122.128.596	Ingeniero ambiental	Salud Total	Porvenir	Sura
5	Juan Pablo Rodríguez Coronado	74.080.400	Especialista estructural	Sanitas	Porvenir	Sura
6	Jefferson Parra Capera	1.032.398.799	Ingeniero electricista	Sanitas	Colpensiones	Positiva
7	Jorge Eduardo Acosta Acosta	79.248.930	Especialista bioclimático	Compensar	Colpensiones	Sura

Tabla 16 Relación seguridad social personal administrativo. Fuente: Propia

7.2 PERSONAL OPERATIVO

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL
1	Luis Antonio Molina Castro	17.312.984	Maestro de obra	Cajacopi	Colpensiones	Sura
2	Emilse González	1.120.362.537	Ayudante de obra	Capital Salud	Colpensiones	Sura
3	Ricardo Castillo	1.124.994.764	Ayudante de obra	Medimás	Colpensiones	Sura
4	Luis Miguel Hernández	1.006.776.248	Ayudante de obra	Salud Total	Colpensiones	Sura
5	Julián Reyes	8.102.467	Ayudante de obra	Sanitas	Colpensiones	Sura

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

6	Fabian Andres Rey	1.122.118.780	Ayudante de obra	Capital Salud	Colpensiones	Sura
7	Richard Moreno	17.418.711	Ayudante de obra	Capital Salud	Colpensiones	Sura
8	Luis Antonio Piñeros	PPT5471061	Almacenista de obra	Sanitas	Porvenir	Sura
9	Vidal Fernando Bejarano Montenegro	18.224.618	Operario	Famisanar	Colfondos	Sura
10	Jhon Guillermo Ortiz Gutiérrez	79.252.022	Operario	Salud Total	N/A	Sura
11	Eduar Arbey Ortiz Parrado	86.078.482	Ingeniero Civil - Apoyo	Sanitas	Colpensiones	Sura

Tabla 17 Relación seguridad social personal operativo. Fuente: Propia

8 ASPECTOS LOGÍSTICOS

La relación del personal profesional administrativo a cargo de la subsanación a las observaciones presentadas por parte del Ministerio del Interior, son los que se relacionan a continuación:

8.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O DIRECTIVO

NOMBRE DEL PROESIONAL	CARGO	CANT.	DEDICACIÓN	MATRICULA PROFESIONAL
Pedro Alexander Gutiérrez Aguilera	Director de obra	1	50%	63202-82799 QND
Yuber Betancourt Cepeda	Residente de obra	1	100%	25202-103983 CND
Silvestre Ariza Angulo	Profesional en SST	1	100%	25228-77268 CND
Andres Camilo Guarnizo Rodríguez	Ingeniero Ambiental	1	100%	25238-325899 CND
Juan Pablo Rodríguez Coronado	Especialista estructural	1	20%	25202-262270 CND
Jefferson Parra Capera	Ingeniero Electricista	1	20%	CN205-68996
Jorge Eduardo Acosta Acosta	Arquitecto Bioclimático	1	30%	25700-63290 CND

Tabla 18 Relación personal administrativo y/o directivo. Fuente: Propia

8.2 INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS

La sede administrativa se encuentra ubicada en la carrera 14 No. 13 – 76 Barrio Centro del Municipio de Acacias - Meta. Es desde allí que se realiza la coordinación general del proyecto.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

9 CONCLUSIONES

- El avance de ejecución de obra alcanzado para el periodo de tiempo comprendido entre el día 1 de enero del 2024 y el día 31 de enero de 2024, con las actividades ejecutadas permiten evidenciar un avance mensual del 1.52% y un acumulado correspondiente a 2.34% mensual que representa un total ejecutado a la fecha de $372,423,174.01 del valor total actualizado del presupuesto para la Etapa II – Ejecución de obra.

  Dicho avance en general corresponde a las siguientes: continuación y finalización de excavaciones, rellenos y transportes correspondientes al bloque de la zona administrativa y alojamientos, así mismo se realiza el primer pedido de acero de refuerzo correspondiente para la cimentación administrativo, para con ello iniciar con el proceso de armado y colocación en el bloque administrativo. Además, se continua con la localización del urbanismo general del proyecto e inicia la localización, replanteo y nivelación de los bloques “servicios generales y celdas” y “social”.

  Aunado a esto, se culminan las adecuaciones pertinentes de logística como lo son puntos de hidratación, batería sanitaria, señalización de obra, punto ecológico, portón para control de acceso a la obra, de conformidad con las obligaciones como contratista.

  De esta manera, se espera que para el siguiente mes se avance en igual o mayor forma ya que se incluirá personal de obra que mejore el rendimiento, así como jornadas de trabajo extendidas en caso de requerir para mitigar las actividades que signifiquen rutas críticas, con el fin de cumplir con el porcentaje de avance programado.



ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
R/L CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023
NIT. 901.699.813-1

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

10 ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO








Tabla 19 Evidencia fotográfico - Avance de obra (Mes enero 2024). Fuente: Propia

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro
Acacías - Meta
3106731902 - 3165870320

CONTRATO DE OBRA No. 377 DE 2023

OBJETO: “ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META”



INFORME MENSUAL No. 2

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

31 DE ENERO DEL 2024

CONTROL DE CAMBIOS	
Objeto del Contrato:	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".
Tipo de Documento:	Informe Mensual SST No. 2
Etapa:	Ejecución de obra
Versión No.	02
APROBACIÓN	
Nombre:	ING. SILVESTRE ARIZA ANGULO
Cargo:	Profesional en SST
Fecha:	31/01/2024
Firma:	
APROBACIÓN INTERVENTORÍA	
Firma:	

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 7
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 8
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 9
4. ALCANCE DEL PROYECTO 10
5. OBJETIVO 12
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 12
7. ALCANCE Y RESPONSABILIDADES 13
8. GENERALIDADES DEL SG-SST 15
8.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL SGSST 15
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 20
11. GESTIÓN AMBIENTAL 23
12. CONTROL DE PERSONAL 25
12.1 Novedades de personal (ingreso, retiros, ausencias e incapacidades) 25
a. Relación de seguridad social dependiente ENERO 2024 25
b. Relación de seguridad social independiente 25
e. Retiro de personal dependiente 27
g. Ausentismos 27
13. REGISTRO FOTOGRÁFICO 28
13.1 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 29
13.2 GESTIÓN AMBIENTAL 31
14. ANEXOS 32
14.1 Formatos Inducción, charlas y capacitación 32
14.2 Formato Inspección de elementos de protección personal 32
14.3 Formatos Permisos de trabajo, general, ... 32
14.4 Formato MEDEVAC 32
14.5 Formato Inspección de botiquín y camilla 32
14.6 Formato Inspección de extintores 32
14.7 Formato ATS 32
14.8 Documentos Jhon Guillermo Ortiz Gutiérrez 32

14.9 Documentos Volqueta..... 32

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Información general del contrato 8

Tabla 2 Relación exámenes de ingreso. Fuente: Propia 16

Tabla 3 Relación de charlas preoperacionales SST. Fuente: Propia 17

Tabla 4 Relación de capacitaciones. Fuente: Propia 17

Tabla 5 Relación Permisos de Trabajo. Fuente: Propia 19

Tabla 6 Relación seguridad social - Personal de obra (Dependiente). Fuente: Propia .. 25

Tabla 7 Relación seguridad social - Personal Administrativo (Independiente). Fuente: Propia 26

Tabla 8 Relación seguridad social - Ingreso Personal Operativo. Fuente: Propia 27

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización geográfica general. 9

Ilustración 2 Localización del área a intervenir. 9

Ilustración 3 Implantación general del proyecto. Fuente: Propia 11

Ilustración 4 Punto ecológico. Fuente: Minambiente 25

1 INTRODUCCIÓN

El Municipio de Acacias-Meta mediante Decreto N° 001 del 01 de enero de 2022 y posesionado mediante Acta N° 002 del 04 de enero de 2022, delegado para celebrar contratos mediante el Decreto No. 257 del 31 de diciembre de 2014, y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.122.143.748 expedida en Acacias - Meta, en su calidad de representante legal del **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023** con NIT No. 901.699.813-1, conformado por las empresas BIMCON S.A.S identificada con NIT No. 901.253.373-6, con participación del 70% y por OMICRON DEL LLANO S.A.S, identificada con NIT No. 900.204.854-4, con participación del 30%, con domicilio principal e igualmente para efectos de notificaciones en la Carrera 14 No. 13 -76 Acacias, Meta, y quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, presentado dentro de la convocatoria el proceso de licitación obra pública en modalidad llave en mano No. OCA-LP-002-2023 cuyo objeto es "**ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META**", suscribiendo para ello el CONTRATO DE OBRA No. 377 del 2023 el día 10 de abril de 2023.

En el presente informe se describen las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido entre la fecha de inicio 1 de enero hasta el 31 de enero del 2024, lo anterior con el fin de presentar el **INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST No. 2** que hace parte de la ejecución de la Etapa II correspondiente a la Ejecución de Obra, en cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra N° 377 de 2023 suscrito con el Municipio de Acacias Meta, en donde esta segunda etapa a la presente fecha tiene un valor inicial contratado de ONCE MIL NOVECIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (**$11.912.622.964**).

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

En el siguiente cuadro se relacionan los aspectos más importantes del contrato de obra:

OBJETO DEL CONTRATO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META."
No. DE CONTRATO	377 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO POLICIA – ACACIAS 2023 NIT: 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
VALOR TOTAL INICIAL DEL CONTRATO	$12.575.646.216,00
VALOR ETAPA I DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$662.923.252,00
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	10 DE ABRIL DEL 2023
FECHA ACTA DE INICIO ETAPA I - ESTUDIOS Y DISEÑOS	27 DE ABRIL DEL 2023
PLAZO INICIAL ETAPA I – ESTUDIOS Y DISEÑOS	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA I – ESTUDIOS Y DISEÑOS	27 DE JUNIO DEL 2023
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ETAPA I – ESTUDIOS Y DISEÑOS	100%
VALOR INICIAL – ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRA	$11.912.622.964,00
FECHA DE INICIO ETAPA II - EJECUCIÓN DE OBRA	11 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL ETAPA II - EJECUCIÓN	24 DE MARZO DEL 2024
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ETAPA II – EJECUCIÓN DE OBRA	0.86%
PLAZO TOTAL INICIAL	DOCE (12) MESES SIN EXCEDER 24 DE MARZO DE 2024

Tabla 1 Información general del contrato
Fuente: Propia

3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en el municipio de Acacias, departamento del Meta, el cual está ubicado en la llanura oriental, zona adyacente al piedemonte de la cordillera oriental, en la región Orinoquía.

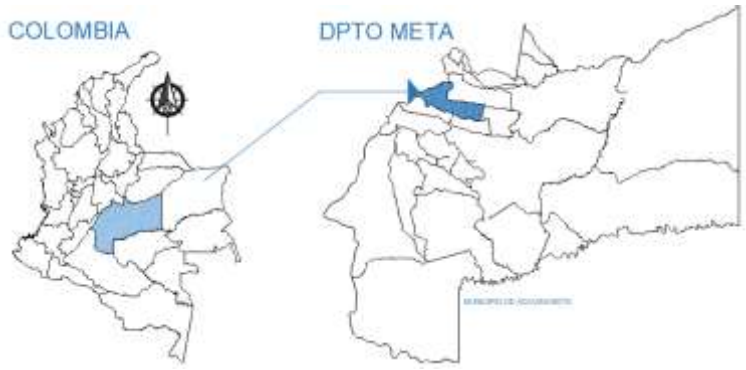


Ilustración 1 Localización geográfica general.
Fuente: Propia

La zona en la cual se desarrolla el proyecto se encuentra ubicada en área urbana del Municipio de Acacias, específicamente frente a la plaza de mercado acacias centenaria sobre la carrera 41, en el predio denominado Lote A Escuela Carabineros, en el barrio San Isidro.

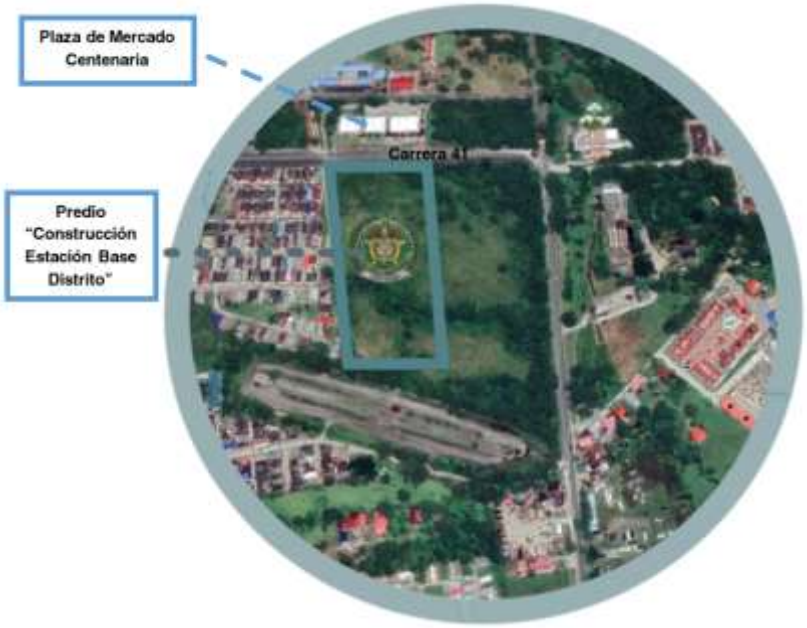


Ilustración 2 Localización del área a intervenir.
Fuente: Propia

4 ALCANCE DEL PROYECTO

El contrato de obra No. 377 de 2023 cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META", tiene como alcance de acuerdo a lo contemplado durante la ejecución de la Etapa I – Estudios y Diseños, la construcción de una infraestructura policial categorizada como Distrito de Policía Tipo A con capacidad para 115 funcionarios (103 hombres + 12 mujeres), la cual a su vez se dispuso de conformidad con el "programa arquitectónico y cuadro de áreas mínimas de acuerdo a las instalaciones policiales" estipulado por la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional – DIRAF, resultando así las siguientes zonas:

Zona Administrativa: Es una estructura de dos niveles, en la cual se encontrarán las diferencias oficinas o dependencias que se requieren para el funcionamiento y operación del Distrito de Policía, así como también se dispondrá de una sala múltiple y zona de oratorio.

Zona Servicios y Celdas: Es una estructura de un nivel en la cual se encuentra las celdas para retenidos, zona de seguridad, bodega de intendencia, cuarto de máquinas y técnico para el componente eléctrico y RCI.

Zona Social: Es una estructura de dos niveles, en la cual se encontrará la cocina, comedor, despensas, lavado de vajillas, zona de ropas, zona de residuos cuarto de aseo, baños sociales para hombres y mujeres, zonas de tv y descanso, sala policafe y cafetería.

Zona Armerillo: Es una estructura de un nivel en la cual se encontrará el almacenamiento del armamento, como también el puesto de trabajo y habitación con baño para el armero.

Zona Alojamientos: Se proyectan 3 bloques para alojamientos colectivos, el primero de ellos para mujeres de un nivel con sus respectivos aparatos sanitarios, los dos restantes contarán con dos niveles y estos son destinados para hombres, de acuerdo a la capacidad para el tipo de instalación policial categorizada.

Zona Apartamento Fiscal: Es una estructura de un nivel con destinación para alojamiento del comandante y familiares al interior del Distrito de Policía.

Garitas y shut de basuras: Se proyecta una estructura de un nivel para la disposición final de los diferentes residuos que se generen en las instalaciones. Por otra parte, se disponen garitas de vigilancia de acuerdo a las especificaciones técnicas correspondientes al tipo de instalación policial categorizada.

Urbanismo y Paisajismo: Se contemplan las áreas construidas descubiertas y obras exteriores tales como andenes, la plaza de formación, parqueadero para vehículos institucionales, visitantes, C.A.I. móvil, camión tipo NPR, motocicletas institucionales y de funcionarios, acceso vehicular, peatonal así mismo se tienen en cuentan las demás circulaciones internas y externas que integran según el diseño arquitectónico y paisajístico del proyecto.

Cerramiento Perimetral: Se contemplan dos tipos de construcciones siguiendo las recomendaciones generales para el diseño respecto a los niveles de seguridad para la instalación policial correspondiente donde se indica que deberá ser en ladrillo tolete o bloque macizo espesor de 20 a 25 cm altura 2 metros hasta longitud que se considere o recomiende y el restante se encerrará en cerca viva, donde su principal característica es brindar seguridad a la infraestructura total.



Ilustración 3 Implantación general del proyecto. Fuente: Propia

5 OBJETIVO

Describir el informe de actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado con el propósito de cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y técnicos, que permiten la protección de sus trabajadores al igual que la atención, satisfacción de las necesidades de nuestro cliente y mejoramiento continuo de la empresa.

6 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- **Acto subestándar o inseguro:** Todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo.
- **Alerta:** acciones específicas de respuesta frente a una emergencia.
- **Alta Dirección:** Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización.
- **Amenaza:** factor de origen natural que afecta a una comunidad ocasionando lesiones a sus integrantes e instalaciones
- **Capacitación:** conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en una empresa
- **Contingencia:** evento que puede suceder o no suceder, para el cual se debe estar preparado.
- **Control:** acción encaminada a eliminar o limitar el desarrollo de un siniestro, para evitar o minimizar sus consecuencias
- **Emergencia:** estado de alteración parcial o total de las actividades de una empresa, ocasionado por la ocurrencia de un evento que genera peligro inminente y cuyo control supera la capacidad de respuesta de las personas y organizaciones.
- **Exposición:** Acción de exponer a alguien o algo a los efectos de otros agentes lo cual depende de la cantidad de sustancia o dosis, tiempo de contacto y/o frecuencia.
- **Gestión:** Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
- **Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional:** Conjunto de acciones, programas y/o proyectos encaminados a controlar y mejorar la seguridad y salud en el trabajo.
- **Identificación:** Es la acción que permite reconocer los registros y relacionarlos con la actividad involucrada o el proceso del sistema que evidencian.
- **Información:** datos que poseen significado.

- **Manual del Sistema de Gestión:** Documento que especifica el Sistema de Gestión de una organización.
- **Objetivos:** Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad, medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo.
- **Políticas:** Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad, medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo, tal como se expresan formalmente por la alta dirección.
- **Proceso:** Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada en resultado.
- **SGSST:** Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- **SST:** Sigla que significa seguridad y salud en el trabajo
- **Peligro:** Fuente, situación o acto con potencial de daño, en términos de enfermedad o lesión a las personas, o a una combinación de éstos.
- **Riesgo:** Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s) y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es).
- **Requisito:** Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

7 ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.

Este informe aplica para todo el sistema de gestión y niveles de la organización con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de la entidad contratante y normatividad legal vigente encabeza de la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 entre otras actualizaciones vigentes.

Responsabilidades del Representante Legal:

- Asegurar que los recursos necesarios para las medidas de seguridad y el sistema de gestión estén disponibles.
- Asegurar que se establezcan la política y objetivos del sistema de gestión, y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización.
- Asegurar la integración de los requisitos del sistema de gestión con los procesos de negocio de la organización.
- Implementar las recomendaciones aquí previstas conforme a las condiciones y necesidades de cada uno de los proyectos; garantizando la continuidad de las actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas, autoridades,

personal de interventoría, supervisión y demás personas que estén presentes en los frentes de obra u operación de los proyectos.

- Promover el enfoque a procesos, a la mejora continua y el pensamiento basado en riesgos.
- importancia de una gestión eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión.
- Asegurar de que el sistema de gestión logre los resultados previstos.
- Liderar el desarrollo e implementación de los sistemas de gestión comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión.
- Asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión.
- Apoyar otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.
- Informar al responsable e inspector del SG-SST todo cambio a nivel estructural, físico o actividades que se realicen en los diferentes procesos.

Responsabilidades del Profesional en SST:

- Diseñar, administrar y ejecutar el sistema de gestión de la empresa.
- Identificar los peligros, evaluar los riesgos las actividades de trabajo
- Actualizar la matriz de peligros, establecer medidas de control en conjunto con las áreas y procesos de la organización.
- Realizar seguimiento a los planes de acción.
- Asesorar a la Gerencia en la implementación del sistema de gestión, así como la intervención y prioridad para la prevención y control de los riesgos.
- Verificar que se cumplan las medidas preventivas y correctivas establecidas en los resultados de las inspecciones de seguridad
- Solicitar el acompañamiento de la ARL para verificar el cumplimiento de las medias y acciones adoptadas en su proyecto.
- Reportar cualquier evento de contagio que se presente dentro del desarrollo de las actividades de obra, operación y mantenimiento.

Responsabilidades de los colaboradores y partes interesadas:

- Cumplir todos los procedimientos del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo establecidos por el CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023.

- Informar al **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023** sobre cualquier condición de salud que pueda generar restricciones, antes de realizar cualquier tipo de trabajo.
- Utilizar las medidas de prevención y protección sean implementadas por **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023**.
- Reportar oportunamente peligros detectados en el área de trabajo por medio del reporte de actos y condiciones inseguras.
- Participar activamente en las actividades del sistema de gestión en las cuales se vean involucrados.
- Reportar al responsable o inspector del SG-SST todas las condiciones inseguras que identifique al realizar su labor y en el entorno en que se desarrolla en relación contaminación biológica.
- El residente, maestros y ayudantes de obra son responsables de cumplir las directrices descritas en el presente informe y recomendaciones del encargado del SG-SST.

8 GENERALIDADES DEL SG-SST

Consciente de la importancia de la seguridad y salud en el Trabajo SST y consecuente con la reglamentación legal existente en el país, el **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023** en cabeza de su representante legal, asume la responsabilidad de la planeación y ejecución de las actividades del presente Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo SGSST; con el objetivo de brindar las mejores condiciones de salud y de trabajo, para el buen desempeño de sus colaboradores y partes interesadas.

El presente documento corresponde al informe mensual de las actividades desarrolladas y aplicadas a los colaboradores en materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la normatividad en materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), como lo son la ley 9 de 1979, resolución 1016 de 1983, resolución 2413 de 1979, la resolución 2400 de 1979, decreto No. 1295 de 1994, ley 1262 de 2012, decreto 1072 de 2015; Resolución 0312 de 2019 entre otros.

1.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL SGSST

Con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores en sus puestos de trabajo como medidas de control el sistema de gestión de seguridad y salud

en el trabajo en el periodo del **1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2024** se realizaron las siguientes actividades:

a. **Exámenes de Ingreso**

Teniendo en cuenta los peligros, tareas, exigencias físicas y condiciones de trabajo a los cuales estarán expuestos los diferentes colaboradores y en cumplimiento a la Resolución número 2346 de 2007 antes de su incorporación a la empresa, los aspirantes son remitidos para la toma del examen médico de aptitud laboral de ingreso, en el periodo del **1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2024,** se registraron los siguientes ingresos de personal**:**

FECHA DE INGRESO	PERSONAL INCORPORADO	CLASE
12-01-2024	1-SISO	DEPENDIENTE
15-01-2024	1-ALMACENISTA	DEPENDIENTE
23-01-2024	6-OPERARIOS	INDEPENDIENTES

Tabla 2 Relación exámenes de ingreso. Fuente: Propia

b. **Inducción de Personal**

Una vez vinculado el nuevo trabajador inicia la etapa de inducción a la empresa, puesto de trabajo, así como los riesgos asociados a las actividades a realizar y las directrices del sistema de gestión de la SST, para ello se realizan charlas personalizadas con el personal antes de su ingreso e inicio de labores, dejando constancia de estas (Ver anexo formato inducción).

En el periodo**,** se realizó inducción a personal operativo que ingresó quienes recibieron información de los siguientes temas:

- Obligaciones frente al sistema de gestión SST.
- Uso de Elementos de Protección Personal.
- Riesgos asociados a la actividad de la construcción.

c. **Charlas Pre operacionales y Pausas Activas**

Enfatizadas en mitigar, controlar y prevenir los accidentes e incidentes de trabajo; previo al desarrollo e inicio de labores mediante charlas de seguridad diarias con una duración

de 5 minutos se dan conocer diferentes temas en materia de seguridad y salud en el trabajo que hacen parte del programa de capacitaciones.

De igual manera se desarrollaron ejercicios de Calistenia y estiramiento antes de iniciar labores que ayudan a reducir la fatiga laboral, a prevenir lesiones o trastornos osteomusculares, a los colaboradores.

En estas actividades asistió el personal operativo (de la cual se deja registro de asistencia diaria (Ver anexo control de asistencia).

FECHA DE CHARLA	TEMA	N° PARTICIPANTES
11-01-2024	INDUCCION-SST	9
12-01-2024	RIESGOS LOCATIVOS	9
13-01-2024	USO DE EPP	12
15-01-2024	SEGURIDAD Y RIESGOS	10
16-012024	POLITICAS SST	7
17-01-2024	PROTECCION- CABEZA	12
18-01-2024	RIESGOS NATURALES	7
19-01-2024	PROTECCION DE OJOS	11
20-01-2024	RIESGO FISICO	11
22-01-2024	PROTECCION FACIAL	13
24-01-2024	SEGURIDAD VIAL	10
26-01-2024	AUTOCUIDADO, PROTECCION DEL CUERPO	12

Tabla 3 Relación de charlas preoperacionales SST. Fuente: Propia

d. Capacitación

Se realiza una reunión con el personal de obra con el fin de reforzar los conocimientos en seguridad y salud en el trabajo haciendo énfasis en promover la salud, detectar riesgos y prevenir accidentes laborales.

FECHA DE CAPACITACION	TEMA	N° PARTICIPANTES
27-01-2024	PLAN DE EMERGENCIAS	13

Tabla 4 Relación de capacitaciones. Fuente: Propia

Registro de asistencia (ver anexo control de asistencia).

e. Entrega y cambio de dotación o elementos de protección individual

Conforme al Art.230 SUMINISTRO DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR del CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Artículo 2.2.1.4.2. Favorabilidad respecto a la dotación de calzado y vestido y Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control, Literal 5 del DECRETO 1072/2015.

Se revisa el suministro por parte del contratista a sus operarios la dotación del vestido y el calzado necesario para el normal desarrollo de las labores de trabajo.

f. Inspección de dotación Elementos de protección personal mensual

Se realiza la correspondiente inspección semanal a los elementos de protección individual entregado al personal de la obra, dicha inspección fue realizada en el formato "Inspección de dotación y elementos de protección personal (EPP'S)" por el inspector de seguridad y salud en el trabajo quien a través de observación directa verifica las condiciones y estado de estos que permitan garantizar la seguridad para los colaboradores en el desarrollo de las actividades. (Ver Anexo Inspección de EPP).

g. Instalación e Inspección de botiquín y equipos de emergencia

Garantizando las actividades tendientes a prestar la primera atención o primeros auxilios a los trabajadores en caso de accidentes e incidentes de trabajo o eventualidades de emergencias, se realizó la instalación de un botiquín tipo b con su respectiva dotación, equipo contra incendios (Extintor), una camilla rígida tipo Fel.

Se realiza la correspondiente inspección mensual al botiquín y equipos de emergencia asignados a las instalaciones de la obra, dicha inspección fue realizada en el formato correspondiente por el inspector de seguridad y salud en el trabajo quien verifica las condiciones, vigencia, orden y aseo que permitan garantizar la utilidad de estas a la hora de prestar la primera atención o primero auxilios a los trabadores en caso de accidentes e incidentes de trabajo o eventualidades de emergencias. (Anexo formato de inspección de extintor, botiquín y camilla).

h. Análisis de Trabajo Seguro - ATS

Los ATS se realizarán semanal o diariamente para analizar los riesgos y peligros a los cuales pueden estar expuestos los trabajadores en las actividades no rutinarias y rutinarias, se realizarán inspecciones en los diferentes puestos de trabajo, inspección de equipos, elementos de protección personal entre otros, que servirán como insumo para para implementar medidas de control para minimizar y prevenir los accidentes e incidentes de trabajo.

En el periodo se realizaron **DOS (02)** ATS's, debido a las actividades recurrentes. (Anexo formatos ATS).

i. Permisos de trabajo

Dependiendo de la complejidad de las actividades en conjunto identificamos, verificamos y autorizamos las diferentes tareas en obra con el fin de tener claro los riesgos y peligros a los cuales están expuestos, así mismo se informa la viabilidad, suspensión o culminación de la actividad, así mismo se recomienda el uso de elementos de protección adecuados y correctos para dicha tarea y las medidas de control para cada actividad.

En el periodo se formalizaron **los siguientes** permisos de trabajo (anexo formatos permisos de trabajo)

TIPO DE PERMISO	FECHA	CANTIDAD
TRABAJO ELECTRICO	11-01-2024	1
TRABAJO DE EXCAVACION	10-0-2024 AL 12-01-2024	1
TRABAJO GENERAL	09-0-1-2024 AL 13-0-1-2024	1
TRABAJO EN ALTURA	18-01-2024	1
TRABAJO GENERAL	15-01-2024 AL 2001-2024	1
TRABAJO DE EXCAVACION	15-01-2024 AL 20-01-2024	3
TRABAJO EN ALTURA	23-01-24	1
TRABAJO GENERAL	23-01-2024 AL 24-01-2024	1
TRABAJO DE EXCAVACION	22-01-24 AL 27-01-2024	1
TRABAJO GENERAL	22-01-24 AL 27-01-24	1

Tabla 5 Relación Permisos de Trabajo. Fuente: Propia

j. Actualización del MEDEVAC

Para ello se realiza la recolección de información y datos básicos del personal tales como nombres y apellidos, número de documento de Identidad, Numero de celular del trabajador, tipo de sangre, número de teléfono y contacto de un familiar en caso de eventualidad; esta información reposa en los registros informativos que están ubicadas en el campamento en obra. (Ver anexo MEDEVAC)

k. Señalización y demarcación de áreas de trabajo

Como medida preventiva y teniendo en cuenta las condiciones locativas de la obra se realiza la ubicación de señalización a fin de prevenir a los usuarios sobre la existencia de riesgos o situaciones especiales en la vía o en las zonas aledañas, de igual manera se restringe el paso de personal, se realiza la señalización de zonas de intervención a fin de evitar accidentes y eventualidades con la comunidad.

9 PLAN MANEJO DE TRANSITO

Con este plan de manejo de Transito se da cumplimiento al Decreto 145 de 2015, y al capítulo 4 “MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL 2015”, con el cual se dispone la siguiente reglamentación para el manejo del tránsito vehicular y peatonal permitiendo lograr al máximo la reducción de los niveles de tráfico vehicular actual que presenta la vía, la cual se verá afectada quizás por la presencia de los vehículos de carga.

En los siguientes numerales se describen las características principales que se implementaron por el mes de enero:

9.1 CIERRE DE VIAS

Se hace cierre parcial de la vía de acceso a la obra para dar entrada a los equipos tipo maquinaria pesada para realizar de terraceo y descapote del predio.

Para cumplir con el PMT se implementaron las siguientes actividades para el control de ingreso y salida de la maquinaria:

- Señalización del punto de acceso a la obra para que sea conocimiento general y se designó para dirigir el trafico para garantizar el bienestar de los transcendentes y el personal de obra.

9.2 MANEJO Y DESVIO DE PEATONES:

De acuerdo a las actividades programadas la cual se intervino dentro del previo y el tráfico de vehículos y el tráfico de peatones, no fue necesario la implementación de la señalización.

9.3 MANEJO Y DESVIO TRANSPORTE PUBLICO:

Se plantea esta opción, pero el flujo vehicular es minino por el área, no se implementó ninguna actividad.

9.4 MANEJO Y DESVIO DE TRANSPORTE PARTICULAR:

Durante el ingreso y salida de los vehículos de maquinaria pesada se realizo un control con una persona asignada para asegurar el flujo de vehículos particulares que es relativamente bajo.

9.5 MANEJO Y DESVIO DE TRANSPORTE DE CARGA:

Se realizó el control y seguimiento de personal contratista de maquinaria pesada de las cuales ingresaron al área de construcción del CONSORCIO POLICIA – ACACIAS 2023, durante el desarrollo de las actividades realizadas se llevaron las siguientes acciones y medidas:

- Supervisión al ingreso del operario y maquinaria constatando su documentación.
- Realización de inducción y compromiso con el sistema de SST.
- Compromiso de asistir obligatoriamente a las charlas de seguridad, previo al inicio de las actividades
- Realización de permisos de trabajo.

A continuación, se enuncian los equipos que intervinieron en el periodo:

a. Nombre de Equipo: Retroexcavadora
   Tipo. Construcción
   Línea: 410J
   Marca: JHON DERE
   MODELO: 2009
   Actividades realizadas: Terraceo y nivelación del área de construcción, realización de excavación para zapatas.
   Para estas actividades se realizaron rutinas de supervisión en el cumplimiento de la seguridad, en el ingreso de la máquina y en las actividades implementando la respectiva señalización de las áreas.

b. Nombre de Equipo: MIXER
Tipo: Mixer
Marca: Mack
Actividades realizadas: Transporte y descargue de concreto para área de construcción zapatas.
Se realiza rutinas de supervisión en el cumplimiento de la seguridad, en el ingreso de la máquina y en las actividades, aislando el área de trabajo

Se anexan evidencias fotográficas:

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
</table>

10 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Durante el periodo del **01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2024** se presentaron las siguientes actividades complementarias:

- ✓ Se realiza inducción y recorrido a personal nuevo.
- ✓ Se realizan inspecciones de todas las áreas de la obra para mirar los puntos que se deben tener en cuenta para señalización.
- ✓ Se continúa organizado el cierre perimetral con el fin de evitar eventualidades como medida de prevención garantizando la seguridad de los peatones y visitantes.
- ✓ Se realizan inspecciones diarias de las excavaciones manuales, garantizando la seguridad de los trabajadores.
- ✓ Garantizando el bienestar de los colaboradores se instala un punto de hidratación.
- ✓ Al finalizar cada jornada de trabajo se hace una limpieza general y cada vez que se requiera se recogerán los desperdicios o basura presentes en el sitio de obra y se disponen en las canecas para el manejo de los residuos comunes.

11. PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

El **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023** contará con un plan de respuesta ante emergencias, que ofrecerá los lineamientos de actuación para atender las posibles emergencias que se puedan presentar en el desarrollo de sus actividades.

- **Punto de encuentro**

Se cuenta con un punto de encuentro totalmente identificado por todos los colaboradores del que han recibido el aviso de evacuación en su zona.

- **Rutas de evacuación y salida de emergencia**

Con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores y evitar eventualidades como medida de prevención los ayudantes de administración realizan la instalación de la Señalización y demarcación de las diferentes áreas críticas de trabajo y respectiva ruta de evacuación.

12. GESTIÓN AMBIENTAL

- Jornada de Aseo

Se realizan jornadas de aseo semanal y clasificación de materiales, las cuales se desarrollan al inicio y final de las labores, limpieza y adecuación de bodega de almacenamiento de materiales a fin de garantizar y mantener en buenas condiciones las diferentes locaciones de la obra.

Se cuenta con un punto Ecológico en los dos frentes de obra, con la finalidad de mantener un buen manejo de residuos y así promover el orden y aseo en obra, dando a conocer a los trabajadores la ubicación del punto y brindándoles la información sobre el buen manejo y separación de residuos de obra.

- Disposición de residuos

Se realiza semanalmente jornadas de orden y aseo, cuya finalidad fue recoger los residuos que encontramos en la obra, tales como (papel de cemento, geotextil dañado, cinta de señalización dañada, botellas plásticas).

Se clasificarán los residuos domésticos, industriales y especiales, los residuos son llevados a un lugar o punto ecológico para que sean dispuestos por la empresa prestadora del servicio del municipio.

El punto ecológico es la zona especial claramente demarcada y señalizada, para incentivar, motivar y sensibilizar a las personas a actuar responsablemente en la separación en la fuente de todos los residuos sólidos que producen.

Con la unificación del código de colores a nivel nacional, la separación de residuos en la fuente será más fácil, los colores a usar serán los mismos. Los colores son:

- **Blanco:** residuos aprovechables limpios y secos, como plástico, vidrio, metales, papel y cartón.
- **Negro:** residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros. En esta bolsa o recipiente también deberán disponerse los residuos COVID-19 como tapabocas, guantes, entre otros.
- **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín, etc.



Ilustración 4 Punto ecológico. Fuente: Minambiente

13. CONTROL DE PERSONAL

a. Novedades de personal (ingreso, retiros, ausencias e incapacidades)

a. Relación de seguridad social dependiente ENERO 2024

#	NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL
1	Patrocinio Vásquez Ruiz	17328844	Ejero	Salud total	Colpensiones	Sura
2	Luis Antonio Molina Castro	17312984	Maestro	Cajacopi	Colpensiones	Sura

Tabla 6 Relación seguridad social - Personal de obra (Dependiente). Fuente: Propia

b. Relación de seguridad social independiente

#	NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL
1	Yuber Betancourt Cepeda	6770732	Ingeniero Residente	Nueva EPS	Porvenir	Sura
2	Eduar Arbey Ortiz	86078482	Ingeniero Auxiliar	Sanitas	Colpensiones	Colpatria
3	Vidal Fernando Bejarano Montenegro	18224618	Operario Volqueta	Famisanar	Colfondos	Sura

4	Jhon Guillermo Ortiz Gutiérrez	79252022	Operario Retro	Salud Total	Ninguna	Sura
5	Robinson Escobar Daza	1123512948	Topógrafo	Nueva EPS	Ninguna	Colfondos
6	Luis E. Benavides	19416407	Topógrafo	Sanitas	Ninguna	Sura
7	Silvestre Ariza Angulo	9527938	Profesional SST	Compensar	Colpensiones	Colpatria

Tabla 7 Relación seguridad social - Personal Administrativo (Independiente). Fuente: Propia

c. Ingresos dependientes

#	NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	EPS	ARL	AFP
1	Emilse Eugenia Gonzales Martin	1120362537	Ayudante	Capital Salud	Sura	Porvenir
2	Ricardo Castillo Arango	1124994764	Ayudante	Famisanar	Sura	Porvenir
3	Luis Miguel Hernández Pedraza	1006776248	Ayudante	Salud Total	Sura	Porvenir
4	Yulian Andrés Reyes	8102467	Ayudante	Sanitas	Sura	Colpensiones
5	Fabian Andres Rey Niño	1122118780	Ayudante	Capital Salud	Sura	Porvenir
6	Richard Moreno Guiza	17418711	Ayudante	Capital Salud	Sura	Colfondos
7	Luis Antonio Piñero Pino	PPT 5471061	Almacenista	Sanitas	Sura	Porvenir
8	Brayan Alexis Ruiz Rodríguez	1122142788	Ayudante	Famisanar	Sura	Protección
9	Luis Fernando Daza Cubillos	93461815	Ayudante	Famisanar	Sura	Protección
10	Fabian Andrés Castillo Villar	1001271237	Ayudante	Famisanar	Protecciones	Sura
11	Orlando Barrera	4272180	Oficial	Famisanar	Colpensiones	Sura

Tabla 8 Relación seguridad social - Ingreso Personal Operativo. Fuente: Propia

d. Ingresos independientes

No se presentaron ingresos independientes en el periodo.

e. Retiro de personal dependiente

1- Gilbert Adonias Prieto Castillo
2- Daniel Felipe Méndez Santos
3- Víctor Andres Pérez Santos

f. Retiro de personal independiente

No se presentaron retiros de personal independiente durante el periodo.

g. Ausentismos

Enfermedad General

No se presentaron casos por enfermedad general de origen común.

Accidente trabajo

No se presentaron casos por accidente de trabajo en el periodo.

Enfermedad Profesional

No se presentaron casos de enfermedades profesionales en el periodo.

14.REGISTRO FOTOGRÁFICO

INDUCCIONES

Se realizan inducción de acuerdo a los ingresos de personal.

CHARLA - CALISTENIA	
	
Se realizan inducción de acuerdo a los ingresos de personal.	

SEÑALIZACION SST	
	
La señalización como herramienta extremadamente útil la cual puede evitar accidentes, se mantienen las áreas debidamente señalizadas y divulgadas a todos los colaboradores y se educa para que las cuiden y no las retiren.	

14.1 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

ESTACIÓN DE EMERGENCIA	
	
El **CONSORCIO POLICIA - ACACIAS 2023** cuenta con un punto de primeros auxilios el cual contiene camilla, botiquín de primeros auxilios.	

LABORES SEGURAS Y OPERARIOS CON SUS EPP	
	
	
	
Se realizan las diferentes actividades de obra programadas de manera segura y en cumplimiento con la implementación de los respectivos EPP.	

b. GESTIÓN AMBIENTAL

PUNTO ECOLÓGICO

Se realiza aseo dejando la obra totalmente limpia, así mismo se clasifican residuos aprovechables y los de disposición final.

SILVESTRE ARIZA ANGULO

INGENIERO INDUSTRIAL

M.P. 25228-77268

ESP. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LICENCIA No. 3902 del 14/08/2020 SDS

15.ANEXOS

24.1 Formatos Inducción, charlas y capacitación
24.2 Formato Inspección de elementos de protección personal
24.3 Formatos Permisos de trabajo, general,
24.4 Formato MEDEVAC
24.5 Formato Inspección de botiquín y camilla
24.6 Formato Inspección de extintores
24.7 Formato ATS
24.8 Documentos Jhon Guillermo Ortiz Gutiérrez
24.9 Documentos Volqueta

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CAPACITACION - INDUCCION

CIUDAD:	AREA/CENTRO DE TRABAJO:	C-I-R. No.
ACACIAS	11 de enero 2023	01

TEMA DE CAPACITACION: CHARLA - Inducción. SST

C.C./NIT: 9527928

NOMBRE ESPOSITOR: Silvestre Anjo

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y/COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	FIRMA
Luis A Mojica	17312995	Sura	C.Cop.	
Patrocinio Vasquez	1233288811	sura	sura	
Orlando Barrera	4272180	sura	Coomeva	
Andres Castillo	1001271237	sura	Famisanar	
Juan B Ortiz	79.252022	Sura	Salud Total	
Luis E. Benavides	19416407	Sanitas		
Robinson Escobar Parra	1123512148	Cafesalud	P. EPS	
Luis A. Molina Lorc.	1121 EC8163.	SURA		
Robinson Prieto	17266471	Sura	Saluco	

Silvestre Anjo — NOMBRE EJECUTOR — FIRMA — 9527928 — CEDULA

NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA — FIRMA — CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CAPACITACION - INDUCCION - 9CAP

CIUDAD:	Acacias 12-01-24	AREA/CENTRO DE TRABAJO:	Consorcio policia	C-I-R. No.	02
TEMA DE CAPACITACION	Charla RIESGOS LOCATIVOS	C.C./NIT:	1006558861	NOMBRE ESPOSITOR:	Valentina Vanegas

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	FIRMA
Luis Antonio Mora	17.319.984	Sura	Coosalud	
Robinson Escobar Ruiz	1123512948	Sura	N. EPS	
Luis E. Bejarano	1941640?	sanitas	EPS.	
Jhon G Ortiz	79232022	salud total	sura	
Carlos Pinillos	17413396	Electrica	MEPS	
Ricardo Ramos R.	17.411.825	Riesgos	S. Total	
Nestor Yamid Urquina O	1062623164	Electricidad	Salud	
Luis A. Nuñez	1121 SIEIGS	SURA	" "	
[illegible]	1122133044	SURA	[illegible]	

Silvestre Anaya — NOMBRE EJECUTOR

FIRMA

9527978 — CEDULA

NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA

FIRMA

CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CAPACITACION - INDUCCION - 9CAP

CIUDAD:	Acacias - 13-01-24	AREA/CENTRO DE TRABAJO:	consorcio policia	C-I-R. No. 03
TEMA DE CAPACITACION: USO EPP.		C.C./NIT: 1006558861	NOMBRE ESPOSITOR: SISO	

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	FIRMA
Luis A. Molina	17319784	Sura	P. Cap.	
Andres Castillo	1001271237	Suya	E. Salud	
Orlando Barrera	4272180	Sura	Famí	
[illegible]	7333xsura	ORIGINAL		
Jhon G Ortiz	79251022	Sura	Salud Total	
Robinson Escobar Dura	1123512948	Sura	N.EPS	
Luis E. Benavides	1941640 7	Sanitas	SURA	
Edwar Arley Ortiz Parra	86078482	Axa Colp.	Sanitas	
Miguel Angel Giraldo Montes	1121917353		N. EPS	
Nestor Daniel Ordoñez	1002623166	Sura	Famisanar	
Angel Dar [illegible]	1123 1330 44	Sura	[illegible]	
Luis D. Molina Para.	1121 518 163	Sura	Famisanar	

Salvador Ayala A. — NOMBRE EJECUTOR — FIRMA — 9527978 CEDULA

NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA — FIRMA — CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CAPACITACION - INDUCCION - 9CAP

CIUDAD:	Acacias 15-01-24	AREA/CENTRO DE TRABAJO:	Consorcio policia	C-I-R. No. 01
TEMA DE CAPACITACION	Charla seguridad y riesgos	C.C./NIT:	1006558861	NOMBRE ESPOSITOR: Valentina Vanegas

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	FIRMA
Luis A Pinzon	5471061	Sura	Sanitas	
JHON E Ortiz	79.252.092	Sura	salud total	
Yormun Prieto castillo	1122777787	Sura	DUCUVA EPS	
Gilber Prieto Castillo	1122118898	SURA	Sanitas	
Luis F. Benavides	1941640?	Sanitas		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		
Andres Castillo	1001271237	Sura	F. sanar	
orlando Barrera	4272180	sura	famisa	
Robinson Escobar	1123512948	Sura	N. EPS	
Luis Antonio Molina	17312984	Sura	C. Capi	

Silvestre Agudelo — NOMBRE EJECUTOR — FIRMA — 9527938 CEDULA

NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA — FIRMA — CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CAPACITACION - INDUCCION - 9CAP

CIUDAD:	Acacias 16-01-24	AREA/CENTRO DE TRABAJO:	Consorcio Policia	C-I-R No. 02
TEMA DE CAPACITACION: Socializacion politicas SST		C.C./NIT: 1006558861	NOMBRE ESPOSITOR: Valentina Vanegas	

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	FIRMA
[illegible]	7732854	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Orlando Barrera	4272180	Sura	Famisanar	[illegible]
Juan G Ortiz	79252092	Sura	Salud Total	[illegible]
Andres Castillo	1001221237	Sura	Famisanar	[illegible]
Yorman Prieto	1122776787	Sura	Nueva Eps	[illegible]
Gilber Prieto Castillo	1122118898	Sura	Sanitas	[illegible]
Fernando Rodriguez	17321433	Sura	Sanitas	[illegible]

Silvestre Ayala — 9524978
NOMBRE EJECUTOR — FIRMA — CEDULA

9527908
NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA — FIRMA — CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CAPACITACION - INDUCCION - 9CAP

CIUDAD: Acacias 17 Enero/24

AREA/CENTRO DE TRABAJO: Consorcio Policia

C-I-R. No. 03

TEMA DE CAPACITACION: Proteccion/Cabeza

C.C./NIT: 1006558861

NOMBRE ESPOSITOR: Silvestre Agra.

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	FIRMA
Juan A. Molina	17312464	Sosa.	C. Cop:	
Orlando Barrera	4277180	Sura	famisa	
Yorman Prieto castillo	1122117187	Sura	EPS.M	
Patrocinio Vera	7239894	Positiva	Ser	
Andres Castillo	1cd 271 237	Sura	E. Sanar	
Gilber Prieto Castillo	1122118898	Sura	Sanitas	
Jhon G Ortiz	79252022	Sura	Salutotal	
Juan de Rebuelta	17321433.	Sura	Sanitas	
Yuber Esparragoza	1278854	Sura	P. EPS	
Robinson escobar Barrera	1123312948	Sanitas	EPS	
Luis E. Bernardes	19416407			
Luis A Rivera	5471061	SURA	Sanitas	

Silvestre Agra A. — NOMBRE EJECUTOR — FIRMA — 9527978 — CEDULA

NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA — FIRMA — 9527978 — CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CAPACITACION - INDUCCION - 9CAP

CIUDAD: Acacias 18-01-24

AREA/CENTRO DE TRABAJO: Consorcio policia

C.I.R. No. 84

TEMA DE CAPACITACION: RIESGOS NATURALES

C.C./NIT: 1006558861

NOMBRE ESPOSITOR: Valentina Vanegas

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	FIRMA
Andres Castillo	1cd271237	Sura	E. Sanitas	
Luis A Pinzon	6471061	Sura	Sanitas	
Deanson Esteban Duza	1123512448	sura	N. EPS	
Pedro	72328444	colsur	Famisanar	
Luis E. Benavides	1941/6407	sanitas		
JHON G ORTIZ	79.252.829	Sura	salutotal	
Orlando barrera	4272180	Sura	Famisanar	

Silvestre Vega A. — FIRMA — 9527918

NOMBRE EJECUTOR — FIRMA — CEDULA

NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA — FIRMA — CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CAPACITACION - INDUCCION - 9CAP

CIUDAD:	Acacias 19-01-23	AREA/CENTRO DE TRABAJO:	consorcio policia	C-I-R No.	05
TEMA DE CAPACITACION	Proteccion de gas	C.C./NIT:	1006558861	NOMBRE ESPOSITOR:	Valentina Vanegas

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	FIRMA
Cristopher Vasquez	77398564	Colsun	Cn	
Alvis D Molina	1731296U	Sura	C.Coni	
Andres Castillo	1001271737	Sura	E.Sanar	
Orlando Bassera	4277180	Sura	famisa	
Lyan Rodriguez	17371433	Sura	Sanitas	
Jorman Prieto castillo	1122147187	Sura	D. ISPS	
Gilber Prieto Castillo	1122118898	Sura	Sanitas	
Yoanson Escobar Suarez	1123579238	Sura	N. EPS	
Luis F. Benavides	1941640	sanitas	EPS	
William Patiño	9932453	Sura		
Jhon G Ortiz	79852022	Sura	Solutota	

Silvestre Anaya — FIRMA — 9527978 CEDULA
NOMBRE EJECUTOR

NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA — FIRMA — CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CAPACITACION - INDUCCION - 9CAP

CIUDAD/FECHA	Acacias 20-01-24	AREA/CENTRO DE TRABAJO:	consorcio policia	C-I-R No. 06
TEMA DE CAPACITACION: PUESTO FISICO		C.C./NIT: 1006558861	NOMBRE ESPOSITOR:	Valentina Vanegas

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	FIRMA
Andres Castillo	1001271237	Suva	E. Sanitas	
Orlando Barrera	4272180	Sura	Sanitas	
Sowlyn Prieto castillo	1122117187	Suva	N. EPS	
Luis Antonio Mola.	1731984	Sura	Coopi-	
Luis A Perez	5471061	Sura	Sanitas	
Edinson Estaban Bura	1123514148	Sura	N. EPS	
Luis E. Beganda	19416407	Positiva		
[illegible]	17321433	Positiva	Sanitas	
[illegible]	9932453	A.R.P.	Sura	
Jhon Ortiz	79852892	SURA	Salutas	

Silvestre Anaya — FIRMA — 9507913 CEDULA

NOMBRE EJECUTOR

NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA — FIRMA — CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CAPACITACION - INDUCCION - 9CAP

CIUDAD/FECHA	Acacias 22-01-24	AREA/CENTRO DE TRABAJO:	consorcio policia	C-I-R. No. 01
TEMA DE CAPACITACION	charla proteccion facial	C.C./NIT:	1006558861	NOMBRE ESPOSITOR: Valentina Vanegas

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	FIRMA
orlando Barrera	4272180	sura	famisa	
Yorman Prieto castillo	1122117187	sura	N. E.P.S	
Luis A Piñeros	5471061	Sura	Sanitas	
Miguel Angel Giraldo Morales	1121917353	Sura	N. EPS	
Andres Castillo	1001271237	Sura	E.sanar	
[illegible]	77328[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Luis. A Molina	17312984	sura	Coomeva	
[illegible]	17321433	Sura	sanitas	
Luis Miguel Hernandez	1006776248	Sura	cajacopi	
Luis E Bernardes	19416407	sanitas	E.P.S.	
Robinson Escobar [illegible]	117[illegible]	Sura	N. EPS	
JHON G Ortiz	79252022	Sura	Salud total	
Orlando Saenz	17325065 ot	Sura	Nueva EPS	

Silvestre Ayala — FIRMA — 9527528

NOMBRE EJECUTOR — FIRMA — CEDULA

NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA — FIRMA — CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CAPACITACION - INDUCCION - 9CAP

CIUDAD/FECHA	Acacias 23-01-24	AREA/CENTRO DE TRABAJO:	Consorcio Policía	C-I-R. No. 02
TEMA DE CAPACITACION	Asistencia	C.C./NIT:	1006558861	NOMBRE ESPOSITOR: Valentina Vanegas

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	FIRMA
Luis Antonio Molina	17319484	Sura	C. Copia	
Luis A Pinzon	547061	SURA	Sanitas	
Jarman Prieto castillo	1122117187	Sura	N. E.P.S	
Andres Castillo	1001271237	sura	F. Sanar	
Orlando Barrera	4272180	sura	famisa	
Fernando Rodriguez	17321433	Sura	Sanitas	
JHON G Ortiz	79.252092	SURA	saludtota	
Vidal Bejarano	18224618	sura	Famuca	
Robinson Escobar Sura	1122351248	sura	N.EPS	
Wilfred Patiño.	79324537.	sura.	Sura	
Emilse Gonzalez	1170362537		capital salud	emilse gonzalez
Luis E. Benavides.	19416407	Asanitas	E.P.S.	

Valentina Vanegas	Valentina Vanegas	1006558861
NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA
Silverio Ayala		9577978
NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA	FIRMA	CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CAPACITACION - INDUCCION - 9CAP

CIUDAD/FECHA	Acacias 24-01-24	AREA/CENTRO DE TRABAJO:	Consorcio Policia	C-I-R. No. 03
TEMA DE CAPACITACION	charla seguridad vial	C.C./NIT:	1006558861	NOMBRE ESPOSITOR: Valentina Vanegas

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	FIRMA
Oscar Escobar Cura	1123129478	Sura	N. EPS	
JHon G Ortiz	79958092	Sura	salutotal	
Emilse Gonzalez	1120362537	Sura	cartal salud	emilse gonzalez
Yorman Prieto castillo	1122117187	Sura	N. EPS	
Luis Miguel Hernandez Pedraza	1.096776248	Sura	caja colv	
Juan Antonio Piñero	5471061	Sura	Sanitas	
Luis Antonio Molina C	1731996	Sura	Sanitas	
[illegible]	7222.8[illegible]	Fraisa	Coosalud	
Andres Castillo	1121271237	Sura	[illegible]	
Orlando Barrera	4272180	Sura	famisa	

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA
Silvestre Baez		9527938
NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA	FIRMA	CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CAPACITACION - INDUCCION - 9CAP

CIUDAD/FECHA	Acacias 25-01-24	AREA/CENTRO DE TRABAJO:	Consorcio policia	C-I-R. No. 04
TEMA DE CAPACITACION		C.C./NIT: 1006558861	NOMBRE ESPOSITOR:	Valentina Vanegas

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	FIRMA
Orlando Barrera	4277180	Sura	famisa	
Andres Castillo	1001271137	Sura	F. sanitas	
Emilse Gonzalez	1120362537	Sura	capital salud	emilse G
Jhon G Ortiz	29251092	Sura	saludata	
Luis A Piñeros	5171061	Sura	Sanitas	
Luis E. Begambre	1941640	sanitas	EPS.	
Jorman prieto castillo	1122117187	Sura	EPS N.	
Robinson Escobar Durán	1123512948	Sura	N. EPS	

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA
Silvestre Anaya A.		9527938
NOMBRE SUPERVISOR DE AREA	FIRMA	CEDULA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CAPACITACION - INDUCCION - 9CAP

CIUDAD/FECHA	Acacias 26-01-24	AREA/CENTRO DE TRABAJO:	Consorcio policia	C-I-R. No. 05
TEMA DE CAPACITACION: Autocuidado, proteccion del cuerpo		C.C./NIT: 1006558861	NOMBRE ESPOSITOR:	Valentina Vanegas

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	FIRMA
JHon G Ortiz	79.252022	Sura	Salutotal	
Cpolicia Asley Ayala	8102467	Sura	sanitas	
Emilse Gonzalez	1120362537	sura	sanitas	
Diego Zuñiga	1073788844	Sura	Saludtotal	
Orlando Barrera	4272180	Sura	F.Sanar	
Andres Castillo	1006127237	sura	F. sanar	
Arango Castillo Ricardo	1122494764	Sura	Medimas	
Luis Miguel Hernandez Pedraza	1006776248	Sura	cajacopi	
Jhon Pinto Castillo	1122117187	Sura	N EPS	
Luis E. Bocanegra	1941640?	sanitas	E.P.S	
Julio Antonio Molina	1931298?	Sura	Cajacopi	
Richard Toro G.	17478777	Sura	Sanitas	
Robinson Escobar Parra	1123512948	Sura	N. EPS	

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	79252022 CEDULA	
NOMBRE SUPERVISOR DE AREA	FIRMA	9577918 CEDULA	

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CAPACITACION - INDUCCION - 9CAP

CIUDAD/FECHA	Acacias 27-01-24	AREA/CENTRO DE TRABAJO:	Consorcio policia	C-I-R. No.
TEMA DE CAPACITACION	plan de emergencia	C.C./NIT:	1006558861	NOMBRE ESPOSITOR: Valentina Vanegas

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	FIRMA
Jhon G Ortiz	79.252022	Sura	Salud Total	
[illegible]	8102467	Sura	Sanitas	
Emilse Gonzalez	7720362537	Sura	Coomeva	
[illegible]	1732[illegible]44	Sura	Salud total	
Orlando Barrera	4277980	Sura	F. Sura	
Andres Castillo	1001271237	Sura	E. Sanar	
Arango Cedillo Ricardo	1124994764	Sura	Medimas	
Luis Miguel Hernandez Cedraza	1.006776948	Sura	Cafacol	Luis.Miguel
Jorman Prieto Castillo	1122117187	Sura	N. EPS	
Luis E. Bernardez	194/6407	Sanitas	Eps.	
Jorge Antonio Molina	1732401	Sura	Cafacol	
Richard Moreno G.	17478777	Sura	Salud	Richard Moreno
Robinson Escobar Arce	1123512483	Sura	N. EPS	

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA 79.252022
NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA Salvador Bautista	FIRMA	CEDULA 9571938

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CONTROL ENTREGA DE EPP -10SS

FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS	CAMISA		PANTALON		CHALECO		CASCO		BOTAS		GUANTES		GAFAS		FIRMA
		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
11-01 24	Orlando Barrera	X		X			X	X		X		X		X		
11-01 24	Andres castillo	X		X			X	X		X		X		X		
11-01 24	Patrocinio Vasquez	X		X			X	X		X		X		X		

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN: Silvestre Ariza

El registro del cambio de los elementos de protección deberá estar firmada por el portador de estos.

OBSERVACIONES:

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CONTROL ENTREGA DE EPP -10SS

FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS	CAMISA		PANTALON		CASCO		BOTAS		P.OIDO		GUANTES		GAFAS		FIRMA
		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
15-01 24	Yorman Prieto	X		X		X		X			X	X		X		
15-01 24	Orlando Barrera	X		X		X		X			X	X		X		
15-01 24	Andres castillo	X		X		X		X			X	X		X		
15-01 24	Patrocino Vasquez	X		X		X		X			X	X		X		

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:

El registro del cambio de los elementos de protección deberá estar firmada por el portador de estos.

OBSERVACIONES:

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CONTROL ENTREGA DE EPP -10SS

FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS	CAMISA		PANTALON		CASCO		BOTAS		P.OIDO		GUANTES		GAFAS		FIRMA
		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
22-01 24	Orlando Barrero	X		X		X		X		/	X	X		X		
22-01 24	Patrocinio Vasquez	X		X		X		X			X	X		X		Patrocinio Vasquez
22-01 24	Andres castillo	X		X		X		X			X	X		X		
22-01 24	Yorman prieto		X	X		X		X			X	X		X		
23-01 24	Emilce Gonzales	X		X		X		X			X	X		X		Emilse Gonzalez
26-01 24	Ricardo castillo	X		X		X		X			X	X		X		
26-01 24	Julian Reyes	X		X		X		X			X	X		X		
26-01 24	Fabian Andres Rey	X		X		X		X			X	X		X		
26-01 24	Richard Moreno	X		X		X		X			X	X		X		Richard Moreno C
23-01 24	luis Miguel Hernandez	X		X		X		X			X	X		X		luis miguel

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:

El registro del cambio de los elementos de protección deberá estar firmada por el portador de estos.

OBSERVACIONES:

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

PERMISO TRABAJO GENERAL - 8PGL

SOLICITUD DEL PERMISO

CIUDAD:	AREA/CENTRO DE TRABAJO:	PGL Nro.
Acacias 02-01-24	Consorcio policia	01

NOMBRE EJECUTOR	C.C./NIT:	COMPAÑIA:
silvestre Araza	9527938	

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	OTRAS
Andres castillo				
Orlando Barrera				
Petrocinio				

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

EQUIPOS A UTILIZAR	LUGAR/ÁREA/PROCESO	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
martillo, barra, pica	campo	

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES CRITICAS

	SI	NO		SI	NO
Esta el área limpia y libre de sustancias combustibles?	X		Se trabajara con herramientas que proyecten partículas?		X
Se utilizaran sustancias químicas (desengrasantes, pinturas)		X	Las herramientas utilizadas pueden generar chispa?		X
Se ha identificado y demarcado adecuadamente el área?	X		Tiene el personal entrenamiento y competencia?	X	
Se requiere el uso de escaleras que no superen los 1,50 mts?		X	Se requiere el encerramiento del sitio de trabajo?	X	
Son seguros y adecuados el acceso y salida del área?	X		Es necesario el cierre de vías?		X
Se requiere iluminación adicional antiexplosión?		X	Se requiere la parada de equipos?		X
Se requiere ventilación adicional?		X	Se requiere la asistencia permanente de un supervisor?	X	
Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)	X		Esta disponible y listo el equipo contra incendios?	X	
Las herramientas y equipos cuentan con guardas de seguridad?	X		Esta disponible y listo el equipo de primeros auxilios?	X	
Es requerido aplicar Bloqueo y Etiquetado? (Utilizar Formato)		X	Es claro cuales son los centros médicos mas cercanos?	X	
Se tendrá algún tipo de acercamiento con partes eléctricas?		X			

Otros:

OBSERVACIONES ESPECIALES

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Casco de seguridad	X	Careta protectora		Botas de seguridad, tipo:	X	Petos o traje especial, Tipo:	
Gafas de seguridad	X	Guantes, Tipo:	X	Protección respiratoria, tipo:		**Otros:**	
Protectores auditivos		Cinturón Portaherramientas					

INICIACIÓN y/o RENOVACIÓN				SUSPENSIÓN			
Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor	Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
02-01-24	7:00am			06-01-24		12:00pm	

APROBACIÓN DEL PERMISO

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA	Declaro que he leído y entendido los Procedimientos de Seguridad
NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA	FIRMA	CEDULA	Estoy enterado del trabajo a realizar y de las precauciones a tomar

CIERRE DEL PERMISO

Iniciado pero no terminado	X	Terminado en aprobación		Terminado, aprobado y asegurado	

Certifico que el trabajo amparado por esta autorización ha sido cumplido en todas sus partes y el área ha quedado en condiciones seguras

Nombre: Valentina Vanegas — Ejecutar	Nombre: — Supervisor de Area

PERMISO DE TRABAJO GENERAL

SOLICITUD DEL PERMISO

CIUDAD:	Acacias · 09-01-24	AREA/CENTRO DE TRABAJO:	Consorcio policia	PGL Nro. 01

NOMBRE EJECUTOR	C.C./NIT:	COMPAÑIA:
Silvestre Arata	9527938	

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	OTRAS
Robinson Escobar Pura	1123512948	Colmena	N EPS	
Luis E. Benavides.	19416407	Colmena	EPS.	

EQUIPOS A UTILIZAR	LUGAR/ÁREA/PROCESO	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
TEODOLITO	TERRENO - POLICIA	Levantar y ubicar parametros de niveles
BANDEROLAS		

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES CRITICAS

	SI	NO		SI	NO
Esta el área limpia y libre de sustancias combustibles?	X		Se trabajara con herramientas que proyecten particulas?		X
Se utilizaran sustancias químicas (desengrasantes, pinturas)		X	Las herramientas utilizadas pueden generar chispa?		X
Se ha identificado y demarcado adecuadamente el área?	X		Tiene el personal entrenamiento y competencia?	X	
Se requiere el uso de escaleras que no superen los 1,50 mts?		X	Se requiere el encerramiento del sitio de trabajo?	X	
Son seguros y adecuados el acceso y salida del área?	X		Es necesario el cierre de vias?		X
Se requiere iluminación adicional antiexplosión?		X	Se requiere la parada de equipos?		X
Se requiere ventilación adicional?		X	Se requiere la asistencia permanente de un supervisor?	X	
Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)	X		Esta disponible y listo el equipo contra incendios?	X	
Las herramientas y equipos cuentan con guardas de seguridad?	X		Esta disponible y listo el equipo de primeros auxilios?	X	
Es requerido aplicar Bloqueo y Etiquetado? (Utilizar Formato)		X	Es claro cuales son los centros médicos mas cercanos?	X	
Se tendrá algún tipo de acercamiento con partes eléctricas?		X			

Otros:

OBSERVACIONES ESPECIALES

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Casco de seguridad	X	Careta protectora		Botas de seguridad, tipo:	X	Petos o traje especial, Tipo:	
Gafas de seguridad	X	Guantes, Tipo:		Protección respiratoria, tipo:		**Otros:**	
Protectores auditivos		Cinturón Portaherramientas					

INICIACIÓN y/o RENOVACIÓN

Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
09-01-24	7:00am		

SUSPENSIÓN

Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
13-01-24	7:00am	12:00pm	

APROBACIÓN DEL PERMISO

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA	Declaro que he leído y entendido los Procedimientos de Seguridad
Robinson Escobar		1123512948	
NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA	FIRMA	CEDULA	Estoy enterado del trabajo a realizar y de las precauciones a tomar

CIERRE DEL PERMISO

Iniciado pero no terminado	X	Terminado en aprobación		Terminado, aprobado y asegurado	

Certifico que el trabajo amparado por esta autorización ha sido cumplido en todas sus partes y el área ha quedado en condiciones seguras

Nombre:	Nombre:
Ejecutar	Supervisor de Area

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIÓN

SOLICITUD DEL PERMISO

CIUDAD ACACIAS	AREA/CENTRO DE TRABAJO ESTACION DE POLICIA			PEX Nro. 01-24 01
NOMBRE EJECUTOR CONSORCIO	C.C.7NIT	COMPAÑÍA SERVICIOS Y SUMINISTROS		
RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	OTRAS
GUILLERMO ORTIZ	79252022	SURA	S. TOTAL	

EQUIPOS A UTILIZAR	LUGAR/ÁREA/PROCESO	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
RETROESCAVADORA A30	LOTE ESTACION POL	DESCAPOTE Y NIVELACION TERRAZA
		DESCAPOTE Replanteo y nivelacion del terreno

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES CRITICAS

	SI	NO		SI	NO
Se han consultado los planos del área?	x		Se requiere la asistencia permanente de un supervisor?	x	
Se ha identificado tuberías, cables y ductos del área?	x		Se requiere realizar taludes de tierra o apuntalamientos?		x
Se cuenta con entrada y salida segura del área ?	x		Tiene el personal entrenamiento y competencia?	x	
Se acordonará el área de trabajo?	x		Están reconocidas las distancias a tuberías y cables?	x	
Se ha verificado la atmósfera y dirección del viento?	x		Esta disponible y listo el equipo de primeros auxilios?	x	
Es posible realizar el trabajo en circuitos energizados?			Se cuenta con un procedimiento de Rescate?	x	
Esta el área limpia y libre de sustancias combustibles?	x		Se ha verificado el tipo de herramienta a usar?	x	
Se dispone de elementos para minimizar derrames?	x		Afectara la excavación algún camino? Explique		x
Existe la presencia de vapores en el área de trabajo?		x	Se requiere algún tipo de maquinaria pesada y/o vehículos?	x	
Es requerido aplicar Bloqueo y Etiquetado? (Utilizar Formato)		x	Si se trabaja con torre grúa esta posee el manual técnico?		x
Existen rampas o pasarelas seguras para el cruzar peatonal?	x		Es claro cuales son los centros médicos mas cercanos?	x	

Otros:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco de seguridad	x	Protectores auditivos	x	Arnés de Seguridad		Botas de seguridad	x
Gafas de seguridad	x	Careta protectora		Petos o traje especial		Guantes de cuero	x
Protección respiratoria	x	Otros:					

PRUEBA ATMOSFÉRICAS

HORA	MÉTODO - EQUIPO	O_2	LEL	CO	H_2S	CH_4

VALORES ADMISIBLES PARA INGRESO EN EXCAVACIÓN

Oxigeno		0-19.4%	19.5-23.5%	23.6-100%	Tiempo
L.E.L.	0%	2	3	1	
	1 - 10%	2	2	1	
	10.1-100%	1	1	1	

1 Ingreso prohibido
2 Requiere condiciones especiales
3 Condiciones aceptable para realizar el trabajo

OBSERVACIONES ESPECIALES

INICIACIÓN y/o RENOVACIÓN				SUSPENSIÓN			
Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor	Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
810-01-24	7::	18:00		13-01-24	8:00am		

APROBACIÓN DEL PERMISO

Guillermo Ortiz		79252022	
NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA	Declaro que he leído y entendido los Procedimientos de Seguridad
	Salvador Rojas	9527978	
NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA	FIRMA	CEDULA	Estoy enterado del trabajo a realizar y de las precauciones a tomar

CIERRE DEL PERMISO

Iniciado pero no terminado [X] Terminado en aprobación [ ] Terminado, aprobado y asegurado [ ]

Certifico que el trabajo amparado por esta autorización ha sido cumplido en todas sus partes y el área ha quedado en condiciones seguras

Nombre:	Nombre:
Ejecutor	Edwar Arley Ortiz
	Supervisor de Área

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

PERMISO TRABAJO GENERAL

SOLICITUD DEL PERMISO

CIUDAD:	Acacias-Meta 15-01-24	AREA/CENTRO DE TRABAJO:	consorcio policial	PGL Nro. 02
NOMBRE EJECUTOR: Silvestre Ariza		C.C./NIT: 95.27938	COMPANIA:	

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	OTRAS
Robinson escobar Daza	1123512948	Colfondos	MEPS	
Luis eduardo Benavidez	19416407	SURA	sanitas	

EQUIPOS A UTILIZAR	LUGAR/ÁREA/PROCESO	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES CRITICAS

	SI	NO		SI	NO
Esta el área limpia y libre de sustancias combustibles?	X		Se trabajara con herramientas que proyecten partículas?		X
Se utilizaran sustancias químicas (desengrasantes, pinturas)		X	Las herramientas utilizadas pueden generar chispa?		X
Se ha identificado y demarcado adecuadamente el área?	X		Tiene el personal entrenamiento y competencia?	X	
Se requiere el uso de escaleras que no superen los 1,50 mts?		X	Se requiere el encerramiento del sitio de trabajo?	X	
Son seguros y adecuados el acceso y salida del área?	X		Es necesario el cierre de vias?		X
Se requiere iluminación adicional antiexplosión?		X	Se requiere la parada de equipos?		X
Se requiere ventilación adicional?		X	Se requiere la asistencia permanente de un supervisor?	X	
Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)	X		Esta disponible y listo el equipo contra incendios?	X	
Las herramientas y equipos cuentan con guardas de seguridad?	X		Esta disponible y listo el equipo de primeros auxilios?	X	
Es requerido aplicar Bloqueo y Etiquetado? (Utilizar Formato)		X	Es claro cuales son los centros médicos mas cercanos?	X	
Se tendrá algún tipo de acercamiento con partes eléctricas?		X			

Otros:

OBSERVACIONES ESPECIALES

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Casco de seguridad	X	Careta protectora		Botas de seguridad, tipo:	X	Petos o traje especial, Tipo:	
Gafas de seguridad	X	Guantes, Tipo:		Protección respiratoria, tipo:		Otros:	
Protectores auditivos		Cinturón Portaherramientas					

INICIACIÓN y/o RENOVACIÓN

Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
15-01-23	7:00am		

SUSPENSIÓN

Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
20-01-24	12:00pm		

APROBACIÓN DEL PERMISO

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA	Declaro que he leído y entendido los Procedimientos de Seguridad
NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA	Valentina Vargas FIRMA	1005538881 CEDULA	Estoy enterado del trabajo a realizar y de las precauciones a tomar

CIERRE DEL PERMISO

Iniciado pero no terminado [X] Terminado en aprobación [ ] Terminado, aprobado y asegurado [ ]

Certifico que el trabajo amparado por esta autorización ha sido cumplido en todas sus partes y el área ha quedado en condiciones seguras

Nombre:	Nombre:
Ejecutar	Supervisor de Area

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

PERMISO TRABAJO DE EXCAVACION

SOLICITUD DEL PERMISO

CIUDAD	AREA/CENTRO DE TRABAJO	PEX Nro.
Acacias 15-01-24	Consorcio policia	01

NOMBRE EJECUTOR	C.C./NIT	COMPAÑIA
Valentina Vanegas	1006558861	servicio y suministros

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	OTRAS
Guillermo Ortiz	79252022	Sura	S.Total	

EQUIPOS A UTILIZAR	LUGAR/ÁREA/PROCESO	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Retroexcavadora	campo	

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES CRITICAS

	SI	NO		SI	NO
Se han consultado los planos del área?	x		Se requiere la asistencia permanente de un supervisor?	x	
Se ha identificado tuberías, cables y ductos del área?	x		Se requiere realizar taludes de tierra o apuntalamientos?		x
Se cuenta con entrada y salida segura del área ?	x		Tiene el personal entrenamiento y competencia?	x	
Se acordonará el área de trabajo?	x		Están reconocidas las distancias a tuberías y cables?	x	
Se ha verificado la atmósfera y dirección del viento?	x		Esta disponible y listo el equipo de primeros auxilios?	x	
Es posible realizar el trabajo en circuitos energizados?			Se cuenta con un procedimiento de Rescate?	x	
Esta el área limpia y libre de sustancias combustibles?	x		Se ha verificado el tipo de herramienta a usar?	x	
Se dispone de elementos para minimizar derrames?	x		Afectara la excavación algún camino? Explique		x
Existe la presencia de vapores en el área de trabajo?		x	Se requiere algún tipo de maquinaria pesada y/o vehículos?	x	
Es requerido aplicar Bloqueo y Etiquetado? (Utilizar Formato)		x	Si se trabaja con torre grúa esta posee el manual técnico?		x
Existen rampas o pasarelas seguras para el cruzar peatonal?	x		Es claro cuales son los centros médicos mas cercanos?	x	

Otros:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco de seguridad	X	Protectores auditivos	X	Arnés de Seguridad		Botas de seguridad	X
Gafas de seguridad	X	Careta protectora		Petos o traje especial		Guantes de cuero	X
Protección respiratoria	X	Otros:					

PRUEBA ATMOSFÉRICAS

HORA	MÉTODO - EQUIPO	O_2	LEL	CO	H_2S	CH_4

VALORES ADMISIBLES PARA INGRESO EN EXCAVACIÓN					
Oxigeno		0-19.4%	19.5-23.5%	23.6-100%	Tiempo
L.E.L.	0%	2	3	1	
	1 - 10%	2	2	1	
	10.1-100%	1	1	1	

1 Ingreso prohibido
2 Requiere condiciones especiales
3 Condiciones aceptable para realizar el trabajo

OBSERVACIONES ESPECIALES

INICIACIÓN y/o RENOVACIÓN				SUSPENSIÓN			
Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor	Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
15-01-24	7:00	5:00		20-01-24	12:00pm		

APROBACIÓN DEL PERMISO

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA	Declaro que he leído y entendido los Procedimientos de Seguridad
Valentina Vanegas	Valentina Vanegas	1006558861	

NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA	FIRMA	CEDULA	Estoy enterado del trabajo a realizar y de las precauciones a tomar

CIERRE DEL PERMISO

Iniciado pero no terminado [X] Terminado en aprobación [ ] Terminado, aprobado y asegurado [ ]

Certifico que el trabajo amparado por esta autorización ha sido cumplido en todas sus partes y el área ha quedado en condiciones seguras

Nombre:	Nombre:
Ejecutor	Supervisor de Area

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

PERMISO TRABAJO DE EXCAVACION - 7PEX

SOLICITUD DEL PERMISO

CIUDAD	AREA/CENTRO DE TRABAJO	PERMISO
Acacias 18-01-23	consorcio policia	02

NOMBRE EJECUTOR	C.C./NIT	COMPAÑIA
Valentina Vanegas	1006558861	

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARL	EPS	OTRAS
Jesus fernando rodriguez	17321433	SURA	sanitas	

EQUIPOS A UTILIZAR	LUGAR/ÁREA/PROCESO	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
motoniveladora	campo	

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES CRITICAS

	SI	NO		SI	NO
Se han consultado los planos del área?	X		Se requiere la asistencia permanente de un supervisor?	X	
Se ha identificado tuberías, cables y ductos del área?	X		Se requiere realizar taludes de tierra o apuntalamientos?		X
Se cuenta con entrada y salida segura del área ?	X		Tiene el personal entrenamiento y competencia?	X	
Se acordonará el área de trabajo?	X		Están reconocidas las distancias a tuberías y cables?	X	
Se ha verificado la atmósfera y dirección del viento?	X		Esta disponible y listo el equipo de primeros auxilios?	X	
Es posible realizar el trabajo en circuitos energizados?	X		Se cuenta con un procedimiento de Rescate?	X	
Esta el área limpia y libre de sustancias combustibles?	X		Se ha verificado el tipo de herramienta a usar?	X	
Se dispone de elementos para minimizar derrames?	X		Afectara la excavación algún camino? Explique		X
Existe la presencia de vapores en el área de trabajo?		X	Se requiere algún tipo de maquinaria pesada y/o vehículos?	X	
Es requerido aplicar Bloqueo y Etiquetado? (Utilizar Formato)		X	Si se trabaja con torre grúa esta posee el manual técnico?		X
Existen rampas o pasarelas seguras para el cruzar peatonal?	X		Es claro cuales son los centros médicos mas cercanos?	X	

Otros:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco de seguridad	X	Protectores auditivos	X	Arnés de Seguridad		Botas de seguridad	X
Gafas de seguridad	X	Careta protectora		Petos o traje especial		Guantes de cuero	X
Protección respiratoria		Otros:					

PRUEBA ATMOSFÉRICAS

HORA	MÉTODO - EQUIPO	O_2	LEL	CO	H_2S	CH_4

VALORES ADMISIBLES PARA INGRESO EN EXCAVACIÓN					
Oxigeno		0-19.4%	19.5-23.5%	23.6-100%	Tiempo
L.E.L.	0%	2	3	1	
	1 - 10%	2	2	1	
	10.1-100%	1	1	1	

1 Ingreso prohibido
2 Requiere condiciones especiales
3 Condiciones aceptable para realizar el trabajo

OBSERVACIONES ESPECIALES

INICIACIÓN y/o RENOVACIÓN				SUSPENSIÓN			
Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor	Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
15-01-23	7:00am			20-01-23		12:00pm	

APROBACIÓN DEL PERMISO

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA	Declaro que he leido y entendido los Procedimientos de Seguridad
Valentina Vanegas	Valentinavanegas	1006558861	

NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA	FIRMA	CEDULA	Estoy enterado del trabajo a realizar y de las precauciones a tomar

CIERRE DEL PERMISO

Iniciado pero no terminado ☐ Terminado en aprobación ☐ Terminado, aprobado y asegurado ☐

Certifico que el trabajo preparado por esta autorización ha sido cumplido en todas sus partes y el área ha quedado en condiciones seguras

Nombre:	Nombre:
Ejecutor	Supervisor de Area

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

SOLICITUD DEL PERMISO

CIUDAD:	AREA/CENTRO DE TRABAJO	PAL Nro.
ACACIAS 18 Enero/24	consorcio policia	01

NOMBRE EJECUTOR	C.C.NIT.	COMPAÑÍA
Valentina Vanegas	1006558861	

RELACION DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	CERTIFICADO APTITUD			
orlando Barrera	4272180	Sura	familiar		SENA	X	EMPRESA
Andres castrillo	1001277237	Sura	F. sanar		SENA		EMPRESA
					SENA		EMPRESA
					SENA		EMPRESA
					SENA		EMPRESA
					SENA		EMPRESA

EQUIPOS/HERRAMIENTAS A UTILIZAR	LUGAR/ÁREA/PROCESO	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Arnes	Tejado contenedor	
Taladro		
Tornillos		
Teja		Altura aproximada:

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES CRITICAS

Se requiere la asistencia permanente de un supervisor?	X	NO	N/A	Se cuenta con un plan de rescate?	X	NO	N/A
Existe riesgo de caida de personas al agua?	SI	X	N/A	Existe riesgo eléctrico o presencia de animales (avispas, abejas)	SI	X	N/A
Se ha señalizado y demarcado el área de trabajo?	X	NO	N/A	**Mencione en observaciones las medidas tomadas en caso de riesgo eléctrico**			
Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)?	X	NO	N/A	Existen huecos y han sido tapados y/o señalizados?	SI	X	N/A
El área esta libre de superficies húmedas, lisas, y/o irregulares?	X	NO	N/A	**PARA TRABAJOS SOBRE ANDAMIOS / SISTEMAS DE ACCESO**			
Se requiere instalación de barandas? (resistencia 200 lbs.)?	SI	X	N/A	El área de trabajo esta 100% cubierta y anclada a la estructura?	X	NO	N/A
Se requiere la instalación de línea de vida?	SI	X	N/A	Cuenta con escaleras internas para el ascenso?	X	NO	N/A
Los puntos de anclaje soportan 5000 lbs por persona conectada	X	NO	N/A	Existe un punto de anclaje seguro, distinto al andamio?	X	NO	N/A
El punto de anclaje esta por encima de los hombros?	X	NO	N/A	Los puntos de apoyo del andamio son estables y resistentes?	X	NO	N/A
Tiene el personal entrenamiento y competencia?	X	NO	N/A	Los cables del andamio colgante soportan 10000 lbs?	X	NO	N/A
El personal esta en buen estado de salud. Incluye alcohol-drogas	X	NO	N/A	El andamio colgante ha sido probado con anterioridad?	X	NO	N/A
Se han inspeccionado los equipos y herramientas a usar?	X	NO	N/A	Todas las partes del andamio están bien aseguradas?	X	NO	N/A
Se ha confirmado con operaciones la parada de equipos?	X	NO	N/A	Los sistemas de acceso son certificados?(Incluir canastillas/elevadores)	X	NO	N/A

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco de seguridad con barbuquejo, tipo:	X	Eslingas		Gafas de seguridad	
Botas de seguridad con suela antideslizante	X	Cuerdas		Protectores auditivos	
Arnés de cuerpo completo	X	Mosquetones		Prot. respiratoria, Tipo:	
Linea autoretractil		Cinta de anclaje	X	Chaleco salvavidas (caida al agua)	
Freno de cable / freno de cuerda		Guantes:		Otros:	

OBSERVACIONES ESPECIALES

INICIACIÓN y/o RENOVACIÓN				SUSPENSIÓN			
Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor	Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
18-01-24	7:00 am			18-01-24	4pm		

APROBACIÓN DEL PERMISO

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CÉDULA	
Valentina Vanegas	Valentina Vanegas	1006558861	Declaro que he leido y entendido los Procedimientos de Seguridad
NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA	FIRMA	CEDULA	
Silvestre Ajce		9527958	Estoy enterado del trabajo a realizar y de las precauciones a tomar

CIERRE DEL PERMISO

Iniciado pero no terminado [X] Terminado en aprobación [ ] Terminado, aprobado y asegurado [X]

Certifico que el trabajo amparado por esta autorización ha sido cumplido en todas sus partes y el área ha quedado en condiciones seguras

Nombre:	Ejecutor	Nombre:	Supervisor de Área

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

PERMISO TRABAJO DE EXCAVACION - 7PEX

SOLICITUD DEL PERMISO

CIUDAD	AREA/CENTRO DE TRABAJO	REV. Núm.
Acacias 19-01-23	consorcio policia	03

NOMBRE EJECUTOR	C.C./NIT	COMPAÑÍA
Valentina Vanegas		

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARL	EPS	OTRAS
William patino	1[illegible]24537			

EQUIPOS A UTILIZAR	LUGAR/ÁREA/PROCESO	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Vibrocompactador de 17 toneladas	Campo Adecuamiento de terreno	

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES CRITICAS

	SI	NO		SI	NO
Se han consultado los planos del área?	X		Se requiere la asistencia permanente de un supervisor?	X	
Se ha identificado tuberías, cables y ductos del área?	X		Se requiere realizar taludes de tierra o apuntalamientos?		X
Se cuenta con entrada y salida segura del área ?	X		Tiene el personal entrenamiento y competencia?	X	
Se acordonará el área de trabajo?		X	Están reconocidas las distancias a tuberías y cables?	X	
Se ha verificado la atmósfera y dirección del viento?	X		Esta disponible y listo el equipo de primeros auxilios?	X	
Es posible realizar el trabajo en circuitos energizados?	X		Se cuenta con un procedimiento de Rescate?	X	
Esta el área limpia y libre de sustancias combustibles?	X		Se ha verificado el tipo de herramienta a usar?	X	
Se dispone de elementos para minimizar derrames?	X		Afectara la excavación algún camino? Explique		X
Existe la presencia de vapores en el área de trabajo?		X	Se requiere algún tipo de maquinaria pesada y/o vehiculos?	X	
Es requerido aplicar Bloqueo y Etiquetado? (Utilizar Formato)		X	Si se trabaja con torre grúa esta posee el manual técnico?		X
Existen rampas o pasarelas seguras para el cruzar peatonal?	X		Es claro cuales son los centros médicos mas cercanos?	X	

Otros:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco de seguridad	X	Protectores auditivos	X	Arnés de Seguridad		Botas de seguridad	X
Gafas de seguridad	X	Careta protectora		Petos o traje especial		Guantes de cuero	X
Protección respiratoria		Otros:					

PRUEBA ATMOSFÉRICAS

HORA	MÉTODO - EQUIPO	O_2	LEL	CO	H_2S	CH_4

VALORES ADMISIBLES PARA INGRESO EN EXCAVACIÓN

	Oxigeno	0-19.4%	19.5-23.5%	23.6-100%	Tiempo
L.E.L.	0%	2	3	1	
	1 - 10%	2	2	1	
	10.1-100%	1	1	1	

1 Ingreso prohibido
2 Requiere condiciones especiales
3 Condiciones aceptable para realizar el trabajo

OBSERVACIONES ESPECIALES

INICIACIÓN y/o RENOVACIÓN				SUSPENSIÓN			
Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor	Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
19-01-23	8:30am			20-01-23	2:00pm		

APROBACIÓN DEL PERMISO

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA	Declaro que he leido y entendido los Procedimientos de Seguridad
Valentina Vanegas	Valentina Vanegas	1006558861	
NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA	FIRMA	CEDULA	Estoy enterado del trabajo a realizar y de las precauciones a tomar

CIERRE DEL PERMISO

Iniciado pero no terminado [X] Terminado en aprobación [ ] Terminado, aprobado y asegurado [ ]

Certifico que el trabajo amparado por esta autorización ha sido cumplido en todas sus partes y el área ha quedado en condiciones seguras

Nombre:	Nombre:
Ejecutor	Supervisor de Area

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

PERMISO TRABAJO DE EXCAVACION - 7PEX

SOLICITUD DEL PERMISO

CIUDAD	AREA/CENTRO DE TRABAJO	PEX Nro.
Acacias 22-01-24	consorcio policia	02

NOMBRE EJECUTOR	C.C./NIT	COMPAÑÍA
Valentina Vanegas	1006558861	

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARL	EPS	OTRAS
Jesus fernando rodriguez	1732 1433	Sura	Sanitas	

EQUIPOS A UTILIZAR	LUGAR/ÁREA/PROCESO	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
motoniveladora	campo	

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES CRITICAS

	SI	NO		SI	NO
Se han consultado los planos del área?	X		Se requiere la asistencia permanente de un supervisor?	X	
Se ha identificado tuberías, cables y ductos del área?	X		Se requiere realizar taludes de tierra o apuntalamientos?		X
Se cuenta con entrada y salida segura del área ?	X		Tiene el personal entrenamiento y competencia?	X	
Se acordonará el área de trabajo?	X		Están reconocidas las distancias a tuberías y cables?	X	
Se ha verificado la atmósfera y dirección del viento?	X		Esta disponible y listo el equipo de primeros auxilios?	X	
Es posible realizar el trabajo en circuitos energizados?	X		Se cuenta con un procedimiento de Rescate?	X	
Esta el área limpia y libre de sustancias combustibles?	X		Se ha verificado el tipo de herramienta a usar?	X	
Se dispone de elementos para minimizar derrames?	X		Afectara la excavación algún camino? Explique		X
Existe la presencia de vapores en el área de trabajo?		X	Se requiere algún tipo de maquinaria pesada y/o vehículos?	X	
Es requerido aplicar Bloqueo y Etiquetado? (Utilizar Formato)		X	Si se trabaja con torre grúa esta posee el manual técnico?		X
Existen rampas o pasarelas seguras para el cruzar peatonal?	X		Es claro cuales son los centros médicos mas cercanos?	X	

Otros:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco de seguridad	X	Protectores auditivos	X	Arnés de Seguridad		Botas de seguridad	X
Gafas de seguridad	X	Careta protectora		Petos o traje especial		Guantes de cuero	X
Protección respiratoria		Otros:					

PRUEBA ATMOSFÉRICAS

HORA	MÉTODO - EQUIPO	O_2	LEL	CO	H_2S	CH_4

VALORES ADMISIBLES PARA INGRESO EN EXCAVACIÓN

	Oxigeno	0-19.4%	19.5-23.5%	23.6-100%	Tiempo
L.E.L.	0%	2	3	1	
	1 - 10%	2	2	1	
	10.1-100%	1	1	1	

1 Ingreso prohibido
2 Requiere condiciones especiales
3 Condiciones aceptable para realizar el trabajo

OBSERVACIONES ESPECIALES

INICIACIÓN y/o RENOVACIÓN

Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
22-01-24	7:00am		

SUSPENSIÓN

Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
24-01-24	5:00pm		

APROBACIÓN DEL PERMISO

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA	Declaro que he leído y entendido los Procedimientos de Seguridad
Valentina Vanegas	Valentina Vanegas	1006558861	

NOMBRE SUPERVISOR DE AREA	FIRMA	CEDULA	Estoy enterado del trabajo a realizar y de las precauciones a tomar

CIERRE DEL PERMISO

Iniciado pero no terminado ☐ Terminado en aprobación ☐ Terminado, aprobado y asegurado ☒

Certifico que el trabajo amparado por esta autorización ha sido cumplido en todas sus partes y el área ha quedado en condiciones seguras

Nombre:	Nombre:
Ejecutor	Supervisor de Area

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

PERMISO TRABAJO DE EXCAVACION - 7PEX

SOLICITUD DEL PERMISO

CIUDAD	AREA/CENTRO DE TRABAJO	PEX Nro.
Acacias 22-01-23	consorcio policia	03

NOMBRE EJECUTOR	C.C./NIT	COMPAÑIA
Valentina Vanegas	1006558861	

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARL	EPS	OTRAS
William Patiño	1932453?			

EQUIPOS A UTILIZAR	LUGAR/ÁREA/PROCESO	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Vibrocompactador de 17 Toneladas	campo Adecuamiento de terreno	

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES CRITICAS

	SI	NO		SI	NO
Se han consultado los planos del área?	X		Se requiere la asistencia permanente de un supervisor?	X	
Se ha identificado tuberías, cables y ductos del área?	X		Se requiere realizar taludes de tierra o apuntalamientos?		X
Se cuenta con entrada y salida segura del área ?	X		Tiene el personal entrenamiento y competencia?	X	
Se acordonará el área de trabajo?		X	Están reconocidas las distancias a tuberías y cables?	X	
Se ha verificado la atmósfera y dirección del viento?	X		Esta disponible y listo el equipo de primeros auxilios?	X	
Es posible realizar el trabajo en circuitos energizados?	X		Se cuenta con un procedimiento de Rescate?	X	
Esta el área limpia y libre de sustancias combustibles?	X		Se ha verificado el tipo de herramienta a usar?	X	
Se dispone de elementos para minimizar derrames?	X		Afectara la excavación algún camino? Explique		X
Existe la presencia de vapores en el área de trabajo?		X	Se requiere algún tipo de maquinaria pesada y/o vehículos?	X	
Es requerido aplicar Bloqueo y Etiquetado? (Utilizar Formato)		X	Si se trabaja con torre grúa esta posee el manual técnico?		X
Existen rampas o pasarelas seguras para el cruzar peatonal?	X		Es claro cuales son los centros médicos mas cercanos?	X	

Otros:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco de seguridad	X	Protectores auditivos	X	Arnés de Seguridad		Botas de seguridad	X
Gafas de seguridad	X	Careta protectora		Petos o traje especial		Guantes de cuero	X
Protección respiratoria		Otros:					

PRUEBA ATMOSFÉRICAS

HORA	MÉTODO - EQUIPO	O_2	LEL	CO	H_2S	CH_4

VALORES ADMISIBLES PARA INGRESO EN EXCAVACIÓN

	Oxigeno	0-19.4%	19.5-23.5%	23.6-100%	Tiempo
L.E.L.	0%	2	3	1	
	1 - 10%	2	2	1	
	10.1-100%	1	1	1	

1 Ingreso prohibido
2 Requiere condiciones especiales
3 Condiciones aceptable para realizar el trabajo

OBSERVACIONES ESPECIALES

INICIACIÓN y/o RENOVACIÓN

Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
22-01-24	7:00AM		

SUSPENSIÓN

Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
	24-01-24	5:00pm	

APROBACIÓN DEL PERMISO

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA	Declaro que he leído y entendido los Procedimientos de Seguridad
Valentina Vanegas	Valentina Vanegas	1006558861	

NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA	FIRMA	CEDULA	Estoy enterado del trabajo a realizar y de las precauciones a tomar

CIERRE DEL PERMISO

Iniciado pero no terminado ☐ Terminado en aprobación ☐ Terminado, aprobado y asegurado ☒

Certifico que el trabajo amparado por esta autorización ha sido cumplido en todas sus partes y el área ha quedado en condiciones seguras

Nombre:	Nombre:
Ejecutante	Supervisor de Area

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

PERMISO TRABAJO GENERAL - 8PGL

SOLICITUD DEL PERMISO

CIUDAD:	Acacias 22-01-23	AREA/CENTRO DE TRABAJO:	Consorcio Policia	PGL Nro. 01
NOMBRE EJECUTOR: Valentina Vanegas		C.C./NIT: 1006558861	COMPAÑÍA:	

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	OTRAS
Robinson daza escobar	1123512948	Sura	N.EPS	
Luis E. Benavidez	19416407	Sura	Sanitas	

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

EQUIPOS A UTILIZAR	LUGAR/ÁREA/PROCESO	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES CRITICAS

	SI	NO		SI	NO
Esta el área limpia y libre de sustancias combustibles?	X		Se trabajara con herramientas que proyecten partículas?		X
Se utilizaran sustancias químicas (desengrasantes, pinturas)		X	Las herramientas utilizadas pueden generar chispa?		X
Se ha identificado y demarcado adecuadamente el área?	X		Tiene el personal entrenamiento y competencia?	X	
Se requiere el uso de escaleras que no superen los 1,50 mts?		X	Se requiere el encerramiento del sitio de trabajo?		X
Son seguros y adecuados el acceso y salida del área?	X		Es necesario el cierre de vías?		X
Se requiere iluminación adicional antiexplosión?		X	Se requiere la parada de equipos?		X
Se requiere ventilación adicional?		X	Se requiere la asistencia permanente de un supervisor?	X	
Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)	X		Esta disponible y listo el equipo contra incendios?	X	
Las herramientas y equipos cuentan con guardas de seguridad?	X		Esta disponible y listo el equipo de primeros auxilios?	X	
Es requerido aplicar Bloqueo y Etiquetado? (Utilizar Formato)		X	Es claro cuales son los centros médicos mas cercanos?	X	
Se tendrá algún tipo de acercamiento con partes eléctricas?		X			

Otros:

OBSERVACIONES ESPECIALES

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Casco de seguridad	X	Careta protectora		Botas de seguridad, tipo:	X	Petos o traje especial, Tipo:	
Gafas de seguridad	X	Guantes, Tipo:		Protección respiratoria, tipo:		**Otros:**	
Protectores auditivos		Cinturón Portaherramientas					

INICIACIÓN y/o RENOVACIÓN				SUSPENSIÓN			
Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor	Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
22-01-24	7:00am			27-01-23	7	12:00pm	

APROBACIÓN DEL PERMISO

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA	Declaro que he leído y entendido los Procedimientos de Seguridad
Valentina Vanegas	Valentina Vanegas	1006558861	
NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA	FIRMA	CEDULA	Estoy enterado del trabajo a realizar y de las precauciones a tomar

CIERRE DEL PERMISO

Iniciado pero no terminado	X	Terminado en aprobación		Terminado, aprobado y asegurado	

Certifico que el trabajo amparado por esta autorización ha sido cumplido en todas sus partes y el área ha quedado en condiciones seguras

Nombre:	Nombre:
Ejecutar	Supervisor de Area

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA - 2PAL

SOLICITUD DEL PERMISO

CIUDAD:	AREA/CENTRO DE TRABAJO	PAL Nro.
Acacias 23-01-24	consorcio policia	01

NOMBRE EJECUTOR	C.C.NIT.	COMPAÑÍA
Valentina Vanegas	1006558861	

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	CERTIFICADO APTITUD EMPRESA			
Andres Castillo				Sena	X		
Orlando Barrera							

EQUIPOS/HERRAMIENTAS A UTILIZAR	LUGAR/ÁREA/PROCESO	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
rejas, Martillo		
pintilla, Arnes		
		Altura aproximada:

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES CRITICAS

Se requiere la asistencia permanente de un supervisor?	X	NO	N/A	Se cuenta con un plan de rescate?	X	NO	N/A
Existe riesgo de caída de personas al agua?	SI	NO	X	Existe riesgo eléctrico o presencia de animales (avispas, abejas)	SI	NO	X
Se ha señalizado y demarcado el área de trabajo?	X	NO	N/A	**Mencione en observaciones las medidas tomadas en caso de riesgo eléctrico**			
Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)?	X	NO	N/A	Existen huecos y han sido tapados y/o señalizados?	SI	X	N/A
El área esta libre de superficies húmedas, lisas, y/o irregulares?	X	NO	N/A				

PARA TRABAJOS SOBRE ANDAMIOS / SISTEMAS DE ACCESO

Se requiere instalación de barandas? (resistencia 200 lbs.)?	SI	X	N/A	El área de trabajo esta 100% cubierta y anclada a la estructura?	X	NO	N/A
Se requiere la instalación de línea de vida?	X	NO	N/A	Cuenta con escaleras internas para el ascenso?	X	NO	N/A
Los puntos de anclaje soportan 5000 lbs por persona conectada	X	NO	N/A	Existe un punto de anclaje seguro, distinto al andamio?	X	NO	N/A
El punto de anclaje esta por encima de los hombros?	X	NO	N/A	Los puntos de apoyo del andamio son estables y resistentes?	X	NO	N/A
Tiene el personal entrenamiento y competencia?	X	NO	N/A	Los cables del andamio colgante soportan 10000 lbs?	X	NO	N/A
El personal esta en buen estado de salud. Incluye alcohol-drogas	X	NO	N/A	El andamio colgante ha sido probado con anterioridad?	X	NO	N/A
Se han inspeccionado los equipos y herramientas a usar?	X	NO	N/A	Todas las partes del andamio están bien aseguradas?	X	NO	N/A
Se ha confirmado con operaciones la parada de equipos?	X	NO	N/A	Los sistemas de acceso son certificados?(Incluir canastillas/elevadores)		X	N/A

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco de seguridad con barbuquejo, tipo:	X	Eslingas		Gafas de seguridad	X
Botas de seguridad con suela antideslizante	X	Cuerdas		Protectores auditivos	
Arnés de cuerpo completo	X	Mosquetones		Prot. respiratoria, Tipo:	
Línea autoretractil	X	Cinta de anclaje		Chaleco salvavidas (caída al agua)	
Freno de cable / freno de cuerda	X	Guantes:		Otros:	

OBSERVACIONES ESPECIALES

INICIACIÓN y/o RENOVACIÓN				SUSPENSIÓN			
Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor	Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
23-01-24	1:00pm				23-01-24	4:00pm	

APROBACIÓN DEL PERMISO

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA	Declaro que he leído y entendido los Procedimientos de Seguridad
Valentina Vanegas	Valentina Vanegas	1006558861	
NOMBRE SUPERVISOR DE AREA	FIRMA	CEDULA	Estoy enterado del trabajo a realizar y de las precauciones a tomar

CIERRE DEL PERMISO

Iniciado pero no terminado ☐ Terminado en aprobación ☐ Terminado, aprobado y asegurado ☒

Certifico que el trabajo amparado por esta autorización ha sido cumplido en todas sus partes y el área ha quedado en condiciones seguras

Nombre:	Nombre:
Ejecutor	Supervisor de Área

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

PERMISO TRABAJO GENERAL - 8PGL

SOLICITUD DEL PERMISO

CIUDAD:	AREA/CENTRO DE TRABAJO:	PGL Nro.
Acacias 23-01-24	Consorcio policia	81

NOMBRE EJECUTOR	C.C./NIT :	COMPAÑIA:
Valentina Vanegas	1006558861	

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	OTRAS
Vidal Bejarano	18224618	Sura	F.Sanar	

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

EQUIPOS A UTILIZAR	LUGAR/ÁREA/PROCESO	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
bicicleta	campo	Recoger material

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBSERVACIONES CRITICAS

	SI	NO		SI	NO
Esta el área limpia y libre de sustancias combustibles?	X		Se trabajara con herramientas que proyecten partículas?	X	
Se utilizaran sustancias químicas (desengrasantes, pinturas)		X	Las herramientas utilizadas pueden generar chispa?		X
Se ha identificado y demarcado adecuadamente el área?	X		Tiene el personal entrenamiento y competencia?	X	
Se requiere el uso de escaleras que no superen los 1,50 mts?		X	Se requiere el encerramiento del sitio de trabajo?		X
Son seguros y adecuados el acceso y salida del área?	X		Es necesario el cierre de vías?		X
Se requiere iluminación adicional antiexplosión?		X	Se requiere la parada de equipos?		X
Se requiere ventilación adicional?		X	Se requiere la asistencia permanente de un supervisor?	X	
Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)	X		Esta disponible y listo el equipo contra incendios?	X	
Las herramientas y equipos cuentan con guardas de seguridad?	X		Esta disponible y listo el equipo de primeros auxilios?	X	
Es requerido aplicar Bloqueo y Etiquetado? (Utilizar Formato)		X	Es claro cuales son los centros médicos mas cercanos?	X	
Se tendrá algún tipo de acercamiento con partes eléctricas?		X			

Otros:

OBSERVACIONES ESPECIALES

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Casco de seguridad	X	Careta protectora		Botas de seguridad, tipo:	X	Petos o traje especial, Tipo:	
Gafas de seguridad	X	Guantes, Tipo:		Protección respiratoria, tipo:		**Otros:**	
Protectores auditivos	X	Cinturón Portaherramientas					

INICIACIÓN y/o RENOVACIÓN

Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
23-01-24	7:00am	5 pm	

SUSPENSIÓN

Fecha	Desde (hora)	Hasta (hora)	Supervisor
24:01-24	1:00pm	5:00pm	

APROBACIÓN DEL PERMISO

NOMBRE EJECUTOR	FIRMA	CEDULA	Declaro que he leído y entendido los Procedimientos de Seguridad
Valentina Vanegas	Valentina Vanegas	1006558861	
NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA	FIRMA	CEDULA	Estoy enterado del trabajo a realizar y de las precauciones a tomar

CIERRE DEL PERMISO

Iniciado pero no terminado ☐ Terminado en aprobación ☐ Terminado, aprobado y asegurado ☒

Certifico que el trabajo amparado por esta autorización ha sido cumplido en todas sus partes y el área ha quedado en condiciones seguras

Nombre:	Nombre:
Ejecutar	Supervisor de Area

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

EMEDEVAC-EVACUACION MEDICA -16SS

Nº	NOMBRE	CEDULA	RH	EPS	ARL	TELEFONO	EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A	TELEFONO
1	LUIS ANTONIO MOLINA	17312984	O+	CAJA COPI	SURA	3112022352	LUIS ALEJANDRO MOLINA	3223851349
2	ANDRES CASTILLO	1001271237	O-	FAMISANAR	SURA	3227105691	SANDRA MILENA VILLAR	3102397465
3	ORLANDO BARRERA	4272180	O+	FAMISANAR	SURA	3125698622	MARIA TERESA GOMEZ	3132913489
4	PATROCINIO VASQUEZ	17328844	A+	SALUD TOTAL	SURA	3227065292	CHELLENIN MARTINEZ	3102267671
10	JHON GUILLERMO ORTIZ	79232022	O+	SALUD TOTAL	SURA	3112361639	LIGIA CORREA	3133008210
11	MIGUEL ANGEL GIRALDO	1121917353	O+	NUEVA EPS	SURA	3204660449	CLAUDIA MORALES	3112065165
12	LUIS EDUARDO BENAVIDEZ	19416407	B+	SANITAS	SURA	3115777080	MARBY YANETH GARZON	3132612933
13	ROBINSON ESCOBAR DAZA	1123512948	A+	NUEVA EPS	SURA	3206879663	SOLANYI FUENTES	3122777412
14	LUIS ALEJANDRO MOLINA	1121868163	O+	FAMISANAR	SURA	3222851349	LUCIA RAMIREZ	3204968553
16	LUIS MIGUEL HERNANDEZ PED	1006776248	O+	SALUD TOTAL	SURA	3202003732	HUMBERTO HERNANDEZ	3122799766
17	LUIS ANTONIO PIÑERO	PPT 5471061	O+	SANITAS	SURA	3209160125	MARTHA DIAZ	3176747195
18	ISABELLA URAVIJO	1122143748	B+	SANITAS	SURA	3106731902	NOHORA CAMACHO	3182908059
19	MIGUEL ANDRES PEREZ	1122139389	A+	SANITAS	SURA	3165870320	MARINA SANTOS	3103401744
20	EDUAR ARBEY ORTIZ	86078482	O+	SANITAS	A.COLPATRIA	3134757724	LEIDY RINCON	3137106240
21	EMILCE GONZALEZ	1120362537	O+	CAPITAL SALUD	SURA	3223135628	MARIA MARTIN	3202316793
22	RICARDOARANGO CASTILLO	1124994764	O+	MEDIMAS	SURA		MAIRA INES ARANGO	3228592852
23	JULIAN REYES	8102467	A+	SANITAS	SURA	3025454596	CESAR REYES	3207789031
24	FABIAN ANDRES REY	1122118780	A+	CAPITALSALUD	SURA	3227593498	ENIESTELA	3224062726
25	RICHARD MORENO	17418711	O+	CAPITAL SALUD	SURA	3143469750	CARMEN MORENO	3138162772
26	EDWIN PAEZ	1121868371	B+	SANITAS	SURA	3203833458	YERLI PAEZ	3242051730
27	YEISON PAEZ	86071378	O+	SANITAS	SURA	3135779309	YERLI PAEZ	3242051730
28	MAURICIO HERRERA	1121838357	A+	CAPITAL SALUD	SURA	3112618366	YERLI PAEZ	3123687102
29	LUIS FERNANDO DAZA	93461815	O+	FamiSanar	Sura	3212783395	CARLOS JULIO DAZA	3118018251
30	BRAYAN ALEXIS RUIZ	1122142788	O+	FAMI SANAR	SURA	3106355962	ROSANA RODRIGUEZ	3138372917

	NOMBRE	CIUDAD	UBICACIÓN
NTIDAD	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E	ACACIAS	DG 15 26-21
OSPITAL	BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ACACIAS	ACACIAS	CALLE 13 # 15-43
MBEROS			

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

INSPECCION DE BOTIQUIN Y CAMILLA - 13SS

MES DE INSPECCION Y DOTACION: Enero

SUMINISTROS	CANTIDAD RECOMENDADA (UND)	BOTIQUIN PRINCIPAL ESTADO B	R	M	NO TIENE	OBS	BOTIQUIN PORTATIL ESTADO B	R	M	NO TIENE	OBS
ALCOHOL BOTELLA (FRASCO)	1	B									
ALGODÓN (PAQUETE)	0				X						
ISODINE ESPUMA (FRASCO)	0				X						
ISODINE SOLUCION (FRASCO)	1	B									
SUERO FISIOLOGICO (BOLSA DE 250 C.C.)	2	B									
SUERO ORAL (SOBRES)	3				X						
GUANTES EN LATEX (PARES)	100	B									
VENDAS FIJAS	0				X						
VENDAS ELASTICAS	3	B									
APLICADORES	10				X						
MICROPORE	0										
ESPARADRAPO	2	B									
GASA ESTERIL (PRECORTADA)	4	B									
CURITAS	10				X						
PARCHE OCULAR	2				X						
BAJA LENGUAS	20	B									
JERINGA	0				X						
TAPABOCAS DESECHABLES	10				X						
JABON NEUTRO O GEL QUIRURGICO	0				X						
TIJERAS (MEDIANAS) PUNTA ROMA	0				X						
TERMOMETRO	1	B									
LINTERNA PEQUEÑA	0				X						
PITO	0				X						
INSTRUCTIVO PRIMEROS AUXILIOS	0				X						
BOLSA ROJA	1	B									
REGISTRO DE PRIMEROS AUXILIOS	0				X						
CAMILLA (Señalización, Lona, correas de seguridad, Estado General)	1	B									
INMOBILIZADOR	1	B									

OBSERVACIONES:

Valentina Vanegas
RESPONSABLE

Vo. GERENCIA

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

INSPECCION EXTINTORES - 15SS

FECHA DE INSPECCIÓN:	UBICADO EN	CLASE EXTINTOR	CAPACIDAD LIBRAS	PARTES A REVISAR	BUENO	REGULAR	MALO	ACCIÓN A TOMAR
Julio	Bodega Parte de Afuera	Multiproposito	10 20 30 Libras	MANÓMETRO	/			
				MANIJA	/			
				BOQUILLA	/			
				ETIQUETA	/			
				CUERPO	/			
				TARJETA	/			
				VENCIMIENTO	/			
				LIMPIEZA	/			
				MANÓMETRO				
				MANIJAS				
				BOQUILLA				
				ETIQUETA				
				CUERPO				
				TARJETA				
				VENCIMIENTO				
				LIMPIEZA				
				MANÓMETRO				
				MANIJAS				
				BOQUILLA				
				ETIQUETA				
				CUERPO				
				TARJETA				
				VENCIMIENTO				
				LIMPIEZA				
				MANÓMETRO				
				MANIJAS				
				BOQUILLA				
				ETIQUETA				
				CUERPO				
				TARJETA				
				VENCIMIENTO				
				LIMPIEZA				
				MANÓMETRO				
				MANIJAS				
				BOQUILLA				
				ETIQUETA				
				CUERPO				
				TARJETA				
				VENCIMIENTO				
				LIMPIEZA				
				MANÓMETRO				
				MANIJAS				
				BOQUILLA				
				ETIQUETA				
				CUERPO				
				TARJETA				
				VENCIMIENTO				
				LIMPIEZA				
				MANÓMETRO				
				MANIJAS				
				BOQUILLA				
				ETIQUETA				
				CUERPO				
				TARJETA				
				VENCIMIENTO				
				LIMPIEZA				

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE

NOMBRE:

CARGO:

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

CIUDAD	AREA/CENTRO DE TRABAJO	ATS No.
ACACIAS 02-01-24	CONSORCIO POLICIA.	015

LUGAR/AREA/PROCESO	FECHA ELABORACIÓN	TIEMPO DE COBERTURA DEL ATS
CAMPO.	02 | 01 | 24	7 DIAS

TRABAJO A REALIZAR

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS	CEDULA	POSICIÓN/CARGO	EMPRESA
Patrocinio			

ANÁLISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO

TAREAS DEL TRABAJO	Coloque todas las tareas propias del trabajo en forma secuencial y ordenada
RIESGOS	Si existe un riesgo en cada tarea, escríbalo en cada casilla
CONTROLES	Coloque en la casillas de *Controles* la letra que aparece en *Control Exigido,* acorde al riesgo.
PRIORIZACIÓN	Coloque estos valores: 1=Bajo, 2=Medio, 3=Alto, en *Consecuencia* y *Probabilidad* y luego multiplique estos dos valores entre si colocando el resultado en la casilla de *Grado Riesgo*.
INTERPRETACIÓN EL GRADO DE RIESGO	*Menor:* (valores entre 1 y 2), se deben mantener los riesgos controlados con los planes de acción establecidos. *Moderado:* (Valores entre 3 y 4), se requiere supervisión periódica, mantener los controles establecidos en forma permanente. *Mayor:* (Valores entre 6 y 9), se requiere supervisión permanente y controles espaciales.

CONTROLES EXIGIDOS

EPP	(A)	Talud/Apuntalamiento	(G)	Conexiones a Tierr	(M)	Cortinas de agua	(S)	Cubrir material	(Y)
Capacitación	(B)	Trabajo con planos Arqu	(H)	Paradas de Emerg	(N)	Insonorización	(T)	Centro de acopio	(Z)
Charla de Seguridad	(C)	Demarcación / Señaliza	(I)	Hojas de Seguridad	(O)	Anclajes	(U)	Mallas de retención	(AB)
Supervisión	(D)	Iluminación Provisional	(J)	Monitoreo ambient	(P)	Orden y aseo	(V)	Proced. Operación	(AC)
Bloqueo y Etiquetado	(E)	Mamparas de seguridad	(K)	Inspección Pre-usc	(Q)	Sistema de Extrac	(W)	Control Inventarios	(AD)
Guardas	(F)	Ayudas Mecánicas	(L)	Proc. Izaje de Carg	(R)	Ventilación adicion	(X)	Otros:	(AE)

TAREAS	RIESGOS/ASPECTOS	CONTROLES	PRIORIZACION		
			Conse.	Proba.	Grado Riesgo
EXCAVACION MANUAL	FISICO - Polvo	A B C D	1	1	1
POSTES/CAMPAMENTO	ERGONOMICO levantamiento de cargas	A B C D	1	1	1
RELLENO PISO/MANUAL	FISICO Polvo-	A B C D	1	1	1
CAMPAMENTO.	ERGONOMICO Malas Posturas levantamiento de cargas	A B C D	1	1	1

FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

TAREAS	RIESGOS/ASPECTOS	CONTROLES	PRIORIZACION Conse.	Proba.	Grado Riesgo

OBSERVACIONES ADICIONALES

CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO

Entorno

- [X] Nivel de Ruido
- [ ] Material filoso
- [ ] Ventilación
- [ ] Congestión
- [ ] Trabajos Altos
- [ ] Caminos
- [ ] Áreas Punteadas
- [ ] Clima
- [ ] Guayas/cables
- [ ] Muelle/Agua
- [ ] Resbalos/Caídas
- [ ] Vibración
- [ ] Contaminación
- [ ] Iluminación
- [ ] Líneas eléctricas
- [ ] Combustibles
- [ ] Cables Enterrados/Tuberías

Otros:

Herramientas / Equipos

- [X] Herram. de Mano
- [ ] Motobombas
- [ ] Herram. de Aire
- [ ] Mangueras
- [ ] Generador
- [ ] Andamio
- [ ] Escaleras
- [ ] Vehiculo
- [ ] Sustancias químicas
- [ ] Especial/Herramienta Inusual
- [ ] Herram. Eléctrica/ Extensiones Eléctricas
- [ ] Grúa / Malacate / Winche
- [ ] Circuito Interruptor/Tierra
- [ ] Linterna a prueba de explosión

Otros:

Pruebas

- [ ] Benceno
- [ ] Voltímetro
- [ ] Monitoreo de Gases
- [ ] Plomo
- [ ] Monitoreo de aguas
- [ ] Presión

Otros:

Respuesta Emergencias

- [X] Extintores
- [ ] Kit Derrames
- [ ] Equipo de Medición
- [X] Botiquín P.A.
- [ ] Equipo de Rescate
- [X] Camilla
- [ ] Plan de Emergencia y Evacuación
- [ ] Plan de Contingencias

Otros:

Producto / Material

- [ ] Corrosivo
- [ ] Frío
- [ ] Sólidos (Plomo)
- [ ] Caliente
- [ ] Gas/Vapor
- [ ] Líquido
- [ ] Partículas (Polvo)
- [ ] Hidrocarburo
- [ ] Tóxico

Otros:

Notificaciones

- [ ] Cliente(s)
- [ ] CAR(ambiental)
- [ ] Bomberos
- [ ] Supervisor Sitio
- [ ] Jefe C. de Trabajo
- [ ] Vecinos
- [ ] SDA (Secretaria Distrital Ambiente)

Otros:

Se requiere personal especializado

- [X] Ingeniero
- [X] Seguridad Industrial
- [ ] Técnico
- [ ] Soldador
- [ ] Operador de Equipo
- [ ] Empleado Temporal

Otros:

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS

PT en Espacio Confinado	SI [ ]	NO [ ]	PT Eléctrico	SI [ ]	NO [ ]	PT General	SI [X]	NO [ ]	PT Excavación	SI [ ]	NO [ ]
PT Desacople de Equipo	SI [ ]	NO [ ]	PT en Caliente	SI [ ]	NO [ ]	PT en Alturas	SI [ ]	NO [ ]	Otro:		

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo:	SI	NO
	[ ]	[ ]

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre	Nombre
Edwar Arley Ortiz	
Elaboró (Ejecutor)	Revisó (Supervisor de Area)

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - 1ATS

CIUDAD	AREA/CENTRO DE TRABAJO	ATS No.
Acacias	consorcio policia	01

LUGAR/ÁREA/PROCESO	FECHA ELABORACIÓN	TIEMPO DE COBERTURA DEL ATS
Adecuacion del terreno	10 | 01 | 24	05 dias

TRABAJO A REALIZAR

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS	CEDULA	POSICIÓN/CARGO	EMPRESA
Edgar Albeir ortiz	86078482	Residente obra	consorcio
Silvestre ariza	9527938	SISO	consorcio
luis molina	17317984	Maestro obra	consorcio

ANÁLISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO	
TAREAS DEL TRABAJO	Coloque todas las tareas propias del trabajo en forma secuencial y ordenada
RIESGOS/ASPECTOS	Si existe un riesgo en cada tarea, escríbalo en cada casilla
CONTROLES	Coloque en la casillas de *Controles* la letra que aparece en *Control Exigido,* acorde al riesgo.
PRIORIZACIÓN	Coloque estos valores: 1=Bajo, 2=Medio, 3=Alto, en *Consecuencia* y *Probabilidad* y luego multiplique estos dos valores entre si colocando el resultado en la casilla de *Grado Riesgo*.
INTERPRETACIÓN EL GRADO DE RIESGO	*Menor:* (valores entre 1 y 2), se deben mantener los riesgos controlados con los planes de acción establecidos. *Moderado:* (Valores entre 3 y 4), se requiere supervisión periódica, mantener los controles establecidos en forma permanente. *Mayor:* (Valores entre 6 y 9), se requiere supervisión permanente y controles espaciales.

CONTROLES EXIGIDOS									
EPP	(A)	Talud/Apuntalamiento	(G)	Conexiones a Tierr	(M)	Cortinas de agua	(S)	Cubrir material	(Y)
Capacitación	(B)	Trabajo con planos Arqu	(H)	Paradas de Emerg	(N)	Insonorización	(T)	Centro de acopio	(Z)
Charla de Seguridad	(C)	Demarcación / Señaliza	(I)	Hojas de Seguridad	(O)	Anclajes	(U)	Mallas de retención	(AB)
Supervisión	(D)	Iluminación Provisional	(J)	Monitoreo ambient	(P)	Orden y aseo	(V)	Proced. Operación	(AC)
Bloqueo y Etiquetado	(E)	Mamparas de seguridad	(K)	Inspección Pre-usc	(Q)	Sistema de Extrac	(W)	Control Inventarios	(AD)
Guardas	(F)	Ayudas Mecánicas	(L)	Proc. Izaje de Carg	(R)	Ventilación adicion	(X)	Otros:	(AE)

TAREAS DEL TRABAJO	RIESGOS/ASPECTOS	CONTROLES								PRIORIZACION		
										Conse.	Proba.	Grado Riesgo
Topografia	FISICOS: Ruido	A								1		
	Quimico: Polvo	A								1	1	1
	Biologico: Animales, vegetacion	A								1	1	1
	Ergonomico: Sobreesfuerzos	A	B	C	D					1	1	1
	locativo caidas	A										
	Natural: lluvia, sol	A								1	1	1
Desc. y nivelacion	FISICO: Ruido	A								1	1	1
	Quimico: Polvo	A								1	1	1
	Ergonomico: Posturas prolongadas	A	B	C	D					1	1	1
Adecuacion Area	FISICO: Ruido, Radicion	A								1	1	1
	Quimico: Polvo	A								1	1	1
	Ergonomico: Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos	A	B	C	D					1	1	1

FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

TAREAS	RIESGOS/ASPECTOS	CONTROLES	PRIORIZACION Conse.	Proba.	Grado Riesgo

OBSERVACIONES ADICIONALES

CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO

Entorno

- [X] Nivel de Ruido
- [ ] Ventilación
- [ ] Trabajos Altos
- [ ] Áreas Punteadas
- [ ] Guayas/cables
- [X] Resbalos/Caídas
- [ ] Contaminación
- [ ] Líneas eléctricas
- [ ] Cables Enterrados/Tuberías
- [ ] Material filoso
- [ ] Congestión
- [X] Caminos
- [X] Clima
- [ ] Muelle/Agua
- [ ] Vibración
- [ ] Iluminación
- [ ] Combustibles

Otros:

Herramientas / Equipos

- [X] Herram. de Mano
- [ ] Herram. de Aire
- [ ] Generador
- [ ] Escaleras
- [ ] Sustancias químicas
- [ ] Especial/Herramienta Inusual
- [ ] Herram. Eléctrica/ Extensiones Eléctricas
- [ ] Grúa / Malacate / Winche
- [ ] Circuito Interruptor/Tierra
- [ ] Linterna a prueba de explosión
- [ ] Motobombas
- [ ] Mangueras
- [ ] Andamio
- [X] Vehiculo

Otros:

Pruebas

- [ ] Benceno
- [ ] Monitoreo de Gases
- [ ] Monitoreo de aguas
- [ ] Voltímetro
- [ ] Plomo
- [ ] Presión

Otros:

Respuesta Emergencias

- [X] Extintores
- [ ] Equipo de Medición
- [X] Equipo de Rescate
- [X] Plan de Emergencia y Evacuación
- [ ] Plan de Contingencias
- [ ] Kit Derrames
- [X] Botiquín P.A.
- [X] Camilla

Otros:

Producto / Material

- [ ] Corrosivo
- [ ] Sólidos (Plomo)
- [ ] Gas/Vapor
- [X] Partículas (Polvo)
- [ ] Tóxico
- [ ] Frío
- [ ] Caliente
- [ ] Líquido
- [ ] Hidrocarburo

Otros:

Notificaciones

- [ ] Cliente(s)
- [X] Bomberos
- [X] Jefe C. de Trabajo
- [ ] SDA (Secretaria Distrital Ambiente)
- [ ] CAR(ambiental)
- [X] Supervisor Sitio
- [ ] Vecinos

Otros:

Se requiere personal especializado

- [X] Ingeniero
- [X] Técnico
- [X] Operador de Equipo
- [ ] Empleado Temporal
- [X] Seguridad Industrial
- [ ] Soldador

Otros:

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS

PT en Espacio Confinado	SI [ ]	NO [X]	PT Eléctrico	SI [X]	NO [ ]	PT General	SI [X]	NO [ ]	PT Excavación	SI [X]	NO [ ]
PT Desacople de Equipo	SI [ ]	NO [X]	PT en Caliente	SI [ ]	NO [X]	PT en Alturas	SI [X]	NO [ ]	Otro:		

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo:	SI	NO
	[ ]	[ ]

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre	Nombre
Elaboró (Ejecutor)	Edwar Arley Ortiz Revisó (Supervisor de Area)

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - 1ATS

CIUDAD	AREA/CENTRO DE TRABAJO	ATS No.
Acacias	consorcio policia	03

LUGAR/ÁREA/PROCESO	FECHA ELABORACIÓN	TIEMPO DE COBERTURA DEL ATS
campo	15 / 01 / 24	06 días

TRABAJO A REALIZAR

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS	CEDULA	POSICIÓN/CARGO	EMPRESA
Edgar Albert Ortiz	86078482	Residenteobra	consorcio
Silvestre Anaya	9527938	SISO	consorcio
Luis molina	17312484	Maestroobra	consorcio

ANÁLISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO

TAREAS DEL TRABAJO	Coloque todas las tareas propias del trabajo en forma secuencial y ordenada
RIESGOS/ASPECTOS	Si existe un riesgo en cada tarea, escríbalo en cada casilla
CONTROLES	Coloque en la casillas de *Controles* la letra que aparece en *Control Exigido,* acorde al riesgo.
PRIORIZACIÓN	Coloque estos valores: 1=Bajo, 2=Medio, 3=Alto, en *Consecuencia* y *Probabilidad* y luego multiplique estos dos valores entre si colocando el resultado en la casilla de *Grado Riesgo*.
INTERPRETACIÓN EL GRADO DE RIESGO	*Menor:* (valores entre 1 y 2), se deben mantener los riesgos controlados con los planes de acción establecidos. *Moderado:* (Valores entre 3 y 4), se requiere supervisión periódica, mantener los controles establecidos en forma permanente. *Mayor:* (Valores entre 6 y 9), se requiere supervisión permanente y controles espaciales.

CONTROLES EXIGIDOS

EPP	(A)	Talud/Apuntalamiento	(G)	Conexiones a Tierr	(M)	Cortinas de agua	(S)	Cubrir material	(Y)
Capacitación	(B)	Trabajo con planos Arqu	(H)	Paradas de Emerg	(N)	Insonorización	(T)	Centro de acopio	(Z)
Charla de Seguridad	(C)	Demarcación / Señaliza	(I)	Hojas de Seguridad	(O)	Anclajes	(U)	Mallas de retención	(AB)
Supervisión	(D)	Iluminación Provisional	(J)	Monitoreo ambient	(P)	Orden y aseo	(V)	Proced. Operación	(AC)
Bloqueo y Etiquetado	(E)	Mamparas de seguridad	(K)	Inspección Pre-usc	(Q)	Sistema de Extrac	(W)	Control Inventarios	(AD)
Guardas	(F)	Ayudas Mecánicas	(L)	Proc. Izaje de Carg	(R)	Ventilación adicion	(X)	Otros:	(AE)

TAREAS DEL TRABAJO	RIESGOS/ASPECTOS	CONTROLES	PRIORIZACION		
			Conse.	Proba.	Grado Riesgo
DESCAPOTE	FISICO: Ruido Quimico Polvo Ergonomico: mala postura	A B C D	1	1	1
Excavación	FISICO: Ruido Quimico Polvo Ergonomico: mala postura	A B C D	1	1	1
Nivelacion	FISICO: Ruido Polvo = Quimico Ergonomico: mala postura	A B C D	1	1	1
Adecuacion locativa Baño, encerramiento porton	FISICO: Ruido Quimico: Polvo Ergonomico: Sobre esfuerzos posturas	A B C D V	1	1	1

FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

TAREAS	RIESGOS/ASPECTOS	CONTROLES	PRIORIZACION Conse.	Proba.	Grado Riesgo

OBSERVACIONES ADICIONALES

CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO

Entorno

- [X] Nivel de Ruido
- [ ] Material filoso
- [ ] Ventilación
- [ ] Congestión
- [ ] Trabajos Altos
- [ ] Caminos
- [ ] Áreas Punteadas
- [ ] Clima
- [ ] Guayas/cables
- [ ] Muelle/Agua
- [ ] Resbalos/Caídas
- [ ] Vibración
- [ ] Contaminación
- [ ] Iluminación
- [ ] Líneas eléctricas
- [ ] Combustibles
- [ ] Cables Enterrados/Tuberías

Otros:

Herramientas / Equipos

- [X] Herram. de Mano
- [ ] Motobombas
- [ ] Herram. de Aire
- [ ] Mangueras
- [ ] Generador
- [X] Andamio
- [ ] Escaleras
- [X] Vehiculo
- [ ] Sustancias químicas
- [ ] Especial/Herramienta Inusual
- [ ] Herram. Eléctrica/ Extensiones Eléctricas
- [ ] Grúa / Malacate / Winche
- [ ] Circuito Interruptor/Tierra
- [ ] Linterna a prueba de explosión

Otros:

Pruebas

- [ ] Benceno
- [ ] Voltímetro
- [ ] Monitoreo de Gases
- [ ] Plomo
- [ ] Monitoreo de aguas
- [ ] Presión

Otros:

Respuesta Emergencias

- [X] Extintores
- [ ] Kit Derrames
- [ ] Equipo de Medición
- [X] Botiquín P.A.
- [ ] Equipo de Rescate
- [X] Camilla
- [X] Plan de Emergencia y Evacuación
- [ ] Plan de Contingencias

Otros:

Producto / Material

- [ ] Corrosivo
- [ ] Frío
- [ ] Sólidos (Plomo)
- [ ] Caliente
- [ ] Gas/Vapor
- [ ] Líquido
- [X] Partículas (Polvo)
- [ ] Hidrocarburo
- [ ] Tóxico

Otros:

Notificaciones

- [ ] Cliente(s)
- [ ] CAR(ambiental)
- [ ] Bomberos
- [X] Supervisor Sitio
- [ ] Jefe C. de Trabajo
- [ ] Vecinos
- [ ] SDA (Secretaria Distrital Ambiente)

Otros:

Se requiere personal especializado

- [X] Ingeniero
- [ ] Seguridad Industrial
- [ ] Técnico
- [ ] Soldador
- [X] Operador de Equipo
- [ ] Empleado Temporal

Otros:

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS

PT en Espacio Confinado	SI [ ]	NO [ ]	PT Eléctrico	SI [ ]	NO [ ]	PT General	SI [X]	NO [ ]	PT Excavación	SI [X]	NO [ ]
PT Desacople de Equipo	SI [ ]	NO [ ]	PT en Caliente	SI [ ]	NO [ ]	PT en Alturas	SI [X]	NO [ ]	Otro:		

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo:	SI [ ]	NO [ ]

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre	Nombre
Valentina Vanegas	
Elaboró (Ejecutor)	Revisó (Supervisor de Area)

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

CIUDAD	AREA/CENTRO DE TRABAJO	ATS No.
Acacias 22-01-24	Consorcio policia	04

LUGAR/ÁREA/PROCESO	FECHA ELABORACIÓN	TIEMPO DE COBERTURA DEL ATS
campo	22 | 01 | 24	06 dias

TRABAJO A REALIZAR
Adecuacion y construccion de terraza

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS	CEDULA	POSICIÓN/CARGO	EMPRESA
Ing Edgar Arbey Ortiz		Ingeniero	
Luis A. Molina		Maestro de obra	
Silvestre Arca		P. SST	

ANÁLISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO	
TAREAS DEL TRABAJO	Coloque todas las tareas propias del trabajo en forma secuencial y ordenada
RIESGOS	Si existe un riesgo en cada tarea, escríbalo en cada casilla
CONTROLES	Coloque en la casillas de *Controles* la letra que aparece en *Control Exigido,* acorde al riesgo.
PRIORIZACIÓN	Coloque estos valores: 1=Bajo, 2=Medio, 3=Alto, en *Consecuencia* y *Probabilidad* y luego multiplique estos dos valores entre si colocando el resultado en la casilla de *Grado Riesgo*.
INTERPRETACIÓN EL GRADO DE RIESGO	*Menor:* (valores entre 1 y 2), se deben mantener los riesgos controlados con los planes de acción establecidos. *Moderado:* (Valores entre 3 y 4), se requiere supervisión periódica, mantener los controles establecidos en forma permanente. *Mayor:* (Valores entre 6 y 9), se requiere supervisión permanente y controles espaciales.

CONTROLES EXIGIDOS

EPP	(A)	Talud/Apuntalamiento	(G)	Conexiones a Tierr	(M)	Cortinas de agua	(S)	Cubrir material	(Y)
Capacitación	(B)	Trabajo con planos Arqu	(H)	Paradas de Emerg	(N)	Insonorización	(T)	Centro de acopio	(Z)
Charla de Seguridad	(C)	Demarcación / Señalizac	(I)	Hojas de Seguridad	(O)	Anclajes	(U)	Mallas de retención	(AB)
Supervisión	(D)	Iluminación Provisional	(J)	Monitoreo ambient	(P)	Orden y aseo	(V)	Proced. Operación	(AC)
Bloqueo y Etiquetado	(E)	Mamparas de seguridad	(K)	Inspección Pre-usc	(Q)	Sistema de Extrac	(W)	Control Inventarios	(AD)
Guardas	(F)	Ayudas Mecánicas	(L)	Proc. Izaje de Carg	(R)	Ventilación adicion	(X)	Otros:	(AE)

TAREAS	RIESGOS/ASPECTOS	CONTROLES	PRIORIZACION		
			Conse.	Proba.	Grado Riesgo
Terraceo Area	Fisico: radiaciones Ergonomico: Movimientos repetitivos Quimico: Polvo	A B C D	1	1	1
Excavacion Manual Zapatas	Fisico: radiaciones Quimico: Polvo Ergonomico: Movimientos repetitivos	A B C D	1	1	1
Descargue y Amarre Acero	Ergonomico: Sobre esfuerzos Malas posturas Quimico: Polvo	A B C D 1	1	1	1
Recibo y colocacion de concreto Solados	Ergonomico: Sobre esfuerzos mala postura	A B C D	1	1	1

FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

TAREAS	RIESGOS/ASPECTOS	CONTROLES	PRIORIZACION Conse.	Proba.	Grado Riesgo
Tracego Interno de relleno	Ergonomico: Sobreesfuerzo Quimico: Polvo	A B C D	1	1	1

OBSERVACIONES ADICIONALES

CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO

Entorno

- [X] Nivel de Ruido
- [ ] Ventilación
- [ ] Trabajos Altos
- [ ] Áreas Punteadas
- [ ] Guayas/cables
- [ ] Resbalos/Caídas
- [ ] Contaminación
- [ ] Líneas eléctricas
- [ ] Cables Enterrados/Tuberías
- [ ] Material filoso
- [ ] Congestión
- [ ] Caminos
- [ ] Clima
- [ ] Muelle/Agua
- [ ] Vibración
- [ ] Iluminación
- [ ] Combustibles

Otros:

Herramientas / Equipos

- [X] Herram. de Mano
- [ ] Herram. de Aire
- [ ] Generador
- [ ] Escaleras
- [ ] Sustancias químicas
- [ ] Especial/Herramienta Inusual
- [ ] Herram. Eléctrica/ Extensiones Eléctricas
- [ ] Grúa / Malacate / Winche
- [ ] Circuito Interruptor/Tierra
- [ ] Linterna a prueba de explosión
- [ ] Motobombas
- [ ] Mangueras
- [ ] Andamio
- [X] Vehiculo

Otros:

Pruebas

- [ ] Benceno
- [ ] Monitoreo de Gases
- [ ] Monitoreo de aguas
- [ ] Voltímetro
- [ ] Plomo
- [ ] Presión

Otros:

Respuesta Emergencias

- [X] Extintores
- [ ] Equipo de Medición
- [ ] Equipo de Rescate
- [X] Plan de Emergencia y Evacuación
- [ ] Plan de Contingencias
- [ ] Kit Derrames
- [X] Botiquín P.A.
- [X] Camilla

Otros:

Producto / Material

- [ ] Corrosivo
- [ ] Sólidos (Plomo)
- [ ] Gas/Vapor
- [X] Partículas (Polvo)
- [ ] Tóxico
- [ ] Frío
- [ ] Caliente
- [ ] Líquido
- [ ] Hidrocarburo

Otros:

Notificaciones

- [ ] Cliente(s)
- [ ] Bomberos
- [ ] Jefe C. de Trabajo
- [ ] SDA (Secretaria Distrital Ambiente)
- [ ] CAR(ambiental)
- [X] Supervisor Sitio
- [ ] Vecinos

Otros:

Se requiere personal especializado

- [X] Ingeniero
- [ ] Técnico
- [X] Operador de Equipo
- [ ] Empleado Temporal
- [X] Seguridad Industrial
- [ ] Soldador

Otros:

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS

PT en Espacio Confinado	SI [ ]	NO [ ]	PT Eléctrico	SI [ ]	NO [ ]	PT General	SI [X]	NO [ ]	PT Excavación	SI [X]	NO [ ]
PT Desacople de Equipo	SI [ ]	NO [ ]	PT en Caliente	SI [ ]	NO [ ]	PT en Alturas	SI [ ]	NO [ ]	Otro:		

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo:	SI	NO
	[X]	[ ]

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre	Nombre
Valentina Vanegas	Edwar Arley Ortiz
Elaboró (Ejecutor)	Revisó (Supervisor de Area)

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-18, 03:35:27 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1059832810

Periodo Cotización: noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** diciembre de 2023

PAGADO 18/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SL CONSTRUCCIONES SAS	**Nombre Sucursal**	UNO	**Código Sucursal**	01
Documento	NI901546591	**Dirección**	CL 16A #41 - 15		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3112820		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	ACACIAS	**Departamento**	META		
Representante Legal	MARTINEZ ALEIDY EFIGENIA	**Identificación**	CC 1122127640		
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1122134932	NESTOR ANDRES GUZMAN CANTOR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF34) COFREM	$ 100	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.900
CC 17341827	LEONEL DUEÑAS JARA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF34) COFREM	$ 1.000	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.900
CC 79252022	JHON GUILLERMO ORTIZ GUTIERREZ	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF34) COFREM	$ 100	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.300
CC 79357689	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ WALDRON	01	03	X																0	0	15	15	15	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 580.000	$ 23.200	6,960	$ 580.000	$ 40.400	(CCF34) COFREM	$ 100	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.320.000	$ 4.060.000	$ 4.060.000	$ 1.300	$ 371.200	$ 162.400	$ 282.800	$ 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 816.800	$ 0	$ 816.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 95980

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC040015	JOHN DERE	410J	2009

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	152574

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	PE4045T690013	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
8426 Kg	2820 mm	2300 mm	7290 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
K7 EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS	NIT 900.902.707

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) IDENTIFICACION

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOYTTE MCPAL LA ESTRELLA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
16-07-2016	05-04-2022	******
ORIGEN	**DEC. IMPORTACIÓN**	**FECHA DE LEVANTE**
IMPORTACIÓN	48201100012356 2	15/04/2011

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

COSMOCOLOR-TM-20

TM0700002399 4

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS
NIT 830.003.564-7

9010634560
9010634560

No. de Radicación: 27136659
Fecha de Radicación: 06 12 2023

I. DATOS DEL TRAMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]	A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X] • Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectivo [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]	A. Contributivo [ ] B. Subsidiado [X]	A. Cotizante [X] B. Cabeza de familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

A. AFILIACIÓN

6. Apellidos y nombres			
BEJARANO	MONTENEGRO	VIDAL	FERNANDO

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	18224618	Femenino [ ] Masculino [X]	15 06 1976

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de riesgos laborales - ARL	16. Administradora de pensiones
	Tipo [ ] Condición [ ]			SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S A	

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia			
$1.160.000				
		Zona Urbana [ ] Rural [ ]		

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		

	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P	32. Datos de residencia Municipio / Distrito	Zona Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1											
B2											
B3											
B4											
B5											

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
CONSULTORIAS Y ASESORIAS ALC	NT	901628676	

39. Ubicación				
CALLE 1 24 03	3102255062		VILLAVICENCIO	META

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [X] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad A. Régimen Contributivo [X] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación			

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo Femenino	Sexo Masculino	Fecha de nacimiento	42. Fecha novedad
		[ ]	[ ]	D D M M A A A A	06 12 2023

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencias económicas de los beneficiarios o afiliados adicionales [ ]
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo. Especificar el de Excepción [ ]
48. Declaración de diferencias de nombres de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios [ ]
49. Declaración de no afiliación del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud [ ]
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales [ ]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genera de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran [ ]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 [ ]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular (sms) mensajes de texto [ ]

VIII. FIRMAS

54. Firma del cotizante, cabeza de familia o pensionado	55. Firma del empleador, aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) o del cotizante

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CE [ ] PA [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad [ ] Total [ ]
57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente [ ]
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital [ ]
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital [ ]
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor [ ]
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia [ ]
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres [ ]
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud [ ]
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ]
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio [ ]

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad Territorial Código del municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBÉN Número de la ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
					D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación			

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	OBSERVACIONES:
		CARGO: CONDUCTOR DE CAMIONETA
71. Firma del funcionario		

VIGILADO SUPERSALUD

Recuerda que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones consignadas en el capítulo VII del formulario.

Cambio Empleo

INTERNET

Powered by CamScanner

Medellín, 06 de December de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSULTORIAS Y ASESORIAS ALC SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 000000R004 RIESGO 4			Clase: 4		Porcentaje Cotización: 4.35 %	
C18224618	BEJARANO MONTENEGRO VIDAL FERNANDO	07/12/2023		t1901364	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 06/12/2023 13:43:18 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.112.252.67, 192.230.104.6, 172.16.42.57

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030456856

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
DYA985	INTERNATIONAL	S-1954	1985

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
4.000	AMARILLO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	10000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
4BTTMGU185570	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASÍS	REG
DHA13156	N	******	N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

REYES DIANA PADLA — C.C. 40433633

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	RE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
2232	I	10/10/1996	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
14/03/1997	15/11/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

INST DPTAL TTOYTTE META/RESTREPO

LT07002801218

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 18224618

VIDAL FERNANDO BEJARANO MONTENEGRO

FECHA DE NACIMIENTO
15-06-1976

GRUPO SANGUÍNEO
AB-

FECHA DE EXPEDICIÓN
14-10-2021

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
STRIA TTEy MOV CUNDYRICAUNTE



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	[illegible]	[illegible]	PARTICULAR
B3	[illegible]	[illegible]	PARTICULAR
C3	[illegible]	[illegible]	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC07000533182

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 18.224.618

BEJARANO MONTENEGRO

APELLIDOS

VIDAL FERNANDO

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-JUN-1978

HONDA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.79 ESTATURA | AB- G.S RH | M SEXO

31-OCT-1994 SAN JOSE DEL GUAVIARE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A 1510905-00234767-M-0018224618-20100416 0022006227A 1 1740698942

Powered by CamScanner

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-01-10, 09:40:45 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1060390072

Periodo Cotización 202312 **Periodo Servicio** 202401

PAGADA 2024-01-10 09:36:54.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSULTORIAS Y ASESORIAS ALC SAS				
Documento	NI 901628676	**Dirección**	CL 1 #24 - 03		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3102255062		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	6
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META		
Representante Legal	TIQUE CRUZ JOAN ANDRES	**Identificación**	CC 1121929376		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 18224618		**Residente**		**Exonerado**	**S**	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					BEJARANO MONTENEGRO VIDAL FERNANDO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															0	25	25	25	25		F	$ 1.160.000	231001		16 %	$ 966.667	$ 154.700	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 966.667	$ 38.700	$ 0	14-11	4	4.350 %	$ 966.667	$ 42.100	CCF26	4 %	$ 38.666	$ 1.600	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMFACUNDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 154.700	$ 0	$ 0	$ 38.700	$ 42.100	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 10004121

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CONTROL AUTOS DE NOSQUERA

NIT:	900071291	No. de Certificado de Acreditación:	10 CIN-106 001
Fecha de expedición:	2023/11/11	Fecha de vencimiento:	2024/11/11

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	DWI885	CLASE:	VOLQUETA
MARCA:	INTERNATIONAL	MODELO:	1985
SERVICIO:	Público	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	4000	NRO. MOTOR:	467TM2U185570
NRO. CHASIS:		VIN:	
LÍNEA:	9-1634		
COLOR:	AMARILLO		

NOMBRE PROPIETARIO: PIEDAD D. S. MONSALVE P.

FIRMA DEL RESPONSABLE

RAFAEL ARCANGEL FRANCO MARTINEZ

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

INFORME MENSUAL AMBIENTAL - PGIO

PROYECTO: “ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META “


CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023

CONTRATO No. 377 DE 2023

MUNICIPIO DE ACACÍAS

DEPARTAMENTO DEL META

ENERO DE 2024

CONTROL DE CAMBIOS	
OBJETO DEL CONTRATO:	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS- DEPARTAMENTO DEL META"
TIPO DE DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL PGIO – ENERO
ETAPA:	EJECUCIÓN DE OBRA
APROBACIÓN	
NOMBRE:	ANDRES CAMILO GUARNIZO RODRIGUEZ
CARGO:	INGENIERO AMBIENTAL
FECHA:	31/01/2024
FIRMA:	
APROBACIÓN INTERVENTORÍA	
FIRMA:	

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS 4
3. PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 4
3.1. Subprograma Sensibilización y capacitación ambiental 4
3.2. Subprograma Seguridad y salud en el trabajo 5
3.3. Cumplimiento y requerimientos legales 10
4. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 10
4.1. Preliminares, instalación y funcionamiento del campamento 10
4.2. Descapote y remoción de capa orgánica 11
4.3. Excavaciones 11
4.4. Rellenos 12
4.5. Manejo integral de materiales de construcción 12
4.6. Señalización de obra 12
4.7. Manejo y disposición final de escombros y lodos 14
4.8. Manejo y disposición final de residuos solidos 15
5. GESTIÓN DE MEDIO BIOTICO Y ABIOTICO 16
5.1. Control de emisiones atmosféricas 16
5.2. Control de ruido 17
5.3. Protección de fauna y flora 17
6. GESTIÓN SOCIAL 17
6.1. Educación ambiental 17
6.2. Información, divulgación, atención y participación a la comunidad 17
6.3. Contratación de mano de obra 17
7. DESMANTELAMIENTO 18
7.1. Limpieza final y desmantelamiento. 18
ANEXOS 19

1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Gestión Integral en Obra elaborado por el contratista **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023**, establece diferentes medidas y acciones a tener en cuenta para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales ocasionados por el desarrollo de los procesos constructivos del proyecto; de manera general contempla cuatro tipos de medidas: prevención, mitigación, corrección y compensación dirigidos a diferentes entornos en los ámbitos físicos, biológicos y sociales.

De los programas y subprogramas que integran el Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO y que componen las diferentes actividades concebidas para la ejecución de las obras contemplan en gran medida la prevención y mitigación de los impactos, en razón a que las medidas de manejo ambiental se realizan de manera permanente durante el tiempo de ejecución de las obras esto permite que los impactos negativos se den en menor medida. Los programas que incluyen medidas de corrección y compensación fueron analizados de manera global ya que las medidas de manejo establecidas para cada uno se deben llevar a cabo una vez terminada una actividad que involucre una intervención considerable sobre los entornos, o una vez finalizada la obra.

2. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

Se presenta a continuación una descripción general de los programas del PGIO acorde al avance de obra e implícitos en las actividades realizadas en el mes de enero junto a este un análisis desarrollado para cada uno a partir de la revisión en campo al área de influencia del proyecto.

3. PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

3.1. Subprograma Sensibilización y capacitación ambiental

En este primer programa, tenemos que, el **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023** es consciente que los actores principales en cuanto a la prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos generados en obra son los mismos colaboradores del proyecto, lo anterior sin desconocer que la población circunvecina también cuenta con un papel importante.

Dicho lo anterior, en respuesta a este programa y para el primer corte, se estableció dentro de las charlas de inducción una sensibilización a los colaboradores para que su actuar en el avance de la obra se realice de manera ética con el ecosistema que rodea cada intervención, de tal forma que los impactos generados sean menores y llegado el caso, que la corrección en campo no requiera de una intervención mayor.

Adicional a lo anterior, se capacito al personal en cuanto a uso eficiente y ahorro del agua, teniendo en cuenta que es un recurso limitado y que el vital líquido genera interacciones en todas las acciones que realizamos para el desarrollo personal y de obra.



3.2. Subprograma Seguridad y salud en el trabajo

Las actividades de este programa se describen detalladamente en el Informe Mensual N°2 del **SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** del **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023;** sin embargo, se plasmarán generalidades de las actividades relacionadas con este programa tomadas del informe mencionado.

Consciente de la importancia de la seguridad y salud en el Trabajo - SST y consecuente con la reglamentación legal existente en el país, el **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023** en cabeza de su representante legal, asume la responsabilidad de la planeación y ejecución de las actividades del presente Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo - SGSST; con el objetivo de brindar las mejores condiciones de salud y de trabajo, para el buen desempeño de sus colaboradores y partes interesadas.

Con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores en sus puestos de trabajo como medidas de control el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el periodo del **1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2024** se realizaron las siguientes actividades:

a. Exámenes de Ingreso

Teniendo en cuenta los peligros, tareas, exigencias físicas y condiciones de trabajo a los cuales estarán expuestos los diferentes colaboradores y en cumplimiento a la Resolución número 2346 de 2007 antes de su incorporación a la empresa, los aspirantes son remitidos para la toma del

examen médico de aptitud laboral de ingreso, en el periodo del **1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2024,** se registraron los siguientes ingresos de personal**:**

FECHA DE INGRESO	PERSONAL INCORPORADO	CLASE
12/01/2024	1-SISO	DEPENDIENTE
15/01/2021	1-ALMACENISTA	DEPENDIENTE
23/01/2024	6-OPERARIOS	INDEPENDIENTES

FUENTE: INFORME SST CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023

b. Inducción de Personal

Una vez vinculado el nuevo trabajador inicia la etapa de inducción a la empresa, puesto de trabajo, así como los riesgos asociados a las actividades a realizar y las directrices del sistema de gestión de la SST, para ello se realizan charlas personalizadas con el personal antes de su ingreso e inicio de labores, dejando constancia de estas.

En el periodo**,** se realizó inducción a personal operativo que ingresó quienes recibieron información de los siguientes temas:

- Obligaciones frente al sistema de gestión SST.
- Uso de Elementos de Protección Personal.
- Riesgos asociados a la actividad de la construcción.

c. Charlas Pre operacionales y Pausas Activas

Enfatizadas en mitigar, controlar y prevenir los accidentes e incidentes de trabajo; previo al desarrollo e inicio de labores mediante charlas de seguridad diarias con una duración de 5 minutos se dan conocer diferentes temas en materia de seguridad y salud en el trabajo que hacen parte del programa de capacitaciones.

De igual manera se desarrollaron ejercicios de Calistenia y estiramiento antes de iniciar labores que ayudan a reducir la fatiga laboral, a prevenir lesiones o trastornos osteomusculares, a los colaboradores.

En estas actividades asistió el personal operativo (de la cual se deja registro de asistencia diaria (Ver anexo control de asistencia).

FECHA DE CHARLA	TEMA	N° PARTICIPANTES
11-01-2024	INDUCCION-SST	9
12-01-2024	RIESGOS LOCATIVOS	9
13-01-2024	USO DE EPP	12
15-01-2024	SEGURIDAD Y RIESGOS	10
16-012024	POLITICAS SST	7

17-01-2024	PROTECCION- CABEZA	12
18-01-2024	RIESGOS NATURALES	7
19-01-2024	PROTECCION DE OJOS	11
20-01-2024	RIESGO FISICO	11
22-01-2024	PROTECCION FACIAL	13
24-01-2024	SEGURIDAD VIAL	10
26-01-2024	AUTOCUIDADO, PROTECCION DEL CUERPO	12

FUENTE: INFORME SST CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023

d. Capacitación

Se realiza una reunión con el personal de obra con el fin de reforzar los conocimientos en seguridad y salud en el trabajo haciendo énfasis en promover la salud, detectar riesgos y prevenir accidentes laborales.

FECHA DE CAPACITACION	TEM	N° PARTICIPANTES
27-01-2024	PLAN DE EMERGENCIAS	13

FUENTE: INFORME SST CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023

e. Entrega y cambio de dotación o elementos de protección individual

Conforme al Art. 230 SUMINISTRO DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR del CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Artículo 2.2.1.4.2. Favorabilidad respecto a la dotación de calzado y vestido y Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control, Literal 5 del DECRETO 1072/2015.

Se revisa el suministro por parte del contratista a sus operarios la dotación del vestido y el calzado necesario para el normal desarrollo de las labores de trabajo.

f. Inspección de dotación Elementos de protección personal mensual

Se realiza la correspondiente inspección semanal a los elementos de protección individual entregado al personal de la obra, dicha inspección fue realizada en el formato “Inspección de dotación y elementos de protección personal (EPP’S)” por el inspector de seguridad y salud en el trabajo quien a través de observación directa verifica las condiciones y estado de estos que permitan garantizar la seguridad para los colaboradores en el desarrollo de las actividades.

g. Instalación e Inspección de botiquín y equipos de emergencia

Garantizando las actividades tendientes a prestar la primera atención o primeros auxilios a los trabajadores en caso de accidentes e incidentes de trabajo o eventualidades de emergencias, se realizó la instalación de un botiquín tipo b con su respectiva dotación, equipo contra incendios (Extintor), una camilla rígida tipo Fel.

Se realiza la correspondiente inspección mensual al botiquín y equipos de emergencia asignados a las instalaciones de la obra, dicha inspección fue realizada en el formato correspondiente por el inspector de seguridad y salud en el trabajo quien verifica las condiciones, vigencia, orden y aseo que permitan garantizar la utilidad de estas a la hora de prestar la primera atención o primero auxilios a los trabadores en caso de accidentes e incidentes de trabajo o eventualidades de emergencias.

h. Análisis de Trabajo Seguro ATS

Los ATS's, realizarán semanal o diariamente para analizar los riesgos y peligros a los cuales pueden estar expuestos los trabajadores en las actividades no rutinarias y rutinarias, se realizarán inspecciones en los diferentes puestos de trabajo, inspección de equipos, elementos de protección personal entre otros, que servirán como insumo para para implementar medidas de control para minimizar y prevenir los accidentes e incidentes de trabajo.

En el periodo se realizaron **dos** ATS's, debido a las actividades recurrentes.

i. Permisos de trabajo

Dependiendo de la complejidad de las actividades en conjunto identificamos, verificamos y autorizamos las diferentes tareas en obra con el fin de tener claro los riesgos y peligros a los cuales están expuestos, así mismo se informa la viabilidad, suspensión o culminación de la actividad, así mismo se recomienda el uso de elementos de protección adecuados y correctos para dicha tarea y las medidas de control para cada actividad.

En el periodo se formalizaron los siguientes permisos de trabajo:

TIPO DE PERMISO	FECH	CANTIDAD
TRABAJO ELECTRICO	11-01-2024	1
TRABAJO DE EXCAVACION	10-0-2024 AL 12-01-2024	1
TRABAJO GENERAL	09-0-1-2024 AL 13-0-1-2024	1
TRABAJO EN ALTURA	18-01-2024	1
TRABAJO GENERAL	15-01-2024 AL 2001-2024	1
TRABAJO DE EXCAVACION	15-01-2024 AL 20-01-2024	3
TRABAJO EN ALTURA	23-01-	1
TRABAJO GENERAL	23-01-2024 AL 24-01-2024	1
TRABAJO DE EXCAVACION	22-01-24 AL 27-01-2024	1
TRABAJO GENERAL	22-01-24 AL 27-01-24	1

j. Actualización del MEDEVAC

Para ello se realiza la recolección de información y datos básicos del personal tales como nombres y apellidos, número de documento de Identidad, Numero de celular del trabajador, tipo de sangre, número de teléfono y contacto de un familiar en caso de eventualidad; esta información reposa en los registros informativos que están ubicadas en el campamento en obra.

k. Señalización y demarcación de áreas de trabajo

Como medida preventiva y teniendo en cuenta las condiciones locativas de la obra se realiza la ubicación de señalización a fin de prevenir a los usuarios sobre la existencia de riesgos o situaciones especiales en la vía o en las zonas aledañas, de igual manera se restringe el paso de personal, se realiza la señalización de zonas de intervención a fin de evitar accidentes y eventualidades con la comunidad.

3.2.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Durante el periodo del **01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2023** se presentaron las siguientes actividades complementarias:

- Se realiza inducción y recorrido a personal nuevo.
- Se realizan inspecciones de todas las áreas de la obra para mirar los puntos que se deben tener en cuenta para señalización.
- Se continúa organizado el cierre perimetral con el fin de evitar eventualidades como medida de prevención garantizando la seguridad de los peatones y visitantes.
- Se realizan inspecciones diarias de las excavaciones manuales, garantizando la seguridad de los trabajadores.
- Garantizando el bienestar de los colaboradores se instala un punto de hidratación.
- Al finalizar cada jornada de trabajo se hace una limpieza general y cada vez que se requiera se recogerán los desperdicios o basura presentes en el sitio de obra y se disponen en las canecas para el manejo de los residuos comunes.

3.2.2. PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

El **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023** contará con un plan de respuesta ante emergencias, que ofrecerá los lineamientos de actuación para atender las posibles emergencias que se puedan presentar en el desarrollo de sus actividades.

- Punto de encuentro

Se cuenta con un punto de encuentro totalmente identificado por todos los colaboradores del que han recibido el aviso de evacuación en su zona.

- Rutas de evacuación y salida de emergencia

Con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores y evitar eventualidades como medida de prevención los ayudantes de administración realizan la instalación de la Señalización y demarcación de las diferentes áreas críticas de trabajo y respectiva ruta de evacuación.

FUENTE: INFORME SST CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023

3.3. Cumplimiento y requerimientos legales

3.3.1. Recurso Agua

Teniendo en cuenta que dentro de la ejecución de la obra no se realizaran vertimientos puntuales, captaciones de agua y/o ocupaciones de cauce, aprovechamientos forestales; teniendo en cuenta lo anterior, no se requerirá tramitar ante la corporación ambiental este tipo de permisos, sin embargo, se generaran residuos en obra, los mismos serán presentados a la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. quienes gestionan el sistema de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Acacías; de igual forma a la ESPA E.S.P. se solicitó matricula provisional de acueducto y alcantarillado.

3.3.2. Recurso suelo

Las actividades constructivas generan Residuos de Construcción y Demolición RCD, previo al inicio de actividades el **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023**, solicitó al despacho de la secretaría de fomento autorización para disponer este tipo de residuos en predios dentro del municipio; mediante oficio fechado del 28 de junio de 2023 con numero de consecutivo GFDS-F-60V2 la secretaría responde positivamente para ejecutar la actividad de disposición de los RCD´s en el predio Villa Fabiana ubicado en la vereda Sardinata en el municipio de Acacías. De esta forma respondemos a lo establecido en el PGIO en aras de minimizar impactos al recurso suelo, los sitios donde reciben este material, buscan realizar relleno para nivelar terrenos o afirmar algunas vías de acceso, sin embargo, se tendrá en cuenta la solicitud de la comunidad en general.

3.3.3. Recurso aire

De los materiales de relleno, bases, sub bases y demás requeridos, se tiene que son adquiridos a la empresa GRAVICON LTDA, la misma cuenta con licencia ambiental bajo Resolución N° 26051039 Del expediente N° 5.37.04.104 de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena. Para la cual la empresa en mención demuestra ante la corporación tener la capacidad técnica y operativa para su actividad comercial. La resolución también genera unos requerimientos para el control y seguimiento. Establece medidas de compensación social con diferentes actividades como mejoramiento de vías y apoyo a acueductos veredales. Para la compensación paisajística un programa de reforestación y con estas medidas. La empresa mitiga y corrige los impactos en cuanto a emisiones atmosféricas

4. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

4.1. Preliminares, instalación y funcionamiento del campamento

Se describen a continuación las actividades realizadas por el **CONSORCIO POLICIA – ACACIAS 2023** para la instalación de campamento y oficinas, se definió ubicación en obra y la disposición de los mismos para definir tareas en cada área.

4.1.1. Campamento

Dentro del programa y para la instalación del campamento, se realizó el levantamiento de la cubierta y el cerramiento de la misma con láminas de zinc; lo que permite que los materiales utilizados para esta estructura puedan ser reincorporados en cadenas productivas mediante el reciclaje; este campamento será retirado una vez terminada la obra; dado a que la

administración municipal realizo el descapote, no se generó afectación al suelo en el lugar que se instaló el campamento, al ser retirado, el impacto al paisajismo será corregido.

4.1.2. Oficinas

Se realizó la instalación de oficinas mediante un contenedor adecuado para este fin; el mismo se ubica dentro del predio, sin generar afectación al suelo, una vez terminada la obra será retirada y se corrige la alteración al paisajismo.

4.2. Descapote y remoción de capa orgánica

Para dar inicio al proyecto, la administración del municipio de Acacías; de acuerdo a lo anterior el **CONSORCIO POLICIA – ACACIAS 2023**, no genero actividades de descapote y remoción de capa orgánica susceptibles a valorar en cuanto a impactos ambientales. Lo anterior lo evidenciamos mediante el documento ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1901 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓNMINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE ACACIAS (META), **CLÁUSULA SEGUNDA** que establece las obligaciones del municipio: "Numeral 10. *Ejecutar las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio. Las actividades antes relacionadas deben realizarse previo al inicio del contrato de estudios, diseños y obra, para lo cual, el Supervisor del Municipio debe certificar al Ministerio estas actividades. El MUNICIPIO asumirá los costos que para estas actividades se generen. En el evento en que sea necesario realizar obras de estabilidad, las mismas deberán ejecutarse, en su totalidad, con antelación al inicio de la obra".*

4.3. Excavaciones

Para las actividades que involucran excavaciones, se ha optimizado realizando las excavaciones totalmente necesarias como se especifica en el anterior numeral, el **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023** no realizo el descapote general del predio. El manejo de lodos se aclara en el numeral 4.7. pero en un esbozo general, las precipitaciones generadas en este periodo han sido bajas, con generación aislada de lodos, que por efectos de la radiación solar se controlan de manera natural.

Teniendo en cuenta que la pendiente del terreno es mínima, no se presenta inestabilidad en las excavaciones; así mismo la escorrentía es mínima.

El mantenimiento de equipos y maquinaria no se realizará en ningún momento dentro del predio de la obra; se llevarán a sitios especializados en el manejo de lubricantes para que los aceites usados sean dispuestos de manera adecuada.

Para el manejo de Las actividades constructivas que generen residuos de la excavación que podemos llamar Residuos de Construcción y Demolición - RCD, como se aclara en el numeral 3.3., previo al inicio de actividades el **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023** Solicito al despacho de la secretaría de fomento autorización para disponer este tipo de residuos en predios dentro del municipio; mediante oficio fechado del 28 de junio de 2023 con numero de consecutivo GFDS-F-60V2 la secretaría responde positivamente para ejecutar la actividad de disposición de los RCD´s en el predio Villa Fabiana ubicado en la vereda Sardinata en el municipio de Acacías.

De esta forma respondemos a lo establecido en el PGIO en aras de minimizar impactos al recurso suelo, los sitios donde reciben este material, buscan realizar relleno para nivelar terrenos o afirmar algunas vías de acceso, sin embargo, se tendrá en cuenta la solicitud de la comunidad en general, es de aclarar que esta actividad se realiza con el material excedente después de realizar rellenos.

4.4. Rellenos

De ser necesario, como primera medida, para los rellenos se usará el material seleccionado de las actividades de excavación evitando el transporte de estos materiales que puedan incorporarse de nuevo para la nivelación y la recuperación geomorfológica, los rellenos no alteraran de ninguna forma canales pluviales dado que el área intervenida no cuenta con los mismos. Los rellenos se generan de manera que mitiguen la alteración al paisaje de las excavaciones.

4.5. Manejo integral de materiales de construcción

Para los materiales adquiridos para la obra se realizará un acopio transitorio, teniendo en cuenta que la administración municipal realizo entrega del predio con la actividad de descapote inicial, no se afectará con este acopio el suelo del predio, en el numeral 3.3. en el aparte de emisiones atmosféricas se indica que el proveedor cuenta con licencia ambiental bajo Resolución N° 26051039 Del expediente N° 5.37.04.104 de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena. Para la cual la empresa en mención demuestra ante la corporación tener la capacidad técnica y operativa para su actividad comercial. La resolución también genera unos requerimientos para el control y seguimiento. Establece medidas de compensación social con diferentes actividades como mejoramiento de vías y apoyo a acueductos veredales. Para la compensación paisajística un programa de reforestación. Para el caso puntual el consorcio señala que el proveedor del material será GRAVICON LTDA.

4.6. Señalización de obra

Dentro de las diferentes actividades que responden al programa, se establece la señalización de los frentes de obra, de los espacios designados para la ubicación de elementos de seguridad, de los espacios de almacenamiento, de los puntos ecológicos; adicional de contar con los elementos correspondientes a pare y siga en el momento del traslado de maquinaria.

- **Señalización y demarcación de áreas de trabajo**

Como medida preventiva y teniendo en cuenta las condiciones locativas de la obra se realiza la ubicación de señalización a fin de prevenir a los usuarios sobre la existencia de riesgos o situaciones especiales en la vía o en las zonas aledañas, de igual manera se restringe el paso de personal, se realiza la señalización de zonas de intervención a fin de evitar accidentes y eventualidades con la comunidad.

- **PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS**

El **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023** contará con un plan de respuesta ante emergencias, que ofrecerá los lineamientos de actuación para atender las posibles emergencias que se puedan presentar en el desarrollo de sus actividades.

- **Punto de encuentro**

Se cuenta con un punto de encuentro totalmente identificado por todos los colaboradores del que han recibido el aviso de evacuación en su zona.

- **Rutas de evacuación y salida de emergencia**

Con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores y evitar eventualidades como medida de prevención los ayudantes de administración realizan la instalación de la Señalización y demarcación de las diferentes áreas críticas de trabajo y respectiva ruta de evacuación.

SEÑALIZACION SST	
	
La señalización como herramienta extremadamente útil la cual puede evitar accidentes, se mantienen las áreas debidamente señalizadas y divulgadas a todos los colaboradores y se educa para que las cuiden y no las retiren.	

ESTACIÓN DE EMERGENCIA	
	
El **CONSORCIO POLICIA - ACACIAS 2023** cuenta con un punto de primeros auxilios el cual contiene camilla, botiquín de primeros auxilios.	

FUENTE: INFORME SST CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023

4.7. Manejo y disposición final de escombros y lodos

Como se plasmó en el numeral 3.3. Cumplimiento y requerimientos legales en el parte 3.3.2. recurso suelo; se adelantó la siguiente gestión:

Las actividades constructivas generan Residuos de Construcción y Demolición - RCD, previo al inicio de actividades el **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023**, solicitó al despacho de la secretaría de fomento autorización para disponer este tipo de residuos en predios dentro del municipio; mediante oficio fechado del 28 de junio de 2023 con numero de consecutivo GFDS-F-60V2 la secretaría responde positivamente para ejecutar la actividad de disposición de los RCD´s en el predio Villa Fabiana ubicado en la vereda Sardinata en el municipio de Acacías. De esta forma respondemos a lo establecido en el PGIO en aras de minimizar impactos al recurso suelo, los sitios donde reciben este material, buscan realizar relleno para nivelar terrenos o afirmar algunas vías de acceso, sin embargo, se tendrá en cuenta la solicitud de la comunidad en general.

- **Almacenamiento temporal de los sobrantes o escombros.**

El almacenamiento temporal de los RCD´s solo aplica cuando el volumen en obra es menor a la capacidad de los vehículos que los transportan al sitio de disposición final; estos son almacenados de manera transitoria y no superior a 48 horas de tal manera que no se afecten otras áreas y no genere alteración paisajística hasta completar una carga completa optimizando el transporte y disminuyendo emisiones por el uso de vehículos.

- **Transporte de los sobrantes o residuos sólidos**

De los vehículos contratados para el transporte de estos residuos, se tienen en cuenta diversos factores; además de que tengan sus documentos en regla para transitar a nivel nacional; se verifica que cuenten con la capacidad técnica para movilizar los residuos de forma segura desde el sitio en obra hasta el lugar de disposición final; minimizando la ocurrencia de contaminación por caída de los RCD´s y/o accidentes por la misma causa.

- **Disposición final**

Para la disposición final como se nombra al principio de este numeral; la secretaría de fomento y desarrollo autoriza al **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023** a disponer los residuos de construcción y demolición en lugares en los que previo a la autorización la secretaría evaluó y estableció como sitios que por su condición o por recuperación topográfica son susceptibles para que se realicen rellenos.

- **Manejo de lodos**

Teniendo en cuenta que se realiza el manejo de las excavaciones, que la pendiente del terreno afectado no es considerablemente alta, la ocurrencia de presencia de lodos que por escorrentía se transporten es baja; por un costado del proyecto se encuentra la carrera 41 que se encuentra totalmente asfaltada y cuenta con rejillas para el alcantarillado pluvial. Se presentaron algunas precipitaciones durante el mes; de las cuales no se generó mayor afectación por transporte de

lodo; se encontró generación de lodo aislado en las excavaciones, el cual con la radiación solar fue mitigado.

4.8. Manejo y disposición final de residuos solidos

Las actividades que responden al manejo y disposición final de Residuos Sólidos para el periodo informado se logran de acuerdo a las capacitaciones establecidas para la recolección y separación de los residuos generados en obra; adicional del sitio dispuesto en obra para el almacenamiento temporal hasta el día que se presentan para ser recolectados por la Empresa de Servicios Públicos de Acacías. De acuerdo a lo anterior se generaron insumos y capacitaciones suficientes para que no se causen impactos negativos por la incorrecta gestión de los residuos.

PUNTO ECOLOGICO

Se realiza aseo dejando la obra totalmente limpia, así mismo se clasifican residuos aprovechables y los de disposición final.

FUENTE: INFORME SST CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023

- Jornada de Aseo

Se realiza jornada de aseo semanal y clasificación de materiales, adicional de jornadas diarias las cuales se verifica al inicio y para el final de las labores, limpieza y adecuación de bodega de almacenamiento de materiales a fin de garantizar y mantener en buenas condiciones las diferentes locaciones de la obra.

Se cuenta con un punto Ecológico en los frentes de obra, con la finalidad de mantener un buen manejo de residuos y así promover el orden y aseo en obra, dando a conocer a los trabajadores la ubicación del punto y brindándoles la información sobre el buen manejo y separación de residuos de obra.

- Disposición de residuos

Se realizan jornadas de orden y aseo, cuya finalidad fue recolectar los residuos que encontramos en la obra, tales como (papel de cemento, geotextil dañado, cinta de señalización dañada, botellas plásticas).

Se clasificarán los residuos domésticos, industriales y especiales, los residuos son llevados a un punto ecológico para que sean dispuestos por la empresa prestadora del servicio del municipio.

La prestadora de servicios públicos realiza transporte y disposición final de los residuos sólidos en el relleno sanitario parque ecológico reciclante operado por BIOAGRICOLA DEL LLANO.

El punto ecológico es la zona especial claramente demarcada y señalizada, para incentivar, motivar y sensibilizar a las personas a actuar responsablemente en la separación en la fuente de todos los residuos sólidos que producen.

Con la unificación del código de colores a nivel nacional, la separación de residuos en la fuente será más fácil, los colores a usar serán los mismos. Los colores son:

- **Blanco:** residuos aprovechables limpios y secos, como plástico, vidrio, metales, papel y cartón.
- **Negro:** residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros. En esta bolsa o recipiente también deberán disponerse los residuos COVID-19 como tapabocas, guantes, entre otros.
- **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín, etc.

FUENTE: INFORME SST CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023



5. GESTIÓN DE MEDIO BIOTICO Y ABIOTICO

5.1. Control de emisiones atmosféricas

Como preámbulo a este numeral, establecemos que las fuentes de emisiones atmosféricas móviles y las actividades que generen material particulado, tienen un horario establecido para su actividad, de esta forma se tiene control y uso racional de equipos.

5.1.1. Fuentes móviles

Como se nombra en el numeral 4.7. 4.7. Manejo y disposición final de escombros y lodos, en el aparte de transporte de sobrantes o residuos sólidos, el consorcio POLICIA – ACACIAS 2023 verifica que los vehículos en los que se transporte cualquier material hacia o desde la obra, cuente con los documentos exigidos por las autoridades de tránsito para la circulación a nivel nacional; para el caso puntual, se verifica que todo vehículo cuente con la revisión técnico mecánica y de gases lo que avala que el mismo se encuentra dentro de los parámetros máximos

admisibles. Adicional de lo anterior se verifica que los sistemas de escape de estos vehículos se encuentren en buen estado, sin perforaciones antes del último tramo de tubería.

5.1.2. Generación de material particulado

Para el manejo de material particulado o polvo, se generó un cerramiento completo entre el predio en construcción y las viviendas próximas, el mismo se realiza como barrera física, mitigando el transporte de partículas desde la obra, de igual forma se ha humedecido los frentes de trabajo con el fin de que el viento no realice ese transporte de manera natural.

5.2. Control de ruido

El **CONSORCIO POLICIA – ACACIAS 2023** consciente de que las actividades en obra generan ruido; que para vecinos del sector resulta no deseado y a los colaboradores puede generarle problemas de salud, por lo anterior se generaron acciones necesarias para el control del ruido; se generó un cerramiento completo entre el predio en construcción y las viviendas próximas, se realizan uso racional de los equipos y maquinaria amarilla, esto con el fin de que los motores sean fuente de ruido por el menor tiempo posible evitando la exposición prolongada que es la misma que resulta perjudicial para la salud, de preferencia el personal en obra se aleja lo más posible de las fuentes de ruido, se verifica que los equipos usados se encuentren en óptimas condiciones y que sus sistemas de escape funcionen de forma adecuada y finalmente el personal en obra cuenta con los EPP necesarios para protección auditiva.

5.3. Protección de fauna y flora

El predio en el que se desarrolla el proyecto, no presentan individuos arbóreos forestales al momento del inicio de obra y en el perímetro existen algunos arbustos o malezas aisladas, la escasa vegetación hace que se presente poca diversidad de individuos de fauna, de acuerdo a lo anterior, las afectaciones por las actividades antrópicas de urbanismo serán mínimas y transitorias, el **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023** será garante que en los siguientes periodos los emisores de ruidos se usen de manera adecuada y ajustados a tiempos y movimientos, de esta manera se mitiga la migración transitoria de las especies que se encuentren en áreas circunvecinas.

6. GESTIÓN SOCIAL

6.1. Educación ambiental

Como se describe en el numeral 3.1. subprograma de sensibilización capacitación ambiental el **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023** adelanto capacitación al personal en cuanto a uso eficiente y ahorro del agua, teniendo en cuenta que es un recurso limitado y que el vital líquido genera interacciones en todas las acciones que realizamos para el desarrollo personal y de obra

6.2. Información, divulgación, atención y participación a la comunidad

En respuesta a este programa el **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023** realizo en primera medida una socialización del proyecto a la comunidad, previo al inicio de cualquier actividad. se realizó instalación de valla informativa del proyecto y se adelantaron visitas a las viviendas próximas al proyecto, de las mismas se levantan actas de vecindad donde se hace referencia a las afectaciones que tienen estas viviendas previo al inicio de actividades del proyecto. Se anexan actas de vecindad.

6.3. Contratación de mano de obra

De acuerdo a los requerimientos del programa, el **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023** adelanta las siguientes actividades:

- Contratación de mano de obra calificada y no calificada del municipio de Acacías.
- Contratación de madres cabeza de hogar.


Más que un compromiso de Responsabilidad Social Empresarial, el consorcio busca involucrar el concepto de Valor Compartido con estas actividades, limitando la brecha entre comunidad, colaboradores y consorcio, integrando la sostenibilidad social y ambiental. la finalidad del proyecto que dirime en la entrega de unas instalaciones para la Policía Nacional que es una fuerza social que como lo establece el artículo 2° de la constitución política de Colombia, debe proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.

Es así como responde el consorcio crea lazos con la comunidad, con sus colaboradores y con las necesidades de estos actores en el municipio.

7. DESMANTELAMIENTO

7.1. Limpieza final y desmantelamiento.

Se detallará el proceso una vez dado por finalizado el proyecto; para el actual periodo (enero) se están realizado las actividades de obra.



ANDRES CAMILO GUARNIZO RODRIGUEZ
INGENIERO AMBIENTAL
M.P. 25238-325899 CND

ANEXOS

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CAPACITACION - INDUCCION - 9CAP

CIUDAD/FECHA	Acacias	AREA/CENTRO DE TRABAJO:	Consorcio policia	C-I-R. No.	01
TEMA DE CAPACITACION	Uso de eficiente y ahorro del agua	C.C./NIT:	1	NOMBRE ESPOSITOR:	

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	FIRMA
Andres castillo	1001271237	Proteccion	Famisanar	
Orlando Barrera	4277180	colpensiones	Famisanar	Orlando Barrera
Patrocinio Vasquez	17328844	colpensiones	Salud total	Patrocinio
Julian reyes	81024467	colpensiones	Sanitas	
Richard Moreno	17418711	colfondos	capital salud	
Emilse Gonzales	1120367837	Porvenir	capital salud	Emilse G.
Luis miguel Hernadez	1006776248	colpensiones	Salud total	Luis miguel
Luis Antonio Molina	17319984	colpensiones	capital salud	
Ricardo Arango castillo	1124944764	Porvenir	Sanitas	
Fabio Andres Reynino	1122118780	Porvenir	capital salud	
luis fernando Parra	93461815	Proteccion	Famisanar	luis fernando
Brayan Alexis Ruz	1122142788	Proteccion	Famisanar	
Edwin paez	1121868371	Sura	Nueva EPS	Edwin paez
Yeison paez	86071378	Sura	Sanitas	
Mauricio Herrera	1121838357	Sura	capital salud	

Andres camilo Guarnizo

NOMBRE EJECUTOR FIRMA CEDULA

NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA FIRMA CEDULA

ALCALDÍA DE Acacías
Camino de oportunidad

1070 - 42.2

Acacías, Junio 28 de 2023

Ingeniera

ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
R/L COSORSIO POLICIA-ACACIAS
Ciudad

De acuerdo a su solicitud radicada en la Unidad de Correspondencia, con fecha 29 de noviembre de 2022, con el ID CONTROL 1230641, por parte del Ingeniero **ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO,** Representante Legal de CONSORSIO POLICIA ACACIAS. Me permito informarle que el Municipio de Acacías – Meta, no cuenta con Escombrera municipal y que esta se encuentra en estudio en el nuevo PBOT, el cual se encuentra en concertación y revisión con la autoridad ambiental, CORMACARENA.

Sin embargo, esta Secretaría con el ánimo de poder disponer escombros en sitios que no afecten el medio ambiente, habilita algunos sitios, entre ellos el predio Villa Fabiana, ubicado en la Vereda Sardinata, en donde podrá depositar, previa concertación con el propietario, los escombros resultantes de la obra.

Esperamos de esta forma, haber atendido su solicitud.

Cordialmente,

I.A. FABIO MARTÍN JARA AGUDELO
Secretario de Fomento y Desarrollo Sostenible

PROYECTÓ Y REDACTÓ
I.A. CESAR A. RODRIGUEZ CARRILLO
Profesional Universitario
WORD/CONCEPTO TÉCNICO DE RELLENO Y NIVELACIÓN

ANEXO: Permiso para disponer escombros. Dos (2) folios

CONCEPTO TÉCNICO DE RELLENO Y/O NIVELACIÓN

13. DATOS GENERALES DE LA SOLICITUD			
SOLICITANTE:	FABIO VARGAS CUÉLLAR		
CÉDULA:	17'630.122	CEL: 3102357859	IDCONTROL: 1198176
DIRECCIÓN:	FINCA VILLA FABIANA. VEREDA SARDINATA		
AREA DEL LOTE	AREA A INTERVENIR: 1 HA APROXIMADAMENTE		
TOPOGRAFIA DEL LOTE	PLANA		
Nº DE MATRICULA INMOBILIARIA DEL PREDIO	CÓDIGO CATASTRAL 000200180006000 MATRÍCULA 232 - 47070		
¿SE UBICA EN ZONA DE RONDA DE FUENTE HÍDRICA?	SI	NO	X
¿SE UBICA EN ZONA DE NACIMIENTO DE FUENTE HÍDRICA?	SI	NO	X
¿SE UBICA EN ZONA DE RECARGA DE ACUIFEROS?	SI	NO	X
¿SE UBICA EN ZONA CON ALGUNA CATEGORÍA DE PROTECCIÓN?	SI	NO	X
BARRIO:			
VEREDA:	SARDINATA		
SECTOR:			
FINCA:	VILLA FABIANA		

14. DESCRIPCION DE LA SOLICITUD:

El Señor (a) **FABIO VARGAS CUÉLLAR**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17'630.122 de Florencia - Caquetá, y quien actúa como propietario de un predio RURAL (X) URBANO ( ), Ubicado en la Vereda Sardinata, solicita ante esta Secretaría permiso para recibir, adecuar, nivelar y rellenar un área de aproximadamente diez mil metros cuadrados (10.000) M2, en el cual se están adecuando para terminar de rellenar unos bajos del terreno y se va a recibir material de relleno de la Concesión Vial de los llanos y de obras que adelante el municipio..

Para realizar esta labor, necesita utilizar UNA RETROEXCAVADORA O SIMILARES

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES:

De acuerdo con la visita adelantada por el Ingeniero WILMER MENA PEÑA, Profesional Universitario, adscrito a esta Secretaría, el día 29, del mes noviembre, año 2022, el predio

1070 - 42.2

tiene un área de 38 HAS + 6.659 M2, de los cuales se requiere adecuar y nivelar un área de aproximadamente (1,0) hectárea, con el fin de adecuar el terreno para RECIBIR MATERIAL DE RELLENO DEL CONSORCIO POLICIA ACACIAS en cantidad aproximada de 1800 mts cúbicos.

Según el artículo 20 del Acuerdo 184 de 2011 define que: El artículo 26 del acuerdo 021 de 2000 quedará así: Artículo 26. Suelo Suburbano: Está constituido por las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de expansión urbana, que puedan ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en las Leyes 99 de 1993 y 142 de 1994, Decreto 3600 de 2007 y demás normas concordantes, o las que las sustituyan.

El Decreto 1469 de 2010, Capitulo III, Artículo 51 en su numeral 6 enuncia lo siguiente:

Artículo 51. *Otras actuaciones.* Se entiende por otras actuaciones relacionadas con la expedición de las licencias, aquellas vinculadas con el desarrollo de proyectos urbanísticos o arquitectónicos, que se pueden ejecutar independientemente o con ocasión de la expedición de una licencia, dentro de las cuales se pueden enunciar las siguientes:

6. **Autorización para el movimiento de tierras**. Es la aprobación correspondiente al conjunto de trabajos a realizar en un terreno para dejarlo despejado y nivelado, como fase preparatoria de futuras obras de parcelación, urbanización y/o construcción.

Se debe garantizar la protección de vías, instalaciones de servicios públicos, predios aledaños y construcciones vecinas.

Según el Decreto 1469 de 2010, en su artículo 51, se debe tener en cuenta que, si es parcelación, urbanización y/o construcción debe anexar estudio geotécnico. Según su oficio radicado el día 20 de Octubre de 2022, en la Unidad de Correspondencia de la Alcaldía de Acacías – Meta, con el ID CONTROL 1198176, Usted manifiesta de forma escrita a esta dependencia que la solicitud, obedece únicamente a la adecuación y nivelación de un área de aproximadamente DIEZ MIL M2 (1,0) hectárea, con el fin de adelantar de preparar el terreno para recibir material de relleno de la Concesión Vial de los llanos y de las obras que adelanta la Administración Municipal. Que no adelantará ningún proyecto de loteo, sin que haya surtido el trámite de licencia ante la Secretaría de planeación y Vivienda y la Corporación Ambiental CORMACARENA.

Que no va a adelantar ninguna actividad de tipo comercial como loteo, construcción, parcelación; y que, en el momento de realizar algún tipo de estas actividades, adelantara los trámites y permisos legales pertinentes ante la Secretaria de Planeación y Vivienda del municipio de Acacías – Meta o ante la autoridad ambiental competente, CORMACARENA.

Que cualquier permiso adicional para cualquier tipo de construcción deberá tramitarse ante la Secretaría de Planeación y Vivienda y de acuerdo al USO DEL SUELO del área y acorde con el PBOT vigente.


Igualmente, se le advierte que no se pueden afectar fuentes hídricas y que cualquier permiso de ocupación de cauce o construcción sobre fuente hídrica requiere permiso ante la Corporación Ambiental competente CORMACARENA. Igualmente, tramitar los permisos para captación de agua ante CORMACARENA y los demás permisos que demande la actividad.

Este permiso se otorga para RECIBIR, ADECUAR, NIVELAR Y RELLENAR PARA TERMINAR DE RELLENAR LOS HUECOS DEL TERRENO el área descrita. Cualquier infracción o extralimitación a este permiso, lo hará acreedor a las sanciones de ley. No se deben afectar fuentes de agua, las cuales se debe respetar y dejar un área de 30 metros a lado y lado, medidos desde la cota de mayor inundación.


Si requieren hacer movimiento en un área mayor, se deben solicitar DETERMINANTES AMBIENTALES, ante CORMACARENA y solicitar la respectiva autorización a la Secretaría de Planeación y Vivienda.

Si necesita hacer tala de árboles, deberá tramitarse permiso de Aprovechamiento Único Forestal, ante esta Secretaría, para lo cual deberá tramitar el permiso y realizar la respectiva compensación.

16. REGISTRO FOTOGRÁFICO

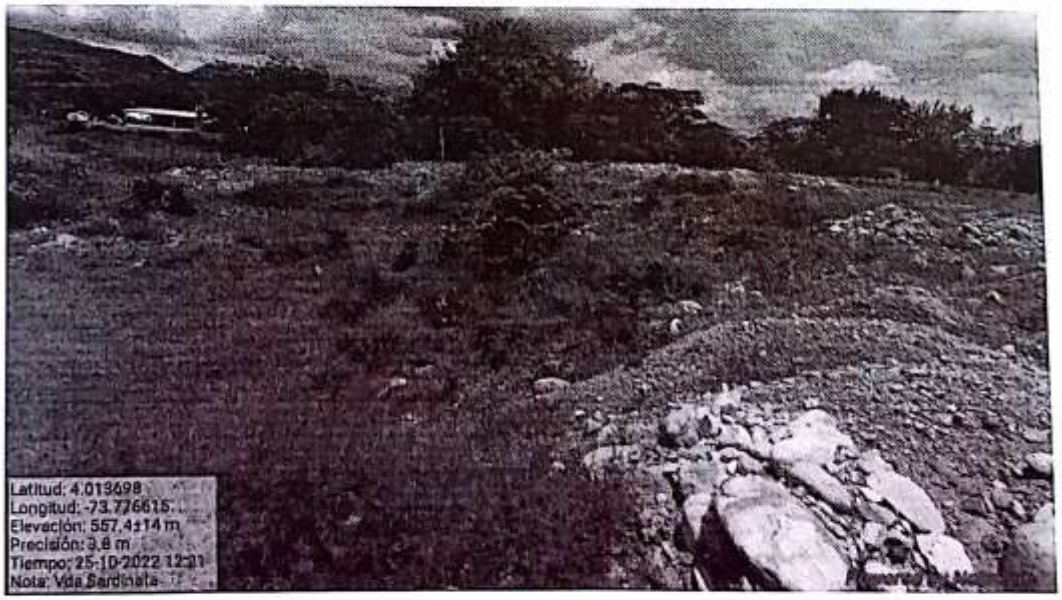

1070 - 42.2

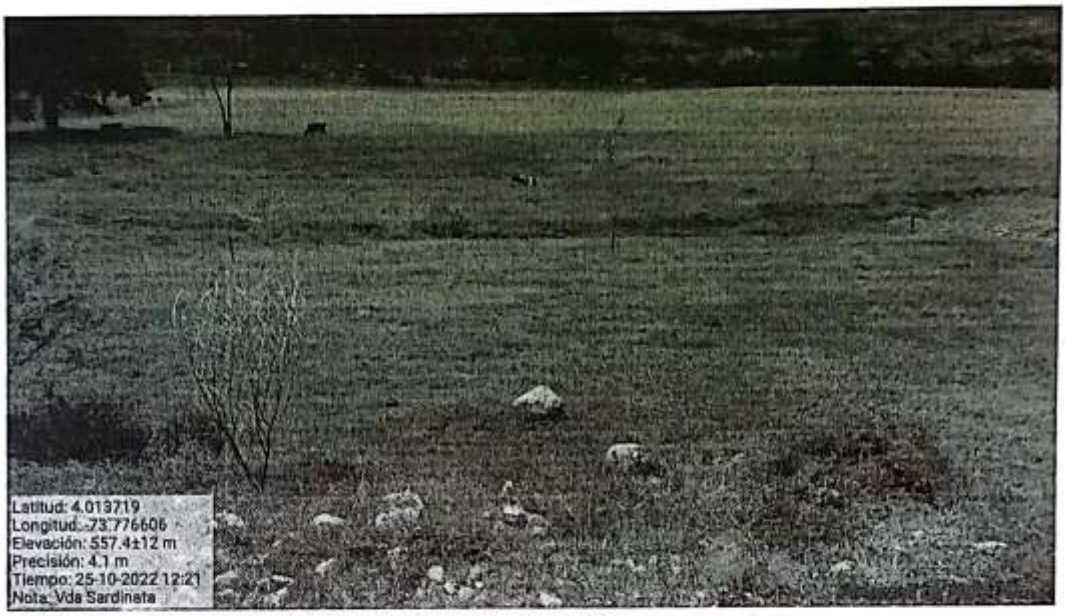

ZONA DE BAJO QUE NO SE PUEDE INTERVENIR.

Este permiso tiene una validez de OCHO (8) meses. A partir del PRIMERO (1) de DICIEMBRE de 2022.

Atentamente.

Original firmado por el Secretario

I.A. FABIO MARTÍN JARA AGUDELO
Secretario de Fomento y Desarrollo Sostenible

PROYECTÓ Y REDACTÓ
I.A. CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ
Profesional Universitario
WORD/CONCEPTO TÉCNICO DE RELLENO Y NIVELACIÓN

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"

RESOLUCIÓN No. 26051039

EXPEDIENTE No. 5.37.04.104

"POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA LICENCIA AMBIENTAL A FAVOR DE LA EMPRESA GRAVICON LTDA, PARA LA EXPLOTACIÓN MINERA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN LA MINA DENOMINADA EL PUERTO, UBICADA EN LA VEREDA EL ROSARIO, DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DEL META."

El Director de la Corporación Autónoma Para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena –CORMACARENA-, en uso de sus facultades legales en especial la que le confiere la Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO

Que mediante escrito radicado bajo el número 2 2 16 56, de fecha 1 de abril de 2004, el señor MOISES BAQUERO CORREAL en calidad de Representante Legal de la sociedad Gravas y Arenas para concreto Limitada -GRAVICON LTDA-, solicitó licencia ambiental para la explotación de material de arrastre sobre el rio Guayuriba, en la mina denominada El Puerto, vereda El Rosario, jurisdicción del municipio de Acacias (Met.).

Que igualmente se allego el Estudio de Impacto Ambiental para la respectiva evaluación.

Que mediante auto número V5.04.051 la Subdirección de Gestión Y Control Ambiental, inició trámite administrativo de Licencia Ambiental para la explotación de material de arrastre.

Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente al señor MOISES BAQUERO CORREAL el día 17 de mayo del 2.004.

Que en ejercicio del derecho de contracicción el señor RAFAEL FERNANDO BAQUERO M., Gerente de la compañía GRAVICON LTDA, mediante escrito de fecha 20 de mayo de 2004, repone el articulo segundo del auto número V5.04.051.

Que CORMACARENA por medio del oficio número 2 2 11 63, da respuesta al escrito de reposición mencionado en el parágrafo anterior.

Que la compañía GRAVICON LTDA el dia 30 de junio de 2004, allegó los requerimientos exigidos mediante el auto número 5.04.051.

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"

Libertad y Orden

CONSIDERACIÓNES TÉCNICAS

Que mediante el Concepto Técnico número 5.04.968 de fecha 17 de noviembre de 2004. la Subdirección de Gestión y Control Ambiental determino lo siguiente;

"2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE

2.1. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA

2.1.1. ASPECTOS FÍSICOS

- *Componente Geosférico.*

  - *Geología: El área se encuentra localizada sobre depósitos cuaternarios de origen aluvial en forma de terrazas antiguas y aluviones recientes. Los aluviones antiguos se ubican en la margen derecha del rio Guayuriba, presentando dos niveles bien diferenciados. el inferior compuesto por gravas y el superior por suelos residuales arenosos – limosos oxidados de unos dos metros de espesor, que revelan la relativa estabilidad de estos niveles: el conjunto conforma una meseta de unos 10 metros de espesor y de desnivel con respecto al cauce activo del rio. El aluvión reciente activo está compuesto en su mayoria por barras de gravas de diversos tamaños con imbricación entre depósitos y entrelazada con algunos niveles pequeños de arena sobre el lechos del rio Guayuriba; las barras corresponden a depósitos heterométricos de diversa granulometria cuya composición es de rocas metamórficas en un 70%, areniscas gruesas y limonitas rojas.*

  - *Geomorfología: El área de interés está conformada por tres unidades de paisaje de llanura Aluvial: las TERRAZAS: de superficie planar bien desarrolladas, con escarpes de erosión de aproximadamente 10 metros de altura, asociadas a antiguos abanicos aluviales coalescentes de gran magnitud que han sido disectados, se presenta en la margen derecha del área y los procesos erosivos dominantes corresponden a la forma laminar; la LLANURA DE DIVAGACIÓN E INUNDACIÓN: que topográficamente presentan alturas de 1,5 metros sobre el nivel de estiaje de las aguas, muy característica por la presencia de cauces abandonados o drenajes intermitentes drenados por las crecientes, los procesos erosivos son de tipo hídrico superficial en forma de surcos y erosión fluvial en época de invierno. la LLANURA DE ALUVIONES: dominada por la corriente activa del rio Guayuriba, donde la corriente toma un patrón de drenaje trenzado, con varios cauces y numerosas barras, playones, islotes, pequeños diques, bajos y planos aluviales dispuestos a lo largo de la corriente, los procesos erosivos están asociados al efecto de la propia corriente fluvial en las orillas del canal de estiaje.*

  - *Suelos: Se encuentran suelos de planicie aluvial de desborde, conformando áreas planas, sometidos a inundación, superficiales a profundos con texturas variables bien a pobremente drenados, fertilidad baja, poco evolucionados y ligeramente inundables; suelos de los bajos superficiales a profundos de textura media gruesa*

con estratificaciones, bien a perfectamente drenados, no evolucionados anegadizos; por otra parte se encuentran suelos de terrazas conformados por sedimentos finos a moderadamente gruesos, bien a pobremente drenados, con texturas finas, baja saturación de bases, con fertilidad baja, clasificándose como suelos ácidos.

Componente Climatológico.

- **Temperatura:** De acuerdo a la estación vanguardia, la temperatura media anual oscila entre 23°C y 26°C; la temperatura más alta se registra en el mes de Febrero con un valor medio de 27,2°C, que corresponde a la temporada seca, y la temperatura mínima se presenta en el mes de Julio, en la mitad de la temporada lluviosa, con un valor medio de 21,8°C.

- **Precipitación:** Existe influencia de un régimen unimodal de lluvias según la estación de Acacías: las máximas precipitaciones se presentan en Mayo (703,1 mm), aunque en Octubre ocurre otro periodo de lluvias (522,9), lo que podría indicar cierta tendencia a un régimen bimodal; se presenta un periodo seco entre diciembre y marzo.

- **Humedad Relativa:** Los valores mas bajos se registran durante el mes de Febrero, con un valor mensual medio de 68%, coincidiendo con la época mas seca y los meses de Julio y Junio como los mas altos (83,0%). Para los emás meses la humedad pasa del 76%.

- **Vientos:** Los menores valores medios mensuales registrados son de 1.6 m/s y corresponden a los meses de Junio y Julio; los valores mas altos se presentan durante el periodo Diciembre – Febrero, con un valor de 2,6 m/s; la dirección predominante de los vientos es en el cuadrante N – E, ya sean provenientes del SW, paralelos a la cordillera, o por las corrientes que corren por el cañón del Guayuriba. Los meses en que más se acentúa la dirección en sentido Norte es en diciembre, enero y febrero; en sentido Este, mayo, junio y septiembre.

Componente Hidrológico.

- **Hidrografía:** la zona de estudio constituye el inicio e la cuenca baja del río Guayuriba donde desarrolla un patrón de drenaje trenzado maduro, que a su vez pertenece a la cuenca del río Meta, sistema hidrográfico del Orinoco.

- **Caudal:** El régimen de caudales del río Guayuriba presenta un comportamiento caracterizado por dos periodos de caudales: un periodo de estiaje (verano) y otro de caudales altos (invierno). Los máximos caudales registrados son de 2.447 m3/seg (estación Puente carretera).

- **Calidad del agua:** Microbiológicamente las aguas superan los limites permisibles de potabilidad (E Coli fecal y aerobios alto), por lo que se consideran no potables. Estos resultados son normales si tenemos en cuenta que el río transcurre [illegible]

municipios y zonas densamente pobladas, recibiendo aguas negras y alcantarillados.

- **Hidrogeología:** Los depósitos aluviales corresponden a gravas, bloques y arenas es decir, los materiales que por su textura se transportan como material de arrastre sin cohesión alguna. Los limos y las arcillas son casi en su totalidad transportados rio abajo hasta que el rio cambia su régimen de trenzado a meándrico. Debido a lo anterior no existe ningún material fino que rellene los espacios vacíos que se crean entre grava y grava (o bloque) razón por la cual la porosidad y la permeabilidad son muy altas. Debido a las muy altas porosidad y permeabilidad y a no existir en el sitio ninguna capa impermeable que aisle las aguas freáticas se debe ser cuidadoso con vertimientos o derrames de combustibles o sustancias contaminantes en general. El nivel freático en general se encuentra a 40 centímetros de la superficie del terreno

2.1.2. ASPECTOS BIÓTICOS:

- **Vegetación.**

En el área de estudio, así como la zona de influencia del proyecto de Explotación del Yacimiento de Materiales de Construcción sobre el rio Guayuriba mina el Puerto, se encuentra vegetación arbustiva y arbórea, que no será intervenida. En el sitio de explotación de la mina la cobertura vegetal está conformada por pasto chigüirero, además existen algunos. árboles de guamo (Inga sp.), los cuales no han sido afectados.

En la tabla No 1 está consignado el inventario forestal con su nombre común, nombre científico y familia botánica.

Tabla 1. VEGETACIÓN RÍO GUAYURIBA (Sector Mina El Puerto)

FAMILIA BOTÁNICA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Anacardiaceae	Tapirira guianense	Guarupayo
Bignoniaceae	Tabebuia ochacea	Flor amarillo
Caesalpinaceae	Cassia grandis	Canafistulo
Euphorbiaceae	Pera sp	Gallino
Flacourtiaceae	Banara sp	Huesito
Lauraceae	Nectandra sp	Laurel
Meliaceae	Guarea guidonea	Palotigre
Mimosaceae	Pithecellobium longifolium	Simbrapotro
Myrtaceae	Psidium guayaba	Guayabo
Papilonaceae	Machaerium sp	Bejuco
Polygonaceae	Coccoloba sp	Tortuga
Rubiaceae	Genipa caruto	Jagua

- *Fauna.*

En la zona de influencia del proyecto que se encuentra completamente intervenida la presencia de fauna silvestre es completamente escasa. En la actualidad no se cuenta con un inventario consolidado de las especies existentes en la zona ni información detallada de las especies afectadas o en peligro de extinción en el municipio de Acacias, sin embargo por observaciones directas y avistamientos en horas de la mañana y en el atardecer como por referencias bibliográficas y por información de personas que reconocen bien la región se recopiló un listado identificando los animales con mayor presencia en el área:

- ***Aves:*** *Alcaraván, Arrendajo, Chulo, Garza del ganado, Corocora, Loro guahibo, Paloma,*
- ***Reptiles:*** *Babilla, Guio, Iguana, Lobo pollero, Tortuga morrocoy,*
- ***Anfibios:*** *Sapo común, Rana*
- ***Mamiferos:*** *Cachicamo sabanero, Chucha común, Zorro, Mico, Murciélagos.*

2.1.3. ASPECTO SOCIAL:

- ***Aspectos Demográficos.***

El municipio de Acacias registra una población total de 48.555 habitantes, de los cuales 37.982 pertenecen al sector urbano y el 10.573 al sector rural. (Fuente: Perfil Socio Económico del departamento del Meta – Planeación Departamental).

- ***Aspectos Socioeconómicos.***

En la región se presenta un modelo de desarrollo orientado por el escaso uso de la tierra y en la concentración y exclusión de su propiedad debido al predominio de prácticas de ganadería extensiva y en menor medida de agricultura subsistencia.

- ***Estructura de servicios públicos.***

  - ***Educación:*** *En el municipio de Acacias hay un centro educativo oficial con 13 sedes, de las cuales 8 son urbanas con 19 sedes y 5 rurales con 19 sedes cada una y atiende una población estudiantil de 14.409 estudiantes, distribuidos de la siguiente manera, preescolar 1.429 estudiantes, primaria 7.399, secundaria, 4225 , en media vocacional 1296.*

  - ***Salud:*** *La prestación del servicio de salud para el municipio de Acacias realiza a través de una E.S.E. y un Hospital Local con 34 camas y se atienden casos de urgencias, medicina general y los pacientes que revisten mayor gravedad son remitidos al hospital departamental ubicado en la ciudad de Villavicencio, el cual cuenta con infraestructura adecuada y un recurso humano especializado que le permite ofrecer un servicio de atención y apoyo en salud eficiente en el casco urbano, apoyados por 4 Centros de Salud y 3 Unidades Intermedias.*

Las principales causas de morbilidad que se han presentado en el municipio en los últimos años se relacionan con las infecciones respiratorias agudas superiores, enfermedades parasitarias intestinales, la enteritis, infecciones intestinales e hipertensión arterial. Los mayores indices de morbilidad se relacionan con problemas de atención al medio ambiente, manejo del agua y condiciones sociales dadas por el nacimiento y marginamiento poblacional.

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MINERO

2.2.1. Actividad exploratoria

Se realizó un conjunto de labores de exploración consistentes en el levantamiento topográfico del terreno, la realización de cuatro apiques y 3 perforaciones con taladro mecánico parcialmente corazonadas.

Se determinó que el yacimiento está constituido por una mezcla de gravas y arenas con predominio de las gravas de hasta 50 centimetros de diámetro. En general los dos metros superiores del yacimiento son los que presentan el mayor porcentaje de arena (de hasta 40%); en tanto, que a partir de dos metros de profundidad el porcentaje de arena es inferior al 5%.

2.2.2. Sistema de explotación a emplear

La explotación se ha programado y se ha aprobado para treinta (30) años de la vida de la mina: el sistema de explotación utilizado consiste en la extracción del material pétreo con una retroexcavadora de 1.5 metros de capacidad la cual desgarra las gravas y arenas y las carga en 2 volquetas de 7 m3 de capacidad para su transporte hacia los patios de almacenamiento de la planta de trituración.

Se trabajará en dos fases: La primera fase de la explotación se ha separado en 57 módulos. Fase 1). El orden de explotación está indicado por el número del módulo avanzando desde el número 1 hasta el 57. Esto significa que la explotación se iniciará en la parte más alejada de la mina aguas abajo del Rio Guayuriba, hacia aguas arriba en franjas de módulos que estarán separadas entre si por los paleocauces (vestigios de brazos antiguos del Rio Guayuriba). En una segunda fase se conectarán parejas de módulos contiguos dejados por la primera fase para obtener 28 módulos; el orden de explotación propuesto para la segunda fase es similar al descrito en la sección anterior para la fase 1

En ambos casos, se ha dispuesto separar los módulos entre si mediante bermas o machones de 10 metros de ancho, al igual que alrededor del borde de los módulos que coincide con los paleocauces, con el fin de que estos sirvan de barreras que reduzcan el riesgo de que un brazo principal del Rio Guayuriba establezca un curso permanente sobre alguna porción de la mina.

2.2.3. Volúmenes de material a extraer

Para el tiempo de vida de la mina, se ha proyectado producir 78.750 m³/año de agregados

Por lo tanto, el volumen de material de mina a remover cada año, si tenemos en cuenta que se espera obtener una eficiencia del 70% en la planta de trituración (perdidas por proceso del 4%, sin contener los sobretamaños que no puedan ser procesados en la planta), es de 112.500 m³. Por lo cual se producirán aproximadamente 4.500 m³ de finos producto del lavado del material de mina.

2.2.4. Recursos de la Región Utilizados por el Proyecto

El agua para el proceso de beneficio será captada del acueducto. A este sistema se integran las aguas residuales resultantes del proceso de lavado las cuales serán tratadas en los pozos sedimentadores recuperadas y nuevamente conducidas al sistema para cerrar el ciclo.

2.2.5. Descripción de la mano de obra, maquinaria y equipo a emplear

Por las características del proyecto que considera la extracción, cargue, transporte y beneficio de material aluvial, la necesidad de personal y equipo a utilizar son:

El personal requerido por el proyecto es el siguiente:

- *1 Administrador de la Mina*
- *1 Almacenista*
- *1 Soldador*
- *1 Operador de Retroexcavadora*
- *2 Conductores Volquetas*
- *1 Ayudante de Patio*
- *1 secretaria.*

Los equipos requeridos son los siguientes:

- *Una retroexcavadora de oruga de 1,5 m3 de capacidad.*
- *Un buldózer.*
- *Dos volquetas de 7 m3 de capacidad.*
- *Vías de acceso interno a la mina.*

2.2.6. Diseño de la adecuación Final de la Zona a Explotar

Un uso potencial que se le podría dar a los terrenos de GRAVICON luego de terminadas las labores mineras sería la adecuación de las excavaciones o módulos explotados para su utilización en el cultivo de especies piscícolas que puedan ser posteriormente aprovechadas en la repoblación del Río Guayuriba.

Para ello y en caso de que no resulte factible realizar una explotación posterior a la culminación de la segunda fase se espera que los módulos que vayan siendo abandonados en la fase 2 sean utilizados progresivamente en la implementación de los cultivos piscícolas.

2.2.7. Funcionamiento del área de explotación.

En el predio el Puerto se contempla la construcción de una oficina, una bodega, una batería de baños, caseta de vigilancia. Dichas instalaciones contará con los siguientes elementos:

- Equipo Contra Incendio: Se dotará con un extintor de 30 Lbr. con capacidad de acuerdo con la zona a atender.
- Pozo séptico: Se construirá un pozo séptico, diseñado para el personal que operará en la mina durante la jornada laboral.
- Basuras: El área se dotará con canecas debidamente señalizadas para la disposición de los residuos debidamente clasificados, que luego serán transportados al relleno sanitario del municipio de Acacias, previo acuerdo con la empresa que lo opera.
- Señalización Interna: El área contará con señales preventivas, reglamentarias e informativas, con el fin de evitar accidentes.

AGUAS RESIDUALES.

El proyecto requiere la construcción de un pozo séptico para la disposición de las aguas residuales y excretas, por lo tanto se debe considerar la localización pertinente del pozo y las condiciones hidrogeológicas del área, para determinar la susceptibilidad de los acuíferos y la potencial contaminación. Igualmente se manejarán vertimientos por disposición de los residuos sólidos finos producto del lavado del material en el proceso de beneficio.

Aunque no se plantea la disposición de aceites y grasas si se requiere de una medida de manejo, pues necesariamente se requiere de maquinaria para la explotación.

2.3. IMPACTOS

2.3.1. Escenario sin proyecto.

Las condiciones existentes en el área de influencia del proyecto, previo al inicio de las actividades de explotación de materiales aluviales, susceptibles de transformarlo pretende definir si los cambios son imputables a la explotación de materiales aluviales en el Río Guayuriba, o bien, si es producto de una situación reciente y espontánea que en la actualidad se viene desarrollando en la región.

Las situaciones de mayor importancia en la región son las siguientes:

- El rio Guayuriba en la zona de explotación presenta un volumen de material considerable que garantiza explotación requerido para la ejecución de obras de construcción.
- El rio Guayuriba tiene un cauce estable y por lo tanto no, sufrirá cambios en morfología y dinámica fluvial, como consecuencia de las labores de explotación.
- Los materiales aluviales serán utilizados para construcción de obras varias, las cuales se ejecutan en el municipio de Acacias, y los demás municipio vecinos como Guamal y Castilla la nueva.

- *En relación con las actividades agropecuarias en el área de influencia del proyecto, predomina la ganadería extensiva y la explotación tecnificada de la palma de aceite. En donde la inversión de capital en su tecnificación, especialmente en pastos mejorados, es frecuente en la vía a Dinamarca.*

➢ *Situación con Proyecto.*

Los indicadores ambientales se han analizado detalladamente para el área de influencia directa del proyecto. El medio hídrico hace referencia al Rio Guayuriba en el que se ejecuta la explotación de materiales aluviales.
Los medios edáfico y atmosférico se relacionan con el suelo y el aire respectivamente, para los cuales se describe la afectación producida por las actividades del proyecto, tanto en la fuente de materiales como en el almacenamiento de estos.
El medio geomorfodinámico se relaciona con los procesos erosivos que sean potenciales durante la explotación de materiales y después de ésta.
En el medio biótico se analiza la vegetación presente, principalmente de los estratos herbáceo y arbustivo que son los que van a tener mayor afectación. También se considera la fauna asociada.
El medio socioeconómico se refiere a la zona de influencia directa, que corresponde a la Vereda El Rosario del Municipio de Acacias.

En la tabla No. 2 aparece el resultado de la confrontación entre el proyecto y los indicadores ambientales, de una manera secuencial, desde la primera hasta la última etapa del proyecto.

ACTIVIDADES	MEDIO HÍDRICO	MEDIO EDÁFICO	MEDIO GEOMORFODINÁMICO	MEDIO ATMOSFÉRICO	MEDIO BIÓTICO	MEDIO SOCIOECONÓMICO
- Explotación de materiales aluviales	Alteración del curso del drenaje Obstrucción, modificación o encauzamiento.		Modificaciones de las características morfométricas del cause. arrastre de sedimentos en los frentes de explotación.	Presencia de polvo en el ambiente	Alteración del hábitat acuático cambios en las comunidades de algas e insectos acuáticos.	Generación de empleo preferencia de mano de obra en el río Guayuriba
- Trituración de material	Mezcla de agua con finos sedimentables			Presencia de polvo en el ambiente por acción del viento	Afectación de cobertura vegetal cercana a los sitios de almacenamiento	Afectación de predios Generación de empleo
- Almacenamiento de material	Arrastre de coloidales y finos sedimentables ocasionados por la acción de las lluvias	Cambios en el uso del suelo de cobertura de pastos a sitio de almacenamiento.		Presencia de polvo en el ambiente por acción del viento	Afectación de cobertura vegetal cercana a los sitios de almacenamiento	Afectación de predios Generación de empleo

(...)
4. CONCEPTO.

El área de explotación, la cual consta de 184,1050 Hectáreas, fue solicitada como Contrato de Concesión No EPD-151, con fecha de 29 de Enero de 2004 ante INGEOMINAS, y se encuentra ubicada en la vereda El Rosario, jurisdicción del municipio de Acacías (Meta), a orillas del río Guayuriba, cuyo polígono se encuentra delimitado por las coordenadas planas indicadas en el inicio de este concepto.

El área presenta reservas potencialmente explotables de calidades aptas para ser trabajadas como agregados para concretos, las cuales a partir de la exploración y ensayos se determinaron las siguientes características geotécnicas del yacimiento:

A partir de la elaboración de los apiques se pudo establecer que el yacimiento de arenas y gravas se caracteriza por la ausencia o escasez de estériles de cobertura, que o bien no están presentes, o sólo en algunos casos se presentan como una mezcla de materia orgánica en descomposición y arena, formando una capa con un espesor máximo medido de 20 centímetros.

El yacimiento está constituido por una mezcla de gravas y arenas con predominio de las gravas de hasta 50 centímetros de diámetro. En general los dos metros superiores del yacimiento son los que presentan el mayor porcentaje de arena (de hasta 40%); en tanto, que a partir de dos metros de profundidad el porcentaje de arena es inferior al 5%.

Otro rasgo importante del yacimiento observado durante la elaboración de los apiques, es la presencia de agua subterránea a partir de 1.5 metros de profundidad la cual fluye hacia el centro de la excavación produciendo el desplome de las paredes del apique. A partir de mediciones en campo se pudo establecer que el ángulo de reposo del material es de aproximadamente 35°. Esto obedece a que las arenas y gravas se encuentran sueltas saturadas de agua y carecen de cohesión.

Los resultados de los ensayos de laboratorio sugieren que las gravas y arenas que constituyen el yacimiento, presentan excelentes condiciones para su utilización en la fabricación de agregados para concreto, por su alta dureza (manifestada por una resistencia al desgaste del 23% en promedio), su bajo contenido de finos (menos de 4%) y bajos contenidos de materia orgánica (menor de 1).

El bajo contenido de finos, en combinación con la ausencia de intervalos arcillosos en los apiques y afloramientos observados, sugiere que las pérdidas durante el proceso de beneficio son muy bajas condición que además de ser atractiva económicamente también presenta ventajas ambientales por cuanto la demanda de agua requerida para el beneficio de los agregados es muy baja.
De igual forma la alta dureza del material atribuible a la composición litológica de las gravas (rocas metamórficas de grano grueso) sumada al amplio rango

granulométrico del depósito: permite prever que por lo menos un 96% del material que sea extraido de la mina, descontando los sobretamaños (particulas de mas de 40 cm. de diámetro), es aprovechable mediante la implementación de un sistema de beneficio adecuado.

Ambientalmente hablando se establece que la zona no presenta comunidades habitadas que puedan verse marginadas por el proyecto, el uso del suelo es de vocación ganadera, por lo que los impactos debidos a la deforestación han sido devastadores, quedando tan solo una vegetación de porte menor (rastrojo) en las partes bajas inundables del rio y pastos manejados en las extensas planicies de la terraza aluvial, tampoco se encuentran ecosistemas frágiles que puedan alterar de manera significante el hábitat y corredores de especies faunisticas.

La calidad del recurso hídrico es mala debido a que Microbiológicamente las aguas superan los límites permisibles de potabilidad (E Coli fecal y aerobios alto), por lo que se consideran no potables. Estos resultados son normales si tenemos en cuenta que el rio transcurre por municipios y zonas densamente pobladas, recibiendo aguas negras y alcantarillados, razón por la cual los únicos indicadores ambientales hídricos afectados serán los sólidos disueltos, sedimentables y totales que se verán alterados durante las labores de explotación.

El proyecto no requiere de la construcción de nuevas vías, pues para el acceso se tendrá la carretera que comunica a Acacias con la vereda Dinamarca, la cual pasa por dentro del área concedida y se encuentra en condiciones regulares; los trabajos internos del transporte de la mina a la planta de beneficio, tampoco incluyen disposición de nuevas zonas teniendo en cuanta que el patio de beneficio se localiza justo al lado de la mina, para lo cual solamente tiene que atravesarse la vía veredal a Dinamarca.

El agua para el lavado de los materiales pétreos se obtendrá del acueducto municipal. Las aguas residuales del proceso de lavado serán conducidas a través de conductores por gravedad hacia los pozos sedimentadores tres en total para la decantación de los finos, se llevara a cabo la recuperación de las aguas para integrarlas nuevamente al proceso de lavado. Para este fin se dispone de una unidad de bombeo para la conducción del agua desde los pozos sedimentadores hacia el reservorio de agua.

No se tendrán emisiones puntuales de gases o material particulado, teniendo en cuenta que la humedad relativa alta de la región y las precipitaciones durante la mayor parte del año, disminuyen las concentraciones de contaminantes atmosféricos debidas al tráfico de volquetas y operación de la retroexcavadora.

El sistema de explotación se establece por medio de la secuencia de excavación de dársenas con profundidad máxima de 1,5 metros en dos fases de explotación: una

inicial de 57 módulos donde la explotación se iniciará en la parte más alejada de la mina aguas abajo del Río Guayuriba, hacia aguas arriba en franjas de módulos que estarán separadas entre sí por los paleocauces. En una segunda fase se conectarán parejas de módulos contiguos dejados por la primera fase para obtener 28 módulos en un orden similar a la de la primera fase; en ambos casos, se ha dispuesto separar los módulos entre sí mediante bermas o machones de 10 metros de ancho. La evaluación de la efectividad de tales estructuras en el control temporal del comportamiento del río, solo podrá determinarse con la experiencia, a medida que evolucione la explotación.

En este sentido, teniendo en cuenta las condiciones actuales de los componentes ambientales y las características técnicas del sistema de explotación a emplear, el proyecto minero para la extracción de material de arrastre en la Mina El Puerto se considera TÉCNICA, ECONÓMICA Y AMBIENTALMENTE VIABLE, siempre y cuando se sigan las recomendaciones y obligaciones establecidas en el presente Concepto Técnico."

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Constitución Política, en el artículo 80, establece: *"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. (...)"*

Que el Decreto número 1180 de mayo 10 de 2003, reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales.

Que se entiende por Licencia Ambiental, la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, la cual sujeta al beneficiario de ésta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.

Que el artículo 9 del decreto en cita, señala que las Corporaciones Autónomas Regionales, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los proyectos, obras o actividades en el sector minero que se ejecuten en el área de su jurisdicción.

Que la norma en cita establece que con base en el Estudio de Impacto Ambiental la autoridad competente otorgará o no la Licencia Ambiental para la construcción, el montaje, la explotación objeto del contrato y el beneficio y para las labores adicionales de exploración durante la etapa de explotación.
Que CORMACARENA de conformidad con lo previsto en el artículo 120 de la Ley 812 en concordancia con el numeral 9º del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, es la autoridad competente para resolver el asunto puesto a su consideración.

En mérito de lo expuesto ésta Corporación,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger en su totalidad el Concepto Técnico número 5.04.968 de fecha 17 de noviembre de 2004, emitido por la Subdirección de Gestión y Control Ambiental de CORMACARENA.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar LICENCIA AMBIENTAL a favor de la compañía GRAVICON LTDA, NIT 830049948-1, para la EXPLOTACIÓN MINERA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, en la Mina El Puerto, ubicada en la vereda El Rosario, del municipio de Acacias, departamento del Meta, la cual se encuentra delimitada por las siguientes coordenadas planas (origen Bogotá – IGAC).

PUNTO INICIAL	PUNTO FINAL	RUMBO	DISTANCIA (m)	COORDENADA NORTE INICIAL	COORDENADA ESTE INICIAL
P.A.	1	S 74°43'34,45" E	1.347,60	937.010	1.038.700
1	2	S 00°00'00" W	155,0	936.655	1.040.000
2	3	N 90°00'00" E	5.000,0	936.500	1.045.000
3	4	N 00°00'00" E	500,0	936.500	1.045.000
4	5	S 90°00'00" W	1.000,0	937.000	1.045.000
5	6	S 00°00'00" W	345,0	937.000	1.044.000
6	7	S 90°00'00" W	1.000,0	936.655	1.044.000
7	8	N 38°11'13,67" W	928,48	936.655	1.043.000
8	9	S 90°00'00" W	1.180,0	937.000	1.042.138
9	1	S 70°11'41,17 W	1.018,23	937.000	1.040.958

ARTÍCULO TERCERO: La compañía GRAVICON LTDA, deberá realizar las siguientes actividades en el tiempo indicado y bajo los lineamientos establecidos para su ejecución, para tal efecto el tiempo que se indica para cada obligación se contará a partir de la ejecutoria la presente resolución; el no cumplimiento de estos términos conllevará al inicio de la respectiva investigación por parte de esta corporación.

1. Realizar el sistema de explotación por medio de dársenas transversales a la corriente y en aquellas zonas centrales, donde se ha incrementado la sedimentación del material de arrastre, excavando siempre en el sentido perpendicular a la corriente, islote o dique que esté dispuesto por lo general en la parte central del cauce madre del rio, en zanjas o trincheras de una longitud que abarque el ancho de la barra o islote por 1,5 metros de profundidad y un ancho entre dársenas de excavación de 10 metros, y evitar hacerlo en la zonas

próximas al escarpe de erosión de la terraza aluvial antigua, con el fin de mantener estable la terraza contra la socavación lateral del rio Guayuriba.

2. Como medida de corrección, los taludes verticales que quedaron conformados en la apertura de la vía de acceso a la mina sobre los materiales de aluvión de la terraza, deberán ser protegidos, en un plazo máximo de tres (3) meses, mediante técnicas Bioingenieriles contra la Erosión Hídrica, tanto para la estabilización de la corona del talud como en talud expuesto.

3. Como medida de mitigación y durante la operación de la planta, los vehículos de transporte de material deberán cumplir con lo dispuesto en el Articulo Segundo de la Resolución 541 de 1994, para el transporte de material de escombros y materiales de construcción.

4. Como medida de compensación Social, se deberá elaborar un Programa de gestión Social, el cual deberá incluir medidas de inversión social, ya sea en mejoramiento de la vía de acceso, acueductos veredales, construcción de infraestructura social (salones, tanques, etc), como proyectos de Educación Ambiental, para lo cual se podrán coordinar los tres (3) talleres propuestos con la Oficina de Planeación de ésta Corporación. Dicho programa deberá entregarse en un término de sesenta (60) días.

5. Como medida de compensación paisajística, se deberá elaborar un Programa de Reforestación, que permita implementar un barrera viva que corrija el Impacto visual tanto de la explotación, como de la operación de la Planta trituradora, el cual se trabajará con especies nativas de la región; dicho programa deberá allegarse a esta Corporación en un término de sesenta (60) días, y deberá incluir un mínimo 3000 arbóreos, tipo de especie, sistema de plantación, localización de la reforestación y técnicas de mantenimiento.

6. El beneficiario se compromete con esta Corporación a establecer un programa de Seguimiento y Monitoreo el cual debe allegar en un plazo máximo de sesenta (60) días; dicho Plan deberá ceñirse a la entrega de Informes Semestrales de Avance del Plan de Manejo Ambiental, en los cuales debe contener por lo menos la descripción de la explotación realizada hasta la fecha indicando las cantidades, áreas explotadas, secuencia de la excavación, plano de áreas explotadas, comportamiento de la dinámica fluvial del rio Guayuriba y los avances en la Gestión Social, Manejo Paisajístico, Plan de Contingencias y Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Manejo de Residuos sólidos y de Vertimientos de aguas del proceso de beneficio. Los informes de avance deberán incluir soporte fotográfico, cálculos, descripción de actividades, planos y Resultados de ensayos que se requieran y deben estar firmados por un profesional ambiental o una firma que haga las veces de auditor ante la Corporación.

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"

Libertad y Orden

7. Las anteriores obligaciones y recomendaciones harán parte del PTO (Plan de trabajos y Obras), el cual debe ser elaborado como parte del proceso de legalización de la mina, por lo tanto estos documentos deberán revisarse, ajustarse y complementarse al PLAN DE MANEJO AMBIENTAL una vez se tenga aprobado dicho estudio.

8. Con relación al documento ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE ARRASTRE DE LA MINA EL PUERTO, el beneficiario deberá allegar a esta Corporación en un término máximo de sesenta (60) días, como complemento a la información contenida en el estudio, con el fin de tener a la mano instrumentos de comparación para los análisis de los Informes semestrales de avance del proyecto:

   A. El ESTUDIO DE DINÁMICA FLUVIAL que se tuvo en cuenta para la planificación del sistema de Explotación; debe incluir Planos Morfológicos, Geotécnicos e Hidráulicos.

   B. Los ANÁLISIS DE MUESTREO DE AGUAS tomados aguas arriba del área a explotar (puntos 1 – 2) y aguas abajo del polígono (puntos 3 – 4).

   C. Copia del informe de EXPLORACIÓN GEOLÓGICA, principalmente en lo referente a los perfiles estratigráficos del yacimiento, con el fin de determinar las condiciones de permeabilidad de los acuíferos superficiales.

   D. Para complementar la Linea base y con el fin de tener un instrumento de trabajo para poder dimensionar y espacializar los elementos ambientales se debe presentar la cartografía temática a escala 1:10.000 o 1:5.000. que incluyan los siguientes mapas: - EDAFOLÓGICO. GEOMORFOLÓGICO - GEOTÉCNICO, COBERTURA VEGETAL. ECOSISTEMAS, USO DEL SUELO Y DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo, en la gaceta oficial de –CORMACARENA-, para tal efecto el interesado deberá consignar en la cuenta de ahorros número 36417398338 de BANCOLOMBIA, a nombre de CORMACARENA, NIT 822.000.091-2, la suma de DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/TE. ($208.600), y allegar 2 copias para ser anexadas al expediente.

ARTÍCULO QUINTO: Informar al Procurador 14 Judicial Ambiental Agrario para lo de su competencia, igualmente, remitir copia del presente proveído al INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA –INGEOMINAS-.

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del la presente resolución a la compañía GRAVICON LTDA, a través del Representante Legal. De conformidad con lo señalado en e articulo 44 y 45 del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo-.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse ante el Director General de CORMACARENA, dentro de los cinco (5) dias siguientes al de la notificación de acuerdo a los requisitos señalados en el articulo 52 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

08 NOV. 2005

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOAQUIN HERNAN PATARROYO VARON
Director General
CORMACARENA

Proyectó: Abogada ELIZABETH CRUZ VARGAS
Asesora Jurídica
Revisó: Abogado Diego Fernando Gomez Perez
Jefe Oficina Jurídica

CONSORCIO
POLICIA-ACACIAS 2023

CAPACITACION - INDUCCION - 9CAP

CIUDAD/FECHA	Acacias	AREA/CENTRO DE TRABAJO:	Consorcio policia	C-I-R. No. 01
TEMA DE CAPACITACION	Uso de eficiente y ahorro del agua	C.C./NIT:	1	NOMBRE ESPOSITOR:

RELACIÓN DE EMPLEADOS Y COLABORADORES	IDENTIFICACIÓN (C.C.)	ARP	EPS	FIRMA
Andres castillo	1001271237	Proteccion	Famisanar	
Orlando Barrera	4272180	colpensiones	Famisanar	Orlando Barrera
Patrocinio Vasquez	17328844	colpensiones	Salud total	Patrocinio
Julian reyes	8102467	colpensiones	Sanitas	
Richard Moreno	17418711	colFondos	coomeva	
Emilee Gonzales	1120367537	Porvenir	coomeva	Emilee G.
Luis miguel Hernadez	1006776248	colpensiones	Salud total	Luis Miguel
Luis Antonio Molina	17312984	colpensiones	coosalud	
Ricardo Arango castillo	1124944764	Porvenir	Sanitas	
Fabia Andres Reyinno	1122118780	Porvenir	coomeva	
luis fernando borja	93461815	Proteccion	Famisanar	luis fernando
Brayan Alexis ruiz	1122142788	Proteccion	Famisanar	
Edwin paez	1218683711	Sura	Nueva EPS	Edwin paez
yeison paez	86071376	Sura	Sanitas	
Mauricio Herrera	1121833857	Sura	coomeva	

Andres camilo Guarnizo _____ _____

NOMBRE EJECUTOR | FIRMA | CEDULA

_____

NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA | FIRMA | CEDULA
