ACTA DE COMITÉ DE OBRA

ACTA COMITÉ No. 2

FECHA: 6 de Marzo de 2024

HORA: 13: 00 horas

LUGAR: Ptar la unión Sumapaz

ASISTENTES: anexo 1. listado de asistencia a comité

INVITADOS:

AUSENTES:

ORDEN DEL DÍA

1. Pendientes y compromisos del acta N° 1 - 28 de febrero
2. Envió de cronograma
3. Respuesta de correos para solicitud de prorroga

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

- Se da respuesta al cronograma el día 6 de marzo de 2024 con un estimado de 7 semanas.
- Se da respuesta a los correos y oficios enviados por interventoría para una posible prorroga.
- Se dan recomendaciones por parte del área ambiental en cuanto acopio y manejo de RCD, solicitando kit de aproximación.
- Área de seguridad y salud sugiere tener un área sanitaria adecuada para los trabajadores, papeles en regla y solicitud de cursos.
- Solicitud de comités de obra virtualmente para conocer evolución de obra.
- Asistencia del equipo completo de interventoría y contratista para los comités.
- El contratista y supervisión de obra manifiesta que se utilice otra metodología aparte de los oficios, para dar manejo a temas asociados al proyecto como lo son; mesas de trabajo presenciales, virtuales y/o comités.
- Se propone realizar los comités 1 semana presencial y la siguiente virtual por motivos de desplazamiento de los directores de obra tanto de interventoría como contratistas.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Envío de actas completas al contratista	Interventoría	8/03/2024
Envio de circulares a las personas de la comunidad sobre temas de señalización, RCD y acopios, (parte ambiental).	Contratista	8/03/2024
Dar solución al área sanitaria y papeles en orden del personal (solicitud del SST de interventoría).	Contratista	8/03/2024
Realizar mesas de trabajo entre interventoría y contratista para definir los ajustes finales el os diseños	Contratista Interventoría	7/03/2024

Anexo: Si aplica.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

LISTADO DE ASISTENTES A COMITÉ

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO O EXTENSIÓN	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Sthiver Perez Maheche			X							Consorcio Inter 1	sthiverperez@gmail.com	3115461859	
Camilo Araque Ballares			X							FDRS	juan.araque@gobiernobogota.gov.co	3057144006	
Jessica Careno Ramírez			X						X	Consorcio GHW	ambiental.sst@sumapaz	3124780	
Jorge Andrés Piza Becerra			X						X	Consorcio GHW	residente.sumapazobra@gmail.com	3016457777	
Mauricio Martinez			X							Consorcio Inter 1	martinezmauricio@outlook.com	3204391542	
Arley Ramos Polo			X							Consorcio Inter 1	ramosarleypolo@gmail.com	3042990866	
Guido Omar Hoyos D									X	Consorcio GHW	mayago742@yahoo.es	3102409722	
Harold Marin Muñoz			X						X	Consorcio GHW	haroldmarinm@gmail.com	3142389742	
Johanna Ramirez			X						X	Consorcio GHW Sumapaz	social.sumapazobra@gmail.com	3506965000	
Escalador Salazar			X							Consorcio Inter 1	Escalador@gmail.com	3227156776	

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

ACTA COMITÉ No. 3

FECHA: 13 de Marzo de 2024

HORA: 10: 30 am

LUGAR: PTAR la unión, Sumapaz

ASISTENTES: anexo 1. listado de asistencia a comité

INVITADOS:

AUSENTES:

ORDEN DEL DÍA

1. Pendientes y compromisos del acta N° 2
2. Envió de actas completas al contratista
3. Realizar mesas de trabajo entre interventoría y contratista para definir ajustes.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

- Inicio obra nueva Granada y santo domingo.
- Solicitud oficial de inps adición y prorroga.
- Permisos ambientales del gestor autorizando para transporte y disposición de RCD.
- Documentación de canteras autorizadas
- Instalación de punto sanitario.
- Entrega de documentación de los trabajadores nuevos, parafiscales y hojas de vida.
- Certificación afiliación de ARL de todo el personal profesional.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Mesa de trabajo para ajuste de presupuesto	Contratista	15/03/2024
Inicio de frentes de obra de nueva granada y santo domingo	Contratista	Nueva granada 15/03/2024 Santo domingo 20/03/2024
Hablar con el dueño del predio acerca de agua tratada de santo domingo (parte social).	Contratista	20/03/2024
Envió de diseño de mezclas de concreto	Contratista	20/03/2024
Entrega certificados de afiliación personal nuevo (nueva granada). Entrega de certificado afiliación ARL todo personal administrativo y operativo.	Contratista	14/03/2024

Anexo: Si aplica.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

LISTADO DE ASISTENTES A COMITÉ

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO O EXTENSIÓN	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Diana Carolina Guasca			X							interventoría	socialGcanyon.com	3014764450	
Luisa Fernanda Lozano			X							FORJ.	luisa.lozano@gobiernobogota.	3003620762	
Jorge Andrés Piza Becerra			X						X	Contratista	residente.sumapaz obra.@gmail.com.	3016457222	
Harold Mann M			X						X	Contratista Consorcio GHW	hmmconstrucciones egmail.com	3142389742	
Guido Omar Mojo			X						X	Consorcio GHW Sumapaz	mhoyago742@ yahoo.es	3102407772	
Luis G Duarte Villamil			X						X	interventoría	luisduarteo207egmail.com	3103686127	
GABRIEL DUARTE D			X						X	INTERVENTORÍA	gabrieljuanfediaz@yahoo.es	3112516304	

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

ACTA COMITÉ No. 4

FECHA: Miércoles 20 de Marzo de 2024

HORA: 10: 30 am

LUGAR: PTAR la unión, Sumapaz

ASISTENTES: anexo 1. listado de asistencia a comité.

INVITADOS:

AUSENTES:

ORDEN DEL DÍA

1. Pendientes y compromisos del acta N° 3.
2. Avance de obra la unión y nueva granda.
3.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

- Mesa de trabajo para ajuste y presupuesto.
- Inicio santo domingo y nueva granada.
- Se hablo con el dueño del predio acerca de agua tratada de santo domingo (Sr. Misael baquero).
- Envió de documentación y diseño de mezclas de concreto.
- Entrega certificados de afiliación ARL de todo el personal nuevo y antiguo tanto administrativo como operativo.
- Retiro de panal de abejas en Ptar nueva granada.
- Se acordó con la supervisión que se podía manejar una Bitácora por el proyecto.
- Ingreso de material como tubería para priorizar relleno de excavaciones.
- El contratista estima que se a realizado un 30% de ejecución de la Ptar la unión.
- Instalación de equipos ambientales en santo domingo y nueva granada.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Envió de propuestas y/o solicitud de prorroga con sus anexos.	Contratista	23/03/2024
Inicio de obra santo domingo reprogramado	Contratista	22/03/2024
Ingreso de tubería para priorizar relleno de excavaciones.	Contratista	22/03/2024
Revisión de documentación enviada por el contratista referente a la afiliación y ARL de los trabajadores	Interventoría	21/03/2024
Instalación de equipos ambiental santo domingo y nueva granada.	Contratista	26/03/2024
Documentación de materiales pétreos y visto bueno por parte de interventoría.	Contratista Interventoría	21/03/2024

Anexo: Si aplica.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

LISTADO DE ASISTENTES A COMITÉ

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO O EXTENSIÓN	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Sthiver Pérez Mahecha			X						X	Consorcio Inter 1	sthiverperez@gmail.com	3115465859	
Luisa F. Lozano G.			X						X	FDRS.	luisa.lozano@gobiernobogota.gov.co	2003500	
GUIDO OMAR NAVA DURANGO			X						X	Consorcio GHW	mayaga742@yahoo.es	3107407772	
Jesica Lorena Ramírez B.			X						X	Consorcio GHW	Arquitecta.sumapaz@gmail.com	3124765	
Diana Carolina Guasca			X						X	Interventoría	socialGccymsas.com	3016765450	
Johanna Ramirez B.			X						X	Con. GHW.	social.sumapaz.obra@gmail.com	3506765000	
Mauricio Martinez			X						X	Consorcio Inter 1	martinezmauricio@outlook.com	3205811542	
Arley Ramos Polo			X						X	Consorcio Inter1	Ramosalexfelo@gmail.com	3109250966	~~Arley~~
Jorge Andrés Piza B.			X						X	Consorcio GHW	residente.sumapaz.obra@gmail.com	3016457772	
Eraldo Salazar Garcia			X						X	Consorcio Inter 1	[illegible]	3227286777	

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

ACTA COMITÉ No. 5

FECHA: Miércoles 27 de Marzo de 2024

HORA: 15: 30

LUGAR: Virtual

ASISTENTES: anexo 1. listado de asistencia a comité.

INVITADOS:

AUSENTES:

ORDEN DEL DÍA

1. Pendientes y compromisos del acta N° 4.
2. Avance de obra la unión, nueva granda y santo domingo.
3.

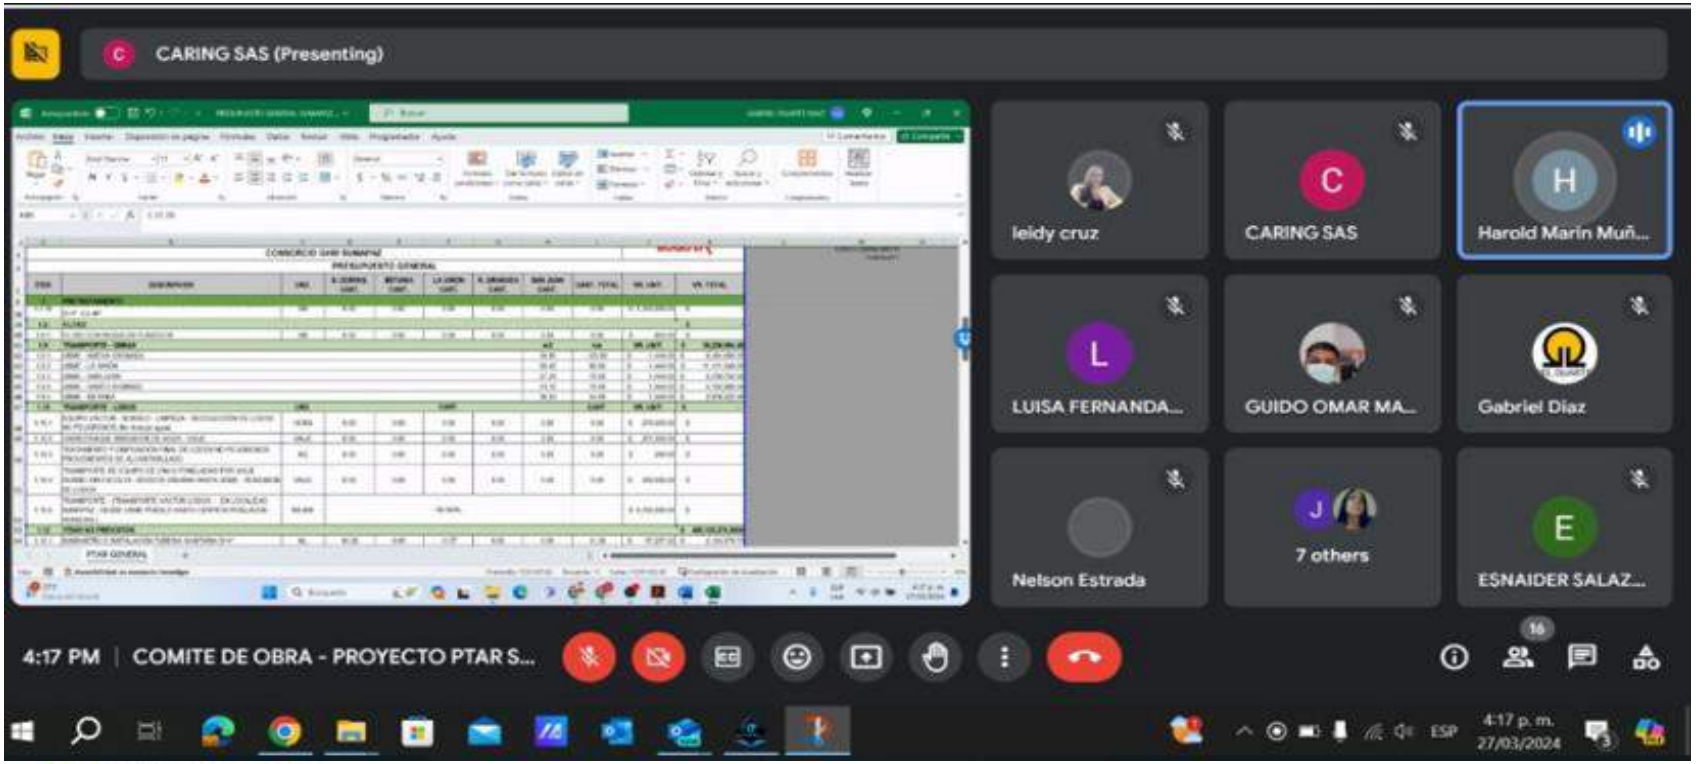
DESARROLLO Y CONCLUSIONES

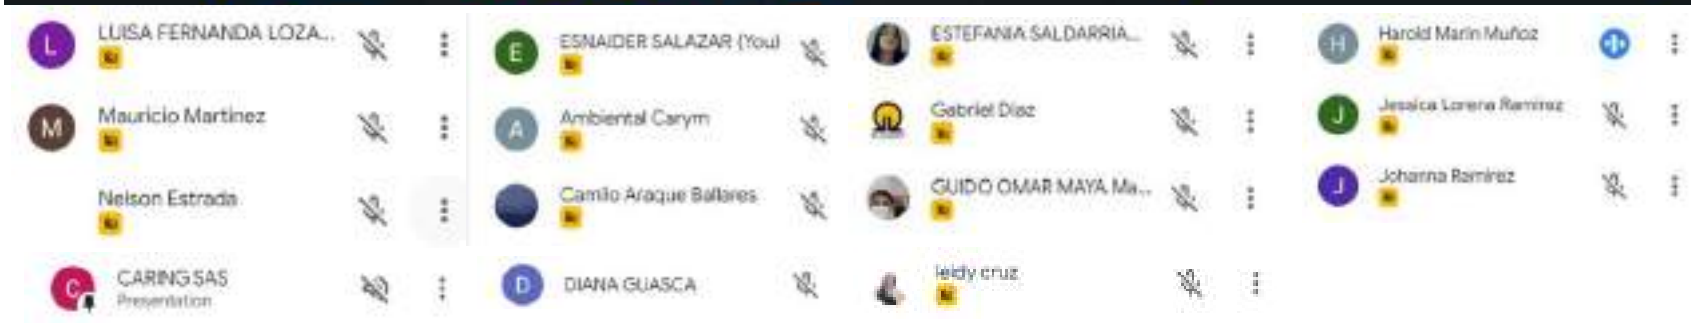
- Envió de propuestas y/o solicitud de prorroga con sus anexos.
- Inicio de obra santo domingo reprogramado.
- Ingreso de tubería y acero de refuerzo a las obras para priorizar relleno de excavaciones.
- Revisión de documentación enviada por el contratista referente a la afiliación y ARL de los trabajadores.
- Instalación de equipos ambiental santo domingo y nueva granada.
- Documentación de materiales pétreos y visto bueno por parte de interventoría.
- Disposición de lodos en sitio o uso de vactor.
- Cuenta de obra del contratista e interventoría.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Solicitud, radicación de prórroga por 1 mes.	Contratista	1/ Abril /2024
Revisión de radicación por parte de interventoría y radicación a supervisión.	Interventoría	1/ Abril /2024
Justificación de ítem a ítem del contrato inicial.	Contratista	2/Abril/2024
Reprogramación de Comité de obra para el jueves 4 de abril.	Contratista Interventoría Supervisión	4/ Abril /2024
Radicar cuenta de obra del mes de marzo.	Contratista	05/Abril /2024
Retiro de panal de abejas de la PTAR Nueva Granada.	Contratista	1/ Abril /2024

Anexo: Si aplica.


CARING SAS (Presenting)
leidy cruz
CARING SAS
Harold Marín Muñ...
LUISA FERNANDA...
GUIDO OMAR MA...
Gabriel Diaz
Nelson Estrada
7 others
ESNAIDER SALAZ...
4:17 PM | COMITE DE OBRA - PROYECTO PTAR S...
4:17 p. m.
27/03/2024


LUISA FERNANDA LOZA...
ESNAIDER SALAZAR (You)
ESTEFANIA SALDARRIA...
Harold Marín Muñoz
Mauricio Martinez
Ambiental Carym
Gabriel Diaz
Jessica Lorena Ramirez
Nelson Estrada
Camilo Araque Ballares
GUIDO OMAR MAYA Ma...
Johanna Ramírez
CARING SAS
Presentation
DIANA GUASCA
leidy cruz
