
AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

AMHS

Actualizar, Integrar y Poner en Servicio AMHS (VIGENCIA FUTURA)

FREQUENTIS

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin
1		**CONTRATO 23001326 H3 2023 (AMHS)**	**220 días**	**vie 29/12/23**	**jue 31/10/24**
2		**Etapa Administrativa**	**165 días**	**vie 29/12/23**	**jue 15/08/24**
3		Firma del Contrato	0 días	vie 29/12/23	vie 29/12/23
4		Aprobación de Polizas	0 días	lun 5/02/24	lun 5/02/24
5		Acta de Inicio	0 días	mié 7/02/24	mié 7/02/24
6		Recibo de Equipos en Colombia	0 días	vie 2/08/24	vie 2/08/24
7		Nacionalización y movimiento a Bodegas Aerocivil	10 días	vie 2/08/24	jue 15/08/24
8		Ingreso al Almacen de Aerocivil	0 días	jue 15/08/24	jue 15/08/24
9		**Etapa de Planeación**	**49 días**	**mié 7/02/24**	**mar 16/04/24**
10		Elaboración de Diseño final del Sistema	18 días	mié 7/02/24	vie 1/03/24
11		Aprobación del diseño	0 días	vie 8/03/24	vie 8/03/24
12		Emision de OC	5 días	mié 7/02/24	mar 13/02/24
13		Levantamiento de información actualizada	10 días	lun 4/03/24	vie 15/03/24
14		Elaboración del Protocolo de Pruebas FAT	10 días	lun 1/04/24	vie 12/04/24
15		Aprobación del Protocolo de pruebas FAT	0 días	mar 16/04/24	mar 16/04/24
16		**Etapa de Alistamiento**	**136 días**	**mié 14/02/24**	**mié 21/08/24**
17		Adquisición del Hardware	45 días	mié 14/02/24	mar 16/04/24
18		Envio de Backup actualizados	1 día	mié 17/04/24	mié 17/04/24
19		Configuración y alistamiento de Componentes	15 días	jue 18/04/24	mié 8/05/24
20		Visita de Inspección (Site Survey)	2 días	mié 8/05/24	jue 9/05/24
21		Instalación de infraestructura requerida	15 días	lun 17/06/24	vie 5/07/24
22		Instalación de equipos en puntos temporales	2 días	mar 20/08/24	mié 21/08/24
23		**Etapa de Pruebas**	**84 días**	**lun 3/06/24**	**jue 26/09/24**
24		Pruebas FAT	5 días	lun 3/06/24	vie 7/06/24
25		Acta de aprobación de Pruebas FAT	0 días	vie 7/06/24	vie 7/06/24
26		Pruebas SAT	5 días	lun 2/09/24	vie 6/09/24
27		Acta de aprobación de Pruebas SAT	0 días	vie 6/09/24	vie 6/09/24
28		Pruebas Aerocivil	10 días	vie 13/09/24	jue 26/09/24
29		**Capacitaciones**	**18 días**	**mié 11/09/24**	**vie 4/10/24**
30		Capacitación en Sitio	2 días	mié 11/09/24	jue 12/09/24
31		Capacitación Remota 1	1 día	mar 24/09/24	mar 24/09/24
32		Capacitación Remota 2	1 día	vie 4/10/24	vie 4/10/24
33		**Etapa de Transicion y entrega**	**39 días**	**lun 9/09/24**	**jue 31/10/24**
34		Transicion entre AMHS Antiguo y Nuevo	15 días	vie 11/10/24	jue 31/10/24
35		Elaboración y Entrega de Documentación	20 días	lun 9/09/24	vie 4/10/24
36		Acta de Entrega	0 días	jue 31/10/24	jue 31/10/24

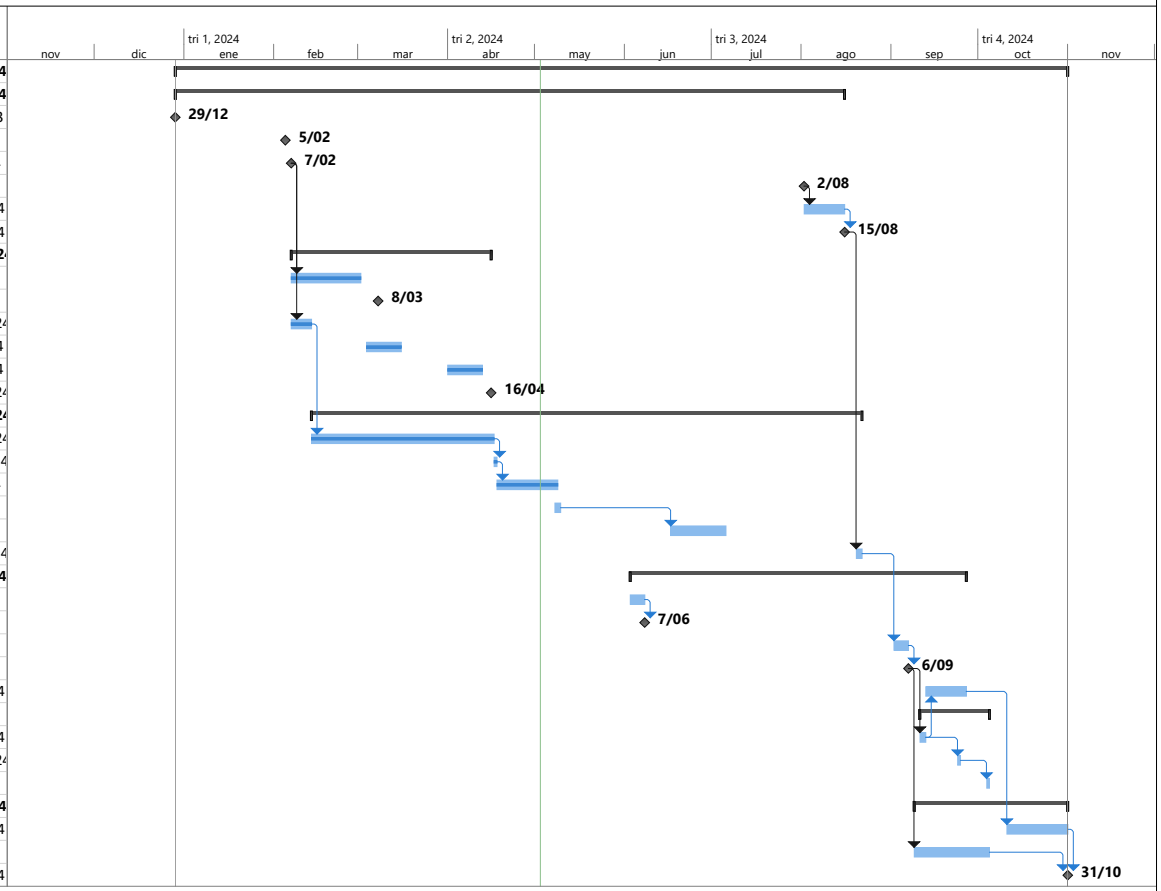

Project: AMHS v1.mpp
Date: vie 3/05/24

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline	
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress	
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress	
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone		

FRISSON Technologies
