DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :74720

Impreso en: 21-DIC-23 01:35 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 17786

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 1655

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO INTERVIAS RURALES con identificación 901713373 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO DE INTERVENTORIA se establece que:

Fecha firma	19/05/2023	**Valor orden gasto**	627.959.555
Fecha iniciación	19/05/2023	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada:**	185.962.540
Fecha Terminación	31/12/2023	**Valor acta**	66.018.345
Duración	315 DIAS	**Saldo pendiente**	375.978.670

OBJETO DEL CONTRATO:

NTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

FUENTE 96, ACTA DE RECIBO PARCIAL N3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1655 DEL 2023SECOP II CO1.PCCNTR 4964560 CONTRATISTA 901713373 CONSORCIO INTERVIAS RURALES.

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
6	PEREIRA - NTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL,	31.659.641	6.015.332
4	DOSQUEBRADAS - NTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL,	23.817.960	4.525.412
Total:		**55.477.601**	**10.540.744**

Total recibido	66.018.345
- Amortización de anticipo	
	66.018.345

Valor Sesenta Y Seis Millones Dieciocho Mil Trescientos Cuarenta Y Cinco Pesos Con Diecinueve Centavos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Pereira el: 21/12/2023

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :74720

Impreso en: 21-DIC-23 01:35 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 17786

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 1655

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO INTERVIAS RURALES con identificación 901713373 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



OLGA LILIANA OSPINA JIMENEZ
02460300130556-729650-001299475



CONSORCIO INTERVIAS RURALES
02460300133503-729650-001299656

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 102069

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 23107 De 21/12/2023 Por 66.018.345,19

FUENTE 96, ACTA DE RECIBO PARCIAL N3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1655 DEL 2023SECOP II CO1.PCCNTR 4964560 CONTRATISTA 901713373 CONSORCIO INTERVIAS RURALES.

ACTA No.: 17786 **de 21/12/2023**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

A FAVOR DE: CONSORCIO INTERVIAS RURALES **C.C o Nit** 901713373

BANCO: 23 **TIPO CUENTA:** Ahorros **NRO CUENTA:** 267874659

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1655 de 19/05/2023 Por 627.959.555,01

NTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

VALOR A PAGAR Sesenta Y Seis Millones Dieciocho Mil Trescientos Cuarenta Y Cinco Pesos Con Diecinueve Centavos M/Cte. **66.018.345,19**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	901713373	196	10.540.744,19	15,00	1.581.112,00	**7.216.440,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	901713373	234	23.817.959,61	0,80	190.544,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	901713373	203	31.659.641,39	0,55	174.128,00	
ESTAMPILLA PRO-CULTURA SGR 1%	901713373		55.477.601,00	1,00	555.000,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN SGR 2.5%	901713373		55.477.601,00	2,50	1.387.000,00	
RETEFUENTE	901713373	196	55.477.601,00	6,00	3.328.656,00	

NETO A GIRAR **58.801.905,19**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3095 **Fecha.** 13/06/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
12	**2019003660023**	2.3.24.02.0600.09	Proyecto mejoramiento en vías terciarias en diferentes municipios del Departamento de Risaralda-00RG-BPIN-2019003660023	96 00RG-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - REGIONES	66.018.345,19

Total obligación **66.018.345,19**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
17050104	Red Terrestre De Propiedad De Terc	37.674.973,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-17786 FUENTE 96, ACTA
17050104	Red Terrestre De Propiedad De Terc	28.343.372,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-17786 FUENTE 96, ACTA
24362790	Reteica- Interventoria - Pereira- SG	0,	174.128,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-17786 FUENTE 96, ACTA
24362717	Reteica- Interventoria Dosquebradas	0,	190.544,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-17786 FUENTE 96, ACTA
1305880604	Estampilla Pro-Cultura - Contratos S	0,	555.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-17786 FUENTE 96, ACTA
1305880504	Tasa Pro-Deporte y Recreación - Co	0,	1.387.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-17786 FUENTE 96, ACTA
2436251302	Iva Ret Honorarios - Sgr	0,	1.581.112,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-17786 FUENTE 96, ACTA
24360309	Honorarios Sgr	0,	3.328.656,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-17786 FUENTE 96, ACTA
2401020212	Proyecto De Inversión - Honorarios -	0,	58.801.905,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-17786 FUENTE 96, ACTA
Sumas Iguales		**66.018.345**	**66.018.345**	

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 102069

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 23107 De 21/12/2023 Por 66.018.345,19

FUENTE 96, ACTA DE RECIBO PARCIAL N3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1655 DEL 2023SECOP II CO1.PCCNTR 4964560 CONTRATISTA 901713373 CONSORCIO INTERVIAS RURALES.

ACTA No.: 17786 de 21/12/2023

FIRMADO

JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA

02460300151345-729714-001299971

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Nosotros **ALVARO HERNANDO VERA AYALA**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.022.329.221 de Bogotá D.C., en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO INTERVIAS RURALES** identificado con Nit: 901.713.373-0 y **MARIBEL BASTO PRIETO** identificada con cedula de ciudadanía N° 52.384.865 de Bogotá en condición de Contador Público con tarjeta profesional expedida por la Junta central de Contadores N 266372-T certificamos el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Caja de Compensación Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016) cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante el mes de Octubre de 2023.

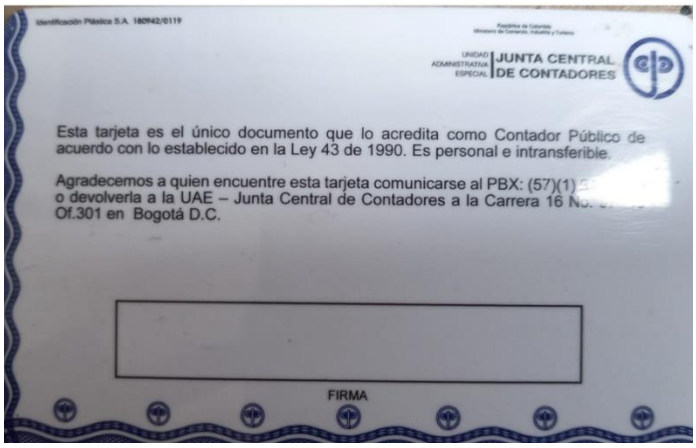
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas concordantes en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Dada en Bogotá D.C., a los (Veinte) 20 días del mes de Diciembre 2023.

ALVARO HERNANDO VERA AYALA
C.C. 1.022.329.221 de Bogotá
Representante Legal

MARIBEL BASTO PRIETO
C.C. 52.384.865 de Bogotá
Contador Público
TP 266372-T


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
266372-T
MARIBEL
BASTO PRIETO
C.C. 52384865
RES. INSCRIPCION 2033 DEL 09/12/2019
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
286027
297616


Identificación Plástica S.A. 180942/0119
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1)
o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 N
Of.301 en Bogotá D.C.
FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4CEF94A4A8270341

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIBEL BASTO PRIETO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52384865 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 266372-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

LCAICEDO-024030012527-729634-001299073-A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901713373-0	CONSORCIO INTERVIAS RURALES	CALLE 123 N 7 A 17	3033518	administrativo@almaintercon com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	CALDAS	RISARALDA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 2 / IBC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-11	2023-10	E		[illegible]	$ [illegible]

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	80.000	0		0		0	23	1.900	0	81.900	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	100.000	0		0		0	23	2.300	0	102.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	400.000	0	0	0	0	23	9.100	0	409.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	23	7.300	0	327.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	23.600				23.600	23	600	24.200			236	24.200	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	180.000	23	4.100	184.100	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	180.000	184.200
Pensión	2	720.000	736.400
Riesgos Laborales	1	23.600	24.200
CCF	1	180.000	184.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.103.600	1.129.900

Powered by CamScanner

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

LCAICEDO-02460300122527-729634-001299073-A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901713373-0	CONSORCIO INTERVIAS RURALES		CALLE 123 N 7 A 17	3033518	administrativo@almaintercon com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	CALDAS	RISARALDA		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E		[illegible]	$ 128.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Código	Extranjero	Colom. retornado	Estudiando	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMPENSACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1004580090	AVENDAÑO CORTES JUAN MANUEL	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF11	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
CC	1065689508	ARTEAGA RODRIGUEZ JHON FERNANDO	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	ESSC18	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	13.100	CCF11	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0

Powered by CamScanner

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

LCAICEDO-024030012527-729634-001299073-A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS	CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3033518	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	VALLEDUPAR	02	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					[illegible]
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-11	2023-10	E	11/12/2023	72841995	[illegible]

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	84.000	0		0		0	20	1.700	0	85.700	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	336.000	0	0	0	0	20	6.600	0	342.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	146.200				146.200	20	2.900	149.100			1.462	149.100	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF15	Comfacesar	892399989-8	42.000	20	900	42.900	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	84.000	[illegible]
Pensión	1	336.000	[illegible]
Riesgos Laborales	1	146.200	[illegible]
CCF	1	42.000	[illegible]
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	608.200	[illegible]

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

LCAICEDO-02460300122527-729634-001299073-A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS	CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3033518	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	VALLEDUPAR / 02	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / IBC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-11	2023-10	E	11/12/2023	72841985	[illegible]

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cot.Exonerada	Subtipo	Extranjero	Colom. en el exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	85203617	LEYVA DELGADO JUAN BAUTISTA	1	0			S																230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS037	2.100.000	84.000	14-11	2.100.000	5	146.200	CCF15	2.100.000	42.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

LCAICEDO-02460300122527-729634-001299073-A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS		CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3033518	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	[illegible]
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				
2023-11	2023-10	E	04/12/2023	[illegible]	[illegible]

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	647.600	0		0		0	13	8.300	0	655.900	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	480.900	0		0		0	13	6.200	0	487.100	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	72.900	0		0		0	13	1.000	0	73.900	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	172.000	0		0		0	13	2.300	0	174.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.305.900	0	0	0	0	13	16.800	0	1.322.700	2
230301	Porvenir	800224808-8	3.979.200	0	0	59.600	59.600	13	51.000	1.600	4.151.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	13	2.700	0	210.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	179.700				179.700	13	2.400	182.100			1.797	182.100	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	686.800	13	8.800	695.600	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.373.400	[illegible]
Pensión	3	5.612.300	[illegible]
Riesgos Laborales	1	179.700	[illegible]
CCF	1	686.800	[illegible]
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	[illegible]	[illegible]

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

LCAICEDO-02460300122527-729634-001299073-A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS	CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3033518	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				15	0
2023-11	2023-10	E	04/12/2023	72422225	TOTAL A PAGAR	
					$7.260.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
	CC	1000954206	RAMIREZ PALACIOS JUAN ANDRES	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	26.000	0	0	0	0	0
	CC	1013587538	SOLANO REYES GINA PAOLA	1	0			S																230301	1.821.000	291.400	0	0	0	0	EPS010	1.821.000	72.900	14-11	1.821.000	1	9.600	CCF22	1.821.000	36.500	0	0	0	0	0
	CC	1013670218	OLARTE TRIANA KAREN YULIANA	1	0			S																230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	60.000	0	0	0	0	0
	CC	1015436316	RODRIGUEZ BELTRAN CHRISTIAN FELIPE	1	0			S																230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	1	20.900	CCF22	4.000.000	80.000	0	0	0	0	0
	CC	1016026253	SANCHEZ SOLANO ANDERSON ESMID	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF22	1.160.000	23.200	0	0	0	0	0
	CC	1022329221	VERA AYALA ALVARO HERNANDO	1	0			S																230201	4.300.000	688.000	0	0	0	0	EPS037	4.300.000	172.000	14-11	4.300.000	1	22.500	CCF22	4.300.000	86.000	0	0	0	0	0
	CC	1094920106	CUELLAR LEGUIZAMON CRISTIAN MAURICIO	1	0			S																230301	5.604.000	896.700	0	0	28.100	28.100	EPS005	5.604.000	224.200	14-11	5.604.000	1	29.300	CCF22	5.604.000	112.100	0	0	0	0	0
	CC	41958924	ENCISO SANCHEZ FLOR LUCIA	1	0			S																230201	3.861.690	617.900	0	0	0	0	EPS008	3.861.690	154.500	14-11	3.861.690	1	20.200	CCF22	3.861.690	77.300	0	0	0	0	0
	CC	52384865	BASTO PRIETO MARIBEL	1	0			S																230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	60.000	0	0	0	0	0
	CC	72278971	ESMERAL VARGAS JOSE ALEXANDER	1	0			S																230301	6.284.000	1.005.500	0	0	31.500	31.500	EPS005	6.284.000	251.400	14-11	6.284.000	1	32.900	CCF22	6.284.000	125.700	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Hacienda** **GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS** **GESTIÓN CONTABLE** **FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO**
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

No. DE CONTRATO CO1.PCCNTR.4964560 de fecha 25/01/223

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [ ] DE TERCEROS [X]

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD DOSQUEBRADAS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Cercano a ramal de la via Departamental 175 - Via Playa Rica - La Cima								
Valor total acta								$ 30.715.094,62
Via Boqueron			$ 28.343.371,94					
Valor total acta			$ 28.343.371,94				$ 28.343.371,94	$ 46.221.896,90
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o							$ 28.343.371,94	$ 76.936.991,52

Firma de Responsable encargado

ALVARO HERNANDO VERA AYALA
Director Interventoria

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Codigo de la via y/o matricula								
Nombre de la vía o bien inmueble								
Valor total acta								
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o								
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación								
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o								
Valor								
Nombre de la entidad								
Nit de la entidad								
Contacto								

Firma de Responsable encargado

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Glosario

El mejoramiento y rehabilitacion son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida util del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la

Mantenimiento y la conservacion de los bienes de uso publico se reconoceran como gastos en el resultado del periodo.

Depreciacion. La depreciacion de un bien de uso publico inicara cuando este disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las

Vida util: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo.
La estimacion de la vida util de un activo se efectuara con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares.
Para determinar la vida util se debe tener en cuenta los siguientes factores:
a) utilizacion prevista del activo
b) Desgaste fisico esperado , que depende de factores operativos, tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservacion que se
La vida util y el metodo de depreciacion seran revisados como minimo, al termino de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables,

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE — FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO	
Versión: 02		Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

No. DE CONTRATO CO1.PCCNTR.4964560 de fecha 25/01/223

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [X] DE TERCEROS [X]

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD PEREIRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1		ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
	MES 1	MES 2							
026 - Via Sucre - Tres Esquinas - Cruce Arabia Mpio. De Pereira * 2,78 Km			$ 29.443.499,52	$ 5.748.435,47					
Valor total acta			$ 29.443.499,52	$ 5.748.435,47				$ 35.191.934,99	$ 39.102.149,99
060 - Via Cruce Alto Erazo - Llano Grande - Pital de Colombia Mpio. De Pereira * 9,3 Km									
Valor total acta									$ 36.336.910,30
Cercano a ramal de la via Municipal 020 - Via Calle Larga - El Jazmin - Cruce Altagracia Mpio. De Pereira *9,7 Km				$ 10.240.414,69					
Valor total acta				$ 10.240.414,69				$ 10.240.414,69	$ 11.130.885,54
Carcano a ramal de la via Departamental 003 - Via Arabia - Yarumal - Cruce									
Valor total acta									$ 14.766.371,29
045 - Via Guacari - Catamonos Mpio. De Pereira * 1,8 Km	$ 24.391.512,13								
Valor total acta	$ 24.391.512,13							$ 24.391.512,13	$ 26.512.513,19
038 - Via la Cecilia - La Esmeralda Mpio. de Pereira * 0,95 Km									
Valor total acta									$ 24.072.482,90
043 - Via Venecia - Cruce Mundo Nuevo Mpio. De Pereira *2,55 Km			$ 5.476.033,07	$ 21.686.123,09					
Valor total acta			$ 5.476.033,07	$ 21.686.123,09				$ 27.162.156,16	$ 29.524.082,79
029 - Via La Horqueta (Cruce Tribunas) - El Guayabo - 2500 Lotes Mpio. De Pereira * 10,28 Km	$ 25.171.099,15								
Valor total acta	$ 25.171.099,15							$ 25.171.099,15	$ 27.359.890,38
050 - Via El Rincon - La bella Mpio. De Pereira * 2, Km	$ 5.931.960,58	$ 11.360.137,89							
Valor total acta	$ 5.931.960,58	$ 11.360.137,89						$ 17.292.098,47	$ 18.795.759,21
004 - Via casa Loma - La Colonia - Corozal Mpio. De Pereira * 6,2 Km		$ 18.109.133,20							
Valor total acta		$ 18.109.133,20						$ 18.109.133,20	$ 19.683.840,44
060 - Via Cruce Alto Erazo - Llano Grande - Pital de Colombia Mpio. De Pereira * 9,3 Km									
Valor total acta									$ 27.624.231,45
Distribución:									
Valor mantenimiento									
Valor, construcción, mejora o rehabilitación								$ 157.558.348,79	$ 274.909.117,46

Firma de Responsable encargado

ALVARO HERNANDO VERA AYALA
Director Interventoria

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Contacto	ACTA 1		ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
	MES 1	MES 2							
003									
Via Arabia - Yarumal - Cruce Armenia Mpio. de Pereira * 13,3 Km									
Valor total acta									$ 10.663.851,66
006									
Via La Estrella Morron - El Chocho - Canceles Mpio. De Pereira * 5 Km			$ 20.802.210,81						
Valor total acta			$ 20.802.210,81					$ 20.802.210,81	$ 22.611.098,71
006									
Via La Estrella Morron - El Chocho - Canceles Mpio. De Pereira * 5 Km		$ 27.854.654,45	$ 17.422.299,13						
Valor total acta		$ 27.854.654,45	$ 17.422.299,13					$ 45.276.953,58	$ 49.214.079,97
Distribución:									
Valor mantenimiento									
Valor, construcción, mejora o rehabilitación									$ 82.489.030,34
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**									
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabiitación de las vías o bien inmueble									
Valor								$ 66.079.164,39	$ 164.978.060,69
Nombre de la entidad									
Nit de la entidad									
Contacto									

Firma de Responsable encargado

ALVARO HERNANDO VERA AYALA
Director Interventoria

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura NOMBRE DEL PROCESO NOMBRE DEL SUBPROCESO (SI APLICA) ACTA PARCIAL Y/O FINAL
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 3 Contrato No interno 1655 de fecha 19/05/2023 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4964560 de fecha 25/01/2023

ACTA PARCIAL [X]
ACTA FINAL [ ]

En el municipio de RISARALDA se reunieron ALVARO HERNANDO VERA AYALA, en calidad de Interventor y OLGA LILIANA OSPINA JIMENEZ en calidad de Supervisora, con el objeto de realizar la presente acta parcial del (Contrato de Interventoría No interno: 1655 SECOP II No CO1.PCCNTR.4964560 de fecha 25/01/223, conforme a lo siguiente:

OBJETO	INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVIAS RURALES integrado por (ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S NIT. 901.573.477-6 y ARA INGENIERÍA S.A.S NIT 830.068.724-8)
NIT O CEDULA	901.713.373-0
REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO HERNANDO VERA AYALA
CEDULA	1.022.329.221 de Bogotá
IMPUTACIONES	Rubro No 2.3.24.02.0600.09 fuente 96 Disponibilidad No 624.959.555 (2023-06-13) Registro No 14123 (2023-06-13)
PLAZO INICIAL	Diez meses
FECHA DE INICIACION	10 de julio de 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	10 de mayo de 2024
VALOR INICIALCONTRATO	$ 627.959.555
FORMA DE PAGO	El departamento de Risaralda, cancelara el valor del contrato que se suscriba con ocasión de este concurso de méritos abierto de la siguiente forma: Mediante presentación de actas parciales de avance de interventoría y un acta final con la liquidación del contrato. La última acta no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato.
FECHA DE ELABORACIÓN:	18/12/2023

LCAICEDO-02460300122527-729629-001299081-A

Powered by CamScanner

ACTA No. 3 Contrato No interno 1655 de fecha 19/05/2023 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4964560 de fecha 25/01/2023

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		$0
Valor amortizado actas anteriores	$0	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	$0	
Saldo por amortizar	$0	
SUMAS IGUALES	$0	$0

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$627.959.555,00
Valor Adición		$0
Valor total de actas pagadas	$185`962.539,93	
Valor presente acta	$ 66`018.345,19	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$375`978.669,88	
SUMAS IGUALES	$627.959.555,00	$627.959.555,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): $ 66´018.345,19

PERIODO DE PAGADO (fechas): DESDE 10/10/2023 HASTA 09/11/2023

OBSERVACIONES:

OCTUBRE	• Se realiza acompañamiento por parte de equipo de interventoría, director de obra, residente y auxiliar a socialización de la obra con la comunidad en los tramos 52 (El Chocho), 54 (Cruce Mundo nuevo), 63 (Vereda el Rincón) y 19 (Via Boqueron) • Para seguimiento de las labores de la interventoría se realizan comités técnicos semanales

NOTA:

- El suscrito supervisor hace constar que el contratista CONSORCIO INTERVIAS RURALES cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

LCAICEDO-02460300122527-729629-001299081-A

Powered by CamScanner

ACTA No. 3 Contrato No interno 1655 de fecha 19/05/2023 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4964560 de fecha 25/01/2023

ACTIVIDAD	EVIDENCIA/SOPORTE
Ingeniero Civil	Revision documentacion del contrato (Acta parcial 02 - Informe mensual N°03) - Asistencia a comites de obra - anexo 13 con titulo "Comités de seguimiento" del presente informe.
Ingeniero Civil con especializacion en Vias	Anexo 10: Correspondencia enviada por interventoria comunicado C.INTERVIAS RURALES - 053 - TEC, C.INTERVIAS RURALES - 050 - TEC.
Ingeniero Civil	Supervision de obra elaboracion de informes semanales y mensuales asistencia a comites. - Anexo 13 y Anexo 14 del presente informe.
Ingeniero Ambiental	Informe mensual N°04 - Numeral 4,6 con titulo "GESTON AMBIENTAL".
Ingeniero Industrial especialista en salud ocupacional	Informe mensual N°04 - Numeral 4,8 con titulo "GESTON DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO".
Ingeniero Civil	Vigilancia, supervision y control de obra.
Topografo	Trabajos de campo
Cadenero	Trabajos de campo

LCAICEDO-02460300122527-729629-001299081-A

Powered by CamScanner

ACTA No. 3 Contrato No interno 1655 de fecha 19/05/2023 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4964560 de fecha 25/01/2023

COSTOS DIRECTOS	EVIDENCIA/SOPORTE
Alquiler de oficina y/o campamento (Incluye servicios públicos)	Pág- 51 "Soportes acta parcial de Interventoría". pág 52 Arriendo oficina
Alquiler de computo	Pág- 51 "Soportes acta parcial de Interventoría". pág 59 Factura FEVN 976
Elementos de consumo y papeleria	Pág- 51 "Soportes acta parcial de Interventoría". pág 55 Factura FEVN 983
Equipo de topografia	Pág- 51 "Soportes acta parcial de Interventoría". pág 56 a 62 Cuenta de cobro y certificados de calibración
Transporte (Camioneta - Incluye conductor y combustible)	Pág- 51 "Soportes acta parcial de Interventoría". pág 63 a 71 Nómina y documentos vehículos
Fotocopias y reproduciones	Pág- 51 "Soportes acta parcial de Interventoría". pág 72 Factura DTF/835187
Fotografias	Pág- 51 "Soportes acta parcial de Interventoría". pág 73 Cuenta de cobro
Telecomunicaciones (Radiotelefono, celulares,)	Pág- 51 "Soportes acta parcial de Interventoría". pág 74 a 78 Facturas
Edicion de informes	Pág- 51 "Soportes acta parcial de Interventoría". pág 79 Cuenta de cobro
Límite líquido de suelos (Sub base y mat. de mejoramiento)	Pág- 51 "Soportes acta parcial de Interventoría". pág 81 Cuenta de cobro. Pag 84-93 resultados de laboratorio.

LCAICEDO-02460300122527-729629-001299081-A

Powered by CamScanner

ACTA No. 3 Contrato No interno 1655 de fecha 19/05/2023 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4964560 de fecha 25/01/2023

COSTOS DIRECTOS	EVIDENCIA/SOPORTE
Indice de plasticidad de suelos (Sub base y mat. de mejoramiento)	Pág- 51 "Soportes acta parcial de Interventoría". pág 82 Cuenta de cobro. Pag 84-93 resultados de laboratorio.
Determinación en laboratorio del contenido de agua (humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de suelo -agregado (Sub base y mat. de mejoramiento)	Pág- 51 "Soportes acta parcial de Interventoría". pág 80 Cuenta de cobro. Pag 84-93 resultados de laboratorio.
Relación de soporte del suelo en laboratorio CBR (Sub base y mat. de mejoramiento)	Pág- 51 "Soportes acta parcial de Interventoría". pág 83 Cuenta de cobro. Pag 84-93 resultados de laboratorio.
Resistencia a la compresión de cilindros	Pág- 51 "Soportes acta parcial de Interventoría". pág 94 Cuenta de cobro. Pag 95-96 resultados de laboratorio.

NOTA:

- El suscrito supervisor hace constar que el contratista CONSORCIO INTERVIAS RURALEScumplió satisfactoriamente con el objeto contractual INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARALAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

LCAICEDO-02460300122527-729629-001299081-A

Powered by CamScanner

ACTA No. 3 Contrato No interno 1655 de fecha 19/05/2023 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4964560 de fecha 25/01/2023

- El contratista ALVARO HERNANDO VERA AYALA declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). (Se deben anexar las constancias de pago o certificados). Planillas de pago Nº 71196455, 70917174, 71161019, 71191661 del personal de INTERVENTORIA

Firma
ALVARO HERNANDO VERA AYALA
Contratista

firma
OLGA LILIANA OSPINA JIMENEZ
Supervisor del Departamento

Nombre de quien elaboró: Gina Paola Solano Reyes

LCAICEDO-02460300122527-729629-001299081-A

Powered by CamScanner

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO INTERVIAS RURALES
NIT 901.713.373-0
Cl 123 N 7 a 17 Ofc 304
Tel: (601) 3117528883
Bogotá - Colombia
almaintercon@gmail.com
www.almaintercon.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 7

Señores	Departamento de Risaralda		
NIT	899.999.230-7	**Teléfono**	(603) 3239030 - Ext. 000
Dirección	Cl 19 13 17	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/12/2023, 10:23
Expedición	21/12/2023, 10:23
Vencimiento	21/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Cto 1655 Objeto : Interventoría para el seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Ambiental, Contable y Jurídico para las Obras de Mejoramiento de Vías terciarias en diferentes municipios del Departamento del Risaralda. Periodo 3 correspondiente del 10 de Octubre al 9 de Noviembre del 2023.	1.00	66,018,345.19

Total items: 1

Total Bruto	55,477,601.00
IVA 19%	10,540,744.19
Total a Pagar	66,018,345.19

Valor en Letras:
Sesenta y seis millones dieciocho mil trescientos cuarenta y cinco pesos m/cte con diecinueve cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 66,018,345.19

Observaciones:
Favor Consignar en la cuenta corriente N 637499625
Banco de Bogota

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057961777 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: e184319d2c518576e8f31092f2ec21cfca3b09953535b552a5f5ebedae698af88eef9b29e8db52702eafed57f72b29cd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

LCAICEDO-02460300122527-729633-001299077-A

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro: CO1.PCCNTR.4964560 de fecha 25/01/223
OBJETO:

INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA
CONTRATISTA : CONSORCIO INTERVIAS RURALES
INTERVENTOR: N/A
IMPUTACIONES (No /fecha)
RUBRO: No 00RG-2402-0600-2019-00366-0023
CDP: No 624.959.555 (2023-06-13)
REGISTRO: No 14123 (2023-06-13)

VALOR CONTRATO: $ 627.959.555
VALOR ADICION(ES) : $ 0
VALOR TOTAL: $ 627.959.555

VALOR ANTICIPO: $ 0
FECHA DE INICIACION: 10 de Julio de 2023
FECHA DE TERMINACION: 10 de mayo de 2023
SUSPENSION:
REINICIACION:
PLAZO: 10.5 Meses
PRORROGA:
FECHA TERM FINAL: 10 de Mayo 2023

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
Acta parcial No. 03

ACTA PARCIAL
ACTA FINAL

VALOR DEL ACTA: **66.018.345,19**

FECHA: 10/10/2023

CONDICIONES ORIGINALES

1. PERSONAL PROFESIONAL				PARTICIPACIÓN (H-MES)													MODIFICACIONES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES				ACUMULADO	
Profesional	Actividad	Salario Mes	DEDICACION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL	Vr/Total		Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	MES 1	MES 2	MES 3	TOTAL ACTAS ANTERIORES	Cantidad	Valor
																			Mes 4							
Ingeniero Civil	Ingeniero Civil (Diretor de obra)	$ 5.500.000	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	5	27.500.000,00				0,50	2.750.000,00	0,50	0,50	0,50	1,50	2,00	11.000.000,00
Ingeniero Civil con especializacion en Vias	Especialista en Vias y transporte y/o pavimentos	$ 4.500.000	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33		3	13.365.000,00				0,33	1.485.000,00	0,00	0,00	0,99	0,99	1,32	5.940.000,00
Ingeniero Civil	Residente de Interventoria	$ 4.500.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10	45.000.000,00				1,00	4.500.000,00	1,00	1,00	1,00	3,00	4,00	18.000.000,00
Ingeniero Ambiental	Profesional en area ambiental	$ 3.300.000	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-	5	14.850.000,00				0,50	1.650.000,00	0,50	0,50	0,50	1,50	2,00	6.600.000,00
Ingeniero Industrial especialista en salud ocupacional	Profesional en area SISO	$ 3.000.000	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-	5	13.500.000,00				0,50	1.500.000,00	0,50	0,50	0,50	1,50	2,00	6.000.000,00
Ingeniero Civil	Inspector de obras civiles de interventoria	$ 2.000.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	9	18.000.000,00				1,00	2.000.000,00	1,00	1,00	1,00	3,00	4,00	8.000.000,00
Topografo	Topografo	$ 3.000.000	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-	5	13.500.000,00				0,50	1.500.000,00	0,50	0,50	0,50	1,50	2,00	6.000.000,00
Cadenero	Cadenero	$ 1.500.000	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-	5	6.750.000,00				0,50	750.000,00	0,50	0,50	0,50	1,50	2,00	3.000.000,00
Secretaria	Secretaria	$ 1.160.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	9	10.440.000,00				1,00	1.160.000,00	1,00	1,00	1,00	3,00	4,00	4.640.000,00
Contador Publico	Contador	$ 2.466.660	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-	3	6.659.982,00				0,60	1.479.996,00	0,00	0,30	0,60	0,90	1,50	3.699.990,00
	Total Costo de Personal														169.564.982,00					18.774.996,00						72.879.990,00
	Factor Multiplicador														188%											
	TOTAL PERSONAL														**318.782.166,00**					**35.296.992,00**						**137.014.380,00**

COSTOS DIRECTOS																										
	Cantidad	Unidad	Tarifa																							
Alquiler de oficina y/o campamento (Incluye servicios públicos)	1	Mes	$ 700.000		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		9,00	6.300.000,00			1,00	$700.000,00	1,00	1,00	1,00	3,00	4,00	2.800.000,00
Alquiler de computo	6	Und	$ 155.000		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		54,00	8.370.000,00			1,00	$930.000,00	1,00	1,00	1,00	3,00	4,00	3.720.000,00
Elementos de consumo y papeleria	1	Und	$ 200.000		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		9,00	1.800.000,00			1,00	$200.000,00	1,00	1,00	1,00	3,00	4,00	800.000,00
Equipo de topografia	3	Mes	$ 950.000		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		27,00	25.650.000,00			1,00	$2.850.000,00	1,00	1,00	1,00	3,00	4,00	11.400.000,00
Transporte (Camioneta - Incluye conductor y combustible)	2	Mes	$ 3.500.000		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		18,00	63.000.000,00			1,00	$7.000.000,00	1,00	1,00	1,00	3,00	4,00	28.000.000,00
Fotocopias y reproduciones	1	Mes	$ 150.000		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		9,00	1.350.000,00			1,00	$150.000,00	1,00	1,00	1,00	3,00	4,00	600.000,00
Fotografias	1	Mes	$ 150.000		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		9,00	1.350.000,00			1,00	$150.000,00	1,00	1,00	1,00	3,00	4,00	600.000,00
Telecomunicaciones (Radiotelefono, celulares,)	1	Und	$ 300.000		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		9,00	2.700.000,00			1,00	$300.000,00	1,00	1,00	1,00	3,00	4,00	1.200.000,00
Edicion de informes	1	Und	$ 200.000		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		9,00	1.800.000,00			1,00	$200.000,00	1,00	1,00	1,00	3,00	4,00	800.000,00
Determinación de los tamaños de las particulas de los suelos, Granulometria combinada por tamizado e hidrometria (Sub base y mat. de mejoramiento)	4	Quince Dias	$ 200.209		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00				28,00	5.605.852,00										

LCAICEDO-02460300122527-729633-001299077-A

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro CO1.PCCNTR 4964560 de fecha 25/01/223

OBJETO:

INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA
CONTRATISTA : CONSORCIO INTERVIAS RURALES
INTERVENTOR: N/A
IMPUTACIONES (No /fecha)
RUBRO: No 00RG-2402-0600-2019-00366-0023
CDP: No 824 959 555 (2023-06-13)
REGISTRO: No 14123 (2023-06-13)

VALOR CONTRATO: $ 627.959.555
VALOR ADICION(ES) : $ 0
VALOR TOTAL: $ 627.959.555

VALOR ANTICIPO: $ 0
FECHA DE INICIACION: 10 de julio de 2023
FECHA DE TERMINACION: 10 de mayo de 2023
SUSPENSION:
REINICIACION:
PLAZO: 10.5 Meses
PRORROGA:
FECHA TERM. FINAL: 10 de Mayo 2023

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
Acta parcial No. 03

ACTA PARCIAL
ACTA FINAL

VALOR DEL ACTA: **66.018.345.19**

FECHA: 10/10/2023

	CONDICIONES ORIGINALES																MODIFICACIONES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES				ACUMULADO	
																	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	MES 1	MES 2	MES 3	TOTAL ACTAS ANTERIORES	Cantidad	Valor
Límite líquido de suelos (Sub base y mat. de mejoramiento)	4	Quince Días	$ 56.629		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00				28,00	1.585.612,00			1,25	$283.145,00			1,50	1,50	2,75	622.919,00
Índice de plasticidad de suelos (Sub base y mat. de mejoramiento)	4	Quince Días	$ 56.630		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00				28,00	1.585.640,00			1,25	$283.150,00			1,50	1,50	2,75	622.930,00
Material orgánico (Sub base y mat. de mejoramiento)	4	Quince Días	$ 92.326		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00				28,00	2.585.128,00										
Densidad en campo (Sub base y mat. de mejoramiento)	12	Semana	$ 50.500		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00				84,00	4.242.000,00										
Determinación en laboratorio del contenido de agua (humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de suelo -agregado (Sub base y mat. de mejoramiento)	4	Quince Días	$ 14.098		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00				28,00	394.744,00			1,25	$70.490,00			1,50	1,50	2,75	155.078,00
Relación de soporte del suelo en laboratorio CBR (Sub base y mat. de mejoramiento)	2	Mensual	$ 333.357		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00				14,00	4.666.998,00			2,50	$1.666.785,00			2,00	2,00	4,50	3.000.213,00
Proctor modificado (Sub base y mat. de mejoramiento)	6	Quince Días	$ 153.273		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00				42,00	6.437.466,00										
Resistencia a la compresión de cilindros	6	Quince Días	$ 20.902		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00				42,00	877.884,00			1,00	$125.412,00			1,33	1,33	2,33	292.209,96
Equivalente de arena	2	Mensual	$ 93.498		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00				14,00	1.308.972,00										
Determinación del valor del 10% de finos (Valor en seco y húmedo, Relación Húmedo/Seco)	2	Mensual	$ 246.884		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00				14,00	3.456.376,00										
Determinación de terrones de arcilla y partículas deleznables en los agregados	3	Quince Días	$ 127.220		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				21,00	2.671.620,00										

LCAICEDO-02460300122527-729633-001299077-A

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro. CO1.PCCNTR.4964560 de fecha 25/01/223
OBJETO:

INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA
CONTRATISTA : CONSORCIO INTERVIAS RURALES
INTERVENTOR: N/A
IMPUTACIONES (No /fecha)
RUBRO: No 00RG-2402-0600-2019-00366-0023
CDP: No 624.959.555 (2023-06-13)
REGISTRO: No 14123 (2023-06-13)

VALOR CONTRATO: $ 627.959.555
VALOR ADICION(ES) : $ 0
VALOR TOTAL: $ 627.959.555

VALOR ANTICIPO: $ 0
FECHA DE INICIACION: 10 de julio de 2023
FECHA DE TERMINACION: 10 de mayo de 2023
SUSPENSION:
REINICIACION:
PLAZO: 10.5 Meses
PRORROGA:
FECHA TERM. FINAL: 10 de Mayo 2023

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
Acta parcial No. 03

ACTA PARCIAL
ACTA FINAL

VALOR DEL ACTA: **66.018.345,19**

FECHA: 10/10/2023

					CONDICIONES ORIGINALES												MODIFICACIONES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES				ACUMULADO	
																	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	MES 1	MES 2	MES 3	TOTAL ACTAS ANTERIORES	Cantidad	Valor
Solidez de los agregados frente a la acción de soluciones de sulfato de sodio o de magnesio (5 ciclos)	3	Quince Días	$	342.412		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				21,00	7.190.652,00										
Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños por medio de la máquina de los ángeles (con trituración de agregados) (Con reporte a 100 y a 500 Revoluciones)	2	Mensual	$	153.967		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00				14,00	2.155.538,00										
Índices de aplanamiento y de alargamiento de los agregados para carreteras	2	Mensual	$	120.521		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00				14,00	1.687.294,00										
		Subtotal															158.771.776,00			$14.908.982,00						$54.613.349,96
		Factor Multiplicador Costos Directos (Rango Mínimo 1,0-Maximo 1,25)																								
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON F.M															318.782.166,00			$35.296.992,00						$137.014.380,00
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON F.M. Y COSTOS DIRECTOS															477.553.942,00			$50.205.974,00						$191.627.729,96
	Polizas	1,0%	SOBRE SUB-TOTAL CON IMPUESTOS														$4.775.539,00			$502.060,00						$1.916.278,00
	Estampilla Pro-Adulto Mayor	3,0%															$14.326.618,00			$1.506.179,00						$5.748.832,00
	Estampilla Procultura	1,0%															$4.775.539,00			$502.060,00						$1.916.278,00
	Estampilla Pro-Desarrollo y Pro	3,0%															$14.326.618,00			$1.506.179,00						$5.748.832,00
	Estampilla Pro-Deporte	2,5%															$11.938.849,00			$1.255.149,00						$4.790.693,00
	SUB-TOTAL CON IMPUESTOS																$50.143.163,00			$5.271.627,00						$20.120.913,00
	IVA	19,0%															$ 527.697.105,00			$55.477.601,00						$211.748.642,96
	TOTAL																$100.262.450,00			$10.540.744,19						$40.232.242,16
																	$627.959.555,00			**66.018.345,19**						**251.980.885,12**
																			AMORTIZACION ANTICIPO:	0,00					0,00
																			TOTAL A PAGAR:	**66.018.345,19**			TOTAL ACUMULADO:		**251.980.885,12**

Nombre Alvaro Hernando Vera Avala
Contratista

Nombre Olga Liliana Ospina Jimenez
Supervisor
