CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	**INFORME PARA ACTA PARCIAL 2 DE EJECUCION**
	Página **1** de 49

PROYECTO

“MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA”

TITULO

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATISTA DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA



VERSION	FECHA	OBSERVACION DE LA VERSIÓN
01	Marzo 12 de 2024	Se entrega informe versión 01

JUAN MANUEL CORTEZ **Ingeniero Residente de Obra.**	**LUIS ERNESTO OTÁLORA URRIAGO** **Ingeniero director de Obra.**
ELABORADO POR	**APROBADO POR**

1- INFORME DE EJECUCIÓN

A. INFORMACION GENERAL

A.1 INTRODUCCIÓN

La presente documentación corresponde al Informe de los meses de enero y febrero de 2024, contiene las actividades técnicas, administrativas, jurídicas y registro fotográfico de los ítems ejecutados durante el proyecto, contrato de obra No CO1.PCCNTR.5268004, y cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA"

Aspectos contractuales relevantes: Los aspectos contractuales para el proyecto de La Mantenimiento y Rehabilitación de la malla vial urbana del municipio de Zipaquirá fueron los siguientes.

Información Actualizada del Contrato.

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5268004	
Objeto	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA"
No. Contrato	No. CO1.PCCNTR.5268004
Contratista	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG
Nit.	901.739.616-8
Representante legal	LUIS ERNESTO OTALORA URIAGO
Plazo inicial	CUATRO 05) MESES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07 DE ABRIL DE 2024 DE 2024
SUSPENSION No.	N/A
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	07 DE ABRIL DE 2024 DE 2024
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5268004	
Valor total inversión	DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.843.400.000,00) M/cte

A.2 Localización

El proyecto en referencia está localizado en el Municipio de Zipaquirá - Departamento de Cundinamarca, el cual limita por el sur con el Municipio de Cajicá, al oriente con el municipio de Tocancipá, al occidente con el municipio de Subachoque, por el norte con el municipio de Cogua. A continuación, se presenta la localización del proyecto:

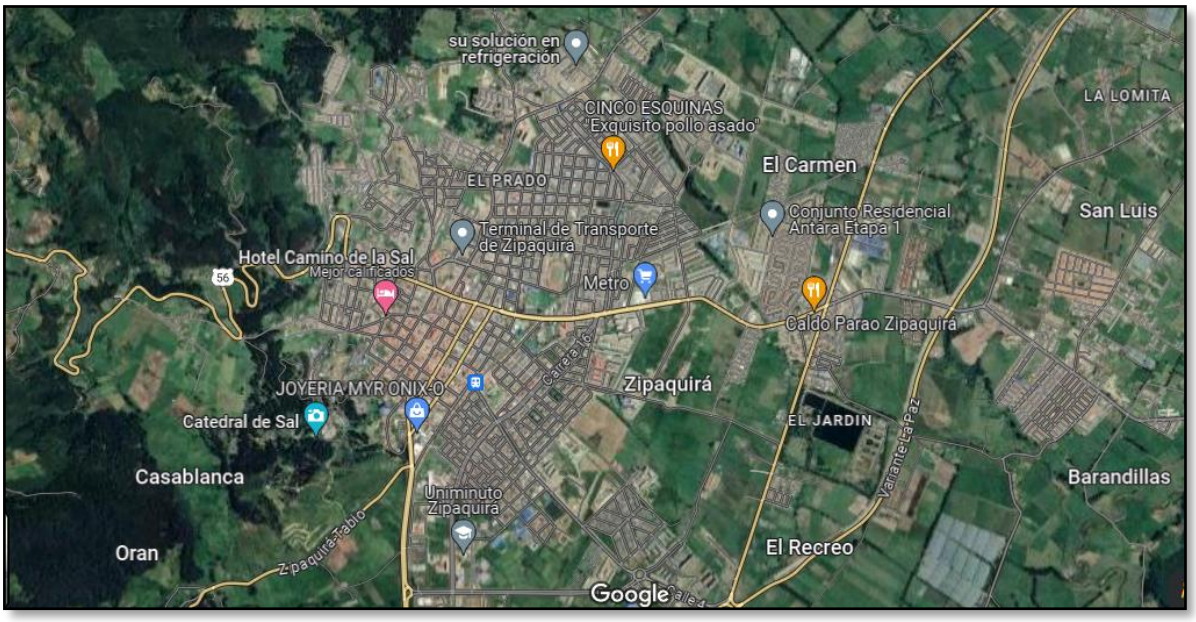


Figura 1. Localización del proyecto. – Fuente Google maps.

A-3 Descripción del Proyecto.

El proyecto de "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA" corresponde al mejoramiento de la malla vial del municipio de Zipaquirá, el cual se deben realizar trabajos de Bacheo y Rehabilitación de total de las vías a intervenir.

En el desarrollo de estas actividades se deben realizar trabajos de excavaciones, suministro de materiales pétreos, reemplazo de carpeta asfáltica, suministro e instalación de tuberías, suministro e instalación de concretos, cerramiento de las zonas a intervenir y todas las actividades necesarias para la buena ejecución de las obras.

En los puntos que se debe hacer rehabilitación parcial tipo bacheo, se observa de igual manera y de forma puntual perdida de carpeta asfáltica, ahuellamientos, fisuras, piel de cocodrilo entre otros, y

su intervención requiere intervención tipo bacheo, y no hay posibilidad de realizar la intervención tipo parcheo por el deterioro de la estructura del pavimento.

A.4 Control de Pólizas de Garantías.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No PÓLIZA	B-100040066
FECHA EXPEDICIÓN	04/09/2023

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	31/08/2023	30/04/2024	$ 284´340.000
PRESTACIONES SOCIALES	31/08/2023	31/12/2026	$ 568´680.000
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2023	31/12/2028	$ 853´020.000

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No PÓLIZA	B-100010292
FECHA EXPEDICIÓN	04/09/2023

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BASICO, PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	31/08/2023	31/12/2023	$ 464,000.000
PATRONAL	31/08/2023	31/12/2023	$ 139´200.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	31/08/2023	31/12/2023	$ 139´200.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	31/08/2023	31/12/2023	$ 139´200.000

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZACION DE POLIZA POR FECHA DE INICIO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No PÓLIZA	B-100040066
FECHA EXPEDICIÓN	27/09/2023
ANEXO	1

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

CUMPLIMIENTO	31/08/2023	30/04/2024	$ 284´340.000
PRESTACIONES SOCIALES	31/08/2023	31/12/2026	$ 568´680.000
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2023	31/12/2028	$ 853´020.000

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZACION DE POLIZA POR FECHA DE INICIO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No PÓLIZA	B-100040066
FECHA EXPEDICIÓN	27/09/2023
ANEXO	2

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	07/09/2023	07/05/2024	$ 284´340.000
PRESTACIONES SOCIALES	07/09/2023	07/01/2027	$ 568´680.000
ESTABILIDAD DE LA OBRA	07/01/2024	07/01/2029	$ 853´020.000

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZACION PRORROGA 1

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No PÓLIZA	B-100040066
FECHA EXPEDICIÓN	28/12/2023
ANEXO	3

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	28/12/2023	07/06/2024	$ 284´340.000
PRESTACIONES SOCIALES	28/12/2023	07/02/2027	$ 568´680.000
ESTABILIDAD DE LA OBRA	07/02/2024	07/02/2029	$ 853´020.000

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PRORROGA 1

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No PÓLIZA	B-100010292
FECHA EXPEDICIÓN	28/12/2023
ANEXO	3

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	

AMPARO BASICO, PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	07/09/2023	07/02/2024	$ 464,000.000
PATRONAL	07/09/2023	07/02/2024	$ 139´200.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	07/09/2023	07/02/2024	$ 139´200.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	07/09/2023	07/02/2024	$ 139´200.000

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZACION PRORROGA 2

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No PÓLIZA	B-100040066
FECHA EXPEDICIÓN	06/02/2024
ANEXO	4

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	28/12/2023	06/08/2024	$ 284´340.000
PRESTACIONES SOCIALES	28/12/2023	06/04/2027	$ 568´680.000
ESTABILIDAD DE LA OBRA	07/02/2024	07/02/2029	$ 853´020.000

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PRORROGA 2

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No PÓLIZA	B-100010292
FECHA EXPEDICIÓN	06/02/2024
ANEXO	4

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
AMPARO BASICO, PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	07/09/2023	07/04/2024	$ 520,000.000
PATRONAL	07/09/2023	07/04/2024	$ 156´000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	07/09/2023	07/04/2024	$ 156´000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	07/09/2023	07/04/2024	$ 156´000.000

B. CONTROL TECNICO

B.1 Registro fotográfico

- Carrera 18A Entre Calles 14A y 15

Se aplica emulsión asfáltica Carrera 18A Entre Calles 14A y 15 y se instala mezcla asfáltica en la Carrera 18A Entre Calles 14A y 15

Se ha realizado las actas de vecindad y reuniones con la comunidad.



Fotografía 1 – Instalación de riego de imprimación
Cra 18A Entre Calles 14A y 15



Fotografía 2 – Instalación de mezcla asfáltica MDC – 19 en la Cra 18 A entre calles 14 A Y 15

- Bacheo en diferentes lugares del municipio.

  Se inicia con bache en diferentes lugares asignados por la entidad contratante y la interventoría

- Entrada de Zipaquirá, Calle 1 y Carrera 10 .



Fotografía 3 – Excavación para bacheo entrada de Zipaquirá



Fotografía 4 – Excavación para bacheo en calle 1 frente la Casona



Fotografía 5 – Excavación para bacheo en carrera 10

- Bacheo en Calle 8 , Carrera 10 , Calle 17 y Carrera 9 .
- Excavación de pavimento antiguo
- Compactación y suministro de material granular
- Riego de emulsión asfáltica
- Instalación de mezcla densa asfáltica en caliente



Fotografía 6 – Excavación para bacheo en Cll 8



Fotografía 7 – Excavación para bacheo en Cra . 9



Fotografía 8 – Compactación de material granular para bacheo en Cra . 9



Fotografía 9 – Riego de emulsión asfáltica para bacheo en Cra . 10



Fotografía 10 – Instalación de mezcla asfáltica para bacheo en Cra . 10



Fotografía 11 – Instalación de mezcla asfáltica para bacheo en Cll . 17

B.2 RESUMEN DE CANTIDADES EJECUTADAS

Se hace una descripción detallada de los trabajos realizados en el proyecto vial del Municipio de Zipaquirá, los cuales se describen a continuación


ANEXAR ACTA DE CANTIDADES



B.2.1 INSTALACIÓN DE RIEGO DE IMPPRIMACION E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CARRERA 18 A ENTRE CALLE 14 A - 15

Una vez recibido por la interventoría la base se procede a la colocación del riego de imprimación y la instalación de la mezcla asfáltica a lo largo de la vía, se realizaron nivelación de pozo y reconstrucción de los sumideros existentes.

- CARRERA 18 A ENTRE CALLE 14 A - 15

  Instalación de riego de imprimación e instalación de asfalto a lo largo de la via.

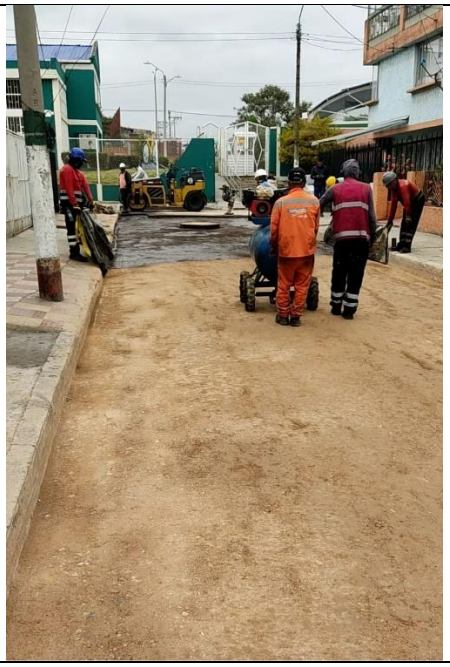	
Fotografía 12 – Colocación de riego de imprimación carrera 18ª entre calle 14 A -15	Fotografía 13 – Instalación de mezcla asfáltica carrera 18ª entre calle 14 A -15

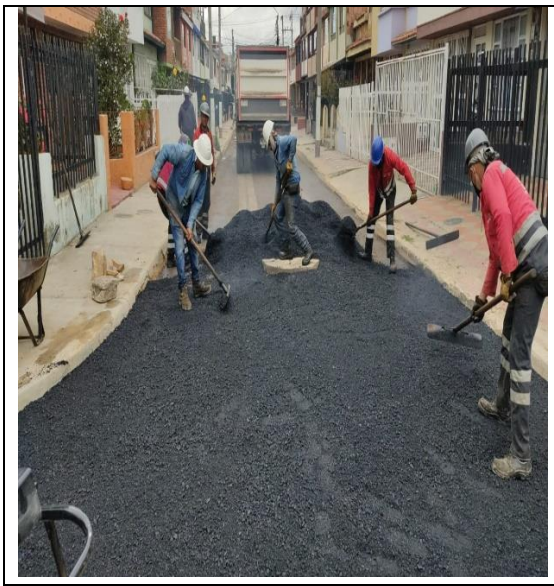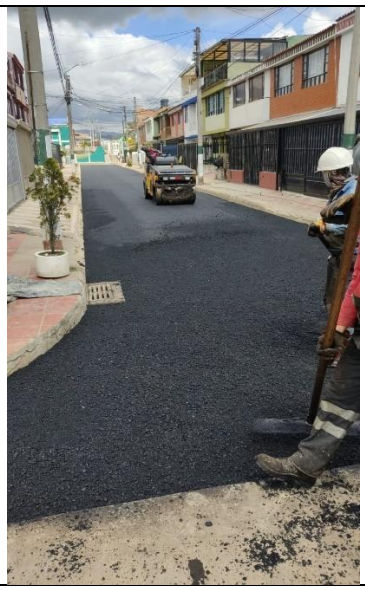	
Fotografía 14 – Instalación de mezcla asfáltica carrera 18ª entre calle 14 A -15	Fotografía 15 – Instalación de mezcla asfáltica carrera 18ª entre calle 14 A -15

B.2.2 INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO

EXCAVACION Y RETIRO DE PAVIMENTO ANTIGUO

- Entrada de Zipaquirá en calle 1 y carrera 10

	
Fotografía 16 – Excavación para bacheo en entrada de Zipaquirá	Fotografía 17 – Excavación para bacheo en Calle 1 con carrera 10



Fotografía 18 – Excavación para bacheo en carrera 10 entre calle 1 y calle 8

INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO



Fotografía 19 – Instalación de mezcla asfáltica para bacheo calle 1 entrada a Zipaquirá



Fotografía 20 – Instalación de mezcla asfáltica para bacheo sobre la calle 1



Fotografía 21 – Excavación para bacheo en carrera 10 entre calles 1 y 8.

B.2.3 EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO ANTIGUO.

Una vez señalados lo baches a intervenir se demarca con pintura en aerosol con interventoría quienes son autorizados por la entidad pública por consiguiente la interventoría dan el visto bueno al contratista y se ejecuta la actividad que básicamente consiste en hacer una descalificación de pavimento antiguo que se encuentra en pésimas condiciones.
Cabe resaltar que estos pavimentos se encuentran con fallas tales como:

- Grietas tipo piel de cocodrilo
- Grietas de contracción
- Elevación y/o Hundimientos
- Grietas de borde
- En Calle 8, Carrera 10, Calle 17 y Carrera 9

	
Fotografía 22 – Excavación para bacheo en Cll.8	Fotografía 23 – Excavación para bacheo en Cll.8
	
Fotografía 24 – Excavación para bacheo en Carrera 10	Fotografía 25 – Excavación para bacheo en Carrera 10

	
Fotografía 26 – Excavación para bacheo en Cll.17	Fotografía 27 – Excavación para bacheo en Cll.17
	
Fotografía 28 – Excavación para bacheo en Carrera 9	Fotografía 29 – Excavación para bacheo en Carrera 9

B.2.4 SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR.

Después de hacer la descalificación de pavimento antiguo se evidencia si el material granular se encuentra en optimas condiciones en caso de lo contrario será remplazado por nuevo material.


- En Calle 8, Carrera 10, Calle 17 y Carrera 9

	
Fotografía 30– Suministro de material granular nuevo en Cll. 8	Fotografía 31– Suministro de material granular nuevo en Carrera 10
	
Fotografía 32 – Suministro de material granular nuevo en Cll.8	Fotografía 33 – Suministro de material granular nuevo en fallo en Cll 17

B.2.5 COMPACTACIÓN DE MATERIAL GRANULAR.

Después del suministro y extendido de material granular se humecta el material para un sellado efectivo y una compactación homogénea

- En Calle 8, Carrera 10, Calle 17 y Carrera 9

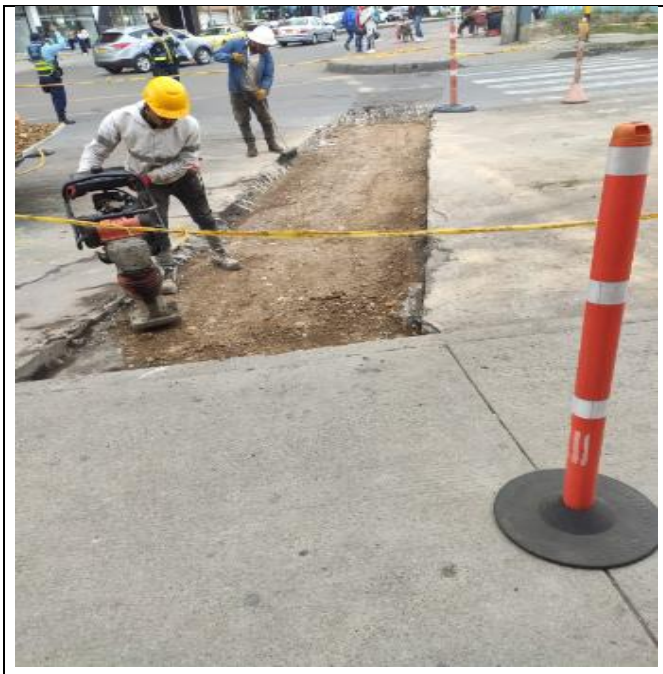

Fotografía 34– Compactación de material granular nuevo en Cll. 8



Fotografía 35– Compactación de material granular en Carrera 9



Fotografía 36– Compactación de material granular nuevo en Carrera 10

B.2.6 RIEGO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA.

Después del suministro y extendido de material granular y compactación del mismo se hace le riego de imprimación

- En Calle 8, Carrera 10, Calle 17 y Carrera 9



Fotografía 37– Riego de emulsión asfáltica Cll. 17



Fotografía 38– Riego de emulsión asfáltica Carrera 10



Fotografía 39– Riego de emulsión asfáltica Carrera 9

B.2.7. INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO

Después del riego de emulsión asfáltica se hace la instalación y compactación del asfalto en el bache intervenido

- En Calle 8, Carrera 10, Calle 17 y Carrera 9



Fotografía 40– Instalación de mezcla asfáltica Cll. 17



Fotografía 41– Instalación de mezcla asfáltica Carrera 10



Fotografía 42– Instalación de mezcla asfáltica Carrera 10



Fotografía 43– Instalación de mezcla asfáltica y compactación Carrera 9

B.3 Certificados de Calidad

Se presentan certificado de calidad de los equipos utilizados en este periodo.

B.3.1 Certificado de Calidad de equipos de Topografía (Estación Total)

EQUITOPO
RUT. 79434602-4



Pablo Julio Martínez S
Asesor técnico optomecánico

BOGOTÁ OCTUBRE 23 DEL 2023

Señor(es)

JOSE JAIRO MURILLO RIVAS

CERTIFICACIÓN DE PATRONAMIENTO Y VERIFICACIÓN CE 98
Descripción del instrumento (Equipo, Marca, Referencia, Número serial, Precisión):

ESTACIÓN Marca TOPCON REF GTS 102 N SERIE 2N6921

Precisión 2"seg *Aprox. a distancia: 1mm*

Lectura Angus. Mínima: 1"seg. *Precisión a distancia: 3mm + 5ppm*

1. Inspección Óptico mecánico:

1.1 Lentes frontales del telescopio	** Buen estado.*
1.2 Lentes del ocular de lecturas	** Buen estado.*
1.3 Retículo de lectura	** Alineado y centrado.*
1.4 Lentes y sistema de plomada óptica	** Buen estado y centrado.*
1.5 1.5 Círculos Horizontal y Vertical	** Buen estado.*
1.6 1.6 Perpendicularidad de ejes	** Estable.*
1.7 1.7 Sistema completo de enfoque	** Buen funcionamiento.*
1.8 1.8 Frenos y movimientos lentos	** Estables.*
1.9 1.9 Niveles tubulares y ojo de pollo	** Centrados y corregidos.*

1.10 Colimación de ángulos V y H.

****Lectura Vertical: 90º00'00" opuesto*** ****Lectura Horizontal: 0º00'00" opuesto***

270º00'05" ***180º00'00"***

Error hallado:05" ***Error promedio:00"***

Calibrado: 90º 00' 00" opuesto ***Calibrado: 0º 00' 00" opuesto 180º 00'00"***

270º00'00"

Tel. 4709108Cel. 3132832094 -3143603824 p.ablis04@hotmail.com

Diagonal 89 a 115-50 int 9 ofi 203

2. ***Inspección del Sistema Electrónico y EDM:***

(Distanció metro, Línea base 85 m y 375 m)

2.1 Compensadores de nivelación	** Centrados y corregidos.*
2.2 Haz de medida	** Alineado.*
2.3 Control de distancias	** Medidas controladas y estables.*
2.4 Display, teclados y visualización	** Buen estado de funcionamiento.*
2.5 Puerto de salida datos RS 232	** Buen funcionamiento.*
2.6 Transferencia de datos	** Buen funcionamiento.*
2.7 Baterías y cargador	** Batería –Normal rendimiento.*
	Cargador –Normal rendimiento
2.8 Constantes del instrumento (PSM/ T /PPM)	** Estables.*
2.9 Sensores de lectura en los círculos	** Funcionamiento estable.*

EQUITOPO: PABLO JULIO MARTÍNEZ S RUT 79434602-4, *CERTIFICA que el instrumento descrito anteriormente fue revisado, verificado y sometido a pruebas técnicas bajo parámetros y características de funcionamiento de los fabricantes;*

Expedida a solicitud del interesado a los VEINTITRES (23) días del mes DE OCTUBRE del año DOS MIL VEINTITRES (2023) y tiene una vigencia de Seis (06) meses a partir de la fecha.

Cordialmente,

PABLO JULIO MARTÍNEZ S

Técnico opto mecánico y electrónico

Jefe Departamento Técnico.

RUT. 79434602-4

Tel. 4709108Cel. 3132832094 -3143603824 p.ablis04@hotmail.com

Diagonal 89 a 115-50 int 9 ofi 203

B.3.2 Certificado de Calidad de equipos de Topografía (Nivel de precisión)

EQUITOPO
RUT. 79434602-4



Pablo Julio Martínez S
Asesor técnico optomecánico

BOGOTÁ NOVIEMBRE 18 DEL 2023

Señor(es)

JOSE JAIRO MURILLO RIVAS

CERTIFICACIÓN DE PATRONAMIENTO Y VERIFICACIÓN CN 54
Descripción del instrumento (Equipo, Marca, Referencia, Número serial, Precisión):

NIVEL Marca TOPCON REF AT-B4 SERIE 12512

1. Inspección Óptico mecánico:

1.1 Lentes frontales del telescopio	** Buen estado.*
1.2 Lentes del ocular de lecturas	** Buen estado.*
1.3 Retículo de lectura	** Alineado y centrado.*
1.4 Lentes y sistema de plomada óptica	** Buen estado y centrado.*
1.5 1.5 Círculos Horizontal y Vertical	** Buen estado.*
1.6 1.6 Perpendicularidad de ejes	** Estable.*
1.7 1.7 Sistema completo de enfoque	** Buen funcionamiento.*
1.8 1.8 Frenos y movimientos lentos	** Estables.*
1.9 1.9 Niveles tubulares y ojo de pollo	** Centrados y corregidos.*

EQUITOPO: PABLO JULIO MARTÍNEZ S RUT 79434602-4, *CERTIFICA que el instrumento descrito anteriormente fue revisado, verificado y sometido a pruebas técnicas bajo parámetros y características de funcionamiento de los fabricantes;*

Expedida a solicitud del interesado a los DIECIOCHO (18) días del mes DE NOVIEMBRE del año DOS MIL VEINTITRES (2023) y tiene una vigencia de Seis (06) meses a partir de la fecha.

Cordialmente,

PABLO JULIO MARTÍNEZ S

Técnico opto mecánico y electrónico

Jefe Departamento Técnico.

RUT. 79434602-4

Tel. 4709108Cel. 3132832094 -3143603824 p.ablis04@hotmail.com

Diagonal 89 a 115-50 int 9 ofi 203

B.4 EQUIPOS Y MAQUINARIA

B.4.1 Estación Topcon



B.4.2 Retroexcavadora SANY





REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 115808

No. DE REGISTRO MC616552	MARCA SANY	LINEA SHI75	AÑO MODELO 2023
TIPO DE MAQUINARIA CONSTRUCCION	CLASE RETROEXCAVADORA		No. SERIE SY007SCC65918
COLOR(ES) AMARILLO	No. MOTOR 77269224		RODAJE NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
7650 Kg	3732 mm	2280 mm	7381 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
BANCO DAVIVIENDA SA

IDENTIFICACIÓN
NIT 860.034.313

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)
JMP INGENIERIA Y EQUIPOS SAS

IDENTIFICACIÓN
NIT 901.507.997

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE ZIPAQUIRA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
30-05-2023	30-05-2023	*****
ORIGEN	**DEC. IMPORTACIÓN**	**FECHA DE LEVANTE**
IMPORTACIÓN	352023000018697	12/01/2023

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM0700003224

COMICOLOR-SM-22

B.4.3 MINICARGADOR





REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. DE REGISTRO MA196369	MARCA JOHN DEERE	LINEA 320E	AÑO 2017
TIPO DE MAQUINARIA AGRICOLA	CLASE MINICARGADOR		No. SERIE *TO320EAKGJ295452
COLOR(ES) AMARILLO	No. MOTOR		RODAJE NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO 3246 Kg	ALTO 2020 mm	ANCHO 176 mm	LARGO 3470 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
SOLUCIONES COLCIVIL SAS

IDENTIFICACIÓN
NIT 901.320.693

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN



LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MANIZALES

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
10-03-2021	14-09-2021	******
ORIGEN	**DEC. IMPORTACIÓN**	**FECHA DE LEVANTE**
IMPORTACIÓN	482019000998766	17/01/2020

VALID 116148 08/17

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM06000008405

B.4.4 EQUIPO DE EXTENDIDO DE ASFALTO



DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

2012

Espacio reservado para la DIAN (antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

PAV.TA010- blawknox

4. Número de formulario: 872012000104380-0

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830053994 | 6. DV: 4 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA

13. Dirección: CR 7 24 89 P 21 | 15. Teléfono: 7456300 | 12. Cód. Admón.: 87 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 890403420 | 25. DV: 1 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS AGENCOMEX LTDA NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cod. usuario: 0276

29. Número documento de identificación: 79237790 | 30. Apellidos y nombres: LOPEZ QUINCHE GUSTAVO

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BAQ	24220	No. 116575003175916	2012 - 04 - 17	No. SCMFPCRBAR00025	2012 - 03 - 29

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: IRON PLANET | 47. Ciudad: PLEASANTON, CA | 48. Cod.País Exportador: 249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 4695 CHABOT DRIVE SUITE 102 PLEASANTON, CA USA, 94 | 50. E-mail: WWW.IRONPLANET.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa $ cvs.
35630-365904	2012 - 02 - 24	249	1	580	11	MULTIPORT E.U	1,776.06

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Tipo	65. Periodicidad pago	66. Cod. país origen	67. Cod. Acuerdo
8479100000	XX	XX	C136		XX	XX	249	*XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs.	73. Cantidad bultos	74. No. bultos	75. Unidades comerciales	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	249	15,422.00	15,422.00	1	PK		U	1.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
20,085.00	3,242.31

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
100.43	10.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
5,952.74	0.00

84. Valor aduana USD	85. Cod. Tipo Cambio	86. Valor Cambio
26,037.74	L	2097801300

87. Clasificación	88. Año	89. Programa No.	90. Cód Interno del Producto
3	2012	XXXXXXXXXX	0

Agregados y Liquidación	Concepto	Tasa %	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
	Arancel	0.00	0	0	0
	IVA	16.00	7,399,589	7,399,000	7,399,000
	Salvaguardia	0.00	0	0	0
	Derechos Complementarios	0.00	0	0	0
	Derechos Antidumping	0	0	0	0
	Sanción	0	0	0	
	Rescate	0	0	0	
	Total		7,399,000		0

91. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe el respaldo de este formulario)

MERCANCIA USADA. COMPRADA EN SUBASTA. MAQUINAS Y APARATOS PARA OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION. PAVIMENTADORA DE ASFALTO DE CADENAS , SOBRE NEUMATICOS Y RODILLOS, MARCA BLAW-KNOX, MODELO PF-3200, SERIAL No 320028-59. MOTOR CUMMINS, NUMERO DE IDENTIFICACION 2502 033. POTENCIA 44 HP, PESO OPERATIVO 4.900 KG, CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE 45 GLS, DIMENSIONES. LARGO 2.5 MTS, ANCHO 2,6 MTS ALTO 1,9 MTS. NO CONTIENE NI UTILIZA FUENTE DE PODER CON HERRAMIENTAS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN. A RO DE FABRICACION 2000, PRECIO CUANDO NUEVO USD 25.000.00. GASTOS EMBARQUE. USD 585.00 LIC-20978013-20042012 DE 24-04-2012. XXXX XXXXXXXXXXXXXX

DIAN

Declaración de Importación

Privada | 500

Año 2016

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

PAV.VA036- BOMAG

4. Número de formulario: 352016000059229-1

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900170399 | 6. DV: 6 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: IMPORTADORA CASA COLOMBIA S A S

13. Dirección: DG 16 96 G 05 | 15. Teléfono: 7460294 | 12. Cód. Admón.: 35 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900036951 | 25. DV: 1 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS FENIX S A S NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 495

29. Número documento de identificación: 79713659 | 30. Apellidos y nombres: CALDERON GARCIA WILLIAM RICARDO

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	20950	No. 116575006734841	2016 - 02 - 17	No. MSCUJX080045	2016 - 01 - 17

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INTERNATIONAL TRADING CO. LTD | 47. Ciudad: KOBE | 48. Cod.País Exportador: 399

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 15,MINATO-JIMA,CHOU-KU KOBE 650-0045 | 50. E-mail: 078-303-2622

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio
CY160106	2016 - 01 - 17	399	1	351	11	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.	3,338.03

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuotas	65. Cantidad de bienes	66. Cod. Año de fabricación	67. Cod. Acuerdo
	8429400000	XX	XX	C100	XX	XXX		399	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	72. Peso neto kgs.	73. Cód.	74. No.	75. Subpartidas	76. Cod. Unidad comercial	77. Cantidad doms.
06	01	399	7,200.00 doms.	0.00			1	u	2.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código	86. Número	87. Cod. oficina	88. Año	89. Número No.	90. Peso Artículo
27,248.64	1,340.16	32.35		1,571.23	0.00	28,819.87		2166220	3	2016	XXXXXXXXXX	0

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	96,201,591	0	0	0
IVA	16.00	96,201,591	15,392,000	15,392,000	0
Subpartida		0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Recargos	0.00	0	0	0	0
Intereses Moratorios	0	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	15,392,000		0

91. Descripción de las mercancías (Describir la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo o en este formulario)

T4P P380-2016

DIM.LARGO.0.35.16.070.ANCHO.0.20.VIBROCOMPACTADORES MIXTOS.MERCANCIA USADA.NOS ACOGEMOS AL DECRETO 1625 DE 2015-08-14 PARA LA DESGRAV ACION DE ARANCEL.Topadoras frontales («bulldozers»), topadoras angulares («angledozers»), niveladoras, traillas («scrapers»), pal as mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas.- Compactad oras y apisonadoras (aplanadoras) BIEN DE CAPITAL.MERCANCIA USADA.PRODUCTO:VIBROCOMPACTADOR AUTOPROPULSADO RODILLO Y LLANTAS.MARC A:BOMAG.MODELO/REF:BW131ACW-2.AÑO DE MODELO:2006.PRECIO CUANDO NUEVO:USD30.000.00.CHASIS SERIE No:751750111721.MOTOR:MARCA:KUBOTA .MODELO:V1505.SERIAL No:V1505-5Y0967.CODIGO No:1G665-52000.USO O DESTINO:DESARROLLO DE OBRAS CIVILES.UNIDAD(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Después de insp.: levante No hay declaración posterior Acta de inspección No.: 352016000007744 Inició: 2016-02-23 16:47:03 Finalizó: 2016-02-25 07:01:00	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 352016000059229 133. Fecha: 2016 02 23

134. Levante No. 352016000052225	135. Fecha: 2016 - 02 - 25	Firma funcionario responsable	136. Nombre: ESTUPINAN CANDELO SONIA 137. C.C. No. 31,385,064

Firma declarante

AGENCIA DE ADUANAS FENIX S A S NIVEL 2 Código 495

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 15,392,000

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

BOGOTA
Autoadhesivo 01861030792679
Fecha presentación 2016-02-23 15:44:00
Valor pagado $15,392,000

Fecha de Impresión: 2016-02-25 09:38:48

20160950033134

DOCUMENTO NO NEGOCIABLE
ESTA MAQUINA ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE PAVICONCRETOS S.A.S - ING. CARLOS E. GARCIA
Valido como soporte de la documentación de referencia comercial, y esta designado
VALIDEZ DE 30 DIAS
Carece de valor
VALIDO A PARTIR DE:

B.4.5 EQUIPO DE COMPACTACION DE ASFALTO



DIAN

Declaración de Importación

Privada | 500

1. Año 2016

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

PAV.VA036- BOMAG

4. Número de formulario: 352016000059229-1

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900170399 | 6. DV: 6 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: IMPORTADORA CASA COLOMBIA S A S

13. Dirección: DG 15 96 G 05 | 15. Teléfono: 7460294 | 12. Cód. Admón.: 35 | 18. Cód. Depto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900036951 | 25. DV: 1 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS FENIX S A S NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 495

29. Número documento de identificación: 79713659 | 30. Apellidos y nombres: CALDERON GARCIA WILLIAM RICARDO

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	20950	No. 116575006734841	2016 - 02 - 17	No. MSCUJX080045	2016 - 01 - 17

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INTERNATIONAL TRADING CO. LTD | 47. Ciudad: KOBE | 48. Cod.País Exportador: 399

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 15,MINATO-JIMA,CHOU-KU KOBE 650-0045 | 50. E-mail: 078-303-2622

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto Destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio
CY160106	2016 - 01 - 17	399	1	351	11	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.	3,338.03

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cr...	65. Cod. Lugar de la ...	66. Cod. Acuerdo
	8429400000	XX	XX	C100	XX	XXX	399	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Cod. ...	74. Unidades Comerciales	75. Cantidad Unidades Comerciales	76. Unidad Comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	399	7,200.00	00.00	XX	1	1	U	2.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
27,248.64	1,340.16

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
32.35	

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
1,571.23	

84. Valor aduana USD	85. Código ... de tasa	86. Núm...
28,819.87		216...

87. Cod. oficina	88. Año	89. No. ...	90. Material del Producto
3	2016	XXXXXXXX	0

Concepto	Base	Tarifa	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	98,201,391	0	0	0
IVA	15,392,000	98,201,391	15,392,000	15,392,000	0
Derechos Compensatorios	0	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Intereses	0	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Reliquidación	0	0	0	0	
Total			15,392,000		0

DOCUMENTO NO NEGOCIABLE
ESTA MAQUINA ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE PAVICONCRETOS S.A.S - ING. CARLOS E. GARCIA
Favor hacerse de valor comercial y esta declaración de importación de referencia
VALIDEZ DE 30 DIAS

VALIDO A PARTIR DE: 14 A 380-2016

79. Descripción de las mercancías (Describa la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo o este formulario)

DIM 0.0.35.16.070 0.0.20.VIBROCOMPACTADORES MIXTOS.MERCANCIA USADA.NOS ACOGEMOS AL DECRETO 1625 DE 2015-08-14 PARA LA DESGRAV AC[illegible] DE ARANCEL.Tractores frontales («bulldozers»), topadoras angulares («angledozers»), niveladoras, traillas («scrapers»), pal as mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas.- Compactad oras y apisonadoras (aplanadoras) BIEN DE CAPITAL.MERCANCIA USADA.PRODUCTO:VIBROCOMPACTADOR AUTOPROPULSADO RODILLO Y LLANTAS.MARC A:BOMAG.MODELO/REF:BW131ACW-2.AÑO DE MODELO:2006.PRECIO CUANDO NUEVO:USD30.000.00.CHASIS SERIE No:751750111721.MOTOR:MARCA:KUBOTA .MODELO:V1505.SERIAL No:V1505-5Y0967.CODIGO No:1G665-52000.USO O DESTINO:DESARROLLO DE OBRAS CIVILES.UNIDAD(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estudio de levante: Después de insp.: levante
No hay declaración posterior
Acta de inspección No.: 352016000007744
Inició: 2016-02-23 10:47:03 Finalizó: 2016-02-25 07:01:00

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 352016000059229
133. Fecha: 2016 02 23

134. Levante No. 352016000052225 | 135. Fecha: 2016 - 02 - 25 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre: ESTUPINAN CANDELO SONIA | 137. C.C. No. 31,385,064

Firma declarante

AGENCIA DE ADUANAS FENIX S.A.S. NIVEL 2 Código 495

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 15,392,000

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

BOGOTA
Autoadhesivo 01861030792679
Fecha presentación 2016-02-23 15:44:00
Valor pagado $15,392,000

Fecha de Impresión: 2016-02-25 09:38:48

20160950033134

4.6. COMPRESOR SULLAIR 260



compresor

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2008

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario
062008100156422-2

157253.

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 800161680 | 6. DV: 0 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: LEASING BOGOTA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMENTO COMERCIAL

13. Dirección: CL 36 7 47 P 11 | 15. Teléfono: 3202066 | 12. Cód. Admón.: 06 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860002153 | 25. DV: 8 | 26. Razón social del declarante autorizado: ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA S.A. | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 0139

29. Número documento de identificación: 73128023 | 30. Apellidos y nombres: BUENDIA URIBE ROBERTO

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34 No Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	14004	No. 062008100003319	2008 - 06 - 11	No. 4120CHI052520	2008 - 06 - 05

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: IMOCOM OVERSEAS S.A | 47. Ciudad: PANAMA | 48. Cod.País Exportador: 580

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 2ND FLOOR SWISS BANK BUILDING EAST 53RD STREET,MAR | 50. E-mail: 507 263 5895

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto. destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
00521	2008 - 06 - 03	249	1	221	25	MARITRANS LTDA.	1,570.31

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8414409000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	249	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	580	10,160.42	10,160.42	PK	1	1	U	7.00

78. Valor FOB USD	79. Valor Fletes USD
117,292.00	3,272.00

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
422.20	165.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
3,859.20	65.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
121,216.20	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód.Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	202,468,631	0	0	0
I.V.A.	16.00	202,468,631	32,394,981	32,394,981	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Rezagte	0	0	0	0	
		Total	32,394,981		0

91. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros). (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

BOMBAS DE AIRE O DE VACIO, COMPRESORES DE AIRE U OTROS GASES Y VENTILADORES; CAMPANAS ASPIRANTES PARA EXTRACCION O RECICLADO, CON VENTILADORINCORPORADO, INCLUSO CON FILTRO. COMPRESORES DE AIRE MONTADOS EN CHASISREMOLCABLE CON RUEDAS // NOMBRE COMERCIAL COMPRESOR PORTATIL. MARCASULLAIR, TIPO DE COMPRESOR TORNILLO ROTATIVO. MODELO 260 DPQ. COMPRESOR DE AIRE, PORTATIL CON UNIDAD COMPRESORA SULLISCREW DE TORNILLOSROTATORIOS ASIMETRICOS, DE UNA ETAPA, EQUIPADA CON RODAMIENTOS DE TRABAJO PESADO, DE RODILLOS CONICOS APAREADOS (CARGA AXIAL Y RADIAL) EN LADESCARGA (ZONA DE MAYOR PRESION) Y DE RODILLOS CILINDRICOS (CARGA RADIAL) TIPO UN EN LA ADMISION. CONDICIONES DE OPERACIÓN OBRA CIVIL, SAND BLASTING, PERFORACIÓN MINERIA. CAPACIDAD 260 CFM; PRESI(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 062008100156422 133. Fecha: 2008 06 24
134. Levante No.	135. Fecha	Firma funcionario responsable / 136. Nombre / 137. C.C. No.

Firma declarante

Almaviva
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA S.A.
NIT. 860002153-8

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

Banco de Bogotá
OF. C.R. ALMAVIVA EL BOSQUE
CAJ 9
25 JUN 2008 204
RECIBIDO CON PAGO

Solicite el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 32,394,981

BANCO DE BOGOTA 01904316 4

(415)7707212489953(8020)01204090601757

Fecha de Impresión: 2008-06-24 17:56:44

B-5 ACTAS DE VECINDAD

B.5.1 Se continua con las actas de vecindad. Se anexan las realizadas en el mes de febrero de 2024.
B.5.2 Se anexa actas de cierre de la carrera 18 A entre calle 14 A – 15.
B.5.3 Se anea actas de cierre de la carrera 15 entre calles 10 – 13.
B.5.4 Se anexa actas de cierre de la calle 10 entre carreras 13 – 16.

C- CONTROL FINANCIERO

No. ACTA	FECHA PAGO	DESCRIPCIÓN	No. COMPROBANTE	VALOR FACTURADO	% PAGADO
ACTA 1	19/01/2024	ACTA PARCIAL DE OBRA		1.137.360.000	40.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
TOTAL				**1.137.360.000**	**40,00%**

D- CONTROL ADMINISTRATIVO

D-1 Relación de personal calificado y no calificado

FECHA APROBACIÓN:	06/01/2024	**ACTA No.**	2
N° CONTRATO	CO1.PCCNTR.5268004		
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA"		
CONTRATISTA	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG		
INTERVENTOR	GKAIROS S.A.S.		
SUPERVISOR	ARQUITECTA SANDRA ATUESTA		

Se deja constancia que la Interventoría (o Supervisión) revisó y aprobó la(s) hoja(s) de vida con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo solicitado en los Pliegos de Condiciones (o Términos de Referencia) del contrato mencionado, la(s) cual(es) se relacionan a continuación:

CARGO POR DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESIÓN	DISPONIBILIDAD	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA
Director de obra	Luis Ernesto Otálora urriago	Ingeniero Civil	Dedicación del cincuenta por ciento (50 %) mensual.	18 años	Haber participado como director no menor de cinco (05) años en contratos cuyo objeto del contrato corresponda a la técnica, Administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental para obras de mejoramiento y/o construcción y/o adecuación y/o rehabilitación de vías.
Residente de Obra	Juan Manuel Cortes Mirque	Ingeniero civil.	Dedicación del cien por ciento (100 %) mensual.	25 años	Haber participado como ingeniero Residente no menor de cuatro (04) años en contratos cuyo objeto del contrato corresponda a la técnica, Administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental para obras de mejoramiento y/o construcción y/o adecuación y/o rehabilitación de vías.

Personal de Apoyo Profesional Obra y/o Interventoría (Personal que no se solicitó en los pliegos y que estará prestando apoyo profesional en obra y/o interventoría). Este personal NO reemplaza al personal solicitado en los pliegos.

CARGO POR DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESIÓN	DISPONIBILIDAD	EXPERIENCIA GENERAL	FUNCIONES
Profesional - Topógrafo	Andrés Ramírez lujo	Ingeniero Topográfico	Dedicación del cien por ciento (100 %) mensual.	8 años	Haber participado como topógrafo no menor de tres (03) años cuyo objeto del contrato corresponda técnica, Administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental para

					de mejoramiento y/o construcción y/o adecuación y/o rehabilitación de obras para vías.
Tecnólogo – HSEQ SISO	Kevin Adrián Sánchez Malaver	Tecnólogo en sistemas integrados de gestión calidad medio ambiente y seguridad y salud ocupacional	Dedicación del cien por ciento (100 %) en campo y administrativo.	2 años	Haber participado como coordinador en HSEQ no menor de 2 años en contratos cuyo objeto sea coordinando técnica, Administrativa, y ambiental para de mejoramiento y/o construcción y/o adecuación y/o rehabilitación de obras, trabajos de alto riesgo y vías.
Trabajadora social	Xury Rosa Guerra Olivella	Profesional trabajo social	Dedicación del cien por ciento (100 %) en campo y administrativo.	4 años	Haber participado como trabajadora social no menor de 2 años coordinando Administrativamente para la socialización de mejoramiento y/o construcción y/o adecuación y/o rehabilitación de obras para vías.
Apoyo Ingeniero civil	Rocha Suarez Ángel David	Ing. Civil	Dedicación del cien por ciento (100 %) mensual.	3 años	Apoyo técnico, administrativo y en obra al personal.
Auxiliar de obra	Moisés Benito Diaz Irazábal	Indiferente	Dedicación del cien por ciento (100 %) mensual	10 años	Apoyar funciones de excavación manual y tareas en general
Auxiliar de obra	Suarez Ruiz Fernando	Indiferente	Dedicación del cien por ciento (100 %) mensual	20 años	Apoyar funciones de excavación manual y tareas en general
Auxiliar de obra	Wilmar Uribe Suarez	Indiferente	Dedicación del cien por ciento (100 %) mensual	15 años	Apoyar funciones de excavación manual y tareas en general
Auxiliar de obra	Medina Ramos Fernando	Indiferente	Dedicación del cien por ciento (100 %) mensual	2 años	Apoyar funciones medición y tareas en general
Auxiliar de obra	Almarat Silva José Rafael	Indiferente	Dedicación del cien por ciento (100 %) mensual	2 años	Apoyar funciones medición y tareas en general
Auxiliar de obra	Ballen Alba Anderson Wilmar	Indiferente	Dedicación del cien por ciento (100 %) mensual	2 años	Apoyar funciones medición y tareas en general
Auxiliar de obra	Romero Álvarez Edwin Alberto	Indiferente	Dedicación del cien por ciento (100 %) mensual	2 años	Apoyar funciones medición y tareas en general

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Zipaquira a los seis (06) días del mes febrero del año dos mil veinticuatro (2024).

CONTRATISTA	SUPERVISOR	INTERVENTOR (Cuando aplique)
FIRMA	**FIRMA**	**FIRMA**
LUIS ERNESTO OTALORA URRIAGO C.C 79.969.704	SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO N° Documento	DAVID FELIPE CAYCEDO VILLARAGA N° Documento

Anexos: Hojas de vida con sus soportes
Concepto de Evaluación

Original – Secretaría Obras Públicas
Copias Interventor o Supervisor y Contratista


D.2 PAGO DE SEGUIRIDAD SOCIAL

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, LUIS ERNESTO OTALORA URRIAGO identificado con cedula de ciudadanía No 79.969.704 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG identificada con Nit 901739616-8, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los meses de enero y febrero de 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Zipaquirá D.C., a los diez (12) días del mes de marzo de 2024.



LUIS ERNESTO OTALORA URRIAGO
Representante Legal
Consorcio Zipaquirá GKG
Tarjeta Profesional 25202120900 CND
C.C 79.969.704

Se anexa planilla paga

PLANILLA PAGA ENERO DE 2024

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901739616-8	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	CRA 14 B 118 72 OF 102	6019371654	consorciozipaquiragkg@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	08/02/2024	74564514	$4.114.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	200.000	0		0		0	2	400	0	200.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	82.900	0		0		0	2	200	0	83.100	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.300	0		0		0	2	100	0	52.400	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	68.900	0		0		0	2	200	0	69.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	123.300	0		0		0	2	300	0	123.600	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	29.500	0		0		0	2	100	0	29.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.108.900	0	0	0	0	2	2.000	0	1.110.900	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	914.700	0	0	0	0	2	1.700	0	916.400	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	968.700				968.700	2	1.800	970.500			9.687	970.500	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	556.900	2	1.100	558.000	12

PAGADA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901739616-8	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	CRA 14 B 118 72 OF 102	6019371654	consorciozipaquiragkg@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	08/02/2024	74564514	$4.114.000	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	556.900	558.200
Pensión	2	2.023.600	2.027.300
Riesgos Laborales	1	968.700	970.500
CCF	1	556.900	558.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.106.100	4.114.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901739616-8	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	CRA 14 B 118 72 OF 102	6019371654	consorciozipaquiragkg@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	05/01/2024	73799711	$6.334.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	198.700	0		0		0	0	0	0	198.700	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	161.200	0		0		0	0	0	0	161.200	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	54.000	0		0		0	0	0	0	54.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	224.600	0		0		0	0	0	0	224.600	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.555.900	0	0	0	0	0	0		1.555.900	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.592.700	0	0	25.000	25.000	0	0		1.642.700	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.458.600				1.458.600	0	0	1.458.600			14.586	1.458.600	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	838.500	0	0	838.500	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	838.500	838.500
Pensión	2	3.198.600	3.198.600
Riesgos Laborales	1	1.458.600	1.458.600
CCF	1	838.500	838.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	6.334.200	6.334.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901739616-8	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG		CRA 14 B 118 72 OF 102	6019371654	consorciozipaquiragkg@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					10	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2024-01	2023-12	E	05/01/2024	73799711	$6.334.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003689477	CHAVES CAPADOR BRAYAN DAVID	1	0			S		X															25-14	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS008	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
2	CC	1075685512	SANCHEZ MALAVER KEVIN ADRIAN	1	0			S								X									230301	2.030.053	324.900	0	0	0	0	EPS017	2.030.053	81.300	14-11	2.030.053	5	141.300	CCF24	2.030.053	81.300	0	0	0	0	0
3	CC	15306458	SUAREZ RUIZ FERNANDO	1	5			S								X										0	0	0	0	0	0	EPS010	1.348.191	54.000	14-11	1.348.191	5	93.900	CCF24	1.348.191	54.000	0	0	0	0	0
4	CC	52377646	GUERRA OLIVELLA XURY ROSA	1	0			S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
5	PT	6029088	ALMARAT SILVA JOSE RAFAEL	1	0			S	X							X									230301	1.328.036	212.500	0	0	0	0	EPS008	1.328.036	53.200	14-11	1.328.036	5	92.500	CCF24	1.328.036	53.200	0	0	0	0	0
6	PT	6036181	DIAZ IRAZABAL MOISES BENITO	1	0			S								X									230301	1.324.951	212.000	0	0	0	0	EPS008	1.324.951	53.000	14-11	1.324.951	5	92.300	CCF24	1.324.951	53.000	0	0	0	0	0
7	PT	6036181	DIAZ IRAZABAL MOISES BENITO	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS008	38.667	0	14-11	38.667	5	0	CCF24	38.667	0	0	0	0	0	0
8	CC	79130654	CORTES MIRQUE JUAN MANUEL	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	25.000	25.000	EPS001	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	5	348.000	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
9	CC	79915745	GARCIA VARGAS LUIS DARIO	1	0			S								X									25-14	3.582.447	573.200	0	0	0	0	EPS017	3.582.447	143.300	14-11	3.582.447	5	249.400	CCF24	3.582.447	143.300	0	0	0	0	0
10	CC	80539810	MEDINA RAMOS FERNANDO	1	0			S	X							X									230301	1.465.851	234.600	0	0	0	0	EPS005	1.465.851	58.700	14-11	1.465.851	5	102.100	CCF24	1.465.851	58.700	0	0	0	0	0
11	CC	80539810	MEDINA RAMOS FERNANDO	1	0			S									X								230301	60.000	7.200	0	0	0	0	EPS005	60.000	0	14-11	60.000	5	0	CCF24	60.000	0	0	0	0	0	0
12	CC	98588603	URIBE SUAREZ WILMAR	1	0			S								X									25-14	1.332.766	213.300	0	0	0	0	EPS008	1.332.766	53.400	14-11	1.332.766	5	92.800	CCF24	1.332.766	53.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA PAGA FEBRERO 2024

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901739616-8	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	CRA 14 B 118 72 OF 102	6019371654	consorciozipaquiragkg@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				12	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	08/02/2024	74564514	$4.114.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	200.000	0		0		0	2	400	0	200.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	82.900	0		0		0	2	200	0	83.100	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.300	0		0		0	2	100	0	52.400	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	68.900	0		0		0	2	200	0	69.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	123.300	0		0		0	2	300	0	123.600	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	29.500	0		0		0	2	100	0	29.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.108.900	0	0	0	0	2	2.000	0	1.110.900	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	914.700	0	0	0	0	2	1.700	0	916.400	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	968.700				968.700	2	1.800	970.500			9.687	970.500	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	556.900	2	1.100	558.000	12

PAGADA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901739616-8	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	CRA 14 B 118 72 OF 102	6019371654	consorciozipaquiragkg@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				12	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	08/02/2024	74564514	$4.114.000	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	556.900	558.200
Pensión	2	2.023.600	2.027.300
Riesgos Laborales	1	968.700	970.500
CCF	1	556.900	558.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.106.100	4.114.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901739616-8	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	CRA 14 B 118 72 OF 102	6019371654	consorciozipaquiragkg@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	08/02/2024	74564514	$4.114.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	200.000	0		0		0	2	400	0	200.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	82.900	0		0		0	2	200	0	83.100	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.300	0		0		0	2	100	0	52.400	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	68.900	0		0		0	2	200	0	69.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	123.300	0		0		0	2	300	0	123.600	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	29.500	0		0		0	2	100	0	29.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.108.900	0	0	0	0	2	2.000	0	1.110.900	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	914.700	0	0	0	0	2	1.700	0	916.400	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	968.700				968.700	2	1.800	970.500			9.687	970.500	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	556.900	2	1.100	558.000	12

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901739616-8	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG		CRA 14 B 118 72 OF 102	6019371654	consorciozipaquiragkg@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	08/02/2024	74564514	$4.114.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	556.900	558.200
Pensión	2	2.023.600	2.027.300
Riesgos Laborales	1	968.700	970.500
CCF	1	556.900	558.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.106.100	4.114.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901739616-8	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG		CRA 14 B 118 72 OF 102	6019371654	consorciozipaquiragkg@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					12	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2024-02	2024-01	E	08/02/2024	74564514	$4.114.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1014288985	ROCHA SUAREZ ANGEL DAVID	1	0			S	X																230301	260.000	41.600	0	0	0	0	EPS005	260.000	10.400	14-11	260.000	5	18.100	CCF24	260.000	10.400	0	0	0	0	0
2	CC	1075671149	BALLEN ALBA ANDERSON WILMAR	1	0			S	X							X									230301	737.128	118.000	0	0	0	0	ESSC24	737.128	29.500	14-11	737.128	5	51.400	CCF24	737.128	29.500	0	0	0	0	0
3	CC	1075685512	SANCHEZ MALAVER KEVIN ADRIAN	1	0			S								X									230301	2.087.926	334.100	0	0	0	0	EPS017	2.087.926	83.600	14-11	2.087.926	5	145.400	CCF24	2.087.926	83.600	0	0	0	0	0
4	CC	15306458	SUAREZ RUIZ FERNANDO	1	4			S								X										0	0	0	0	0	0	EPS010	1.721.117	68.900	14-11	1.721.117	5	119.800	CCF24	1.721.117	68.900	0	0	0	0	0
5	CC	52377646	GUERRA OLIVELLA XURY ROSA	1	0			S		X															230301	583.334	93.400	0	0	0	0	EPS005	583.334	23.400	14-11	583.334	5	40.700	CCF24	583.334	23.400	0	0	0	0	0
6	PT	6029088	ALMARAT SILVA JOSE RAFAEL	1	0			S								X									230301	871.653	139.500	0	0	0	0	EPS008	871.653	34.900	14-11	871.653	5	60.700	CCF24	871.653	34.900	0	0	0	0	0
7	PT	6029088	ALMARAT SILVA JOSE RAFAEL	1	0			S									X								230301	606.667	72.900	0	0	0	0	EPS008	606.667	0	14-11	606.667	5	0	CCF24	606.667	0	0	0	0	0	0
8	PT	6036181	DIAZ IRAZABAL MOISES BENITO	1	0			S		X															230301	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS008	216.667	8.700	14-11	216.667	5	15.100	CCF24	216.667	8.700	0	0	0	0	0
9	CC	72337666	ROMERO ALVAREZ EDWIN ALBERTO	1	0			S	X							X									230301	490.585	78.500	0	0	0	0	EPS017	490.585	19.700	14-11	490.585	5	34.200	CCF24	490.585	19.700	0	0	0	0	0
10	CC	79130654	CORTES MIRQUE JUAN MANUEL	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS001	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	5	348.000	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
11	CC	79915745	GARCIA VARGAS LUIS DARIO	1	0			S		X															25-14	500.000	80.000	0	0	0	0	EPS017	500.000	20.000	14-11	500.000	5	34.800	CCF24	500.000	20.000	0	0	0	0	0
12	CC	80539810	MEDINA RAMOS FERNANDO	1	0			S	X	X						X									230301	1.226.064	196.200	0	0	0	0	EPS005	1.226.064	49.100	14-11	1.226.064	5	85.400	CCF24	1.226.064	49.100	0	0	0	0	0
13	CC	98588603	URIBE SUAREZ WILMAR	1	0			S		X															25-14	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS008	216.667	8.700	14-11	216.667	5	15.100	CCF24	216.667	8.700	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

D-3. INFORME SISO

Se anexa el informe de Seguridad del mes de enero y febrero de 2024

E CONTROL AMBIENTAL

E.1- Impactos Ambientales

E.2- Cantera para suministro

E.2.1 Se anexa documentos ambientales cantera la quinta.
E.2.2 Se anexa documentos ambientales planta de asfalto Castro Tcherassi
E.2.3 Se anexa documentos ambientales planta de asfalto Paviobras

Se anexa **Certificado de registro minero GEWG-02**
Registro único de comercialización de minerales RUCOM - 2020090117470.

E.3- Control maquinaria y equipo.

Se anexa control de equipos del mes de enero y febrero de 2024

E-4- Manejo integral de residuos

Se realizaron trabajos de excavación, el cual el material producto de esta fue colocado en las instalaciones de la alcaldía. Parqueadero de obras públicas calle 8 con carrera 1 y en la vía del Bicentenario.

F CONCLUSIONES

F-1 Logros

Se realiza bacheo en diferentes lugares del municipio, mejorando la movilidad y la comodidad de la ciudadanía ya que estos trabajos se están realizando el lugar de alta afluencia y reemplazando asfalto en baches que con daños muy grandes.
Frecuentemente la comunidad nos resalta el bue trabajo realizado.

F.2- Dificultades

- Se han presentado represamiento de vehículos sobre la carrera 10, calle 8, carrera 9 y calle17 .

F-3 Recomendaciones

Como el parcheo o bacheo se realiza solamente como operación de mantenimiento rutinario y, por lo tanto, va a quedar expuesto al tránsito, los bordes del parche se deberán sellar para prevenir el ingreso de agua u otras sustancias deletéreas, ya que estas afectan la capacidad portante del pavimento y puede generar daños prematuros a los trabajos realizados.
