

Id	Modo de tarea	% trabajo completado	%Planejado	Task Name	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin
0		**40%**	**40%**	**Cronograma IDECAR**	**234 días**	**7.733,72 hrs**	**lun 3/07/23**	**vie 31/05/24**
1		100%	100%	Início	0 días	0 hrs	lun 3/07/23	lun 3/07/23
2		**98%**	**100%**	**Paquete 1 - Produtos**	**96 días**	**1.630,28 hrs**	**lun 3/07/23**	**vie 17/11/23**
3		99%	100%	Realizar acompañamiento gerencial - Paquete 1	96 días	384 hrs	lun 3/07/23	vie 17/11/23
4		**100%**	**100%**	**Planeción**	**9 días**	**48 hrs**	**lun 3/07/23**	**jue 13/07/23**
5		100%	100%	Preparar Plan de Gestión de Proyecto (PGP)	5 días	20 hrs	lun 3/07/23	vie 7/07/23
6		100%	100%	Preparar la lista de productos y solicitara GSP licenciamie	1 día	4 hrs	lun 3/07/23	lun 3/07/23
7		100%	100%	Preparar material sobre hardware necesario	2 días	8 hrs	lun 3/07/23	mar 4/07/23
8		100%	100%	Preparar material de Kick-Off	2 días	4 hrs	lun 10/07/23	mar 11/07/23
9		100%	100%	MARCO: Identificación de participantes kick-off	0 días	0 hrs	mar 11/07/23	mar 11/07/23
10		100%	100%	Realizar reunión de Kick-Off	1 día	8 hrs	mié 12/07/23	mié 12/07/23
11		100%	100%	Reunión con cliente para formalizar infraestructura de se	1 día	4 hrs	jue 13/07/23	jue 13/07/23
12		100%	100%	MARCO: Firma de Acta de Kick-off	0 días	0 hrs	mié 12/07/23	mié 12/07/23
13		100%	100%	Planeación Finalizada	0 días	0 hrs	jue 13/07/23	jue 13/07/23
14		**100%**	**100%**	**Preparación del entorno de desarrollo**	**9 días**	**104 hrs**	**lun 10/07/23**	**jue 20/07/23**
15		100%	100%	MARCO: Servidores Disponibles	0 días	0 hrs	lun 10/07/23	lun 10/07/23
16		100%	100%	Preparar máquinas virtuales de servidor	3 días	24 hrs	lun 10/07/23	mié 12/07/23
17		100%	100%	Instalar y Configurar - M.App Enterprise	3 días	24 hrs	jue 13/07/23	lun 17/07/23
18		100%	100%	Instalar y Configurar - ERDAS Apollo	3 días	24 hrs	vie 14/07/23	mar 18/07/23
19		100%	100%	Instalar y Configurar - Geospatial Portal y SDI	1 día	8 hrs	mié 19/07/23	mié 19/07/23
20		100%	100%	Instalar y Configurar - S|Portal	1 día	8 hrs	jue 20/07/23	jue 20/07/23
21		100%	100%	Instalar y Configurar - LuciadFusion Terrain Analysis Engi	0,5 días	4 hrs	mar 18/07/23	mar 18/07/23
22		100%	100%	Instalar y Configurar - LuciadFusion Infrastructure Standa	0,5 días	4 hrs	mar 18/07/23	mar 18/07/23
23		100%	100%	Instalar y Configurar - IMAGINE	0,5 días	4 hrs	jue 20/07/23	jue 20/07/23
24		100%	100%	Instalar y Configurar - Expansion Pack y SAR Interferome	0,5 días	4 hrs	jue 20/07/23	jue 20/07/23
25		100%	100%	Preparación de entorno finalizada	0 días	0 hrs	jue 20/07/23	jue 20/07/23
26		100%	100%	ENTREGABLE PRODUCTO No. 1. LICENCIAMIENTO PERPE	0 días	0 hrs	jue 20/07/23	jue 20/07/23
27		**100%**	**100%**	**Carga de datos y configuraciones DEV**	**19,5 días**	**248,54 hrs**	**mié 19/07/23**	**mar 15/08/23**
28		100%	100%	MARCO: DUMP Disponible - VPN	0 días	0 hrs	mié 19/07/23	mié 19/07/23
29		100%	100%	Cargar datos Iniciales y Configurar - M.App Enterprise (N	11 días	39,24 hrs	mié 19/07/23	mié 2/08/23
30		100%	100%	Cargar datos Iniciales y Configurar - ERDAS Apollo (Mock	10 días	40 hrs	mié 19/07/23	jue 3/08/23
31		100%	100%	Cargar datos Inciales y Configurar - Geospatial Portal y S	8 días	56,26 hrs	jue 3/08/23	mar 15/08/23
32		100%	100%	Cargar datos Iniciales y Configurar - LuciadFusion Terrain	8 días	56,52 hrs	mié 2/08/23	vie 11/08/23
33		100%	100%	Cargar datos Iniciales y Configurar - LuciadFusion Infrastr	8 días	56,52 hrs	mié 19/07/23	vie 28/07/23
34		100%	100%	Datos y configuraciones completas	0 días	0 hrs	lun 14/08/23	lun 14/08/23
35		**100%**	**100%**	**Especificación Funcional - Catalogo Metadatos + Vectorial**	**64 días**	**165,6 hrs**	**jue 20/07/23**	**vie 20/10/23**
36		100%	100%	Inicio Contrucción Espec Func	0 días	0 hrs	jue 20/07/23	jue 20/07/23
37		100%	100%	Identificar muestra de base de datos PESCAR para integr	15 días	60 hrs	vie 21/07/23	jue 10/08/23
38		100%	100%	Identificar muestra de base de datos SI RioBogota para ir	15 días	61,6 hrs	vie 21/07/23	jue 10/08/23
39		100%	100%	Identificar el entorno del cliente (infraestructura de la re	10 días	40 hrs	vie 4/08/23	mar 29/08/23
40		100%	100%	Presentar Espec Func. Catalog Metadat + Vectorial + Lida	0 días	0 hrs	mar 29/08/23	mar 29/08/23
41		100%	100%	Corregir Espec Func. Catalog Metadat + Vectorial + Lidar	1 día	4 hrs	mié 30/08/23	mié 30/08/23
42		100%	100%	Aprobación Espec. Func. Catalogo Metadatos	20 días	0 hrs	jue 31/08/23	jue 28/09/23
43		100%	100%	Aprobación Espec. Func. Integración Datos Vectoriales	35 días	0 hrs	jue 31/08/23	vie 20/10/23
44		100%	100%	Aprobación Espec. Func. Integración Datos Raster + Lidar	35 días	0 hrs	jue 31/08/23	vie 20/10/23
45		**93%**	**100%**	**Especificación Funcional - Geoportal**	**73 días**	**192,46 hrs**	**vie 21/07/23**	**vie 3/11/23**
46		100%	100%	Preparar especificaciones funcionales - ERDAS Apollo	8 días	64 hrs	mié 2/08/23	vie 11/08/23
47		100%	100%	Preparar especificaciones funcionales - Geospatial Portal	9 días	32,46 hrs	vie 21/07/23	mié 2/08/23
48		100%	100%	Preparar especificaciones funcionales - IMAGINE	8 días	32 hrs	vie 21/07/23	mar 1/08/23
49		100%	100%	Preparar especificaciones funcionales - Expansion Pack y	2 días	8 hrs	vie 4/08/23	lun 7/08/23
50		75%	100%	Presentar Espec Func. Geoportal	0 días	0 hrs	lun 7/08/23	lun 7/08/23
51		75%	100%	Corregir Espec Func. Geoportal	10 días	56 hrs	mar 15/08/23	lun 28/08/23
52		75%	100%	Aprobación Espec. Func. Geoportal	54 días	0 hrs	jue 17/08/23	vie 3/11/23
53		**99%**	**100%**	**Especificación Funcional - Geoanalitica / SIRIO**	**73 días**	**124,84 hrs**	**vie 21/07/23**	**vie 3/11/23**
54		100%	100%	Preparar especificaciones funcionales - M.App Enterprise	10 días	71,44 hrs	vie 21/07/23	jue 3/08/23
55		100%	100%	Preparar especificaciones funcionales - S|Portal	2 días	16 hrs	vie 21/07/23	lun 24/07/23
56		100%	100%	Preparar especificaciones funcionales - LuciadFusion Ter	3 días	21,4 hrs	vie 21/07/23	mar 25/07/23
57		100%	100%	Preparar especificaciones funcionales - LuciadFusion Infr	3 días	5,6 hrs	mar 25/07/23	mar 1/08/23
58		100%	100%	Presentar Espec Func. Geoanalitica / SIRIO	0 días	0 hrs	jue 3/08/23	jue 3/08/23
59		90%	100%	Corregir Espec Func. Geonalitica / SIRIO	5 días	10,4 hrs	vie 4/08/23	jue 10/08/23
60		90%	100%	Aprobación Espec. Func. Geoanalitica / SIRIO	57 días	0 hrs	lun 14/08/23	vie 3/11/23
61		**99%**	**100%**	**Especificación Funcional - Geoanalitica / PESCAR**	**76 días**	**124,84 hrs**	**vie 21/07/23**	**mié 8/11/23**
62		100%	100%	Preparar especificaciones funcionales - M.App Enterprise	10 días	71,44 hrs	vie 21/07/23	jue 3/08/23
63		100%	100%	Preparar especificaciones funcionales - S|Portal	2 días	16 hrs	vie 21/07/23	lun 24/07/23
64		100%	100%	Preparar especificaciones funcionales - LuciadFusion Ter	3 días	21,4 hrs	vie 21/07/23	mar 25/07/23
65		100%	100%	Preparar especificaciones funcionales - LuciadFusion Infr	3 días	5,6 hrs	mar 25/07/23	mar 1/08/23
66		90%	100%	Presentar Espec Func. Geoanalitica / PESCAR	0 días	0 hrs	jue 3/08/23	jue 3/08/23
67		90%	100%	Corregir Espec Func. Geonalitica / PESCAR	5 días	10,4 hrs	vie 4/08/23	jue 10/08/23
68		90%	100%	Aprobación Espec. Func. Geoanalitica / PESCAR	60 días	0 hrs	lun 14/08/23	mié 8/11/23
69		**100%**	**100%**	**Especificación Funcional - Arquitectura**	**56 días**	**48 hrs**	**mar 15/08/23**	**vie 3/11/23**
70		100%	100%	Preparar especificaciones funcionales - Arquitectura de l	5 días	40 hrs	mar 15/08/23	lun 21/08/23
71		100%	100%	Presentar especificaciones funcionales	0 días	0 hrs	lun 21/08/23	lun 21/08/23
72		100%	100%	Corregir Especificaciones Func Arquitectura	1 día	8 hrs	mar 22/08/23	mar 22/08/23
73		100%	100%	Aprobar especificación funcional Arquitectura	50 días	0 hrs	mié 23/08/23	vie 3/11/23
74		**100%**	**100%**	**Worshop funcional**	**57 días**	**40 hrs**	**vie 25/08/23**	**vie 17/11/23**
75		100%	100%	Catalogo Metadatos + Vectorial + Lidar/Raster	2 días	8 hrs	jue 31/08/23	vie 1/09/23
76		100%	100%	Geoportal Interno	2 días	8 hrs	jue 9/11/23	vie 10/11/23
77		100%	100%	Geoportal Externo	2 días	8 hrs	lun 13/11/23	mar 14/11/23
78		100%	100%	SIRIO	2 días	8 hrs	vie 25/08/23	lun 28/08/23
79		100%	100%	PESCAR	2 días	8 hrs	jue 16/11/23	vie 17/11/23
80		**100%**	**100%**	**Gobierno Datos- Definir objetivos y alcance**	**3 días**	**24 hrs**	**jue 10/08/23**	**lun 14/08/23**
81		100%	100%	Determinación de objetivos	0,5 días	4 hrs	jue 10/08/23	jue 10/08/23
82		100%	100%	Determinación de principios	1 día	8 hrs	jue 10/08/23	vie 11/08/23
83		100%	100%	Determinación de directrices	0,5 días	4 hrs	vie 11/08/23	vie 11/08/23
84		100%	100%	Beneficios esperados	0,5 días	4 hrs	lun 14/08/23	lun 14/08/23
85		100%	100%	Retos esperados	0,5 días	4 hrs	lun 14/08/23	lun 14/08/23
86		**96%**	**100%**	**Gobierno Datos - Inventario**	**79,45 días**	**126 hrs**	**lun 24/07/23**	**jue 16/11/23**
87		100%	100%	Definición del matriz	0,5 días	4 hrs	lun 24/07/23	lun 24/07/23
88		95%	100%	Recolección de datos	49 días	98 hrs	mié 23/08/23	vie 3/11/23
89		100%	100%	Categorización de datos	3 días	6 hrs	vie 3/11/23	mié 8/11/23

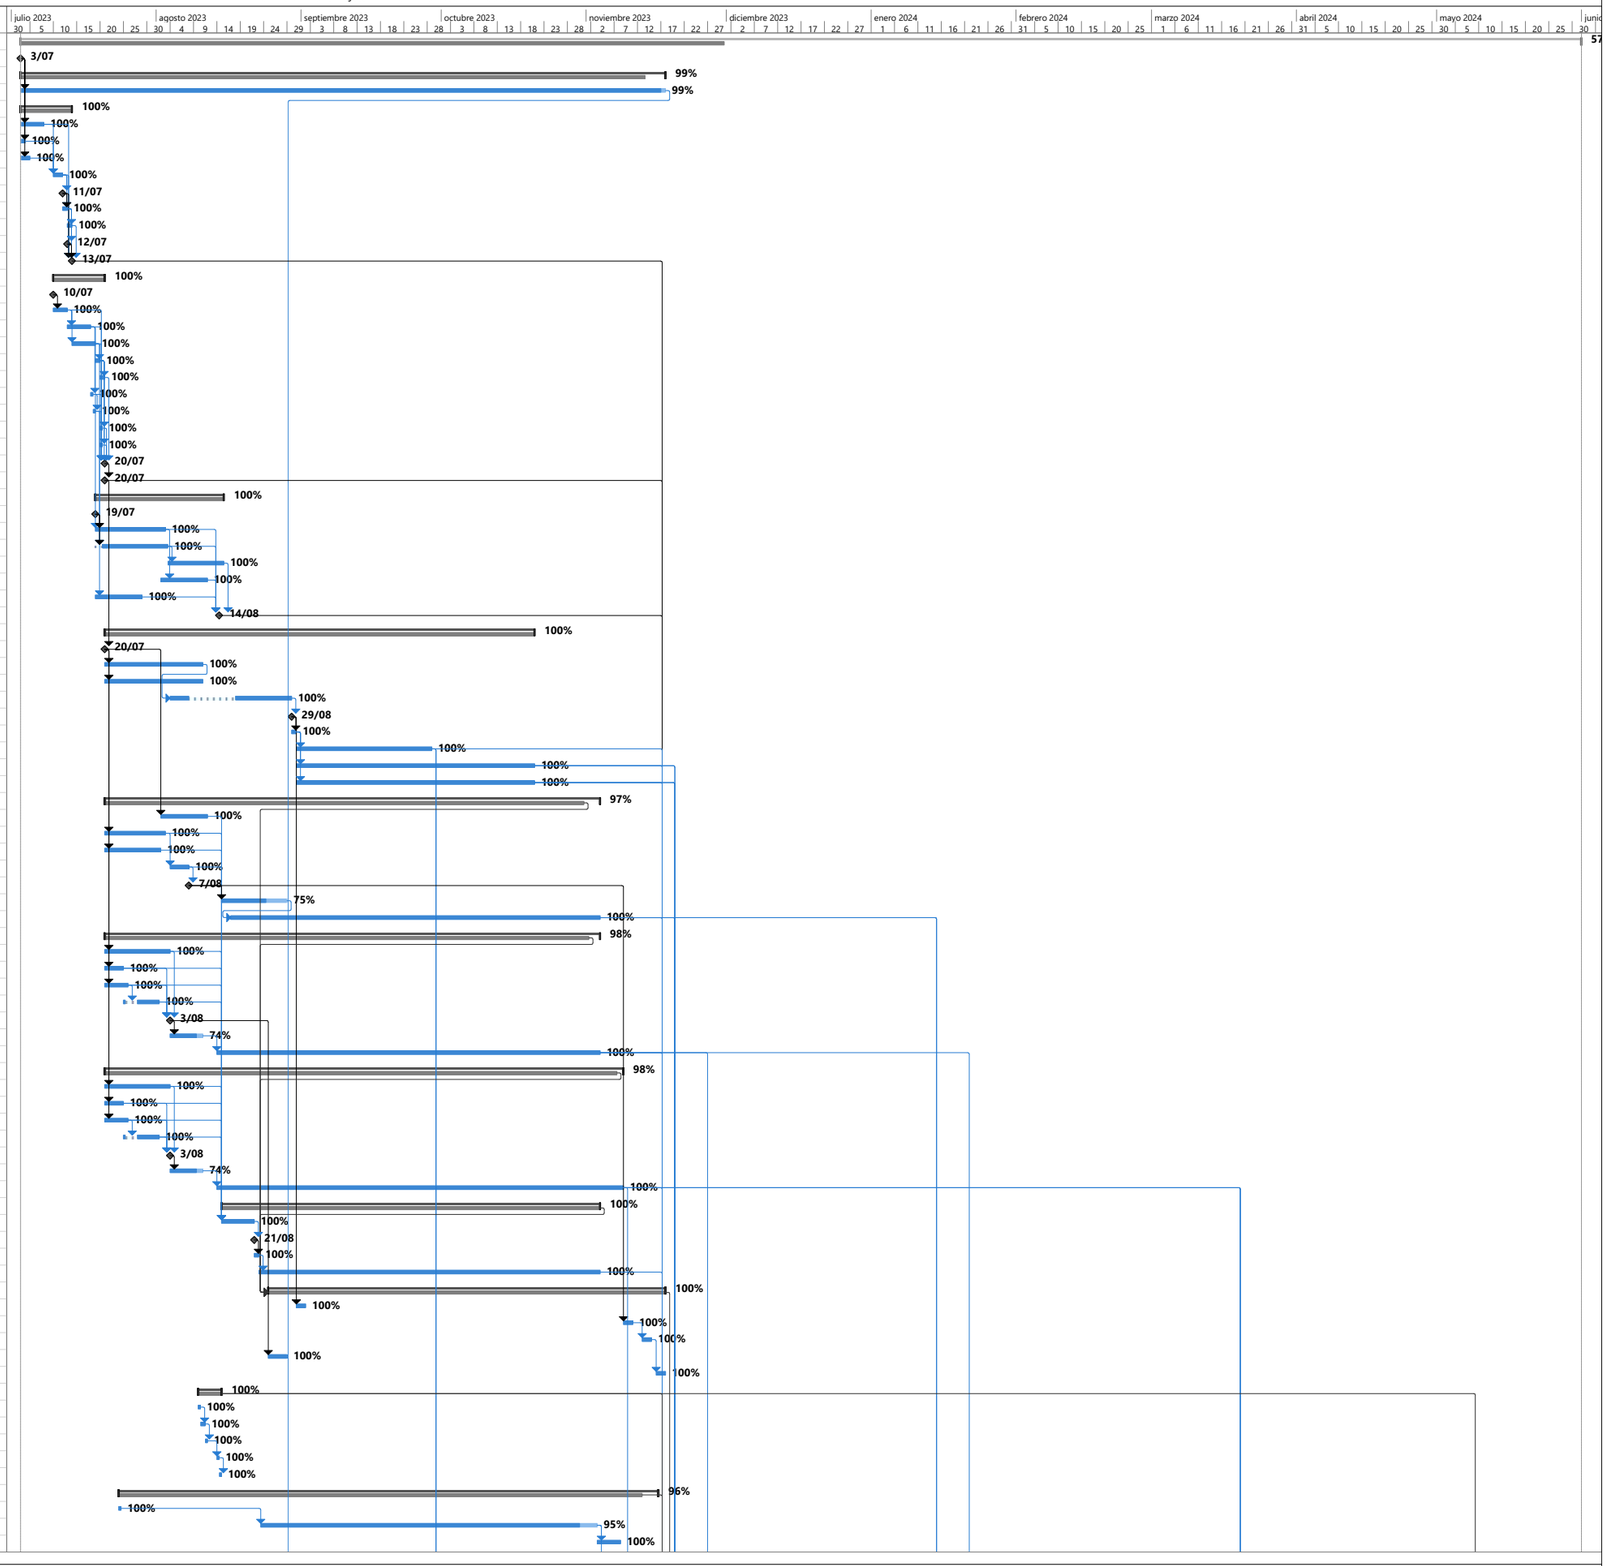


Crítica · Tarefa · Tarefa Manual · Somente duração · Marco de Linha de Base · Resumo · Tarefas externas · Marco Inativo
Divisão Crítica · Divisão · Somente início · Linha de Base · Marco · Resumo Manual · Marco externo · Resumo Inativo
Andamento Crítico · Andamento da Tarefa · Somente término · Divisão da Linha de Base · Andamento do Resumo · Resumo do projeto · Tarefa Inativa · Data limite

Id	Modo de tarea	% trabajo completado	%Planejado	Task Name	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin
90		100%	100%	Catalogar Plantillas de datos	2 días	4 hrs	vie 3/11/23	mar 7/11/23
91		100%	100%	Revisión de conexiones y estandares de datos	3 días	6 hrs	mar 7/11/23	vie 10/11/23
92		100%	100%	Estadisticas descriptivas	3 días	6 hrs	vie 27/10/23	mar 14/11/23
93		100%	100%	Entregar informe para CAR	1 día	2 hrs	mar 14/11/23	jue 16/11/23
94		100%	100%	Paquete 1 completo	0 días	0 hrs	vie 17/11/23	vie 17/11/23
95		**27%**	**28%**	**Paquete 2 - Desarrollo**	**187 días**	**5.351,44 hrs**	**mié 30/08/23**	**vie 24/05/24**
96		47%	47%	Realizar acompañamento gerencial - Paquete 2	73 días	292 hrs	jue 31/08/23	mié 28/02/24
97		**100%**	**100%**	**Gobierno datos - Establecer marco normativo y regulatori**	**52 días**	**260 hrs**	**mié 30/08/23**	**mar 14/11/23**
98		100%	100%	Legislación internacional	15 días	60 hrs	mié 30/08/23	mié 20/09/23
99		100%	100%	Legislación nacional	15 días	60 hrs	lun 11/09/23	jue 5/10/23
100		100%	100%	Identificación normas ICDE - IDECA	15 días	60 hrs	mié 20/09/23	vie 20/10/23
101		100%	100%	Diseño de políticas institucionales CAR	20 días	80 hrs	lun 2/10/23	mar 14/11/23
102		**89%**	**88%**	**Gobierno datos - Adquisición y Calidad**	**74,48 días**	**360,64 hrs**	**mié 6/09/23**	**mar 26/12/23**
103		100%	100%	Requisitos de datos	24 días	104,64 hrs	jue 21/09/23	jue 26/10/23
104		100%	100%	Fuentes de datos	24 días	96 hrs	mié 6/09/23	jue 16/11/23
105		94%	94%	Evaluación de calidad	16 días	64 hrs	jue 21/09/23	mar 28/11/23
106		62%	62%	Normalización y transformación	24 días	96 hrs	mar 3/10/23	mar 26/12/23
107		**51%**	**51%**	**Gobierno datos - Marco Metadatos**	**91 días**	**440 hrs**	**mié 27/09/23**	**mié 7/02/24**
108		100%	100%	Estándares y esquemas	20 días	40 hrs	mié 27/09/23	lun 20/11/23
109		72%	72%	Elementos metadatos	20 días	80 hrs	jue 5/10/23	mié 13/12/23
110		48%	48%	Vocabulario	20 días	160 hrs	mié 11/10/23	jue 11/01/24
111		32%	33%	Plantillas de metadatos	20 días	160 hrs	mié 18/10/23	mié 7/02/24
112		**65%**	**65%**	**Gobierno datos - Seguridad y privacidad de los datos**	**59,7 días**	**120 hrs**	**lun 9/10/23**	**vie 5/01/24**
113		100%	100%	Identificación de datos sensibles	25 días	50 hrs	mié 11/10/23	vie 17/11/23
114		70%	71%	Evaluación de riesgos	20 días	40 hrs	lun 9/10/23	mié 13/12/23
115		0%	0%	Politicas de seguridad y privacidad	15 días	30 hrs	mié 13/12/23	vie 5/01/24
116		**0%**	**0%**	**Gobierno datos - Interoperabilidad de los datos**	**60 días**	**120 hrs**	**vie 5/01/24**	**vie 29/03/24**
117		0%	0%	Definición de Estándares	15 días	30 hrs	vie 5/01/24	vie 26/01/24
118		0%	0%	Formatos y Protocolos	15 días	30 hrs	vie 26/01/24	vie 16/02/24
119		0%	0%	Servicios WEB Geoespaciales	15 días	30 hrs	vie 16/02/24	vie 8/03/24
120		0%	0%	Realizar pruebas de Validación	15 días	30 hrs	vie 8/03/24	vie 29/03/24
121		**14%**	**15%**	**Construción DEV+QA**	**166 días**	**3.111,6 hrs**	**vie 29/09/23**	**vie 24/05/24**
122		**41%**	**45%**	**Catalogo Metadatos + Vectorial + Lidar/Raster**	**77 días**	**1.013,6 hrs**	**vie 29/09/23**	**lun 22/01/24**
123		**62%**	**69%**	**Configuración Catalogo de Metadatos**	**77 días**	**581,6 hrs**	**vie 29/09/23**	**lun 22/01/24**
124		90%	100%	Desarrollo de conexiones con catalogos Externos	27 días	176,8 hrs	vie 29/09/23	mié 8/11/23
125		90%	100%	Desarrollar Conexión con Catalogo Luciad Fusion	27 días	176,8 hrs	vie 29/09/23	mié 22/11/23
126		14%	14%	Configuración AD	10 días	80 hrs	mié 22/11/23	mié 6/12/23
127		2%	0%	Configurar usuarios y Roles	3 días	24 hrs	vie 24/11/23	lun 11/12/23
128		75%	100%	Traducción Apollo	6 días	24 hrs	vie 10/11/23	lun 20/11/23
129		75%	100%	Plan de Pruebas - Carta de Pruebas	4 días	16 hrs	mar 21/11/23	vie 24/11/23
130		0%	0%	Documentos recreación Pruebas — CASOS DE PRUE	3 días	12 hrs	lun 27/11/23	mié 29/11/23
131		0%	0%	Ciclo de Pruebas finalizado	0 días	0 hrs	mié 6/12/23	mié 6/12/23
132		0%	0%	Manual Técnico	10 días	40 hrs	lun 4/12/23	vie 15/12/23
133		0%	0%	Arquitectura Software	4 días	16 hrs	mar 9/01/24	vie 12/01/24
134		0%	0%	Arquitectura Técnologica	4 días	16 hrs	mié 17/01/24	lun 22/01/24
135		0%	0%	Construcción Finalizada	0 días	0 hrs	vie 15/12/23	vie 15/12/23
136		**13%**	**13%**	**Configuración Integración Datos Vectoriales**	**27 días**	**216 hrs**	**lun 20/11/23**	**mié 27/12/23**
137		23%	23%	Catalogo de plantillas inventario datos	15 días	120 hrs	lun 20/11/23	vie 8/12/23
138		0%	0%	Configuración de integración	12 días	96 hrs	lun 11/12/23	mié 27/12/23
139		0%	0%	Construcción Finalizada	0 días	0 hrs	mié 27/12/23	mié 27/12/23
140		**13%**	**13%**	**Configuración Integración Datos Raster + Lidar**	**27 días**	**216 hrs**	**lun 20/11/23**	**mié 27/12/23**
141		23%	23%	Catalogo de plantillas inventario datos	15 días	120 hrs	lun 20/11/23	vie 8/12/23
142		0%	0%	Configuración de integración	12 días	96 hrs	lun 11/12/23	mié 27/12/23
143		0%	0%	Construcción Finalizada	0 días	0 hrs	mié 27/12/23	mié 27/12/23
144		**2%**	**2%**	**GeoPortal (características generales y permisos del acc**	**133 días**	**946 hrs**	**lun 20/11/23**	**vie 24/05/24**
145		**1%**	**0%**	**Configuración GeoPortal Interno Catalog Explorer**	**84 días**	**400 hrs**	**lun 15/01/24**	**jue 9/05/24**
146		1%	0%	Configuración de capas Base en áreas de trabajo	25 días	200 hrs	lun 15/01/24	vie 16/02/24
147		0%	0%	Consulta customizada interno/externo	20 días	160 hrs	lun 19/02/24	vie 15/03/24
148		0%	0%	Plan de Pruebas	5 días	20 hrs	mar 9/04/24	lun 15/04/24
149		0%	0%	Documentos recreación Pruebas — CASOS DE PRUE	5 días	20 hrs	vie 3/05/24	jue 9/05/24
150		0%	0%	Ciclo de Pruebas finalizado	0 días	0 hrs	jue 9/05/24	jue 9/05/24
151		**3%**	**3%**	**Configuración GeoPortal Externo Geoespatial Portal**	**109 días**	**524 hrs**	**lun 20/11/23**	**lun 22/04/24**
152		1%	0%	Configuración de capas Base en áreas de trabajo	25 días	200 hrs	lun 15/01/24	vie 16/02/24
153		0%	0%	Consulta customizada interno/externo	20 días	160 hrs	lun 19/02/24	vie 15/03/24
154		0%	0%	Desarrollo Acceder a servicio CSW de otras fuentes	5 días	40 hrs	lun 18/03/24	vie 22/03/24
155		0%	0%	Configurar Layout con datos CAR	10 días	80 hrs	lun 25/03/24	vie 5/04/24
156		60%	100%	Traducción Software Geoportal + SDI	5 días	20 hrs	lun 20/11/23	vie 24/11/23
157		0%	0%	Plan de Pruebas	3 días	12 hrs	lun 15/04/24	mié 17/04/24
158		0%	0%	Documentos recreación Pruebas — CASOS DE PRUE	3 días	12 hrs	jue 18/04/24	lun 22/04/24
159		0%	0%	Ciclo de Pruebas finalizado	0 días	0 hrs	lun 22/04/24	lun 22/04/24
160		**0%**	**0%**	**Documentación técnica y de soporte**	**11 días**	**22 hrs**	**vie 10/05/24**	**vie 24/05/24**
161		0%	0%	Manual Técnico	5 días	10 hrs	vie 10/05/24	jue 16/05/24
162		0%	0%	Arquitectura Software	3 días	6 hrs	vie 17/05/24	mar 21/05/24
163		0%	0%	Arquitectura Técnologica	3 días	6 hrs	mié 22/05/24	vie 24/05/24
164		**0%**	**0%**	**Interfaz Geoanalitica SI RIOBOGOTA**	**95 días**	**756 hrs**	**lun 27/11/23**	**mar 9/04/24**
165		0%	0%	Traducción M.App Enterprise	5 días	20 hrs	lun 27/11/23	vie 1/12/23
166		**0%**	**0%**	**Configuración Funcionalidades Transversales**	**17 días**	**116 hrs**	**lun 22/01/24**	**mar 13/02/24**
167		0%	0%	Configuración Geoanalitica	12 días	96 hrs	lun 22/01/24	mar 6/02/24
168		0%	0%	Plan de Pruebas	3 días	12 hrs	mié 7/02/24	vie 9/02/24
169		0%	0%	Documentos recreación Pruebas — CASOS DE PRUE	2 días	8 hrs	lun 12/02/24	mar 13/02/24
170		0%	0%	Ciclo de Pruebas finalizado	0 días	0 hrs	mar 13/02/24	mar 13/02/24
171		**0%**	**0%**	**Interfaz Geoanalitica SI RIOBOGOTA - Modulo Recurs**	**8 días**	**56 hrs**	**mié 7/02/24**	**vie 16/02/24**
172		0%	0%	Configuración Geoanalitica	6 días	48 hrs	mié 7/02/24	mié 14/02/24
173		0%	0%	Plan de Pruebas	1 día	4 hrs	jue 15/02/24	jue 15/02/24
174		0%	0%	Documentos recreación Pruebas — CASOS DE PRUE	1 día	4 hrs	vie 16/02/24	vie 16/02/24
175		0%	0%	Ciclo de Pruebas finalizado	0 días	0 hrs	vie 16/02/24	vie 16/02/24
176		**0%**	**0%**	**Interfaz Geoanalitica SI RIOBOGOTA - Modulo Recurs**	**9 días**	**56 hrs**	**mié 7/02/24**	**lun 19/02/24**
177		0%	0%	Configuración Geoanalitica	6 días	48 hrs	mié 7/02/24	mié 14/02/24
178		0%	0%	Plan de Pruebas	1 día	4 hrs	jue 15/02/24	jue 15/02/24
179		0%	0%	Documentos recreación Pruebas — CASOS DE PRUE	1 día	4 hrs	lun 19/02/24	lun 19/02/24

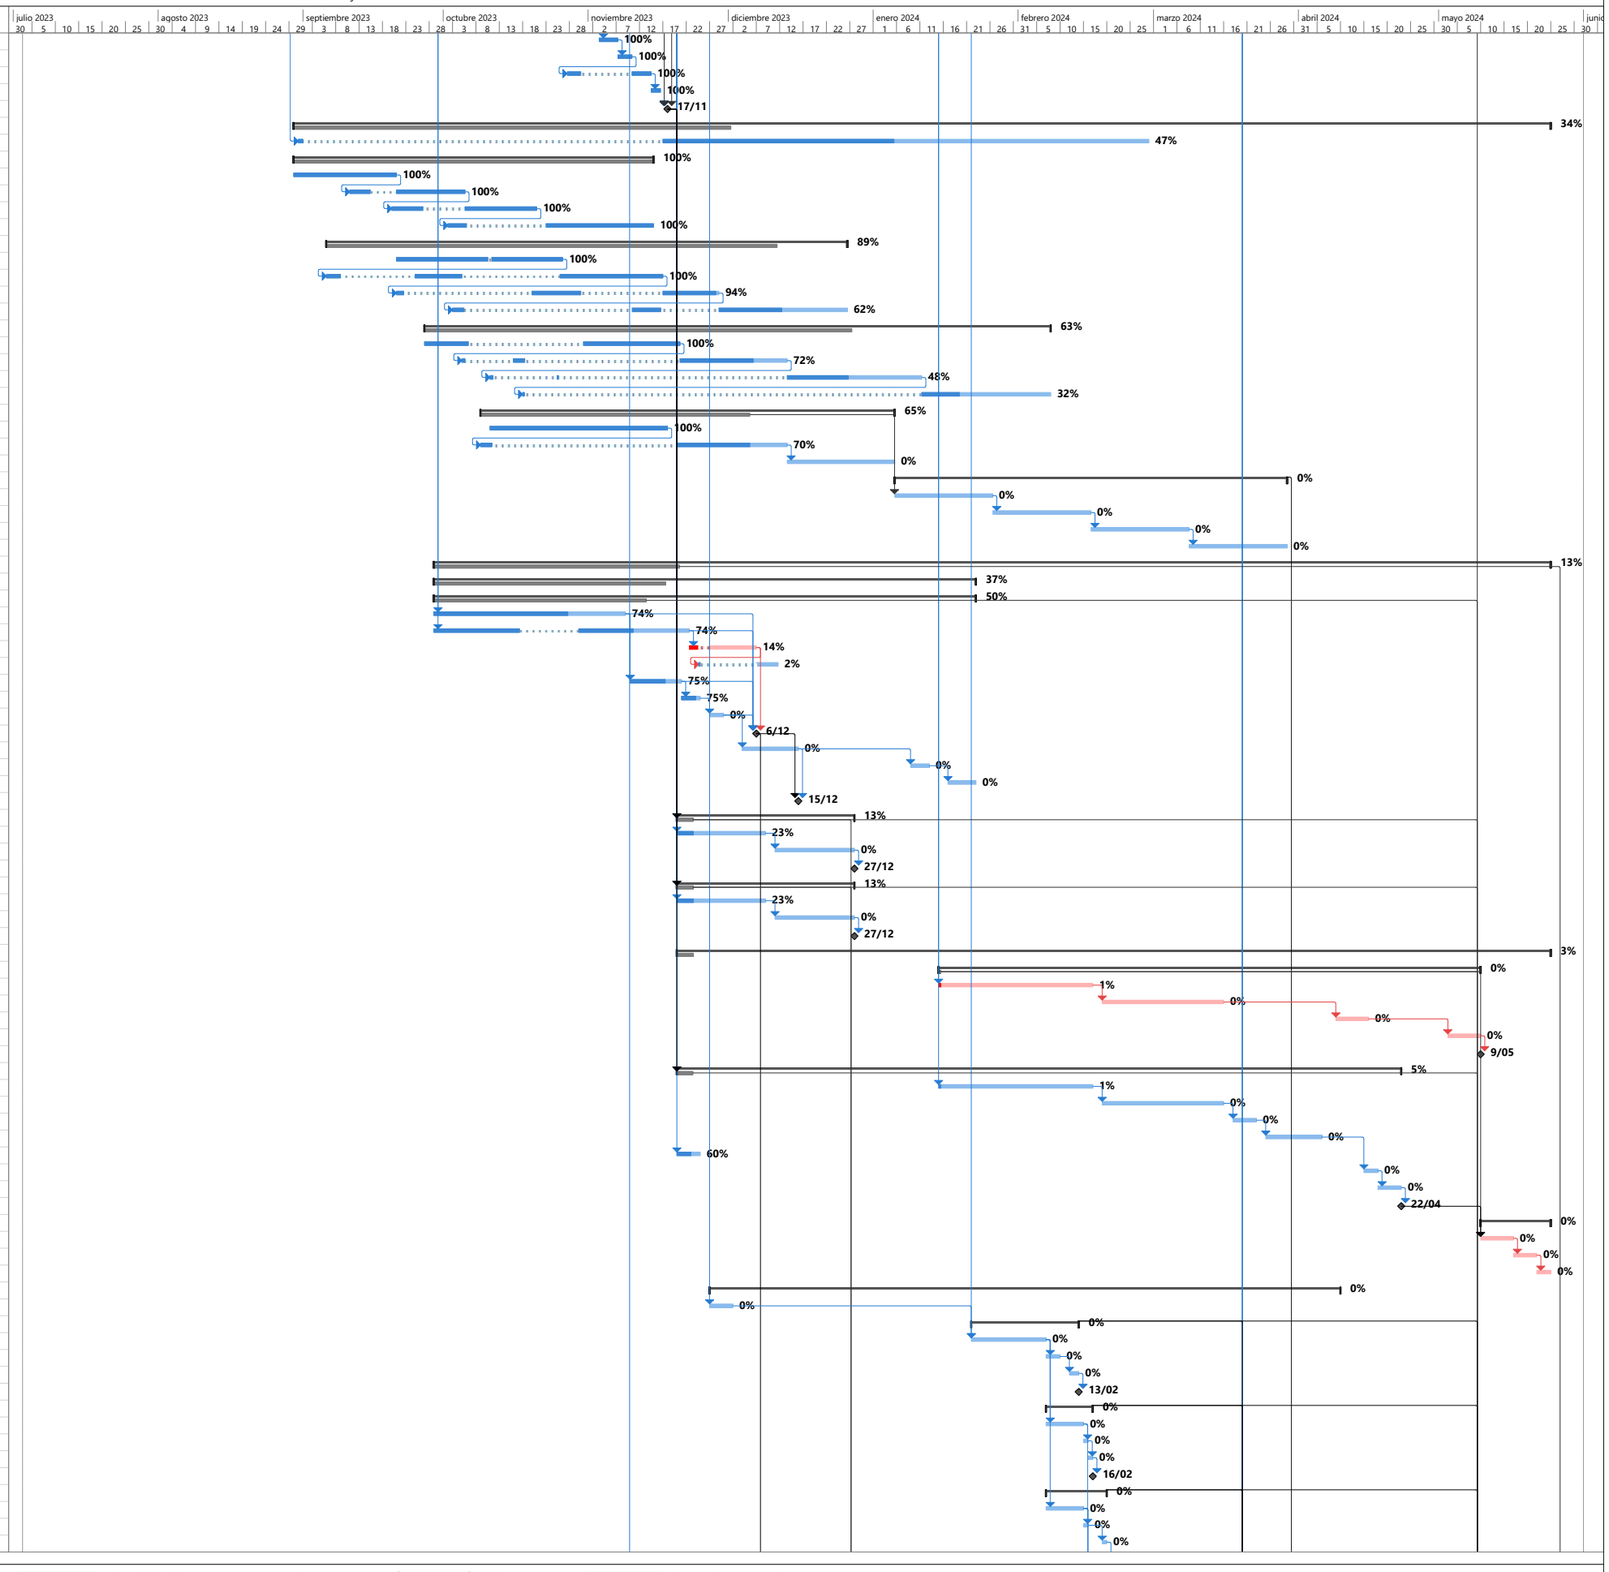


Crítica · Tarefa · Tarefa Manual · Somente duração · Marco de Linha de Base · Resumo · Tarefas externas · Marco Inativo
Divisão Crítica · Divisão · Somente início · Linha de Base · Marco · Resumo Manual · Marco externo · Resumo Inativo
Andamento Crítico · Andamento da Tarefa · Somente término · Divisão da Linha de Base · Andamento do Resumo · Resumo do projeto · Tarefa Inativa · Data limite

Id	Modo de tarea	% trabajo completado	%Planejado	Task Name	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin
180		0%	0%	Ciclo de Pruebas finalizado	0 días	0 hrs	lun 19/02/24	lun 19/02/24
181		**0%**	**0%**	**Interfaz Geoanalitica SI RIOBOGOTA - Modulo Recurs**	**6 días**	**56 hrs**	**jue 15/02/24**	**jue 22/02/24**
182		0%	0%	Configuración Geoanalitica	6 días	48 hrs	jue 15/02/24	jue 22/02/24
183		0%	0%	Plan de Pruebas	1 día	4 hrs	vie 16/02/24	vie 16/02/24
184		0%	0%	Documentos recreación Pruebas — CASOS DE PRUE	1 día	4 hrs	lun 19/02/24	lun 19/02/24
185		0%	0%	Ciclo de Pruebas finalizado	0 días	0 hrs	lun 19/02/24	lun 19/02/24
186		**0%**	**0%**	**Interfaz Geoanalitica SI RIOBOGOTA - Modulo Orden**	**8 días**	**56 hrs**	**jue 15/02/24**	**lun 26/02/24**
187		0%	0%	Configuración Geoanalitica	6 días	48 hrs	jue 15/02/24	jue 22/02/24
188		0%	0%	Plan de Pruebas	1 día	4 hrs	vie 23/02/24	vie 23/02/24
189		0%	0%	Documentos recreación Pruebas — CASOS DE PRUE	1 día	4 hrs	lun 26/02/24	lun 26/02/24
190		0%	0%	Ciclo de Pruebas finalizado	0 días	0 hrs	lun 26/02/24	lun 26/02/24
191		**0%**	**0%**	**Interfaz Geoanalitica SI RIOBOGOTA - Modulo Gestió**	**6 días**	**56 hrs**	**vie 23/02/24**	**vie 1/03/24**
192		0%	0%	Configuración Geoanalitica	6 días	48 hrs	vie 23/02/24	vie 1/03/24
193		0%	0%	Plan de Pruebas	1 día	4 hrs	vie 23/02/24	vie 23/02/24
194		0%	0%	Documentos recreación Pruebas — CASOS DE PRUE	1 día	4 hrs	mar 27/02/24	mar 27/02/24
195		0%	0%	Ciclo de Pruebas finalizado	0 días	0 hrs	mar 27/02/24	mar 27/02/24
196		**0%**	**0%**	**Interfaz Geoanalitica SI RIOBOGOTA - Modulo Areas**	**6 días**	**56 hrs**	**vie 23/02/24**	**vie 1/03/24**
197		0%	0%	Configuración Geoanalitica	6 días	48 hrs	vie 23/02/24	vie 1/03/24
198		0%	0%	Plan de Pruebas	1 día	4 hrs	lun 26/02/24	lun 26/02/24
199		0%	0%	Documentos recreación Pruebas — CASOS DE PRUE	1 día	4 hrs	mar 27/02/24	mar 27/02/24
200		0%	0%	Ciclo de Pruebas finalizado	0 días	0 hrs	mar 27/02/24	mar 27/02/24
201		**0%**	**0%**	**Interfaz Geoanalitica SI RIOBOGOTA - Modulo Biodiv**	**6 días**	**56 hrs**	**lun 4/03/24**	**lun 11/03/24**
202		0%	0%	Configuración Geoanalitica	6 días	48 hrs	lun 4/03/24	lun 11/03/24
203		0%	0%	Plan de Pruebas	1 día	4 hrs	lun 4/03/24	lun 4/03/24
204		0%	0%	Documentos recreación Pruebas — CASOS DE PRUE	1 día	4 hrs	mar 5/03/24	mar 5/03/24
205		0%	0%	Ciclo de Pruebas finalizado	0 días	0 hrs	mar 5/03/24	mar 5/03/24
206		**0%**	**0%**	**Interfaz Geoanalitica SI RIOBOGOTA - Modulo Mineri**	**6 días**	**56 hrs**	**lun 4/03/24**	**lun 11/03/24**
207		0%	0%	Configuración Geoanalitica	6 días	48 hrs	lun 4/03/24	lun 11/03/24
208		0%	0%	Plan de Pruebas	1 día	4 hrs	lun 4/03/24	lun 4/03/24
209		0%	0%	Documentos recreación Pruebas — CASOS DE PRUE	1 día	4 hrs	mar 5/03/24	mar 5/03/24
210		0%	0%	Ciclo de Pruebas finalizado	0 días	0 hrs	mar 5/03/24	mar 5/03/24
211		**0%**	**0%**	**Interfaz Geoanalitica SI RIOBOGOTA - Modulo Gestió**	**6 días**	**56 hrs**	**mar 12/03/24**	**mar 19/03/24**
212		0%	0%	Configuración Geoanalitica	6 días	48 hrs	mar 12/03/24	mar 19/03/24
213		0%	0%	Plan de Pruebas	1 día	4 hrs	mar 12/03/24	mar 12/03/24
214		0%	0%	Documentos recreación Pruebas — CASOS DE PRUE	1 día	4 hrs	mié 13/03/24	mié 13/03/24
215		0%	0%	Ciclo de Pruebas finalizado	0 días	0 hrs	mié 13/03/24	mié 13/03/24
216		**0%**	**0%**	**Interfaz Geoanalitica SI RIOBOGOTA - Modulo Proyec**	**6 días**	**56 hrs**	**mar 12/03/24**	**mar 19/03/24**
217		0%	0%	Configuración Geoanalitica	6 días	48 hrs	mar 12/03/24	mar 19/03/24
218		0%	0%	Plan de Pruebas	1 día	4 hrs	mar 12/03/24	mar 12/03/24
219		0%	0%	Documentos recreación Pruebas — CASOS DE PRUE	1 día	4 hrs	mié 13/03/24	mié 13/03/24
220		0%	0%	Ciclo de Pruebas finalizado	0 días	0 hrs	mié 13/03/24	mié 13/03/24
221		**0%**	**0%**	**Documentación técnica y de soporte**	**15 días**	**60 hrs**	**mié 20/03/24**	**mar 9/04/24**
222		0%	0%	Manual Técnico	5 días	20 hrs	mié 20/03/24	mar 26/03/24
223		0%	0%	Arquitectura Software	5 días	20 hrs	mié 27/03/24	mar 2/04/24
224		0%	0%	Arquitectura Técnologica	5 días	20 hrs	mié 3/04/24	mar 9/04/24
225		**2%**	**2%**	**Interfaz Geoanalitica PESCAR**	**127 días**	**396 hrs**	**jue 9/11/23**	**mié 8/05/24**
226		**9%**	**9%**	**Configuración Funcionalidades Transversales**	**101 días**	**88 hrs**	**jue 9/11/23**	**mar 2/04/24**
227		0%	0%	Configuración Geoanalitica	10 días	80 hrs	mié 20/03/24	mar 2/04/24
228	✓	100%	100%	Plan de Pruebas	1 día	4 hrs	jue 9/11/23	jue 9/11/23
229	✓	100%	100%	Documentos recreación Pruebas — CASOS DE PRUE	1 día	4 hrs	lun 13/11/23	lun 13/11/23
230	✓	100%	100%	Ciclo de Pruebas finalizado	0 días	0 hrs	lun 13/11/23	lun 13/11/23
231		**0%**	**0%**	**Interfaz Geoanalitica PESCAR - Modulo Aire**	**6 días**	**56 hrs**	**mié 20/03/24**	**mié 27/03/24**
232		0%	0%	Configuración Geoanalitica	6 días	48 hrs	mié 20/03/24	mié 27/03/24
233		0%	0%	Plan de Pruebas	1 día	4 hrs	mié 20/03/24	mié 20/03/24
234		0%	0%	Documentos recreación Pruebas — CASOS DE PRUE	1 día	4 hrs	jue 21/03/24	jue 21/03/24
235		0%	0%	Ciclo de Pruebas finalizado	0 días	0 hrs	jue 21/03/24	jue 21/03/24
236		**0%**	**0%**	**Interfaz Geoanalitica PESCAR - Modulo Agua**	**6 días**	**56 hrs**	**jue 28/03/24**	**jue 4/04/24**
237		0%	0%	Configuración Geoanalitica	6 días	48 hrs	jue 28/03/24	jue 4/04/24
238		0%	0%	Plan de Pruebas	1 día	4 hrs	jue 28/03/24	jue 28/03/24
239		0%	0%	Documentos recreación Pruebas — CASOS DE PRUE	1 día	4 hrs	vie 29/03/24	vie 29/03/24
240		0%	0%	Ciclo de Pruebas finalizado	0 días	0 hrs	vie 29/03/24	vie 29/03/24
241		**0%**	**0%**	**Interfaz Geoanalitica PESCAR - Modulo Suelo**	**6 días**	**56 hrs**	**mié 3/04/24**	**mié 10/04/24**
242		0%	0%	Configuración Geoanalitica	6 días	48 hrs	mié 3/04/24	mié 10/04/24
243		0%	0%	Plan de Pruebas	1 día	4 hrs	mié 3/04/24	mié 3/04/24
244		0%	0%	Documentos recreación Pruebas — CASOS DE PRUE	1 día	4 hrs	jue 4/04/24	jue 4/04/24
245		0%	0%	Ciclo de Pruebas finalizado	0 días	0 hrs	jue 4/04/24	jue 4/04/24
246		**0%**	**0%**	**Interfaz Geoanalitica PESCAR - Modulo Fauna y Flora**	**6 días**	**56 hrs**	**vie 5/04/24**	**vie 12/04/24**
247		0%	0%	Configuración Geoanalitica	6 días	48 hrs	vie 5/04/24	vie 12/04/24
248		0%	0%	Plan de Pruebas	1 día	4 hrs	vie 5/04/24	vie 5/04/24
249		0%	0%	Documentos recreación Pruebas — CASOS DE PRUE	1 día	4 hrs	lun 8/04/24	lun 8/04/24
250		0%	0%	Ciclo de Pruebas finalizado	0 días	0 hrs	lun 8/04/24	lun 8/04/24
251		**0%**	**0%**	**Interfaz Geoanalitica PESCAR - Modulo Mineria**	**6 días**	**56 hrs**	**jue 11/04/24**	**jue 18/04/24**
252		0%	0%	Configuración Geoanalitica	6 días	48 hrs	jue 11/04/24	jue 18/04/24
253		0%	0%	Plan de Pruebas	1 día	4 hrs	jue 11/04/24	jue 11/04/24
254		0%	0%	Documentos recreación Pruebas — CASOS DE PRUE	1 día	4 hrs	vie 12/04/24	vie 12/04/24
255		0%	0%	Ciclo de Pruebas finalizado	0 días	0 hrs	vie 12/04/24	vie 12/04/24
256		**0%**	**0%**	**Documentación técnica y de soporte**	**14 días**	**28 hrs**	**vie 19/04/24**	**mié 8/05/24**
257		0%	0%	Manual Técnico	8 días	16 hrs	vie 19/04/24	mar 30/04/24
258		0%	0%	Arquitectura Software	3 días	6 hrs	mié 1/05/24	vie 3/05/24
259		0%	0%	Arquitectura Técnologica	3 días	6 hrs	lun 6/05/24	mié 8/05/24
260		0%	0%	Construción completa	0 días	0 hrs	jue 9/05/24	jue 9/05/24
261		**0%**	**0%**	**Homologación PDN**	**132 días**	**516 hrs**	**vie 10/11/23**	**jue 16/05/24**
262	✓	100%	100%	MARCO: SERVIDORES PDN Disponibles - VPN	0 días	0 hrs	vie 10/11/23	vie 10/11/23
263		**0%**	**0%**	**Preparar máquinas virtuales de servidor**	**65 días**	**432 hrs**	**vie 17/11/23**	**lun 19/02/24**
264		0%	55%	Instalar y Configurar - Proxy Reverso	10 días	0 hrs	vie 17/11/23	jue 30/11/23
265		0%	0%	Instalar y Configurar - Base de Datos	10 días	80 hrs	vie 1/12/23	jue 14/12/23
266		0%	0%	Instalar y Configurar - M.App Enterprise	10 días	80 hrs	vie 15/12/23	vie 29/12/23
267		0%	0%	Instalar y Configurar - ERDAS Apollo	10 días	80 hrs	mar 2/01/24	lun 15/01/24
268		0%	0%	Instalar y Configurar - Geospatial Portal y SDI	10 días	80 hrs	mar 16/01/24	lun 29/01/24
269		0%	0%	Instalar y Configurar - S|Portal	2 días	16 hrs	mar 30/01/24	mié 31/01/24

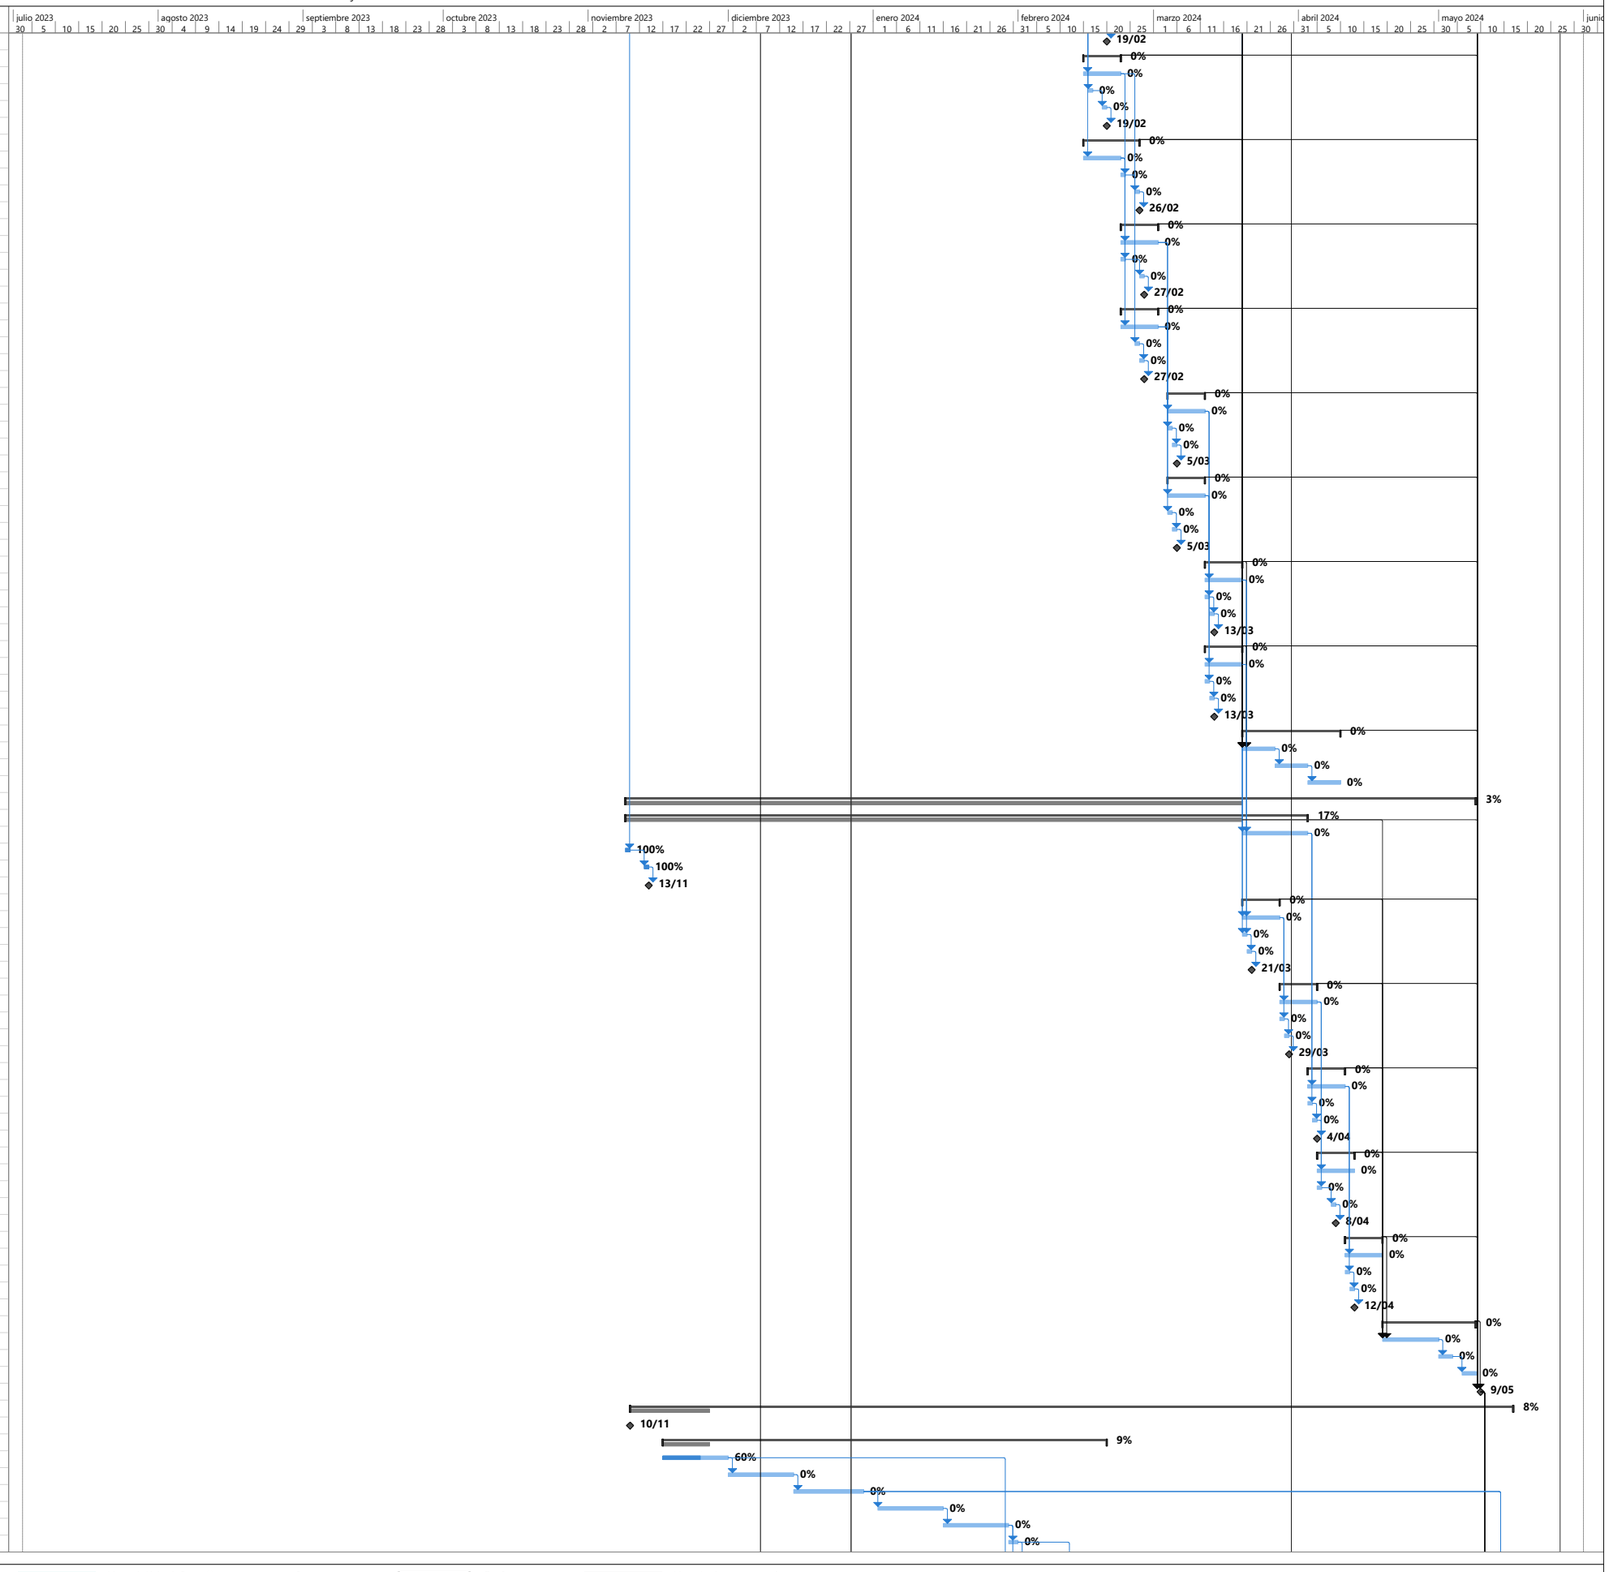

Crítica · Tarefa · Tarefa Manual · Somente duração · Marco de Linha de Base · Resumo · Tarefas externas · Marco Inativo
Divisão Crítica · Divisão · Somente início · Linha de Base · Marco · Resumo Manual · Marco externo · Resumo Inativo
Andamento Crítico · Andamento da Tarefa · Somente término · Divisão da Linha de Base · Andamento do Resumo · Resumo do projeto · Tarefa Inativa · Data limite

Id	Modo de tarea	% trabajo completado	%Planejado	Task Name	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin
270		0%	0%	Instalar y Configurar - LuciadFusion Terrain Analysis Er	6 días	48 hrs	jue 1/02/24	jue 8/02/24
271		0%	0%	Instalar y Configurar - LuciadFusion Infrastructure Star	6 días	48 hrs	lun 12/02/24	lun 19/02/24
272		0%	0%	ENTREGABLE PRODUCTO No. 3 CATALOGO METADATOS	0 días	0 hrs	mié 6/12/23	mié 6/12/23
273		0%	0%	ENTREGABLE PRODUCTO No. 4 INTEGRACIÓN DATOS RA	0 días	0 hrs	mié 27/12/23	mié 27/12/23
274		0%	0%	ENTREGABLE PRODUCTO No. 5 INTEGRACIÓN DATOS VE	0 días	0 hrs	mié 27/12/23	mié 27/12/23
275		**0%**	**0%**	**Configuración de Workstations**	**2,5 días**	**20 hrs**	**mar 20/02/24**	**jue 22/02/24**
276		0%	0%	Instalar y Configurar - IMAGINE Workstation	2 días	16 hrs	mar 20/02/24	mié 21/02/24
277		0%	0%	Instalar y Configurar - Expansion Pack y SAR Interferon	0,5 días	4 hrs	jue 22/02/24	jue 22/02/24
278		0%	0%	ENTREGABLE PRODUCTO No. 6 GEOPORTAL O PORTAL W	0 días	0 hrs	lun 29/01/24	lun 29/01/24
279		0%	0%	Configurar servidores de aplicaciones	3 días	24 hrs	vie 10/05/24	mar 14/05/24
280		0%	0%	Configurar servidores de integraciones	3 días	24 hrs	vie 10/05/24	mar 14/05/24
281		0%	0%	ENTREGABLE PRODUCTO No.7 HERRAMIENTA DE GEON/	0 días	0 hrs	mar 14/05/24	mar 14/05/24
282		0%	0%	ENTREGABLE PRODUCTO No.8 HERRAMIENTA DE GEON/	0 días	0 hrs	mar 14/05/24	mar 14/05/24
283		0%	0%	Aprobar solución	2 días	16 hrs	mié 15/05/24	jue 16/05/24
284		0%	0%	Homologación completa	0 días	0 hrs	jue 16/05/24	jue 16/05/24
285		**0%**	**0%**	**Pruebas**	**6 días**	**131,2 hrs**	**vie 17/05/24**	**vie 24/05/24**
286		**0%**	**0%**	**Ciclo 1**	**3 días**	**65,6 hrs**	**vie 17/05/24**	**mar 21/05/24**
287		0%	0%	Realizar Pruebas Funcionales	1 día	25,6 hrs	vie 17/05/24	vie 17/05/24
288		0%	0%	Realizar Pruebas Integradas	1 día	26 hrs	lun 20/05/24	lun 20/05/24
289		0%	0%	Correcciones	1 día	14 hrs	mar 21/05/24	mar 21/05/24
290		0%	0%	Ciclo 1 completo	0 días	0 hrs	mar 21/05/24	mar 21/05/24
291		**0%**	**0%**	**Ciclo 2**	**3 días**	**65,6 hrs**	**mié 22/05/24**	**vie 24/05/24**
292		0%	0%	Realizar Pruebas Funcionales	1 día	25,6 hrs	mié 22/05/24	mié 22/05/24
293		0%	0%	Realizar Pruebas Integradas	1 día	26 hrs	jue 23/05/24	jue 23/05/24
294		0%	0%	Correcciones	1 día	14 hrs	vie 24/05/24	vie 24/05/24
295		0%	0%	Ciclo 2 completo	0 días	0 hrs	vie 24/05/24	vie 24/05/24
296		0%	0%	Pruebas completas - Paquete 2 Completo	0 días	0 hrs	vie 24/05/24	vie 24/05/24
297		**0%**	**0%**	**Paquete 3 - Puesta en Producción**	**46 días**	**752 hrs**	**vie 29/03/24**	**vie 31/05/24**
298		0%	0%	Realizar acompañamiento gerencial - Paquete 3	46 días	184 hrs	vie 29/03/24	vie 31/05/24
299		0%	0%	PRUEBAS VULNERABILIDAD	5 días	0 hrs	lun 27/05/24	vie 31/05/24
300		**0%**	**0%**	**Gobierno datos - Monitoreo y Seguimiento**	**14 días**	**112 hrs**	**vie 29/03/24**	**jue 18/04/24**
301		0%	0%	Indicadores de rendimiento	2 días	16 hrs	vie 29/03/24	mar 2/04/24
302		0%	0%	Sistemas de seguimiento	2 días	16 hrs	mar 2/04/24	jue 4/04/24
303		0%	0%	Análisis de datos	2 días	16 hrs	jue 4/04/24	lun 8/04/24
304		0%	0%	Desviaciones y problemas	2 días	16 hrs	lun 8/04/24	mié 10/04/24
305		0%	0%	Generación de informes	2 días	16 hrs	mié 10/04/24	vie 12/04/24
306		0%	0%	Ajustes y mejora	2 días	16 hrs	vie 12/04/24	mar 16/04/24
307		0%	0%	Auditorias	2 días	16 hrs	mar 16/04/24	jue 18/04/24
308		0%	0%	ENTREGABLE PRODUCTO No.9 GOBIERNO DE DATOS	0 días	0 hrs	jue 18/04/24	jue 18/04/24
309		**0%**	**0%**	**Formación y transferencia de conocimientos**	**12 días**	**296 hrs**	**vie 10/05/24**	**lun 27/05/24**
310		0%	0%	Ajustar Material - M.App Enterprise	3 días	24 hrs	vie 10/05/24	mar 14/05/24
311		0%	0%	Capacitar - M.App Enterprise	2 días	16 hrs	mié 15/05/24	jue 16/05/24
312		0%	0%	Ajustar Material - ERDAS Apollo	3 días	24 hrs	mié 15/05/24	vie 17/05/24
313		0%	0%	Capacitar - ERDAS Apollo	1 día	8 hrs	lun 20/05/24	lun 20/05/24
314		0%	0%	Ajustar Material - Geospatial Portal y SDI	3 días	24 hrs	mié 15/05/24	vie 17/05/24
315		0%	0%	Capacitar - Geospatial Portal y SDI	3 días	24 hrs	lun 20/05/24	mié 22/05/24
316		0%	0%	Ajustar Material - S|Portal	3 días	24 hrs	mié 15/05/24	vie 17/05/24
317		0%	0%	Capacitar - S|Portal	2 días	16 hrs	lun 20/05/24	mar 21/05/24
318		0%	0%	Ajustar Material - IMAGINE	3 días	24 hrs	mié 15/05/24	vie 17/05/24
319		0%	0%	Capacitar - IMAGINE	2 días	16 hrs	lun 20/05/24	mar 21/05/24
320		0%	0%	Ajustar Material - Expansion Pack y SAR Interferometry	2 días	16 hrs	mié 22/05/24	jue 23/05/24
321		0%	0%	Capacitar - Expansion Pack y SAR Interferometry	2 días	16 hrs	vie 24/05/24	lun 27/05/24
322		0%	0%	Preparar Material Workshop del sistema final	3 días	24 hrs	mié 15/05/24	vie 17/05/24
323		0%	0%	Workshop del sistema final	5 días	40 hrs	lun 20/05/24	vie 24/05/24
324		0%	0%	ENTREGABLE No.2 SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE FÁB	0 días	0 hrs	lun 27/05/24	lun 27/05/24
325		0%	0%	ENTREGABLE No.10 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	0 días	0 hrs	lun 27/05/24	lun 27/05/24
326		**0%**	**0%**	**Operación asistida**	**4 días**	**160 hrs**	**mar 28/05/24**	**vie 31/05/24**
327		0%	0%	Ejecutar go-live y operación asistida	4 días	160 hrs	mar 28/05/24	vie 31/05/24
328		0%	0%	Operación asistida completa	0 días	0 hrs	vie 31/05/24	vie 31/05/24

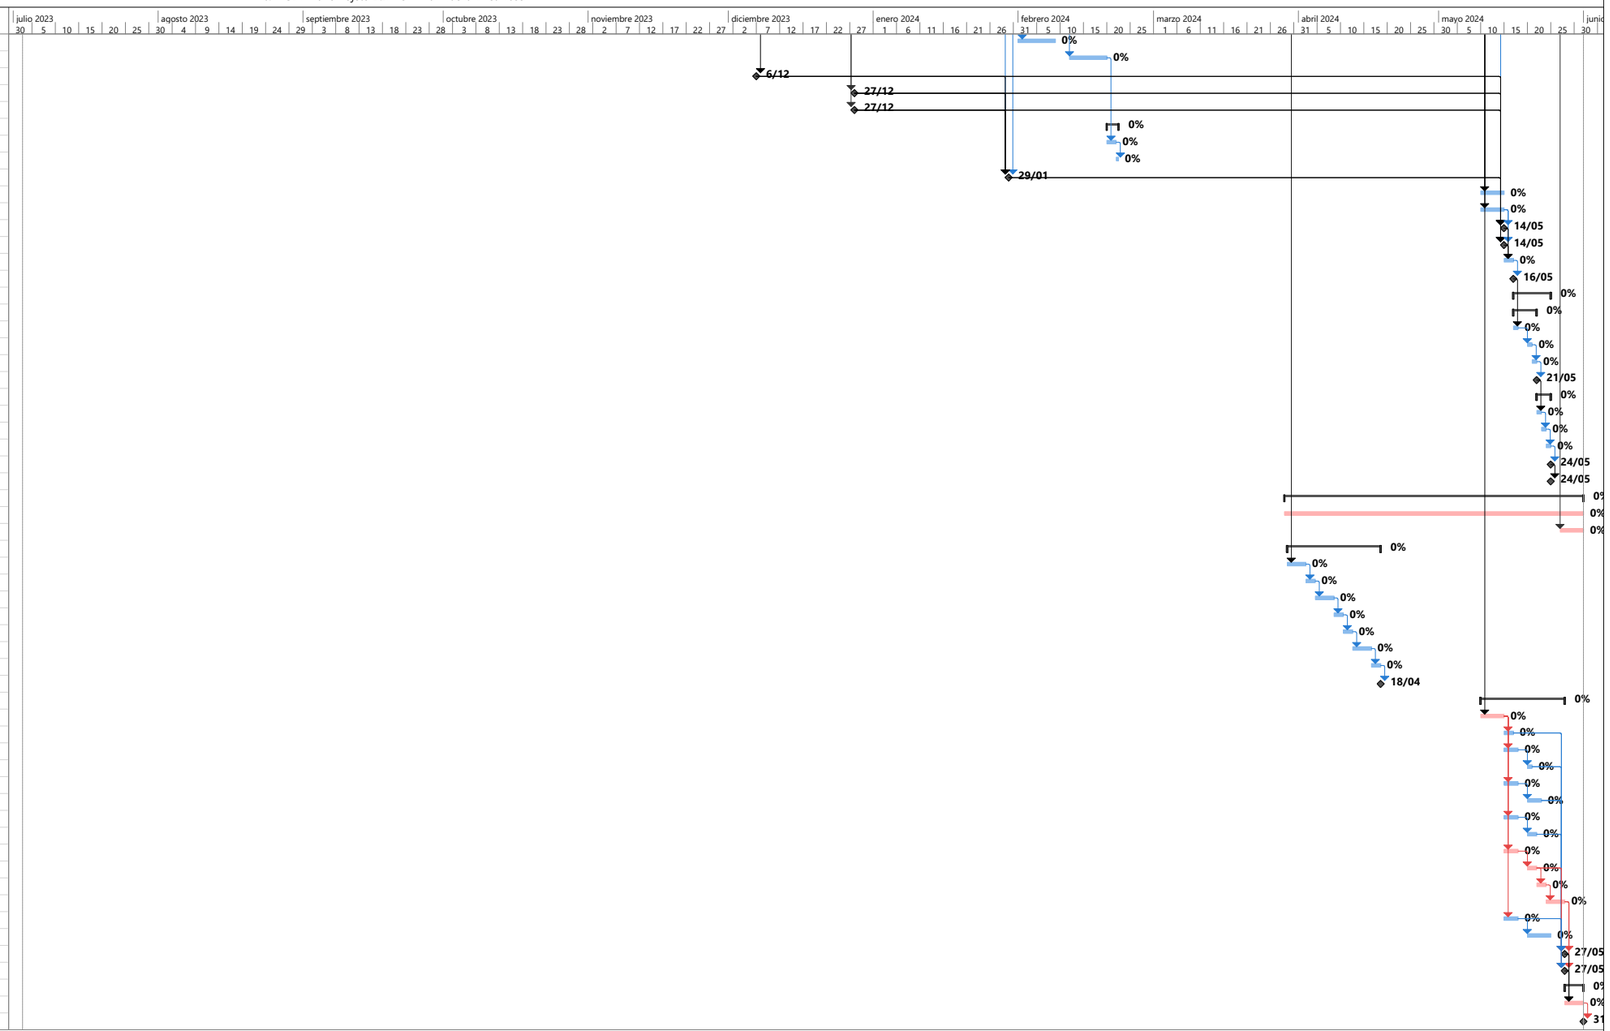

Crítica · Tarefa · Tarefa Manual · Somente duração · Marco de Linha de Base · Resumo · Tarefas externas · Marco Inativo
Divisão Crítica · Divisão · Somente início · Linha de Base · Marco · Resumo Manual · Marco externo · Resumo Inativo
Andamento Crítico · Andamento da Tarefa · Somente término · Divisão da Linha de Base · Andamento do Resumo · Resumo do projeto · Tarefa Inativa · Data limite
