CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 8
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 9
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 11

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**23001227 02 H3**
Nombre del Contratista:	**UT PORTAL AEROCIVIL 2023**
Periodo informe:	**01 al 31 de mayo de 2024**
Nombre de Supervisor:	**Andres Felipe Molina Barrios – Martha Cecilia Cantor Mendoza**
Nombre del Interventor:	**No Aplica**
Área perteneciente:	**Grupo Soluciones de Información y Gestión del Dato**

2. OBJETO DEL CONTRATO

DISEÑAR, CONSTRUIR Y PONER Y EN FUNCIONAMIENTO NUEVOS PORTALES (EXTRANET E INTRANET) PARA LA ENTIDAD (VF) Lote No. 2 DISEÑAR, CONSTRUIR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PORTAL DE EXTRANET

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 01 al 31 de mayo de 2024		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES** (

Al cumplimiento del contrato de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Condiciones, en sus Adendas, Anexos Técnicos: 1. Estudios Previos, 2. Especificaciones Técnicas, 3. Matriz de Riesgos, Formatos Técnicos del Proceso de licitación pública número 23001227 H3 de 2023, la propuesta general publicada del 26 de diciembre de 2023, la Resolución de adjudicación No. 00291 del 19 de febrero de 2024 y a lo previsto en el presente contrato y demás documentos que hagan parte integral del mismo.	1. Se ha dado cumplimiento	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET
Monitorear y gestionar los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidas en el Formato 9 – Matriz de Riesgos	A la fecha no se ha materializado ningún riesgo.	
Prestar los servicios pactados para el cumplimiento del contrato, con personal técnico especializado, el cual deberá estar bajo su permanente subordinación o dependencia	Se ha dado cumplimiento teniendo en cuenta el equipo del trabajo presentado para ejecutar el contrato.	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET
Desarrollar las actividades del contrato de acuerdo con las especificaciones	Se ha venido dando cumplimiento.	

técnicas descritas en el Anexo Técnico, en el lugar y plazos establecidos en el presente contrato		
Dar a conocer a LA AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.	No se ha presentado.	
Cumplir con el plan de garantías ofertadas	A la fecha no se han presentado eventos para hacer efectivas las garantías.	
Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso de Licitación Pública No. 23001227 H3 de 2023	No se ha presentado ningún caso relacionado con lo descrito en la obligación.	
Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos establecidos en el presente Contrato.	Las garantías suscritas están vigentes y fueron aprobadas por la entidad.	
Coordinar con el Supervisor, la gestión y respuesta a requerimientos recibidos de autoridades administrativas u órganos o instancias de control. Una vez el Contratista reciba el requerimiento deberá remitirlo de inmediato a la Aerocivil y a la supervisión con el fin de que la entidad responda directamente al peticionario con	No se ha presentado ningún requerimiento relacionado con lo descrito en la obligación.	

oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales vigentes		
Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la Aerocivil, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva	No se ha presentado ningún caso relacionado con lo descrito en la obligación.	
Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar aviso de tales circunstancias a la Aerocivil y a las autoridades competentes.	El contratista no ha reportado ningún caso relacionado con lo descrito en la obligación.	
Asumir, por su cuenta y riesgo, todos los costos directos, indirectos, el pago de salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal, que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y todos los gastos necesarios para la ejecución del presente contrato.	No se han reportado eventos relacionados con el incumplimiento por parte del contratista de la obligación descrita.	
Tener disponible y vincular para la ejecución del presente contrato el equipo, los elementos, herramientas y	Se ha dado cumplimiento por parte del contratista.	

el personal requerido para su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices y demás documentos que integran el presente contrato.		
Atender las instrucciones del supervisor de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución, en las condiciones y términos establecidos en el mismo.	Se han atendido las instrucciones de la supervisoría por parte del contratista, bajo la coordinación del Gerente del Proyecto.	
Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” y demás normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del consultor tanto la vinculación del personal como cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato.	No se han reportado ningún evento relacionado con el incumplimiento de la obligación descrita.	
Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El Contratista deberá dotar a sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de protección personal necesarios para la	No aplica para el objeto de este contrato.	

ejecución de las labores propias del contrato		
Obtener las aprobaciones por parte del supervisor o quien haga sus veces, dentro del plazo de ejecución del contrato.	Se ha dado cumplimiento.	
Suscribir – conjuntamente con la Aerocivil – las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación del presente contrato	Se suscribió el Acta de inicio del contrato	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas formales
Presentar a la Aerocivil todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este contrato, documentos del proceso, Manuales y Procedimientos vigentes durante la ejecución del presente contrato.	Se ha cumplido	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\
Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.	No se han presentado eventos relacionados.	
Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de la normatividad vigente.	No se han presentado eventos relacionados.	

Las demás que se encuentran contenidas en el numeral 2 de las Especificaciones Técnicas y/o Estudios Previos del proceso de licitación Pública No. 23001227 H3 de 2023.	Se han venido desarrollando las actividades conforme las etapas definidas en el proyecto – del formato 8 Especificaciones técnicas.	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

ACTIVIDAD ACORDE CRONOGRAMA	ESTADO EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN	FECHA APROBACIÓN
Entregable 1 Documento del Plan de gestión del Proyecto	Entregado	Documento generado por el contratista, revisado por Aerocivil	09/05/2024
Entregable 2 Cronograma Detallado	Entregado	Documento generado por el contratista, revisado por Aerocivil	09/05/2024
Entregable 3 Project Charter	Entregado	Documento generado por el contratista, revisado por Aerocivil	09/05/2024
Entregable 4 Documento con el diseño de la arquitectura de la solución y configuración del CMS v1.0	Entregado	Documento generado por el contratista y revisado por Aerocivil	14/05/2024
Entregable 5 Documento de diagramación y diseño gráfico propuesto y el aprobado. V1.0	En desarrollo	El contratista ha presentado propuesta del diseño gráfico del home del portal del CEA el cual está en ajustes por parte del contratista.	Pendiente
Entregable 9 Documento Plan de pruebas v1.0	Entregado	Documento generado por parte del contratista y revisado por Aerocivil	23/05/2024
Entregable 15 Documento de estrategia y plan de gestión del cambio v1.0	Entregado	Documento generado por parte del contratista y revisado por Aerocivil	23/05/2024
Documento de desarrollos seguros OWASP	Entregado	Documento generado por parte del contratista y revisado por Aerocivil	23/05/2024
Documento plan de recuperación de desastres v1.0	Entregado	Documento generado por parte del contratista y revisado por Aerocivil	23/05/2024

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN

			SI	NO

No aplica.

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

- El día 03 de mayo de 2024, se realiza reunión para contextualización del contrato e inicio de levantamiento de información con la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea, en donde el secretario del Área delega la coordinación de reuniones del área.
- El día 06 de mayo de 2024, se realiza una sesión de trabajo de índole técnico relacionada con las propuestas de diseño gráfico portal CEA.
- El día 06 de mayo de 2024, se realiza reunión de trabajo de contextualización y levantamiento de información con la Oficina Asesora Jurídica. Se genera acta de reunión 006 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 07 de mayo de 2024, se realiza reunión inicial de levantamiento de información con la Secretaría de Autoridad de Aviación Civil. Se genera acta de reunión 007 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 08 de mayo de 2024 se realiza reunión de trabajo para retroalimentación y construcción conjunta basado en necesidades (visibilidad, accesibilidad, usabilidad), del home del portal del CEA. Se genera acta de reunión 008 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 10 de mayo de 2024, se realiza reunión de seguimiento 003 del contrato. Se genera acta 003 de la reunión de seguimiento la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de seguimiento\Definitivas.
- El día 14 de mayo de 2024 se realizó sesión de trabajo Reunión de trabajo para que se presente por el CEA la información publicada para mayor entendimiento del contratista. Se genera acta de reunión 009 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 14 de mayo de 2024, se realiza reunión de levantamiento de información con la Oficina Asesora de Planeación. Se genera acta de reunión 010 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 15 de mayo de 2024, se realizó reunión de levantamiento de información de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes. Se genera acta de reunión 011 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas

- El día 15 de mayo de 2024, se realizó reunión de levantamiento de información de la Oficina de Gestión de Proyectos. Se genera acta de reunión 012 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 16 de mayo de 2024, se realizó reunión de levantamiento de información de la Oficina Analítica. Se genera acta de reunión 013 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 17 de mayo de 2024, se realizó reunión de levantamiento de información de la Secretaría de Servicios Aeroportuarios. Se genera acta de reunión 014 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 22 de mayo de 2024, se realiza reunión de levantamiento de información de la Oficina de Control Disciplinario. Se genera acta de reunión 015 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 22 de mayo de 2024, se realiza reunión técnica para explicación por parte del contratista del Plan de Pruebas y del Plan de Gestión del cambio. Se genera acta de reunión 016 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 24 de mayo de 2024, se realiza reunión de seguimiento 004 del contrato. Se genera acta 004 de la reunión de seguimiento la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de seguimiento\Definitivas.
- El día 24 de mayo se realiza reunión de levantamiento de información de la Oficina de Control Interno. Se genera acta de reunión 017 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 29 de mayo se realiza sesión de trabajo para definir alcance de los desarrollos Dir. Técnica de Investigación de accidentes - nuevo portal extranet. Se genera acta de reunión 018 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 31 de mayo de 2024, se realiza reunión para sesión presentación inicial propuesta de diseño gráfico del home del portal de extranet. Se genera acta de reunión 019 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 31 de mayo se realiza reunión revisión consultas en línea nuevo portal extranet. Se genera acta de reunión 020 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas

2 OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	No aplica
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	No aplica
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	No aplica
5	¿Fue oportuna la mitigación?	No aplica
OBSERVACIONES:		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**
Entre el 23/12/2023 y el 18/04/2024	

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
	X
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2		
3		
4		

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

3 PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Valor del contrato: **$2.782.998.775,00 INCLUIDO IVA 19%**
Avance presupuestal: 0%

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Avance planeado: **26%**
Avance real: **24%**

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pre	Nombres de los recursos	% completado	% Esperado de avance
Aerocivil 23001227 02 H3 DE 2023	**178 días**	**jue 21/03/24**	**jue 12/12/24**			**24%**	**26%**
Planeación	**19 días**	**jue 21/03/24**	**vie 19/04/24**			**100%**	**100%**
Revisión de planeación	5 días	lun 22/04/24	vie 26/04/24	12	Supervisores	100%	100%
Ajustes de planeación	2 días	lun 29/04/24	mar 30/04/24	13	Camilo Valencia	100%	100%
Aprobación de planeación	0 días	mar 30/04/24	mar 30/04/24	14	Camilo Valencia;Supe	100%	100%
CMS Nexura Platform	**16,25 días**	**lun 1/04/24**	**mar 23/04/24**			**99%**	**100%**
Documentación técnica	**54,75 días**	**mar 23/04/24**	**lun 15/07/24**			**100%**	**49%**
Reuniones	**65 días**	**jue 21/03/24**	**dom 30/06/24**			**61%**	**72%**
Portal CEA	**64 días**	**lun 29/04/24**	**vie 2/08/24**			**21%**	**36%**
Portal EXTRANET	**174 días**	**lun 1/04/24**	**jue 12/12/24**			**2%**	**25%**
Diseño	**47 días**	**mié 15/05/24**	**mié 24/07/24**			**27%**	**27%**
Arquitectura de contenidos	**15,25 días**	**mié 19/06/24**	**jue 11/07/24**			**0%**	**0%**
Migración	**33,25 días**	**vie 7/06/24**	**vie 26/07/24**			**0%**	**0%**
Micrositios	**20 días**	**mié 24/07/24**	**vie 23/08/24**			**0%**	**0%**
Despliegue a producción Extranet	**25 días**	**vie 23/08/24**	**vie 27/09/24**			**0%**	**0%**
Horas de desarrollo 3500	**174 días**	**lun 1/04/24**	**jue 12/12/24**			**0%**	**25%**

Se adjunta informe de avance presentado por el contratista.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

Firmado digitalmente por ANDRES FELIPE MOLINA BARRIOS
Fecha: 2024.06.07 11:06:22 -05'00'

Firmado digitalmente por MARTHA CECILIA CANTOR MENDOZA
Fecha: 2024.06.07 11:03:55 -05'00'

ANDRES FELIPE MOLINA BARRIOS
93.406.002
SUPERVISOR

MARTHA CECILIA CANTOR MENDOZA
21.015.375
SUPERVISORA

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.

Informe de Avance

Fecha del informe: 05 de junio de 2024

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL

OBJETO: "DISEÑAR, CONSTRUIR Y PONER Y EN FUNCIONAMIENTO NUEVOS PORTALES (EXTRANET E INTRANET) PARA LA ENTIDAD (VF) Lote No. 2 DISEÑAR, CONSTRUIR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PORTAL DE EXTRANET."

Número del contrato	No 23001227 02 H3 DE 2023
Plazo de ejecución	16 de diciembre de 2024
Gerente del proyecto	Camilo Alberto Valencia cvalencia@nexura.com 57-524 04 44

El presente informe contiene el avance que se ha presentado durante el mes de junio del 2024 con respecto al cronograma aprobado, se detallan las actividades cumplidas con fecha de corte al 31 de mayo.

Avance global del proyecto

24%


Avance real

26%

Avance planeado

2%

Desfase

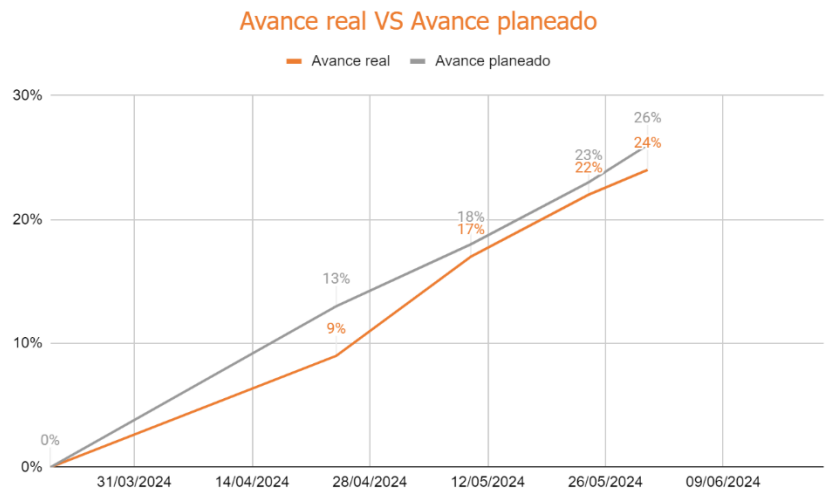

- Para lograr el avance del 24% se han realizado las siguientes actividades del cronograma:
  - Se realiza la revisión, ajustes y aprobación del plan de proyecto.
  - Se realiza la aprobación de la licencia de los derechos de uso del CMS.
  - Se realiza la entrega y aprobación de los siguientes documentos técnicos en su versión 1.0:
    - Documento de arquitectura_v1.0
    - Documento manual técnico_v1.0
    - Documento de instalación de plataforma _v1.0
    - Documento de desarrollos seguros OWASP
    - Plan de recuperación de desastres_v1.0
    - Plan de gestión del cambio_v1.0
    - Plan de pruebas_v1.0

- Se realiza la elaboración del plan de migración para la revisión de los supervisores del contrato.

- Se realizan los ajustes a la propuesta de diseño del sitio Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA) de acuerdo a las reuniones realizadas.

- Se inician trabajos con la elaboración de los diseños del portal principal para ser presentados al área de comunicaciones.

- El desfase del 2% se debe a las siguientes actividades que están pendientes por ejecutar:

  - Presentación de ambientes de pruebas a los supervisores del contrato.

  - Definición de contenidos a migrar para el CEA.

  - Ejecución de migración de contenidos CEA.

  - Validaciones de migración de contenidos CEA.

  - Aprobación de diseño del portal CEA.

- Para recuperar el desfase del 2% es necesario trabajar en conjunto con la entidad para poder definir el tema de migración del portal del CEA ya que este tiene 2 actividades en secuencia que se encuentran con retraso, adicionalmente, se han adelantado actividades como la revisión y aprobación de la documentación técnica, así como la elaboración de propuestas gráficas del portal principal de la entidad lo que ha representado que el desfase no sea mayor.

  Seguiremos trabajando con las actividades definidas en el cronograma para lograr igualar el desfase que se tiene.

Agradezco toda la atención prestada,

Atentamente,

Camilo Alberto Valencia
Gerente de proyecto
Cel: 320 5545613
UT PORTAL AEROCIVIL 2023

---Fin de Documento---
