Señores
EDUARD MAURICIO ANTE TOVAR
Representante Legal
TECNICA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS
tecnicayproyectosdeing@gmail.com

CE 012 23-05-2024

C.C.
Jorge Alfonso Ortega Rojas
SUPERVISOR DEL CONTRATO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CAUCA
jortega@invias.gov.co

REFERENCIA:	CONTRATO No. **3328-2023** CUYO OBEJTO ES EL "**MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS, PUENTE RIO NEGRO - ANTIGUAS CABAÑAS INDERENA TACUEYÓ - TORIBIO - RIO NEGRO - EL PALO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA**".
OBJETO:	SOLICITUD PRORROGA CONTRATO No 3328-2023

Cordial Saludo.

Mediante el presente **EL CONSORCIO OPERATIVO IJ** solicita sea prorrogado el contrato de obra No 3328- 2023, lo anterior teniendo en cuenta los diferentes inconvenientes que han interferido en el rendimiento de las diferentes actividades de construcción del proyecto entre los cuales tenemos:

HECHOS

1. Presencia de rocas de sobre tamaños en las excavaciones de los caissons de los estribos del puente, lo cual ha impedido avanzar de la manera adecuada y con el rendimiento esperado de esta actividad.
2. Malas condiciones meteorológicas, la lluvia impide que los trabajadores continúen su trabajo normalmente a una profundidad mayor de 1.50 m, por posibilidad de inundación de la excavación o llegada de escombros por falta de drenaje de la vía.
3. Debido al fallo de la estructura metálica del puente vehicular sobre el Rio Palo, el cual se encuentra ubicado entre los Municipios de Caloto y Santander de Quilichao, vía de acceso a la obra, fallo que solo fue superado hasta el día 23 de abril de 2024, y que ha dificultó el transporte de materiales y maquinaria al sitio de la obra, por el mayor recorrido y por el estado de la misma vía, al punto generó un mayor costo en transporte de materiales y de maquinaria y de mano de obra.
4. Condiciones de orden público en la zona del proyecto, presencia de grupos armados al margen de la ley, enfrentamientos en el norte de Cauca en municipios como Miranda, Corinto y Toribio. Al igual que en municipios como Piendamó, Silvia, Morales, Pescador, Mondomo, Caloto y Guachené. Enfrentamientos que generan zozobra y temor, por parte de los proveedores quienes temen perder los vehículos y/o materiales o peor aún el recurso humano como lo son sus conductores y ayudantes en el trayecto al sitio de ejecución del proyecto.
5. Los constantes bloqueos de la vía Popayán – Cali, afectan la movilidad y retrasan la entrega de materiales de proveedores con domicilio en la ciudad de Popayán.

6. El personal de obra, se ven limitado por los toques de queda, retenes y por la restricción de movilidad por parte de grupos al margen de la ley, además de eso el pasado viernes 24 de mayo se presentaron enfrentamientos a 200 m del proyecto, situación que obligó al resguardo del personal de obra en el salón comunal, generando zozobra y temor en el personal para continuar con el desarrollando normal de las actividades, generando caída en el rendimiento de ejecución de las actividades.

REGISTRO DOCUMENTAL

Sábado, 25 Mayo , 2024 - 11:13

Cuatro muertos dejan combates entre disidencias en Cauca

En los hechos registrados en el nororiente del departamento, también fueron quemados dos vehículos.




Por: **Radio Nacional de Colombia**


Momentos de tensión vivieron las comunidades de la vereda La Despensa, resguardo de San Francisco, jurisdicción del municipio de Toribío, Cauca, en la noche del viernes cuando presuntos integrantes de los frentes Dagoberto Ramos, del Estado Mayor Central, y del frente 57 Yair Bermúdez, de la Segunda Marquetalia -ambas estructuras disidencias de las Farc- se enfrentaron en una carretera de la zona.

"A 300 metros del punto de cuidado territorial de la Guardia Indígena – Kiwe Thegnas en el crucero de La Despensa, se dieron fuertes enfrentamientos entre dos estructuras armadas (...) como medida de prevención para salvaguardar la vida, las y los comuneros que acompañaban el punto de cuidado se retiraron del lugar temporalmente", informó en un reporte extraordinario el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).


Entre tanto un testigo de lo sucedido, y que pidió omitir su nombre por razones de seguridad, señaló que los choques armados "fueron entre ellos, entre los grupos armados, en este caso la disidencia (...) enfrentamientos donde lamentablemente hay hasta cuatro muertos y carros incinerados".

DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS ESTACION TRAPICHE No 26040210 CALOTO - CAUCA

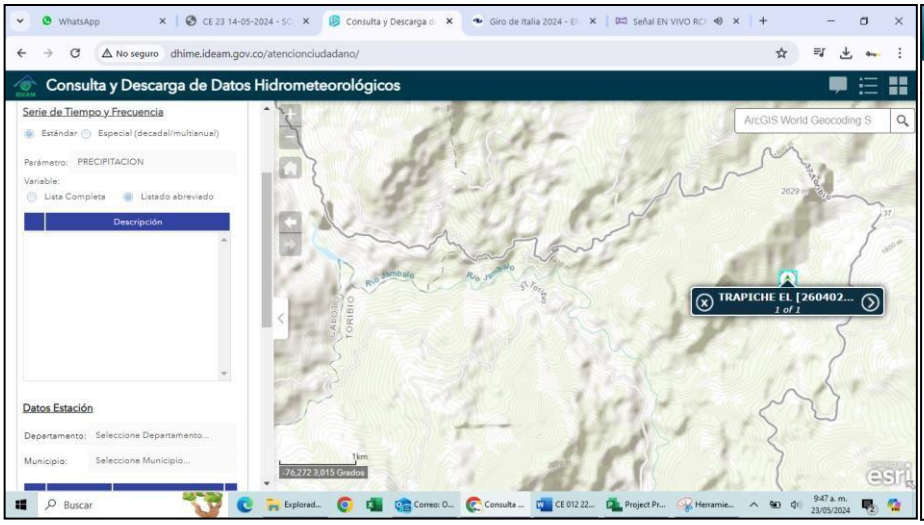

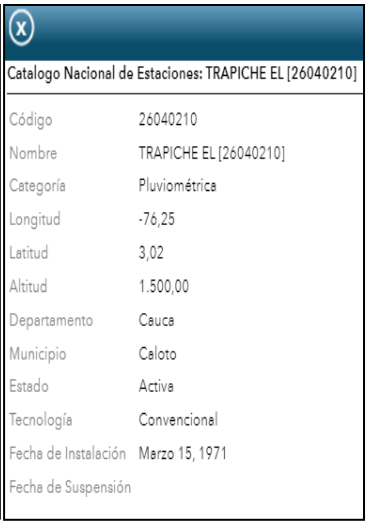


FechaInstalacion	Fech	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	Calific	NivelAprobaci
15/10/1966 0:00		PRECIPITACION	PTPM_TT_M	PrecipitaciÃ³n total mensua	Mensual	1/01/2024 0:00	103	50		900
15/10/1966 0:00		PRECIPITACION	PTPM_TT_M	PrecipitaciÃ³n total mensua	Mensual	1/02/2024 0:00	63	50		900
15/10/1966 0:00		PRECIPITACION	PTPM_TT_M	PrecipitaciÃ³n total mensua	Mensual	1/03/2024 0:00	107	50		900
15/10/1966 0:00		PRECIPITACION	PTPM_TT_M	PrecipitaciÃ³n total mensua	Mensual	1/04/2024 0:00	245	50		900

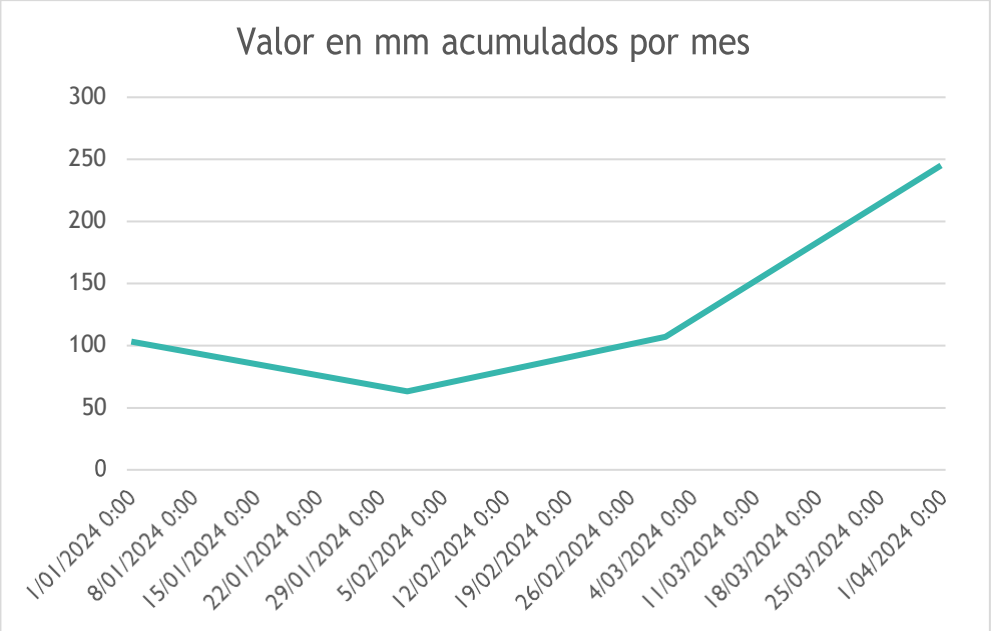

A pesar de todos estos imprevistos se continúa trabajando en los frentes de los caisson de muros de protección, los cuales se siguen avanzando día a día, con el retiro y demolición de rocas y los diferentes elementos de la vía antigua que se van encontrando a medida que se continúa excavando. En este momento se cuenta con un 36% de avance de obra y se está planteando un plan de contingencia para poder llegar a la fecha propuesta.

Por estas razones anteriormente expuestas se solicita una prorroga por un periodo de 1.5 meses, comenzando desde el 08 de junio de 2024 hasta el 23 de julio de 2024.

PROGRAMA DE OBRA CONTINGENCIA

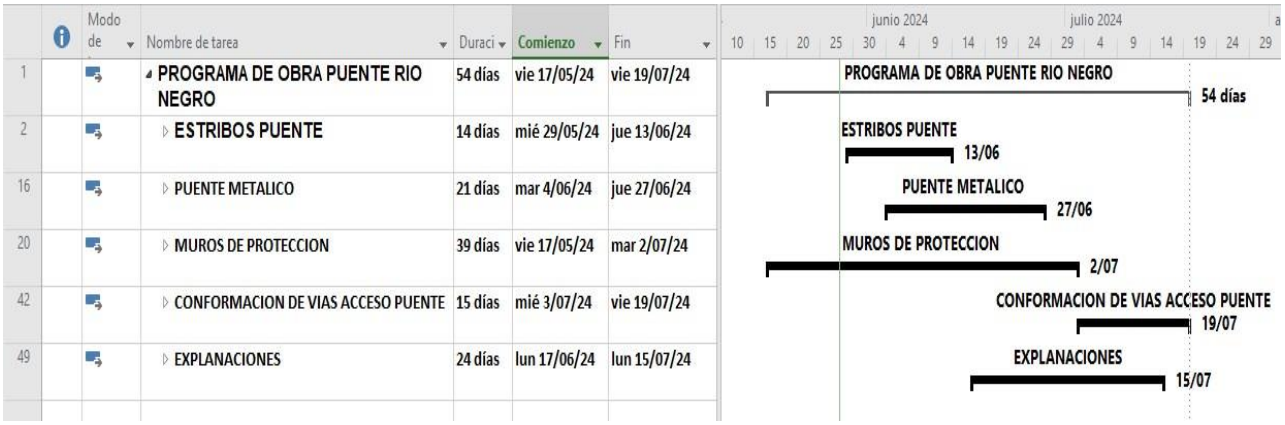

Gracias por su atención.

Atentamente,

Contratista:	CONSORCIO OPERATIVO IJ
Representante Legal:	LUIS URBANO SÁNCHEZ OLIVELLA
Dirección de Correo:	Carrera 2 # 16N – 18 Casa 65 Altos de Tulcán
Dirección Electrónica:	recepcion.consorciooperativoij@hotmail.com
Teléfono:	3233245817
Ciudad:	Popayán – Cauca



LUIS URBANO SÁNCHEZ OLIVELLA
RL. CONSORCIO OPERATIVO IJ
