Empresa de Desarrollo Urbano y Rural EL CARMEN DE VIBORAL	**PRORROGA N°3** **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA** **N° COP-019-2023-CO**	Municipio El Carmen de Viboral

NUMERO DEL CONVENIO: 170-CONV-130-2023.

NÚMERO DEL CONTRATO: COP-019-2023-CO.

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL - EDUR.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.

SUPERVISORA: VALERIA CENDOYA ARIAS.

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALGUNOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL.

VALOR DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINCE PESOS M/L ($ 497.856.015).

FECHA DEL CONTRATO: VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE (2023).

FECHA ACTA DE INICIO: VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE (2023).

PLAZO: UN (01) MES Y VEINTITRES (23) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

FECHA DE TERMINACION INICIAL: VEINTIUNO (21) DE FEBRERO DE (2024).

PRORROGA N° 1:
TIEMPO ADICIONADO: DOS (02) MESES MAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION INICIAL.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: VEINTIDOS (22) DE ABRIL DE (2024).

PRORROGA N° 2:
TIEMPO ADICIONADO: DOS (02) MESES MAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DE LA PRORROGA N°1.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: VEINTIDOS (22) DE JUNIO DE (2024).

PRORROGA N° 3:
TIEMPO ADICIONADO: TRES (03) MESES MAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DE LA PRORROGA N°2.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: VEINTIDOS (22) DE SEPTIEMBRE DE (2024).

EDUR Empresa de Desarrollo Urbano y Rural EL CARMEN DE VIBORAL	**PRORROGA N°3** **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA** **N° COP-019-2023-CO**	Municipio El Carmen de Viboral

Entre los suscritos a saber, la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL - EDUR**, con **NIT N° 901.521.260-2**, representada legalmente por el señor **MARCO ANTONIO DIAZ MEDINA**, con cédula de ciudadanía **N° 71.113.392**, quien actúa como **EL CONTRATANTE**; el señor **HERNAN ALONSO GARCIA GIRALDO**, con cédula de ciudadanía**N° 70.903.964**, actuando como representante legal de la **CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S**, con **NIT N° 901.006.474-3** y que en lo sucesivo se llamará **EL CONTRATISTA**; y la señora **VALERIA CENDOYA ARIAS** con cedula de ciudadanía **N° 1.036.399.740**, quien actúa como la **SUPERVISORA**por parte de la **EDUR**; se conviene en suscribir la presente **PRORROGA N°3** al Contrato de Obra Pública **N° COP-019-2023-CO**, previas las siguientes;

CONSIDERACIONES:

1. Que el día veintiuno (21) de diciembre de 2023, se suscribió entre el Municipio de El Carmen de Viboral y la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural - EDUR, el Contrato Interadministrativo N° 170-CONV-130-2023 cuyo objeto es "*CONTRATO INETRDMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DEL PROYECTO "INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA" PARA LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE ADECUACION Y OBRAS COMPLMENTARIAS DE ALGUNOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL".* El cual se dio inicio el veintidós (22) de diciembre de 2023.

2. Que, para la ejecución del Contrato de Interadministrativo N° 170-CONV-130-2023, la EDUR suscribió el Contrato de Obra Pública N° COP-019-2023-CO el día 29 de diciembre de 2023 y teniendo acta de inicio del mismo día, con la empresa CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S con NIT. 901006474-3, por un término de un (01) mes y veintitrés (23) días contados a partir de la firma del acta de inicio y un valor inicial de cuatrocientos noventa y siete millones ochocientos cincuenta y seis mil quince pesos M/L ($ 497.856.015).

3. Que, el Contrato de Obra Pública requirió prórroga N°1 el día trece (13) de febrero de 2024 con un término de dos (2) meses, contados a partir la fecha de terminación inicial del contrato, teniendo como nueva fecha de terminación el día veintidós (22) de abril de 2024, indicada en la plataforma de SECOP II.

4. Que, el día dieciocho (18) de abril de 2024, el Representante Legal de **Constructora ZUGA S.A.S,** el señor **HERNAN ALONSO GARCIA GIRALDO**, contratista del Contrato de Obra Pública N°COP-019-2023-CO remite solicitud de Prorroga N°2 a la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural El Carmen de Viboral – EDUR; a partir del 23 de abril de 2024 hasta el 22 de junio de 2024 según lo indica la plataforma del SECOP II.

5. Que, el día diecisiete (17) de junio de 2024, el Representante Legal de **Constructora ZUGA S.A.S,** el señor **HERNAN ALONSO GARCIA GIRALDO**, contratista del Contrato de Obra Pública N°COP-019-2023-CO remite solicitud de Prorroga N°3 a la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural El Carmen de Viboral – EDUR; esto, atendiendo las recomendaciones impartidas desde la

administración municipal, en la cual se justifica lo siguiente:

Por medio de la presente nos permitimos informar a la entidad contratante, (Empresa de Desarrollo Urbano y Rural – EDUR) sobre la solicitud de prórroga N° 03 por tres (03) meses más, contados a partir de la fecha de terminación, teniendo en cuenta la necesidad expuesta por el municipio de realizar un cerramiento en la malla eslabonada para la cancha múltiple ubicada en la cancha norte, esta solicitud fue realizada en el comité de obra del día 20 de mayo de 2024, al cual asistieron personal de la EDUR, Secretaria de Infraestructura del Municipio y el Secretario de Deportes. Es por esto que realizando una evaluación técnica y de programación y con el fin de materializar en debida forma las actividades solicitadas se torna necesaria una adición en tiempo.

Se anexa acta de comité del 20 de mayo de 2024 y cronograma de obra actualizado"

Además la Empresa de Desarrollo Urbana y Rural del Municipio de El Carmen de Viboral se recibió comunicación según Radicado 02575 del 20 de junio donde el secretario de Deporte Y Recreación del Municipio de El Carmen de Viboral, donde solicita la realización del cerramiento de la Infraestructura deportiva nueva ubicada en la cancha municipal de la zona norte.

6. Que, después de analizar la solicitud de Prorroga N°3 enviada por la empresa CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S con NIT 901006474-3, del Contrato de Obra Pública N° COP-019-2023-CO, la Empresa de Desarrollo Urbano y rural – Edur, considera necesario otorgar la ampliación de plazo por un término de tres (03) meses más, conforme al cronograma de obra enviado por parte del contratista ejecutor de la obra, para poder realizar las actividades necesarias y planteadas.

Teniendo en cuenta la justificación y de acuerdo a las necesidades surgidas durante la ejecución del contrato, las partes;

ACUERDAN:

PRIMERO: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública N° COP-019-2023-CO por un término de tres (03) meses más, contados a partir de la fecha de terminación de la prórroga N°2; teniendo como nueva fecha de terminación el día veintiuno (22) de septiembre de 2024.

SEGUNDO: El contratista se compromete a ampliar el plazo de las Pólizas, en proporción al término de la prórroga, incluyendo la nueva vigencia.

TERCERO: Esta prórroga se entiende perfeccionada con la firma entre las partes.

CUARTO: Las demás cláusulas del Contrato principal no sufren ninguna modificación.

Para constancia se firma la presente **PRORROGA N°3** en el Municipio de El Carmen de Viboral, a los veintiún (21) días del mes de junio de dos mil veinticuatro (2024).

MARCO ANTONIO DIAZ MEDINA
Gerente
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural - EDUR

HERNAN ALONSO GARCIA GIRALDO
Representante Legal
Constructora ZUGA S.A.S

VALERIA CENDOYA ARIAS
Supervisora Contrato de Obra Publica
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural – EDUR

El Carmen de Viboral (Ant.). 17 de junio de 2024

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural
EL CARMEN DE VIBORAL
NIT: 901.521.260-2

Radicado No. 42
Fecha: 17/06/2024
Hora: 10:25 AM.

Señores

Arquitecta Valeria Cendoya
Directora Técnica
EMPRESA DE DESARROLLO RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL

REFERENCIA: Contrato COP -019-2023-CO, cuyo objeto es: *"Obras complementarias de algunos escenarios deportivos en el municipio de el Carmen de Viboral".*

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA

Cordial saludo.

Por medio de la presente nos permitimos informar a la entidad contratante (EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL - EDUR) sobre la solicitud de prórroga No 3 por TRES (3) meses, contados a partir de la fecha de terminación, teniendo en cuenta la necesidad expuesta por el municipio de realizar un cerramiento en malla eslabonada para la cancha múltiple ubicada en la cancha norte, esta solicitud fue realizada en el comité de obra del día 20 de mayo de 2024, al cual asistieron personal de la EDUR, de la secretaria de Infraestructura del municipio y el secretario de deportes. Es por esto que, realizando una evaluación técnica y de programación y con el fin de materializar en debida forma las actividades solicitadas se torna necesaria una adición en tiempo.

Anexos:

1. Acta de comité del 20 de mayo de 2024
2. Cronograma de obra actualizado

Agradecemos su colaboración.

Cordialmente,

HERNAN ALONSO GARCIA GIRALDO

Representante Legal

Constructora ZUGA S.A.S.

Constructora ZUGA
NIT. 901.006.474-3
Carrera 31 #10-125 Sector Campo Alegre - El Carmen de Viboral (Ant.)
3124703905 / 3113238385

ACTA # 120- Conv- 130- 2023
Cop- 017- 2023- CO

Fecha: 20- 05- 2024
Lugar: Edur
Hora: 8:00 am

EDUR Empresa de Desarrollo Urbano y Rural EL CARMEN DE VIBORAL

Municipio El Carmen de Viboral

Obras Complementarias.

Participantes

Nombre	Cargo/sector
Valeria Cantoya A	Edur
Fredy Zuluaga	ZUGA
Julian Ramirez	Infraestructura
Alejandro Giraldo O	Sec Deporte.

Invitado

Nombre	Cargo/sector

Objetivo de la reunión

Obras complementarias de algunos escenarios deportivos.

Agenda propuesta

Acta de cobro.
Solicitud de obras extras → Compromisos.

Desarrollo de la agenda

- Acta de cobro → Pendiente - no se presento
- Solicitud de O.E → Pendiente - no se presento.
- Acta de cobro por un valor aproximado. $ 180.000.000
- Solicitud de cerramiento a 4.00 mt. de altura para cancha multiple ubicada en la cancha norte → Se define

en vista a campo.
- Bosquejos de seguridad Bmx con paralelas cada 1.00 mts separación entre tablillas 0.30 mts.
Presentar balance de sacos de mayores y menores.

1. Compromisos.


Compromisos	Responsable	Fecha
Acta de cobro	Contratista	06-Junio-2024
Solicitud O.E	Contratista.	06-Junio-2024.

Próxima reunión:

FIRMAS:

-
- Fredy Ulloque
-
-
-

Elaboró: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

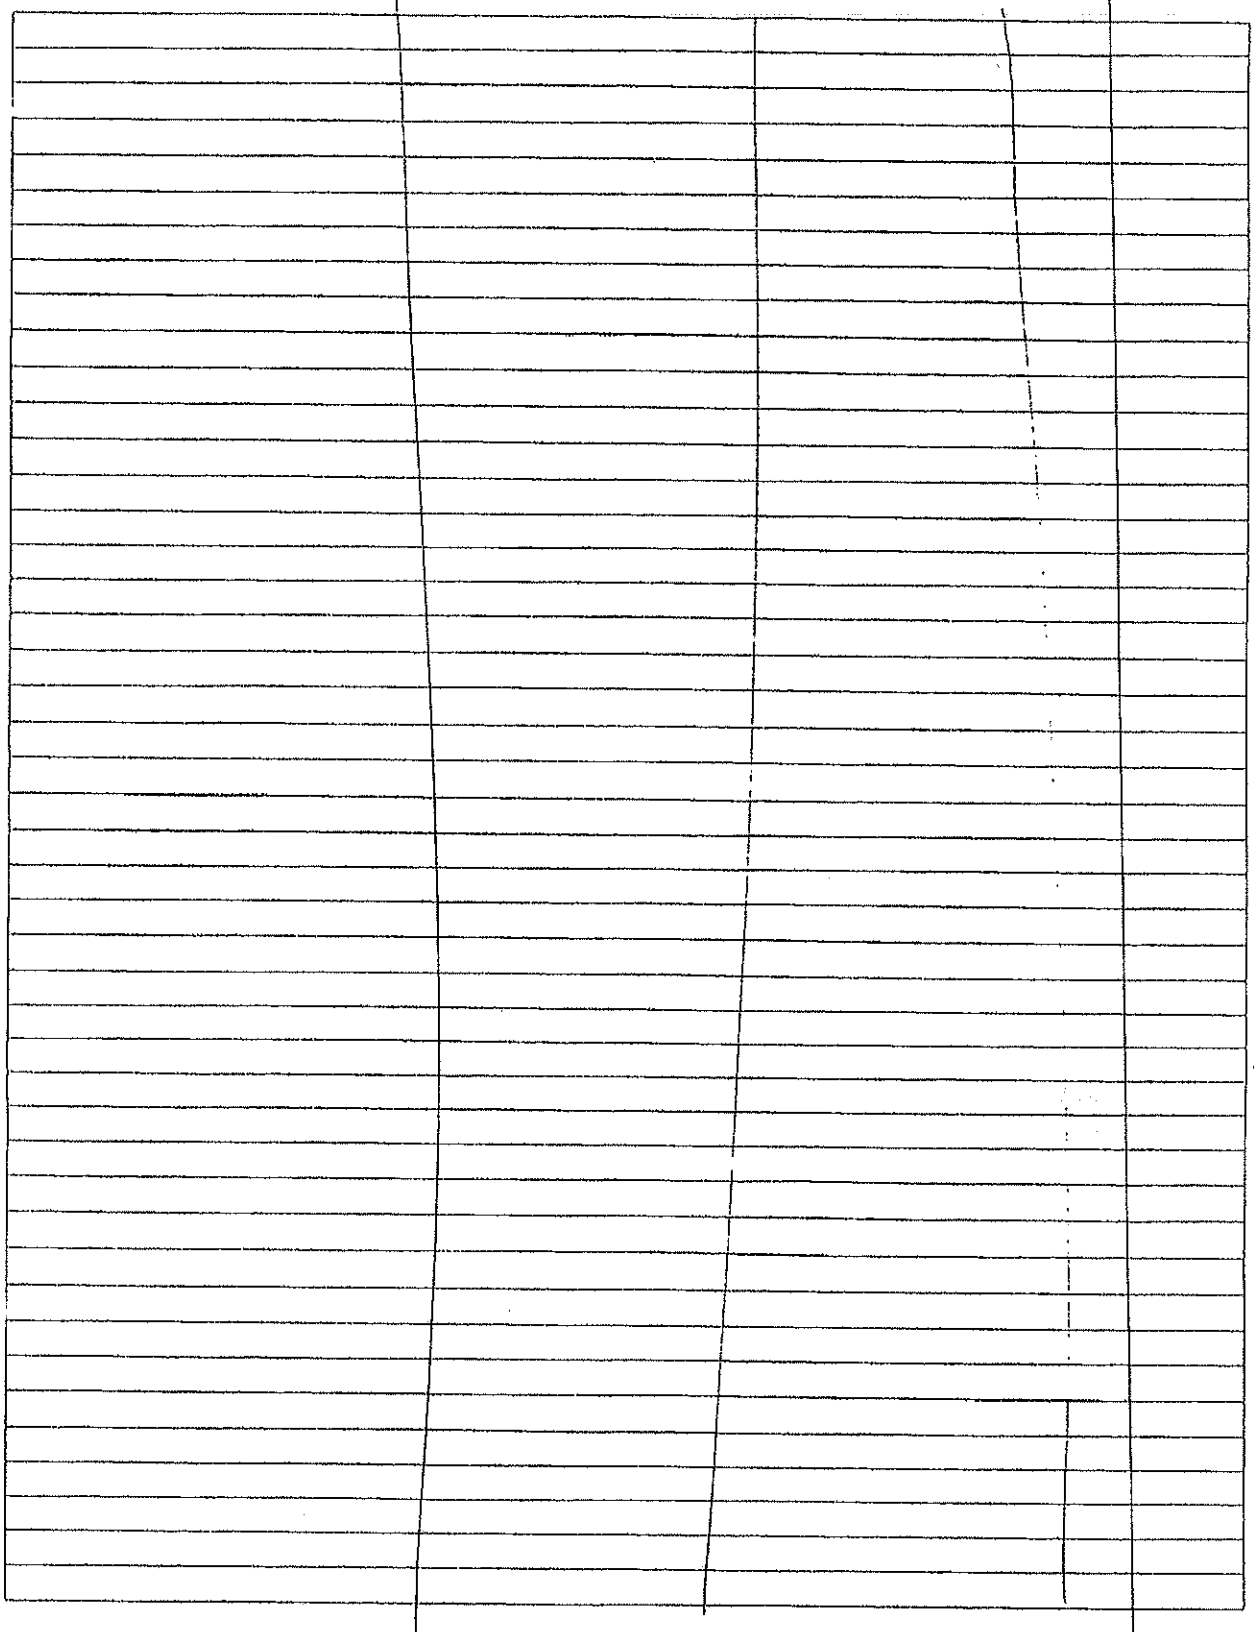

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural
EL CARMEN DE VIBORAL

CONTROL DE ASISTENCIA

Municipio
El Carmen de Viboral

Evento: Pro- Conv- 130- 2023
Cop- 019- 2023 - CO


Lugar: Edur.

Funcionario Responsable: Edur.


Fecha y Hora: 20-05-2024 8:00 am

No	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo o Entidad	Correo o Dirección	Teléfono/Celular	Firma
1	Valeria Cendoya A	1036399240	Edur	direccionpoblacion@edur.co	3113895071	
2	Freddy Villegas	15.446.112	ZUGA	constructora2uga@gmail.com	3113235	
3	Hernan Garcia	1.036.956	Encargado obra	Hagarcia@edu.co	3226985GG	Hernan Garcia
4	Wbeely Vargas R.	43715450	EDUR.		5432000	Wbeely R.
5	Hernan D Cruz	70903964	ZUGA	Hgarcia740@hotmail.	3124707905	
6	Marco Antonio Diaz	71113397	EDUR	gerencia@edur.elcarmen	3216444543	
7	Julian Ramirez Gaviria	1038415208	Interventoria		3108283278	
8	SANTIAGO CASTAÑEDA HENAO	1030417294	ZUGA.		3122426622	
9	Alejandro Giraldo Quintero	1036612381	Apoyo		3117288174	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y URBANISMO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CARMEN DE VIBORAL	186 días	vie 29/12/23	vie 20/09/24
2	**PRELIMINARES**	3 días	vie 29/12/23	mar 2/01/24
3	Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso y todos los elementos necesario	3 días	vie 29/12/23	mar 2/01/24
4	**EXCAVACIONES Y BOTADA**	128 días	mié 3/01/24	vie 5/07/24
5	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.3 m³, su medida será en el sitio. No incluye entibado	4 días	mié 3/01/24	lun 8/01/24
6	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.3 m³, su medida será en el sitio. No incluye entibado	13 días	lun 17/06/24	mié 3/07/24
7	Cargue, transporte y botada de material proveniente de las explanaciones, excavaciones y voladuras de roca. Incluye transportes internos, cargue mecánico, derecho de botadero. La disposición final se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la en	3 días	mar 9/01/24	jue 11/01/24
8	Cargue, transporte y botada de material proveniente de las explanaciones, excavaciones y voladuras de roca. Incluye transportes internos, cargue mecánico, derecho de botadero. La disposición final se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la en	2 días	jue 4/07/24	vie 5/07/24
9	**LLENOS Y CONFORMACIÓN**	18 días	mar 9/01/24	jue 1/02/24
10	Llenos en Arenilla, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y s	3 días	mar 9/01/24	jue 11/01/24

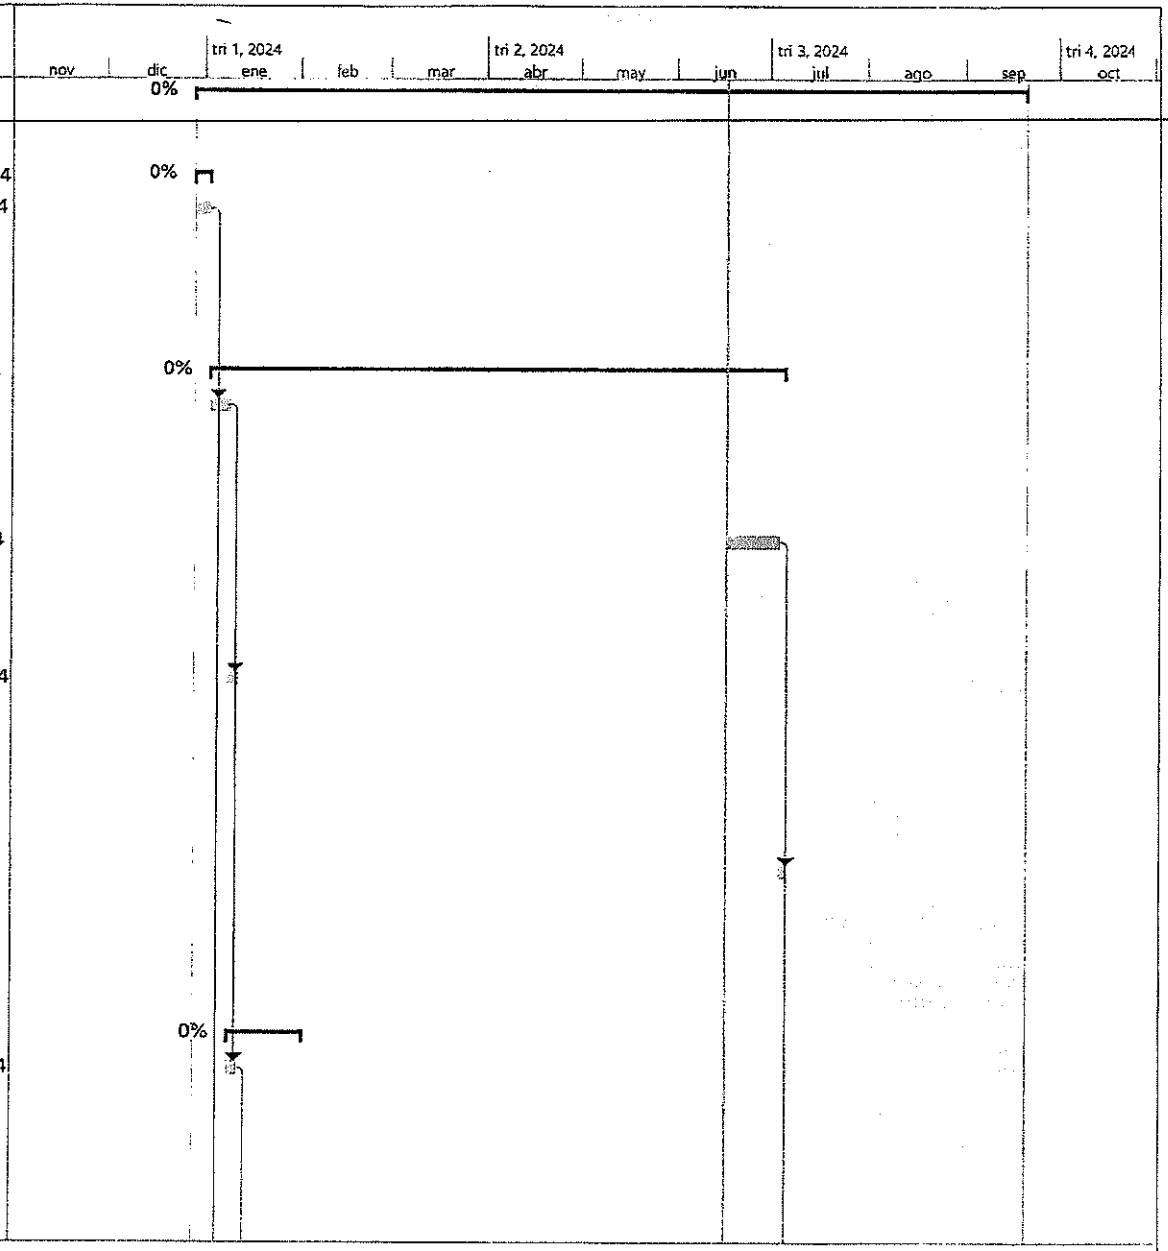


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
11	Lleno con material de afirmado tipo INVIAS. Incluye el suministro, el transporte al sitio de la obra, el regado, sellado y la compactación.	12 días	vie 12/01/24	lun 29/01/24
12	Suministro, transporte y colocación de base granular clase A , reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del próctor modificado, según normas según normas INVIAS para la construcción de pavimentos.	15 días	vie 12/01/24	jue 1/02/24
13	**CONCRETOS**	**119 días**	**mar 13/02/24**	**vie 2/08/24**
14	Colocación de Concreto de Resistencia 21 Mpa (Clase D). Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños y todos lo	30 días	mar 13/02/24	lun 1/04/24
15	Colocación de Concreto de Resistencia 21 Mpa (Clase D). Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños y todos lo	12 días	jue 18/07/24	vie 2/08/24
16	**ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURA METÁLICA**	**136 días**	**mié 3/01/24**	**mié 17/07/24**
17	Suministro, figurado, transporte e instalación de acero de refuerzo FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	5 días	vie 2/02/24	jue 8/02/24
18	Suministro, figurado, transporte e instalación de acero de refuerzo FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	10 días	jue 4/07/24	mié 17/07/24
19	Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada TIPO D 84, Incluye Armado, amarres, elementos de nivelación para garantizar recubrimiento y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	7 días	vie 2/02/24	lun 12/02/24

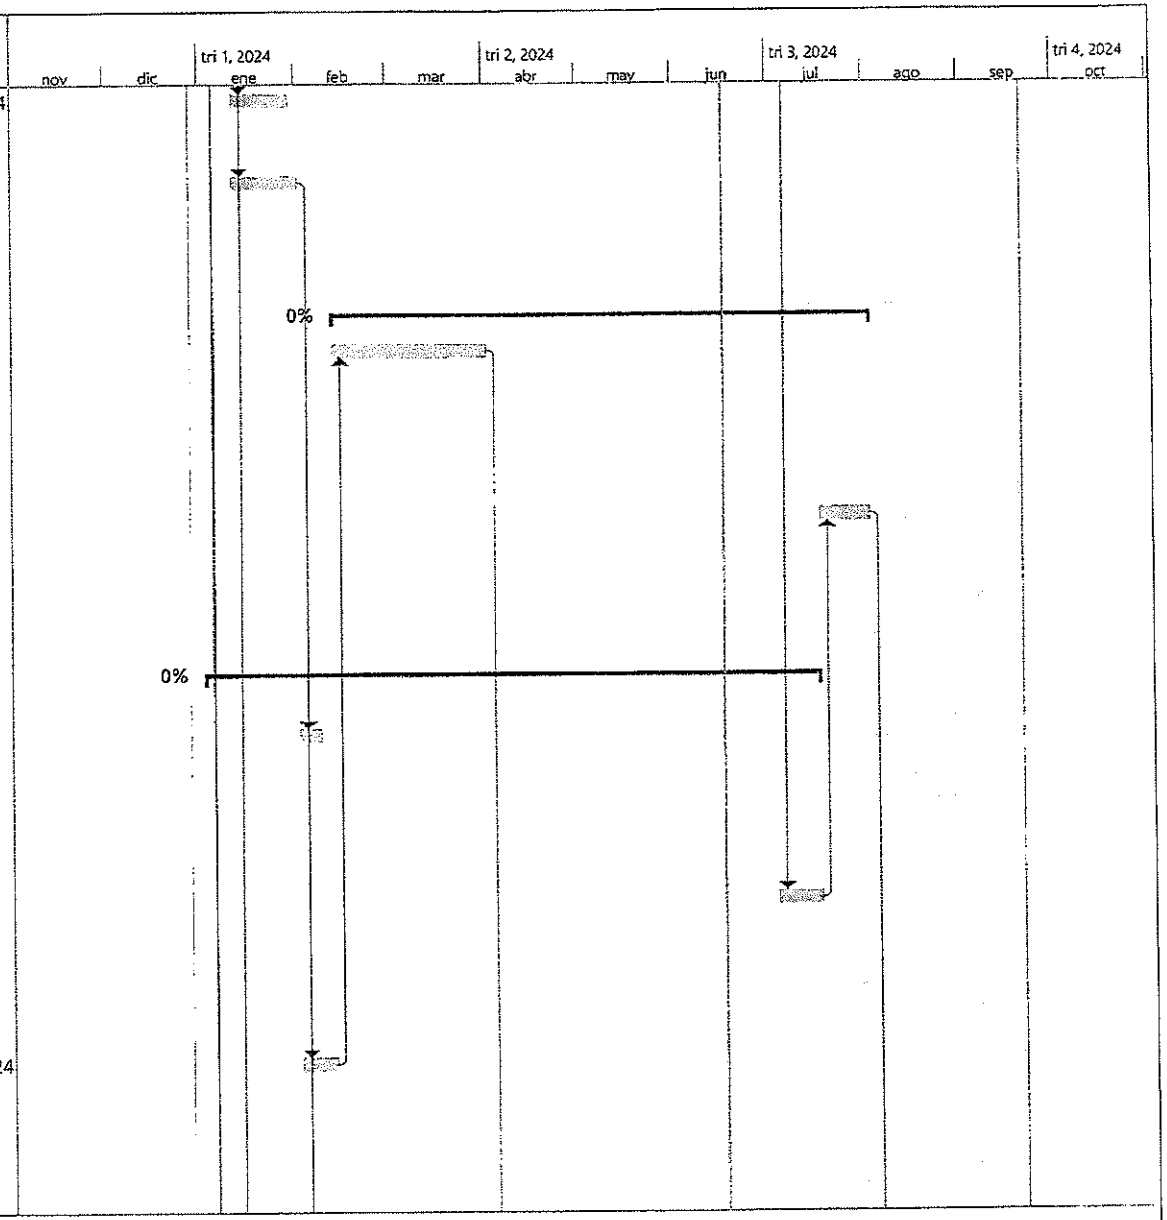


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
20	Suministro, transporte e instalación de pasamanos metálico con una altura de 0.90 m. Barrote 2" x 1,91 mm, superior e inferior; barrotes redondos de 12 mm cada 40 cm, platinas pie de amigo y platina de anclaje con un espesor de 1/4" cada 2.5 m y pernos ex	15 días	mar 2/04/24	lun 22/04/24
21	Construcción de Cerramiento en tubería Galvanizada y malla Nylon. H=1,35 m; Incluye marco soldado en tubo galvanizado 2" cada (1,20 mts x 1,20 metros) aproximadamente (Profundidad de anclaje del tubo =1,70m), malla en nylon altura 1.35 m , pilotes en conc	11 días	mar 23/04/24	mar 7/05/24
22	Fabricación, suministro y montaje "in situ" de estructura metálica. (Incluye: todas las medidas de seguridad y señalización necesarias, transporte, cortes, desperdicios, soldaduras, grúa de ser necesario, aplicación de acondicionador de superficie / ant	6 días	mié 3/01/24	mié 10/01/24
23	**MAMPOSTERÍA EN BLOQUE**	**123 días**	**mié 28/02/24**	**vie 23/08/24**
24	Suministro, transporte y colocación de mamposteria en bloque de concreto 15x20x40, incluye celdas llenas de concreto 1:4, corte, mortero de pega y todo lo necesario para su funcionamiento	15 días	mié 28/02/24	mar 19/03/24
25	Suministro, transporte y colocación de mamposteria en bloque de concreto 15x20x40, incluye celdas llenas de concreto 1:4, corte, mortero de pega y todo lo necesario para su funcionamiento	15 días	lun 5/08/24	vie 23/08/24
26	**DEMARCACIÓN Y COMPLEMENTOS**	**20 días**	**mar 2/04/24**	**lun 29/04/24**
27	Líneas de demarcación de 7 cm, con pintura apta a interperie, aplicación manual con llana ó Similar	15 días	mar 2/04/24	lun 22/04/24
28	S. T. I. de triturado 3/4" a 1" Canto rodado	5 días	mar 23/04/24	lun 29/04/24
29	**URBANISMO Y OTROS**	**183 días**	**mié 3/01/24**	**vie 20/09/24**

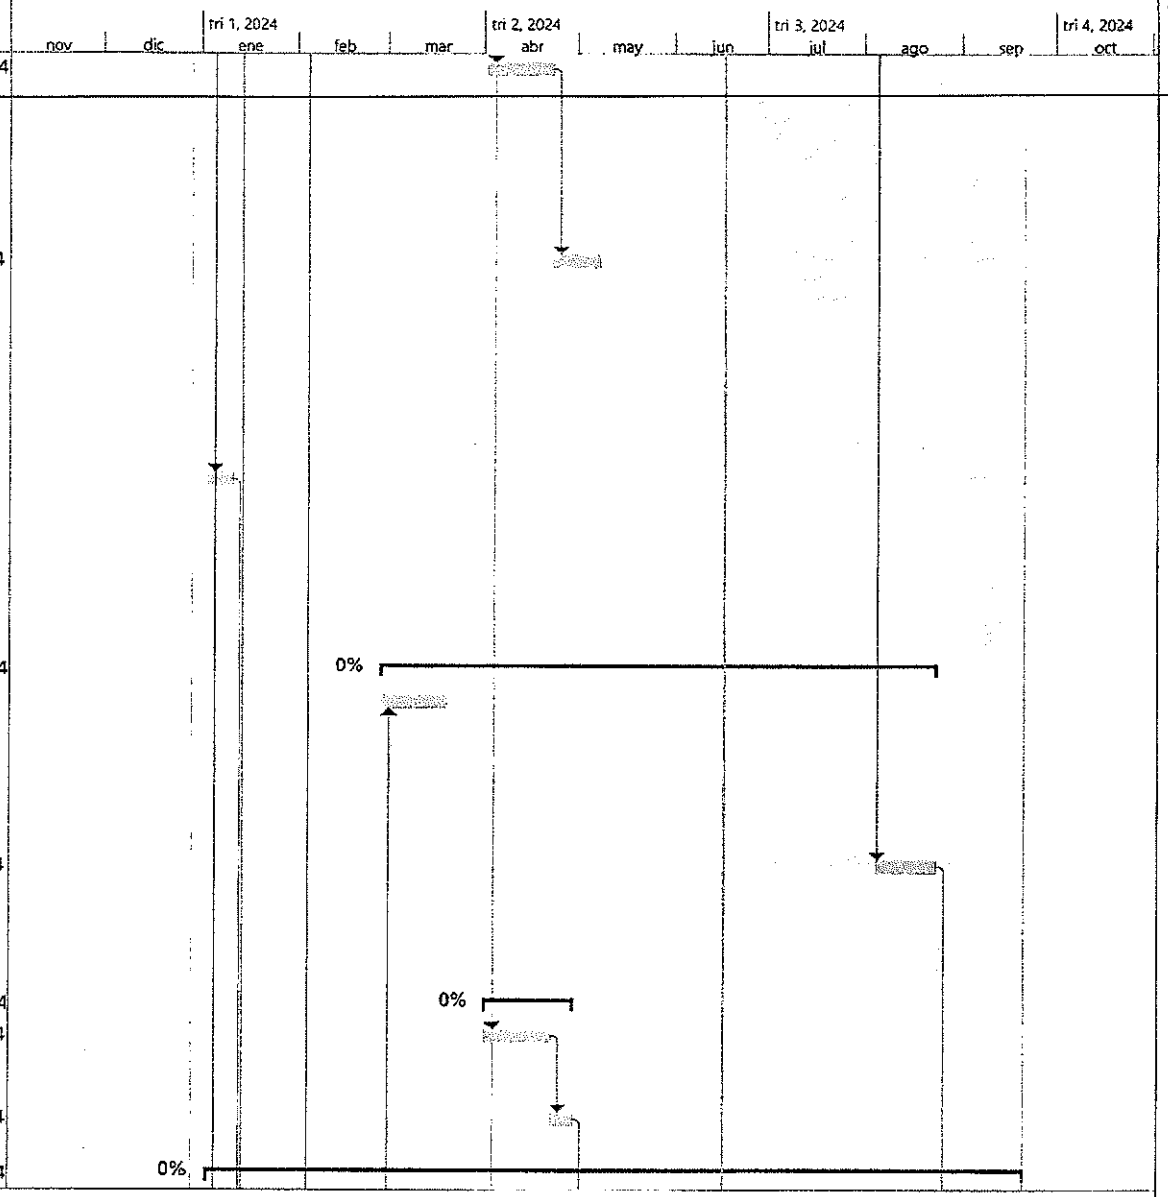


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
30	Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye, conformación del terreno, elementos de concreto o pa	0 días	jue 1/02/24	jue 1/02/24
31	Cerramiento en malla eslabonada para zonas frontales calibre 10, ojo 5*5 con una altura de la malla de 2,00 m, tuberia galvanizada de 1 1/2" calibre 16 cada 2,0 m con pie amigos en diagonal en rombo cada 8,0 m, en tuberia galvanizada de 1 1/2" calibre 16;	38 días	mar 2/04/24	jue 23/05/24
32	Cerramiento en malla eslabonada para zonas frontales calibre 10, ojo 5*5 con una altura de la malla de 2,00 m, tuberia galvanizada de 1 1/2" calibre 16 cada 2,0 m con pie amigos en diagonal en rombo cada 8,0 m, en tuberia galvanizada de 1 1/2" calibre 16;	20 días	lun 26/08/24	vie 20/09/24
33	S.T.I de puerta en tuberia de 2" x 1,91 mm de 2 metros de alto x 4,00 m ancho en malla eslabonada de 2 1/4" x 21/4" de dos marcos (cuadrados) de 1.00 x 1.00 m, con poste diagonal en cada uno de los cuadros que conforman el marco. Doble ALA, Incluye todo l	20 días	vie 24/05/24	jue 20/06/24
34	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente para pavimento MDC-10. Compactada con medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye compactador manual + Operador + Combustible o equivalente, Cuadr	0 días	jue 1/02/24	jue 1/02/24
35	Perfilacion y proteccion de superficies. Incluye perfilacion manual, proteccion con plastico negro calibre 4 y todo lo necesario para la correcta ejecucion y funcionamiento.	0 días	jue 11/01/24	jue 11/01/24
36	Suministro, transporte e instalacion de proteccion de taludes en grama tipo macana o similar. Incluye grama y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.	15 días	vie 2/02/24	jue 22/02/24

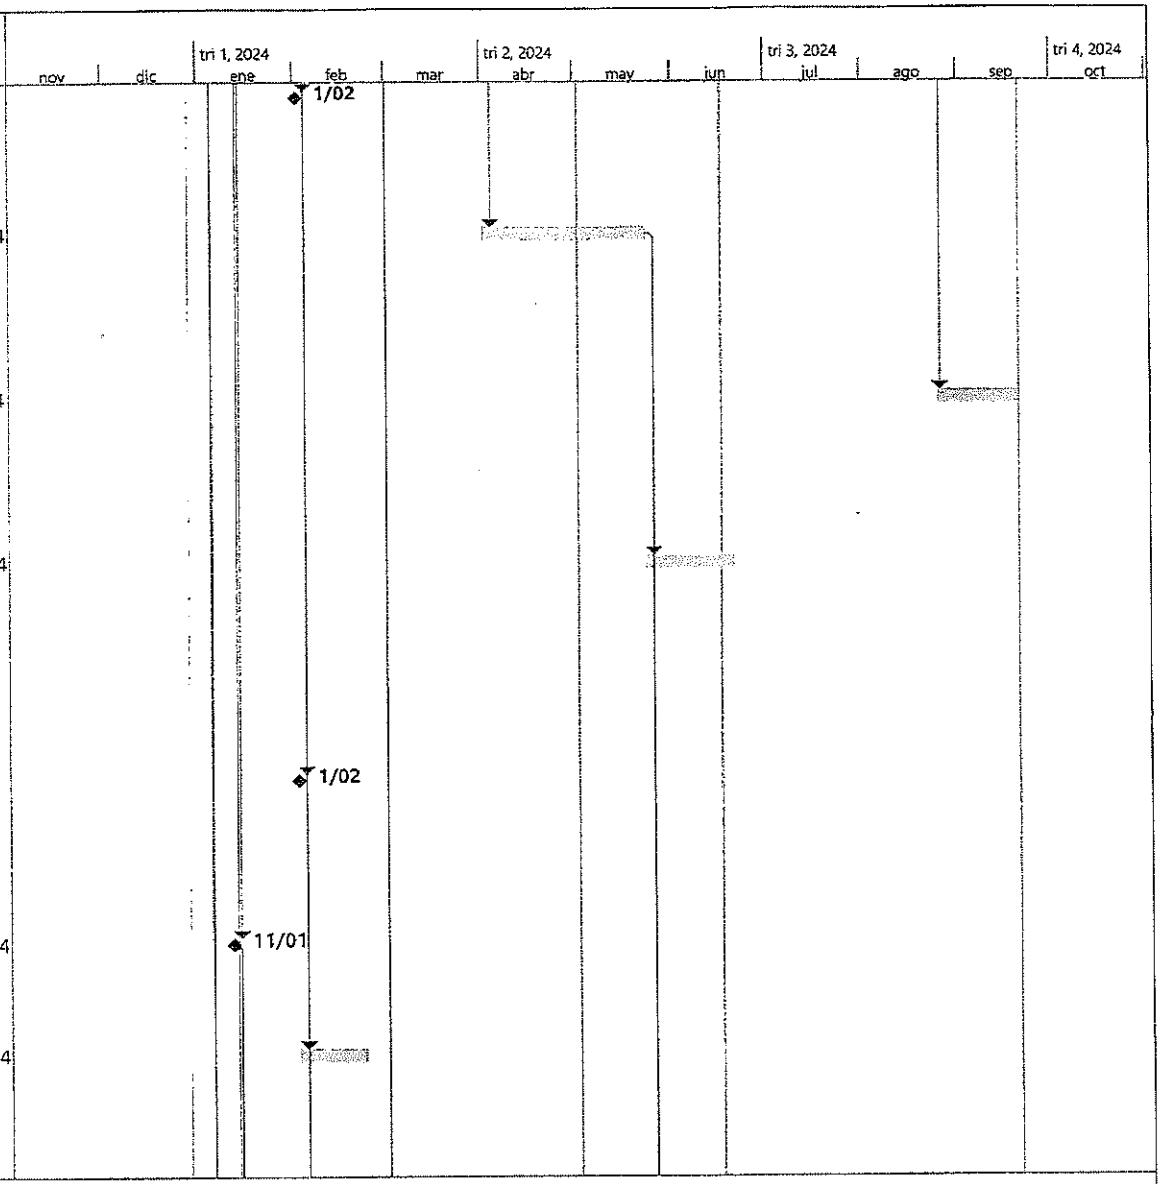

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
37	S.T.I de puerta en tuberia de 2" x 1,91 mm de 2 metros de alto x 1,50 m ancho en malla eslabonada de 2 1/4" x 2 1/4", Dos marcos (cuadrados) de 1.00 x 1.50 m, con poste diagonal en cada uno de los cuadros que conforman el marco. Incluye todo lo necesario p	5 días	vie 24/05/24	jue 30/05/24
38	Suministro y construcción de sumidero tipo B, incluye reja de acuerdo a especificación técnica según EPM	6 días	vie 2/02/24	vie 9/02/24
39	Suministro, transporte e instalación de tubería Novafort PVC-S8 para alcantarillado 200 mm, (8 Pulgadas). Incluye transporte de los materiales, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta	3 días	mar 30/04/24	jue 2/05/24
40	Cuneta en concreto de 21 Mpa, Desarrollo de 50 cm, incluye excavacion, formaleteria, Malla Electrosoldada D-50 y Todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	0 días	jue 1/02/24	jue 1/02/24
41	Suministro, transporte e instalacion de Malla mosquitera en marco metalico.	15 días	mié 21/02/24	mar 12/03/24
42	Suministro, transporte e instalacion de reja superior a 2,5 metros de Altura y/o (5 m2); Incluye puerta metalica según esquemas suministrados por Interventoría ó Supervisión, Incluye Chapa de Seguridad Tipo Yale o Similar	5 días	mié 14/02/24	mar 20/02/24
43	Suministro, transporte e instalacion de rejas para protección de puertas, ventanas o similar, Según diseño suministrados por interventoría o supervisor. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.	30 días	mié 3/01/24	mar 13/02/24
44	Mantenimineto y pintura de pasamanos en tubería metálica, Incluye retiro de pintura existente y aplicación de anticorrosivo y esmalte apto para intemperie, color según indicaciones de la supervision.	3 días	mié 14/02/24	vie 16/02/24

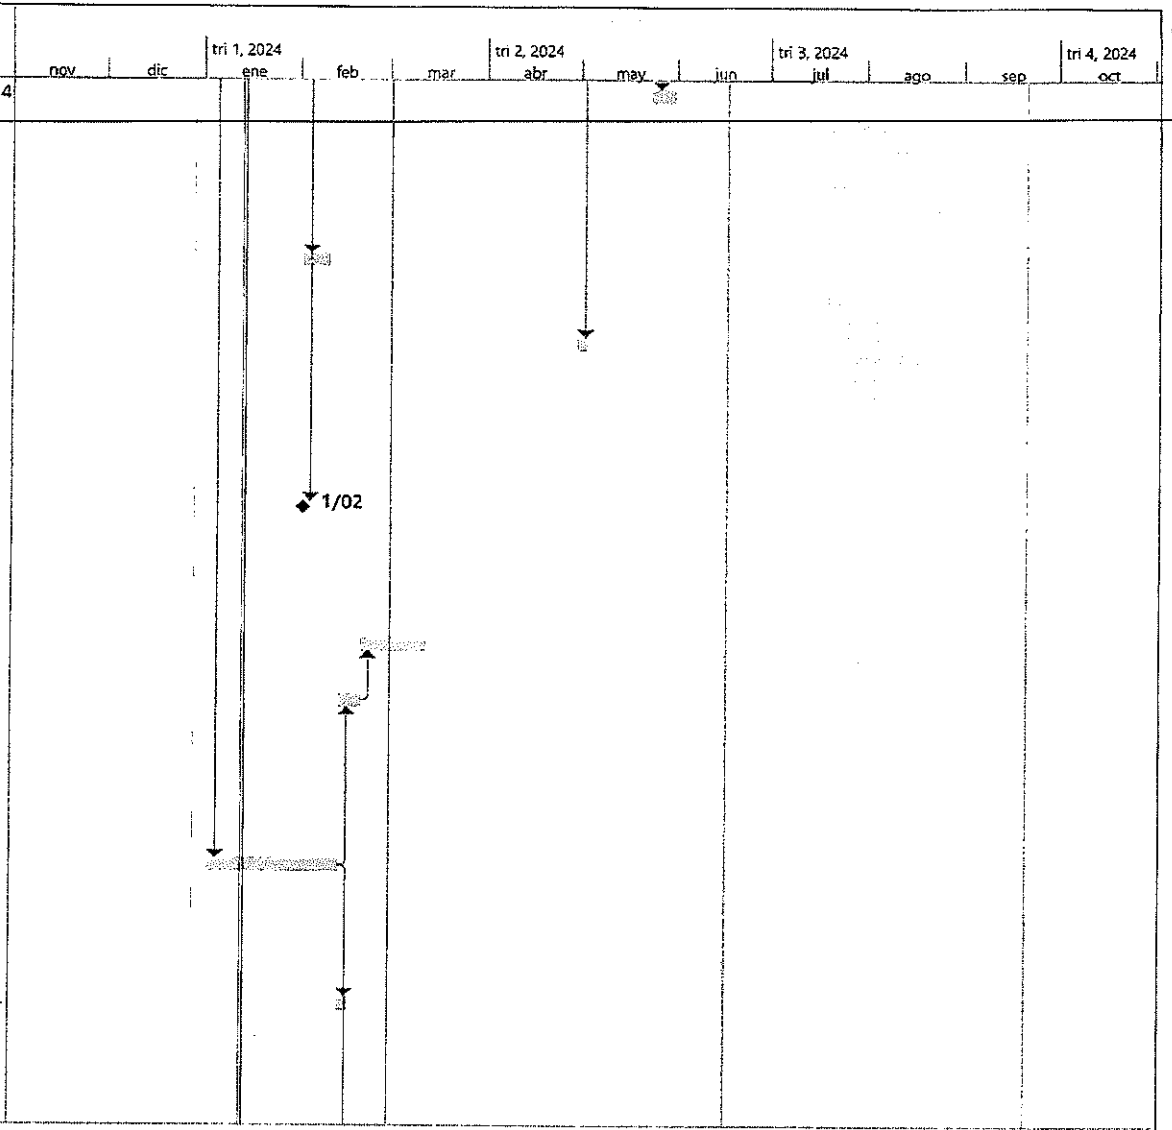

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
45	Aplicación de PINTURA TIPO EXTERIOR en superficies de concreto a la vista, 3 manos o las necesarias para obtener una superficie homogénea, a satisfacción de la interventoria. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada, limpieza y adecuac	10 días	mié 14/02/24	mar 27/02/24
46	Mejoramiento y estabilización de Superficies con Arenilla Cemento, Sometidas a tráfico Liviano E=7 CM. Incluye suministro de cemento y arena de concreto con particulas inferiores a 2mm con una relacion de 2 bultos de cemento por 1 m3 de arena de concreto,	0 días	jue 11/01/24	jue 11/01/24
47	Suministro e Instalaciópn de Espejo biselado 6 mm. Incluye anclajes y todos los elementos para su correcta instalación	4 días	mié 14/02/24	lun 19/02/24
48	Suministro transporte e instalación de reflector 200w tipo sylvania o similar.	5 días	jue 11/01/24	mié 17/01/24
49	Aplicación de PINTURA ACRÍLICA en muros para exteriores tipo koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacci	15 días	mié 14/02/24	mar 5/03/24
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				

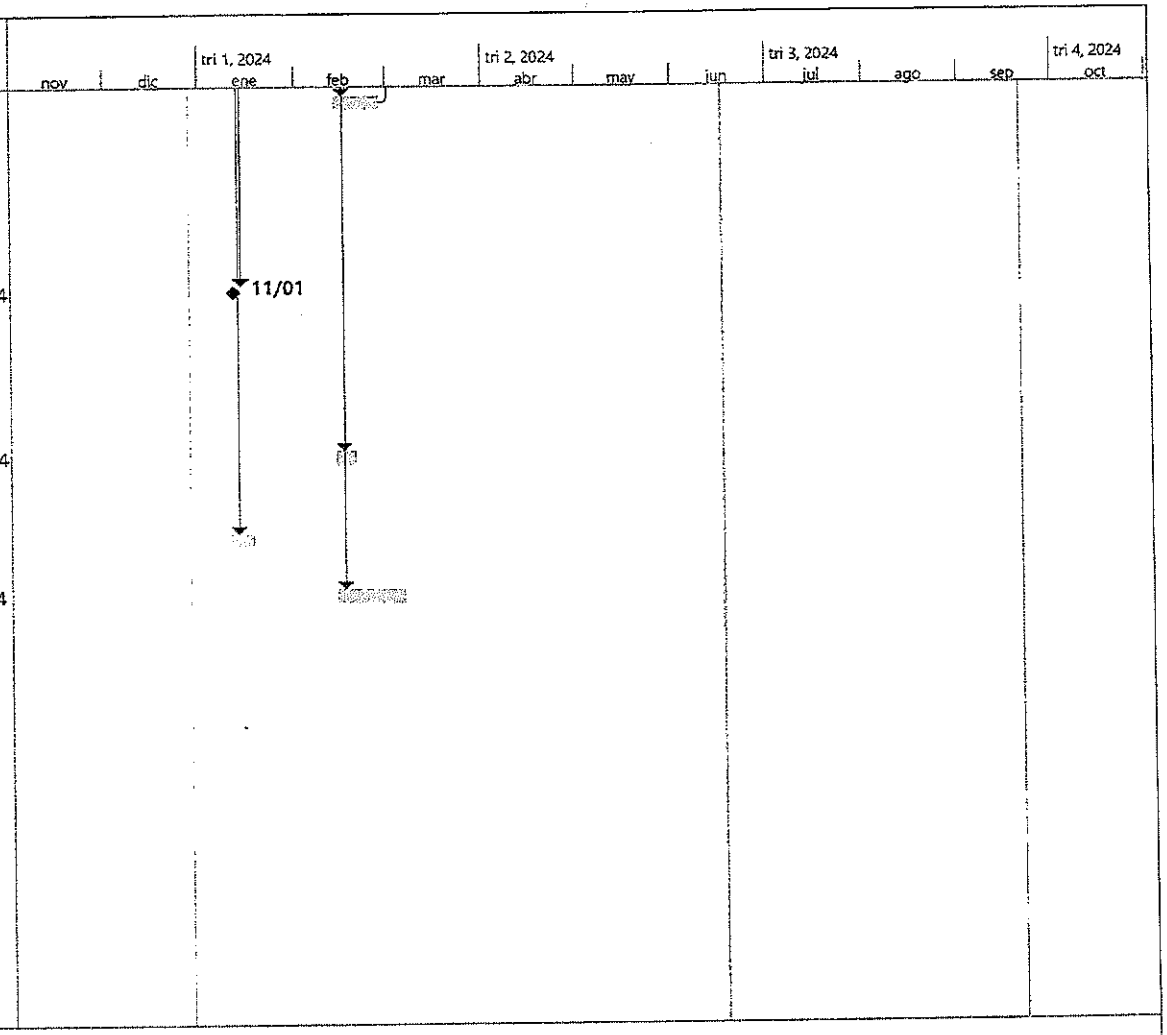

El Carmen de Viboral, Antioquia.

Señor,
MARCO ANTONIO DÍAZ MEDINA
Gerente de la EDUR

EL CARMEN DE VIBORAL.
890982616-9
Al Contestar por favor cite estos datos:
Radicado Nro.: 02565
Fecha. Rad: 20/06/2024 15:46:26

Señor,
JUAN JOSE MORENO SOTO
Secretario de Infraestructura

Cordial saludo,

Como se viene ejecutando el contrato INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO "INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA" PARA LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALGUNOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, 170-CONV-130-2023, solicito muy respetuosamente que se realice el cerramiento de la infraestructura deportiva nueva ubicada en la cancha municipal de la zona sur.

Esperamos que se pueda realizar este cerramiento y de esta manera garantizar la protección de este escenario.

Atentamente,

Alejandro Giraldo Quintero.
Secretario de Deporte y Recreación.

Reviso y aprobó: Alejandro Giraldo Quintero – Secretario de Deporte y Recreación
