INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-42
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	ACTA DE PAGO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032		
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 21 de mayo de 2024	a a	11 de octubre de 2023 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023		
NIT:	901666697-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com		
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.		
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.		
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META													
1	PRELIMINARES													
1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	13.799,17	$ 5.457,00	$ 75.302.071,00	13.819,92	$ 75.415.303,00	12.675,94	$ 69.172.605,00	541,40	$ 2.954.420,00	13.217,34	$ 72.127.025,00	95,64%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP1.2	DESCAPOTE MECANICO H= 0.20 M	M3	0,00	$ 19.501,00	$ 0,00	1.793,40	$ 34.973.093,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP1.3	CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML	0,00	$ 116.447,00	$ 0,00	90,00	$ 10.480.230,00	0,00	$ 0,00	90,00	$ 10.480.230,00	90,00	$ 10.480.230,00	100,00%
	SUBTOTAL				$ 75.302.071,00		$ 120.868.626,00		$ 69.172.605,00		$ 13.434.650,00		$ 82.607.255,00	
2	DESMONTE Y DEMOLICIONES													
2,1	DEMOLICION GAVIONES. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	M3	145,62	$ 215.958,00	$ 31.447.804,00	201,00	$ 43.407.558,00	142,00	$ 30.666.036,00	59,00	$ 12.741.522,00	201,00	$ 43.407.558,00	100,00%
2,2	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	285,18	$ 14.700,00	$ 4.192.146,00	285,18	$ 4.192.146,00	51,75	$ 760.725,00	0,00	$ 0,00	51,75	$ 760.725,00	18,15%
2,3	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	977,76	$ 33.199,00	$ 32.460.654,00	977,76	$ 32.460.654,00	176,76	$ 5.868.255,00	0,00	$ 0,00	176,76	$ 5.868.255,00	18,08%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP2.4	DESMONTE DE LUMINARIA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	UND	0,00	$ 169.110,00	$ 0,00	16,00	$ 2.705.760,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 2.705.760,00	16,00	$ 2.705.760,00	100,00%
NP2.5	DESMONTE DE POSTE EN CONCRETO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	UND	0,00	$ 236.457,00	$ 0,00	10,00	$ 2.364.570,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 2.364.570,00	10,00	$ 2.364.570,00	100,00%
	SUBTOTAL				$ 68.100.604,00		$ 85.130.688,00		$ 37.295.016,00		$ 17.811.852,00		$ 55.106.868,00	
3	EXCAVACIONES Y RELLENOS													
3,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	6.943,97	$ 38.640,00	$ 268.315.001,00	9.094,90	$ 351.426.936,00	6.936,71	$ 268.034.474,00	200,51	$ 7.747.706,00	7.137,22	$ 275.782.180,00	78,47%
3,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	662,84	$ 76.585,00	$ 50.763.601,00	865,11	$ 66.254.449,00	75,79	$ 5.804.377,00	73,56	$ 5.633.593,00	149,35	$ 11.437.970,00	17,26%
3,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	406,71	$ 63.830,00	$ 25.960.299,00	3.220,25	$ 205.548.558,00	403,92	$ 25.782.214,00	2.005,00	$ 127.979.150,00	2.408,92	$ 153.761.364,00	74,81%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP3.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	0,00	$ 248.800,00	$ 0,00	3.082,00	$ 766.801.600,00	0,00	$ 0,00	1.827,29	$ 454.629.752,00	1.827,29	$ 454.629.752,00	59,29%
NP3.5	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN SITIO AUTORIZADO	M3	0,00	$ 14.280,00	$ 0,00	20.935,82	$ 298.963.510,00	0,00	$ 0,00	12.791,00	$ 182.655.480,00	12.791,00	$ 182.655.480,00	61,10%
	SUBTOTAL				$ 345.038.901,00		$ 1.688.996.053,00		$ 299.621.065,00		$ 778.645.681,00		$ 1.078.266.746,00	
4	CIMENTACION													
4,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	19,79	$ 643.591,00	$ 12.736.666,00	19,79	$ 12.736.666,00	14,74	$ 9.486.531,00	4,98	$ 3.205.084,00	19,72	$ 12.691.615,00	99,65%
4,2	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	47,84	$ 2.338.652,00	$ 111.881.112,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	106,30	$ 939.801,00	$ 99.900.846,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032		
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 21 de mayo de 2024	a a	11 de octubre de 2023 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023		
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com		
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.		
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.		
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
4,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	43,21	$ 1.012.044,00	$ 43.730.421,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,5	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	62,30	$ 651.075,00	$ 40.561.973,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	31.903,76	$ 8.544,00	$ 272.585.725,00	83.319,19	$ 711.879.159,00	0,00	$ 0,00	60.525,85	$ 517.132.862,00	60.525,85	$ 517.132.862,00	72,64%
4,7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	136,49	$ 824.636,00	$ 112.554.568,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP4.8	PEDESTALES EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.882.151,00	$ 0,00	33,85	$ 63.710.811,00	0,00	$ 0,00	32,91	$ 61.941.589,00	32,91	$ 61.941.589,00	97,22%
NP4.9	ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.204.022,00	$ 0,00	91,56	$ 110.240.254,00	0,00	$ 0,00	91,56	$ 110.240.254,00	91,56	$ 110.240.254,00	100,00%
NP4.10	VIGA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.247.102,00	$ 0,00	38,16	$ 47.589.412,00	0,00	$ 0,00	38,16	$ 47.589.412,00	38,16	$ 47.589.412,00	100,00%
NP4.11	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLADO EN OBRA	M3	0,00	$ 749.229,00	$ 0,00	162,41	$ 121.682.282,00	0,00	$ 0,00	162,41	$ 121.682.282,00	162,41	$ 121.682.282,00	100,00%
	SUBTOTAL				$ 693.951.311,00		$ 1.067.838.584,00		$ 9.486.531,00		$ 861.791.483,00		$ 871.278.014,00	
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO													
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL. 18 (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	878,02	$ 128.878,00	$ 113.157.462,00	1.454,55	$ 187.459.495,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
5,2	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA.	M3	205,79	$ 677.128,00	$ 139.346.171,00	205,79	$ 139.346.171,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
5,3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	6,85	$ 921.222,00	$ 6.310.371,00	6,85	$ 6.310.371,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP5.4	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.703.798,00	$ 0,00	501,37	$ 854.233.203,00	0,00	$ 0,00	312,80	$ 532.948.014,00	312,80	$ 532.948.014,00	62,39%
NP5.5	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.075.699,00	$ 0,00	41,94	$ 45.114.816,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP5.6	SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y ACABADO DE COLOR A BASE DE POLIUREA MULTICAPA, COMPUESTO POR PRIMER, BASE Y ACABADO, ADICIÓN DE ARENA CUARZO PARA MAYOR RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y ACABADO ANTIDESLIZANTE	M2	0,00	$ 454.033,00	$ 0,00	1.319,89	$ 599.273.616,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP5.7	CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑA FLEXIBLE CON BANDA ENGOMADA CON FILTRO, RESISTENTE A LOS ÁLCALIS Y MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL MONOCOMPONENTE FLEXIBLE	ML	0,00	$ 85.744,00	$ 0,00	119,94	$ 10.284.135,00	0,00	$ 0,00	111,92	$ 9.596.468,00	111,92	$ 9.596.468,00	93,31%
NP5.8	GROUTING DE NIVELACION fc MAYOR O IGUAL 35 MPA	LT	0,00	$ 30.896,00	$ 0,00	1.451,12	$ 44.833.804,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032		
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023	a	11 de octubre de 2023
			21 de mayo de 2024	a	20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023		
NIT:	901166659/-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com		
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.		
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.		
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024		

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP5.9	CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) PARA ELEMENTOS VERTICALES DE CONSTRUCCIÓN COMPUESTA, VACIADO ALTURA MAYOR A 11 MT, ALTAMENTE FLUIDO Y COHESIVO, AGREGADO 3/8" (RELLENO COLUMNA METALICAS EXISTENTES - INCLUYE PERFORACIÓN)	M3	0,00	$ 1.175.465,00	$ 0,00	58,44	$ 68.694.175,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 258.814.004,00		$ 1.955.549.786,00		$ 0,00		$ 542.544.482,00		$ 542.544.482,00	
6	ESTRUCTURAS EN ACERO													
6,1	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	311.037,58	$ 25.899,00	$ 8.055.562.284,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
6,2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	4.427,06	$ 9.991,00	$ 44.230.756,00	4.427,06	$ 44.230.756,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36- A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	KG	0,00	$ 33.906,00	$ 0,00	296.660,73	$ 10.058.578.711,00	0,00	$ 0,00	77.159,63	$ 2.616.174.415,00	77.159,63	$ 2.616.174.415,00	26,01%
	SUBTOTAL				$ 8.099.793.040,00		$ 10.102.809.467,00		$ 0,00		$ 2.616.174.415,00		$ 2.616.174.415,00	
7	CUBIERTA Y FACHADA													
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2``	M2	1.577,32	$ 255.278,00	$ 402.655.095,00	1.577,32	$ 402.655.095,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
7,2	SUMINSITRO DE REVESTIMIENTO LAMINAS EN SCREEN PANEL PARA FACHADAS (incluye estructura de soporte.)	M2	636,00	$ 1.064.060,00	$ 676.742.160,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
7,3	REMATES INFERIORES CALIBRE 24, PREPINTADO EN UNA CARA, COLOR A ESCOGER, SEGÚN SELECTOR DE COLORES.	ML	90,00	$ 136.546,00	$ 12.289.140,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FACHADA EN REVESTIMIENTO MINIWAVE O SIMILAR EN PANEL EN ALUZINC 0.5 MM PERFORADO, PREPINTADO EN POLIESTRER HORNEABLE EN DOS CARAS. INC ELEMENTO DE SOPORTE A ESTRUCTURA.	M2	0,00	$ 904.233,00	$ 0,00	994,61	$ 899.359.184,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 1.091.686.395,00		$ 1.302.014.279,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
8	MAMPOSTERÍA Y PAÑETES													
8,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2	1.432,46	$ 53.902,00	$ 77.212.459,00	1.432,46	$ 77.212.459,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,2	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	16,35	$ 1.343.430,00	$ 21.965.081,00	16,35	$ 21.965.081,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,3	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	22,23	$ 1.382.134,00	$ 30.724.839,00	22,23	$ 30.724.839,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032		
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023	a	11 de octubre de 2023
			21 de mayo de 2024	a	20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.446.211,00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023		
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com		
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.		
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.		
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024		

N° ÍTEM		CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
8,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	10,59	$ 1.012.044,00	$ 10.717.546,00	10,59	$ 10.717.546,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,5	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,07	$ 1.811.652,00	$ 3.750.120,00	2,07	$ 3.750.120,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,6	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,73	$ 1.998.272,00	$ 5.449.823,00	2,73	$ 5.449.823,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,7	GRANITO PULIDO PARA MESON	M2	13,63	$ 142.694,00	$ 1.944.919,00	13,63	$ 1.944.919,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,8	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	2.604,48	$ 26.628,00	$ 69.352.093,00	2.604,48	$ 69.352.093,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,9	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	482,96	$ 36.215,00	$ 17.490.396,00	482,96	$ 17.490.396,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,10	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	2.677,50	$ 8.544,00	$ 22.876.565,00	2.677,50	$ 22.876.560,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 261.483.841,00		$ 261.483.836,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
9	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS													
9,1	SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR	UND	48,00	$ 1.416.495,00	$ 67.991.760,00	54,00	$ 76.490.730,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	3,00	$ 903.966,00	$ 2.711.898,00	4,00	$ 3.615.864,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,3	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UND	19,00	$ 957.101,00	$ 18.184.919,00	18,00	$ 17.227.818,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,4	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	36,00	$ 506.457,00	$ 18.232.452,00	47,00	$ 23.803.479,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,5	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UND	24,00	$ 162.556,00	$ 3.901.344,00	20,00	$ 3.251.120,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.	UND	3,00	$ 329.093,00	$ 987.279,00	4,00	$ 1.316.372,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,7	ESPEJO 4 MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	16,59	$ 156.736,00	$ 2.600.250,00	19,20	$ 3.009.331,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,8	GRIFERÍA ANTIVAND. LAVAMANOS T. AC-65106 DOCOL	UND	36,00	$ 388.578,00	$ 13.988.808,00	45,00	$ 17.486.010,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 128.598.710,00		$ 146.200.724,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
10	CARPINTERIA METALICA													
10,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	UND	4,00	$ 530.305,00	$ 2.121.220,00	4,00	$ 2.121.220,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	145,73	$ 722.824,00	$ 105.337.142,00	145,73	$ 105.337.142,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
10,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO SIST. PERSIANA FIJA ALUMINIO	M2	61,06	$ 324.441,00	$ 19.810.367,00	61,06	$ 19.810.367,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
10,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METALICA EN 4 TUBOS DE 2" Y PLATINA 1/8" CADA 0.12M	ML	281,56	$ 311.411,00	$ 87.680.881,00	281,56	$ 87.680.881,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
10,5	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE REF.304 CALIBRE 18, ENTAMBORADAS CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PASADORES, SEGÚN PLANO.	M2	230,63	$ 1.597.087,00	$ 368.336.175,00	230,63	$ 368.336.175,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
10,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2" PARAL 1-1/2" BARANDA 5/8"	ML	101,37	$ 586.760,00	$ 59.479.861,00	101,37	$ 59.479.861,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023 21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 66.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023
NIT:	901666097-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	SUBTOTAL				**$ 642.765.646,00**		**$ 642.765.646,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
11	OBRAS EXTERIORES													
11,1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	184,43	$ 63.830,00	$ 11.772.167,00	823,69	$ 52.570.388,00	172,23	$ 10.993.441,00	0,00	$ 0,00	172,23	$ 10.993.441,00	20,91%
11,2	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	287,05	$ 132.727,00	$ 38.099.285,00	287,05	$ 38.099.285,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
11,3	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 40 KG/CM2 O 4.0 MPA, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA.	M3	91,86	$ 1.096.869,00	$ 100.758.366,00	176,70	$ 193.816.752,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
11,4	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	268,20	$ 4.716,00	$ 1.264.831,00	268,20	$ 1.264.831,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
11,5	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 20MM 750GR TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	531,00	$ 98.126,00	$ 52.105.968,00	531,00	$ 52.105.968,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
11,6	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	114,22	$ 131.566,00	$ 15.027.469,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO	ML	0,00	$ 94.072,00	$ 0,00	675,33	$ 63.529.644,00	0,00	$ 0,00	186,00	$ 17.497.392,00	186,00	$ 17.497.392,00	27,54%
NP11.8	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	$ 98.967,00	$ 0,00	536,63	$ 53.108.661,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP11.9	SARDINEL BAJO RAMPA DE PIEZAS PREFABRICADAS EN CONCRETO, TIPO A-85 80X20X35 CM, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	$ 119.446,00	$ 0,00	22,67	$ 2.707.841,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP11.10	SARDINEL DE TRANSICIÓN DE PIEZAS PREFABRICADAS EN CONCRETO, TIPO A-100 60X20X50 CM, NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	0,00	$ 105.036,00	$ 0,00	32,00	$ 3.361.152,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP11.11	PIEZA DE REMATE EN CONCRETO, TIPO A-105 80X40X27.5 CM, NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	UND	0,00	$ 111.566,00	$ 0,00	32,00	$ 3.570.752,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP11.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA A-50 DIMENSIONES (0.40M * 0.40M * 0.06M) TIPO IDU	M2	0,00	$ 155.015,00	$ 0,00	5.462,35	$ 846.746.185,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP11.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA ALERTA TOPEROL A-55 DIMENSIONES (0.40M * 0.40M * 0.06M)	ML	0,00	$ 78.318,00	$ 0,00	770,20	$ 60.320.524,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP11.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA ALERTA GUIA A-56 (0.40M * 0.40M * 0.06M)	ML	0,00	$ 78.318,00	$ 0,00	271,51	$ 21.264.120,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 219.028.106,00**		**$ 1.392.466.103,00**		**$ 10.993.441,00**		**$ 17.497.392,00**		**$ 28.490.833,00**	

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032		
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 a 21 de mayo de 2024	a	11 de octubre de 2023 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023		
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorciospacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com		
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.		
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	comprisinterdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.		
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
12	PISOS Y ENCHAPES													
12,1	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 70 MM	M2	1.284,69	$ 48.283,00	$ 62.028.687,00	1.284,69	$ 62.028.687,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
12,2	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	1.284,69	$ 204.130,00	$ 262.243.770,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
12,3	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	971,55	$ 52.732,00	$ 51.231.775,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
12,4	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	429,52	$ 136.174,00	$ 58.489.456,00	973,29	$ 132.536.792,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP12,5	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO CON ENDURECEDOR PARA PISO BASE QUARZO TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP NEUTRO O SIMILAR - TRAFICO PESADO - E= 0.12 M, 24.1 MPA (3500 PSI) - ACABADO CON MAQUINA ALLANADORA TIPO HELICOPTERO INC CORTE Y DILATACIONES	M2	0,00	$ 298.893,00	$ 0,00	785,53	$ 234.789.418,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 433.993.688,00		$ 429.354.897,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
13	ACABADOS													
13,1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	2.172,26	$ 12.171,00	$ 26.438.576,00	2.172,26	$ 26.438.576,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
13,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	482,96	$ 13.992,00	$ 6.757.576,00	482,96	$ 6.757.576,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
13,3	ESTUCO PLASTICO	M2	2.172,26	$ 17.849,00	$ 38.772.669,00	2.172,26	$ 38.772.669,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
13,4	CIELORASO PLACA SUPERBOARD 8 MM (FIGURADO) INCLUYE PINTURA	M2	969,03	$ 131.515,00	$ 127.441.980,00	969,03	$ 127.441.980,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 199.410.801,00		$ 199.410.801,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
14	CANCHA CESPED SINTETICO													
	CIMENTACION													
14,1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	104,46	$ 76.585,00	$ 8.000.069,00	104,46	$ 8.000.069,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
14,2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	1.794,00	$ 38.650,00	$ 69.338.100,00	5.760,00	$ 222.624.000,00	1.773,78	$ 68.556.597,00	1.598,82	$ 61.794.393,00	3.372,60	$ 130.350.990,00	58,55%
14,3	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	1.794,00	$ 132.727,00	$ 238.112.238,00	1.794,00	$ 238.112.238,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	CESPED SINTETICO												$ 0,00	
14,4	CARCAMO TIPO 1 EN CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, SECCION H=0,48 A=0,50 ESPECIFICACIONES SEGÚN DISEÑO DE PLANOS	ML	380,00	$ 135.332,00	$ 51.426.160,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
14,5	GEOTEXTIL T 2100 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	8.970,00	$ 12.776,00	$ 114.600.720,00	8.970,00	$ 114.600.720,00	7.920,00	$ 101.185.920,00	0,00	$ 0,00	7.920,00	$ 101.185.920,00	88,29%
14,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN MICRONIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN GRAVA TAM 3/4" PARA CONFORMACIÓN SOPORTE SUPERFICIE DEPORTIVA	M3	1.794,00	$ 310.674,00	$ 557.349.156,00	1.794,00	$ 557.349.156,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
14,7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYETAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UND	5,00	$ 722.490,00	$ 3.612.450,00	5,00	$ 3.612.450,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032		
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023	a	11 de octubre de 2023
			21 de mayo de 2024	a	20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023		
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com		
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.		
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.		
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024		

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
14,8	SUMINISTRO, E INST. DE GRAMA SINTÉTICA EN POLIETILENO (100%) BICOLOR, ALTURA DE FIBRA 50 MM, PROTECCIÓN UV, ESPESOR MAYOR O IGUAL A 300 MICRONES, DTEX MAYOR O IGUAL A 14000, CON UNA CANTIDAD DE PUNTADAS SUPERIOR O IGUAL A 7500 POR M², BACKING DOBLE O MAYOR CON RECUBRIMIENTO EN POLIURETANO O LÁTEX. INCLUYE: RELLENO DE ARENA SILICE FINA, CON UNA CANTIDAD NO MENOR A 15KG/M2 CON UNA GRADACION ENTRE 0.2mm Y 1.0mm, Y CAUCHO GRANULADO (SRB RECICLADO DE LLANTAS) DE GRANULOMETRIA FINA CON UNA CANTIDAD NO MENOR A 15 KG/M2. LA GRAMA SINTETICA SERA AVALADA POR PREFERRED FIFA.	M2	8.970,00	$ 326.818,00	$ 2.931.557.460,00	8.970,00	$ 2.931.557.460,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
14,9	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	386,00	$ 131.566,00	$ 50.784.476,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
14,10	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	18,72	$ 1.012.044,00	$ 18.945.464,00	18,72	$ 18.945.464,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
14,11	POSTE METALICO DE 12X510 KG	UND	60,00	$ 744.544,00	$ 44.672.640,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
14,12	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN, NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE.	M2	1.404,00	$ 48.913,00	$ 68.673.852,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
14,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS PROFESIONALES DE FÚTBOL EN ALUMINIO (INCLUYE MALLAS Y BANDERINES)	UN	1,00	$ 39.280.853,00	$ 39.280.853,00	1,00	$ 39.280.853,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP14.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCAS DE SUPLENTES PARA 10 PERSONAS	JGO	0,00	$ 49.878.250,00	$ 0,00	2,00	$ 99.756.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP14.15	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2	M2	0,00	$ 4.065,00	$ 0,00	7.920,00	$ 32.194.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP14.16	MALLA CONTRA IMPACTO H=5.00M,(ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO. DE 3" E= 3,81MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD	ML	0,00	$ 1.636.320,00	$ 0,00	157,92	$ 258.407.654,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 4.196.353.638,00		$ 4.524.441.364,00		$ 169.742.517,00		$ 61.794.393,00		$ 231.536.910,00	
15	TANQUE SUBTERRANEO Y CUARTO DE MAQUINAS													
15,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	162,56	$ 5.457,00	$ 887.090,00	158,02	$ 862.315,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	587,94	$ 38.640,00	$ 22.718.002,00	543,97	$ 21.019.001,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	9,09	$ 643.591,00	$ 5.850.242,00	8,21	$ 5.283.882,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032		
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023 21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024		
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023		
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com		
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.		
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.		
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
15,4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA.SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	65,03	$ 1.082.950,00	$ 70.424.239,00	186,25	$ 201.699.438,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA FLEXIBLE JUNTA DE DILATACIÓN / CONSTRUCCIÓN. 22 CM	ML	56,25	$ 64.244,00	$ 3.613.725,00	99,75	$ 6.408.339,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,6	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI PARA MUROS, ELAB. OBRA, ELEVACIONES h<3.0M (INC. FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACION)	M3	92,04	$ 1.465.859,00	$ 134.917.662,00	75,94	$ 111.317.332,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,7	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA E= 0.40 M EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA CON CASETÓN RECUPERABLE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M2	153,56	$ 301.244,00	$ 46.259.029,00	147,98	$ 44.572.062,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,8	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	14.600,92	$ 8.544,00	$ 124.750.260,00	33.320,83	$ 284.693.172,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
											$ 0,00			
	CUARTO DE MAQUINAS													
15,9	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2	23,69	$ 53.902,00	$ 1.276.938,00	23,69	$ 1.276.938,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,10	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	23,69	$ 26.628,00	$ 630.817,00	23,69	$ 630.817,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,11	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	23,69	$ 36.215,00	$ 857.933,00	23,69	$ 857.933,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,12	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,34	$ 1.382.134,00	$ 469.926,00	0,34	$ 469.926,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,13	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,41	$ 1.343.430,00	$ 550.806,00	0,41	$ 550.806,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,14	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	113,28	$ 8.544,00	$ 967.864,00	113,28	$ 967.864,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	7,65	$ 722.824,00	$ 5.529.604,00	7,65	$ 5.529.604,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 333C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	13,20	$ 228.360,00	$ 3.014.352,00	13,20	$ 3.014.352,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,17	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	23,69	$ 12.171,00	$ 288.331,00	23,69	$ 288.331,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,18	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	23,69	$ 13.992,00	$ 331.470,00	23,69	$ 331.470,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 423.338.290,00		$ 689.773.582,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
16	REDES ELECTRICAS													
16.1	CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG	ML	50,00	$ 181.398,00	$ 9.069.900,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.2	TRANSFORMADOR TIPO SECO PEDESTAL 225 KVA	UN	1,00	$ 73.560.340,00	$ 73.560.340,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.3	CELDA DE PROTECCION DE 15KV	UN	1,00	$ 13.392.297,00	$ 13.392.297,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023 21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
16.4	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 300A, A 208 V	UN	1,00	$ 20.430.730,00	$ 20.430.730,00	1,00	$ 20.430.730,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.5	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 200A, A 208 V	UN	2,00	$ 16.799.368,00	$ 33.598.736,00	2,00	$ 33.598.736,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.6	GENERADOR DIÉSEL DE 225KW, SISTEMA TRIFÁSICO, CON MOTOR DIÉSEL 1800 RPM, ALTERNADOR CON CONTROL DIGITAL	UN	1,00	$ 184.257.770,00	$ 184.257.770,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.7	TABLERO DE MEDIDA TRIFASICA SEGÚN NORMA AE 319 PARA MEDIDA SEMIDIRECTA EQUIPADO EN LAMINA COLD ROOL CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER INDUSTRIAL DE 320 A AJUSTABLE, 3 CT´S TIPO BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS. INCLUYE MEDIDIOR ELECTRONICO TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS, CON BLOQUE DE PRUEBA	UN	3,00	$ 11.397.065,00	$ 34.191.195,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.8	TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS EN COFRE DE 2100*1000*450 CON TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 165 AMPERIOS, LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 2 DE 3X70A, 1 DE 3X63A, 2 DE 3X50A, 2 DE 3X30, 2 DE 2X20A, 1 DPS 230 V-CLASE 1, ONDA DE PRUEBA 10/350USG, 50 KA.	UN	1,00	$ 11.200.643,00	$ 11.200.643,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.9	TABLERO GENERAL DE ILUMINACION CANCHA EN COFRE DE 1800*800*450 CON TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 265 AMPERIOS, LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 4 DE 3X63A, 1 DE 3X70A, 1 DPS 230 V-CLASE 1, ONDA DE PRUEBA 10/350USG, 50 KA.	UN	1,00	$ 9.345.039,00	$ 9.345.039,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.10	TABLERO DE MEDIDORES DE 24 CUENTAS CON TOTALIZADOR DE 3X100A, EQUIPADO CON 20 CUENTAS BIFASICAS DE 20A Y MEDIDOR PARA MEDIDA DIRECTA DE 63A.	UN	1,00	$ 9.318.849,00	$ 9.318.849,00	1,00	$ 9.318.849,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.11	MASTIL METALICO PARA ALUMBRADO 25M PARA SOPORTAR 17 PROYECTORES, DISEÑADO PARA UNA VELOCIDAD DE VIENTO DE 120KM/H, GALVANIZADO EN CALIENTE. CONTIENE CANASTILLA , PELDAÑOS A PARTIR DE 8M DE ALTURA, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA.	UN	4,00	$ 49.322.731,00	$ 197.290.924,00	4,00	$ 197.290.924,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.12	POSTE METALICO TRONCOCONICO ILUM BRZ SEN GAVIOTA 1.8M ALT 12.0M GALV Y PINTADO	UN	9,00	$ 4.158.299,00	$ 37.424.691,00	9,00	$ 37.424.691,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.13	PROYECTOR H-BAY 960W, 30°, 60° Y 15° APERTURA.	UN	68,00	$ 10.647.898,00	$ 724.057.064,00	68,00	$ 724.057.064,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.14	LUMINARIA TIPO BALA DE 13W	UN	51,00	$ 259.043,00	$ 13.211.193,00	30,00	$ 7.771.290,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.15	LUMINARIA TIPO BALA DE 16W	UN	14,00	$ 294.260,00	$ 4.119.640,00	81,00	$ 23.835.060,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.16	LUMINARIA TIPO BALA DE 22W	UN	31,00	$ 355.968,00	$ 11.035.008,00	4,00	$ 1.423.872,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.17	LUMINARIA HERMETICA 40W	UN	126,00	$ 250.317,00	$ 31.539.942,00	57,00	$ 14.268.069,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.18	LUMINARIA TIPO PANEL 60X60CM, 40W	UN	15,00	$ 348.488,00	$ 5.227.320,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023 21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 63.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023
NIT:	901666997-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
16.19	LUMINARIA TIPO PANEL 60X60CM, 50W	UN	5,00	$ 364.071,00	$ 1.820.355,00	22,00	$ 8.009.562,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.20	BATERIA DE EMERGENCIA 22-45W IP40 90 MINUTOS DE AUTONOMIA 120- 277V.	UN	21,00	$ 421.727,00	$ 8.856.267,00	2,00	$ 843.454,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.21	LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS RALED II 32LED POTENCIA: 55W.	UN	10,00	$ 1.737.008,00	$ 17.370.080,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.22	LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS RALED II 128LED POTENCIA: 57W.	UN	6,00	$ 1.586.430,00	$ 9.518.580,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.23	CAJA DE BORNERAS PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACION REFLECTORES MASTILES PATINAJE, DE ACUERDO CON DIAGRAMA ELECTRICO	UN	4,00	$ 3.451.551,00	$ 13.806.204,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.24	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	101,00	$ 116.698,00	$ 11.786.498,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.25	SALIDA TOMA BIFASICO (2NO 10+ 1NO 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9,00	$ 189.729,00	$ 1.707.561,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.26	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 887.204,00	$ 887.204,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.27	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 1.055.439,00	$ 2.110.878,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.28	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	24,00	$ 439.833,00	$ 10.555.992,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.29	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 570.146,00	$ 570.146,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.30	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 480.306,00	$ 1.921.224,00	22,00	$ 10.566.732,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4/0+4/0+4T AWG THHN	ML	255,00	$ 262.533,00	$ 66.945.915,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4F+1X4N+X4TAWG THHN	ML	88,00	$ 103.651,00	$ 9.121.288,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6F+1X8N+8T AWG THHN	ML	830,00	$ 68.275,00	$ 56.668.250,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6+6+6T AWG THHN	ML	308,00	$ 83.835,00	$ 25.821.180,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2F+1X2N+X2T AWG THHN	ML	88,00	$ 132.071,00	$ 11.622.248,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 10F+10N+X10T AWG THHN	ML	1.385,00	$ 30.554,00	$ 42.317.290,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1/2"	ML	553,00	$ 21.498,00	$ 11.888.394,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.38	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 1/2" PVC	ML	562,00	$ 45.120,00	$ 25.357.440,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.39	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 1" PVC	ML	501,00	$ 51.717,00	$ 25.910.217,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.40	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	187,839	$ 38.640,00	$ 7.258.099,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.41	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	11,518206	$ 192.794,00	$ 2.220.641,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.42	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	1,152	$ 643.591,00	$ 741.417,00	1,15	$ 740.130,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.43	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,375	$ 1.382.134,00	$ 4.664.702,00	3,38	$ 4.671.613,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023 21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.148.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
16.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUTING DE NIVELACION fc MAYOR O IGUAL 35 MPA	M3	157,50	$ 53.592,00	$ 8.440.740,00	157,50	$ 8.440.740,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.45	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	1.582,88	$ 8.544,00	$ 13.524.127,00	1.582,88	$ 13.524.127,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.46	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	11,52	$ 939.801,00	$ 10.826.508,00	11,52	$ 10.826.508,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.47	BORDILLOS CAJAS DE INSPECCIÓN MINIMO 12CM	ML	96,9888	$ 34.444,00	$ 3.340.682,00	90,80	$ 3.127.515,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.48	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	16,00	$ 606.586,00	$ 9.705.376,00	10,00	$ 6.065.860,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.49	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	11,00	$ 1.156.397,00	$ 12.720.367,00	6,00	$ 6.938.382,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.50	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-276 CODENSA	UN	2,00	$ 1.934.552,00	$ 3.869.104,00	4,00	$ 7.738.208,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM. INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES	ML	116,00	$ 73.301,00	$ 8.502.916,00	135,00	$ 9.895.635,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0,60M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	4,00	$ 439.157,00	$ 1.756.628,00	8,00	$ 3.513.256,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	20,00	$ 59.832,00	$ 1.196.640,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.54	POSTE METALICO TRONCOCONICO ILUM BRZ TRIPLE PRO. GAVIOTA 1.8M ALT 12.0M GALV Y PINTADO	UN	1,00	$ 4.476.217,00	$ 4.476.217,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.55	POSTE METALICO TRONCOCONICO ILUM BRZ DOB GAVIOTA 1.8M ALT 12.0M GALV Y PINTADO	UN	2,00	$ 4.377.081,00	$ 8.754.162,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.56	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO POR NUEVE (09) VARILLAS COBRE-COBRE 99% DE 5/8"X2.4M Y MALLA DE 10X10M, Y CUADRICULAS DE 5X5M. SE USARA SOLDADURA EXOTÉRMICA; SUELO ARTIFICIAL PARA MEJORAR LA RESISTENCIA FINAL	UN	1,00	$ 9.344.578,00	$ 9.344.578,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
	MEDIA TENSION													
NP16.57	MANIOBRA EN LINEA VIVA	HR	0,00	$ 1.173.855,00	$ 0,00	8,00	$ 9.390.840,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.58	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION 12 M, BRAZO FALCO DOBLE DE 1,1/2" X 1,8 M, GALVANIZADO	UN	0,00	$ 8.367.381,00	$ 0,00	5,00	$ 41.836.905,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.59	POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 12 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UND	0,00	$ 2.054.266,00	$ 0,00	1,00	$ 2.054.266,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETE DIRECTO A TIERRA RED M.T. TIPO LAR412 NORMA CODENSA	UND	0,00	$ 445.353,00	$ 0,00	1,00	$ 445.353,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO ICEL 550 - PARA RED DE 13,2 Kv	UND	0,00	$ 1.500.238,00	$ 0,00	1,00	$ 1.500.238,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023 21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP16.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA TIPO 730 NORMA ICEL DERIVACIÓN TRIFÁSICA CON CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UND	0,00	$ 1.820.946,00	$ 0,00	1,00	$ 1.820.946,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR No. 2	ML	0,00	$ 10.642,00	$ 0,00	6,00	$ 63.852,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.64	AFLORAMIENTOS PARA RED MT CS400 - TUBO GALVANIZADO IMC DE 4"X3, CON CAPACETE, CURVA Y FIJACIÓN AL POSTE	UND	0,00	$ 2.435.701,00	$ 0,00	1,00	$ 2.435.701,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.65	JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15 KV	JGO	0,00	$ 898.221,00	$ 0,00	2,00	$ 1.796.442,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.66	CABLE DE ALUMINIO MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 1/0	ML	0,00	$ 277.655,00	$ 0,00	62,00	$ 17.214.610,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.67	CÁRCAMO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI DE 0,4X0,5M INC TAPA EN LAMINA ALFAJOR 1.00X3.00X3MM (1/8")	ML	0,00	$ 686.814,00	$ 0,00	23,09	$ 15.858.535,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL SUBESTACIÓN SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE BREAKERS.	UND	0,00	$ 10.691.656,00	$ 0,00	1,00	$ 10.691.656,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE ILUMINACION CANCHA SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE BREAKERS.	UND	0,00	$ 16.141.825,00	$ 0,00	1,00	$ 16.141.825,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL EDIFICIO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE BREAKERS.	UN	0,00	$ 8.036.187,00	$ 0,00	1,00	$ 8.036.187,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EDIFICIO PISO 2 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE BREAKERS.	UND	0,00	$ 7.609.344,00	$ 0,00	1,00	$ 7.609.344,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL BOMBAS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE BREAKERS.CUARTO DE BOMBAS	UND	0,00	$ 7.664.583,00	$ 0,00	1,00	$ 7.664.583,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS PARA LOCALES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE BREAKERS.	UND	0,00	$ 438.500,00	$ 0,00	16,00	$ 7.016.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO DE 4 CIRCUITOS PARA ILUMINACIÓN GRADERIAS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE BREAKERS.	UND	0,00	$ 490.624,00	$ 0,00	1,00	$ 490.624,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.75	EQUIPO DE MEDIDA TRIFASICA SEGÚN NORMA AE 319 INCLUYE TABLERO EN LAMINA COLD ROLLD CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 350 A AJUSTABLE, 3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS. INCLUYE MEDIDOR ELECTRONICO CLASE 0,5,TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS, CON BLOQUE DE PRUEBA Y BORNERA	UND	0,00	$ 26.519.692,00	$ 0,00	3,00	$ 79.559.076,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032		
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023	a	11 de octubre de 2023
			21 de mayo de 2024	a	20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023		
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com		
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.		
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.		
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024		

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP16.76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2x(3x500+500+2/0T) AL, DEL TRAFO A TABLERO GENERAL, DEL TABLERO GENERAL A TABLERO PRINCIPAL EDIFICIO Y DEL TABLERO GENERAL A TABLERO GRADERÍA ETAPA II	ML	0,00	$ 639.718,00	$ 0,00	249,00	$ 159.289.782,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2x(3x4/0+4/0+2/0T) AL, DEL TRAFO AL TABLERO DE MEDIDORES, Y DEL TABLERO GENERAL A TABLERO BOMBAS	ML	0,00	$ 464.333,00	$ 0,00	199,00	$ 92.402.267,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2x(3x2/0+2/0+1/0T) CU, DEL TABLERO PRINCIPAL EDIFICIO A TABLERO PISO 2	ML	0,00	$ 677.040,00	$ 0,00	52,00	$ 35.206.080,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3x4/0+4/0+2/0T AL, DEL TRAFO A BOMBA RCI	ML	0,00	$ 220.632,00	$ 0,00	40,00	$ 8.833.280,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2x8+8+8T CU, DEL TABLERO PRINCIPAL EDIFICIO A TABLERO GRADERIAS	ML	0,00	$ 111.238,00	$ 0,00	55,00	$ 6.118.090,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3x350+4/0T AL, DEL TRAFO A TABLERO MÁSTILES	ML	0,00	$ 276.837,00	$ 0,00	37,00	$ 10.242.969,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3x4/0+2/0T AL, DEL TABLERO MÁSTILES A CAJA BORNERAS MÁSTILES	ML	0,00	$ 208.545,00	$ 0,00	609,00	$ 127.003.905,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2x6+6T AL, DEL TABLERO GENERAL A ILUMINACIÓN EXTERIOR	ML	0,00	$ 61.575,00	$ 0,00	579,19	$ 35.663.624,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA (3x500+500+2/0T) AL	ML	0,00	$ 321.733,00	$ 0,00	26,00	$ 8.365.058,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA TRIPLEX, DE ENTRADA - SALIDA Y PROTECCION EN MEDIA TENSIÓN, TENSION NOMINAL DE 15KV, SEGÚN NORMA CTS 506 CODENSA	UND	0,00	$ 77.539.686,00	$ 0,00	1,00	$ 77.539.686,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PAUD MOUND TIPO MALLA DE 225 KVA, ENTRADA 13200 V/ SALIDA 220-127 V	UND	0,00	$ 130.289.718,00	$ 0,00	1,00	$ 130.289.718,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA DE GENERACIÓN DE 225KVA - TRIFASICA, VOLTAJE SALIDA 220/127 V, MOTOR DIÉSEL, CABINA INSONORIZADA Y TABLERO DE CONTROL DIGITAL	UND	0,00	$ 259.850.571,00	$ 0,00	1,00	$ 259.850.571,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.88	CANALIZACIÓN 1 DUCTOS DE 1 1/4" PVC	ML	0,00	$ 45.016,00	$ 0,00	168,00	$ 7.562.688,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.89	CANALIZACIÓN 7 DUCTOS DE 1 1/4" PVC	ML	0,00	$ 164.687,00	$ 0,00	24,00	$ 3.952.488,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.90	CANALIZACIÓN 13 DUCTOS DE 1 1/4" PVC	ML	0,00	$ 299.158,00	$ 0,00	23,00	$ 6.880.634,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.91	CANALIZACIÓN 1 DUCTOS DE 1 1/2" PVC	ML	0,00	$ 65.988,00	$ 0,00	572,69	$ 37.803.865,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.92	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 2" PVC	ML	0,00	$ 85.243,00	$ 0,00	131,87	$ 11.240.994,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.93	CANALIZACIÓN 1 DUCTOS DE 3 PVC	ML	0,00	$ 80.756,00	$ 0,00	172,00	$ 13.890.032,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.94	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 3" PVC	ML	0,00	$ 97.684,00	$ 0,00	113,60	$ 11.096.902,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.95	CANALIZACIÓN 6 DUCTOS DE 3" PVC	ML	0,00	$ 300.488,00	$ 0,00	2,30	$ 691.122,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.96	CANALIZACIÓN 1 DUCTOS DE 4 PVC	ML	0,00	$ 92.426,00	$ 0,00	8,30	$ 767.136,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.97	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 4 PVC	ML	0,00	$ 140.478,00	$ 0,00	43,00	$ 6.040.554,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.98	CANALIZACIÓN 3 DUCTOS DE 4 PVC	ML	0,00	$ 186.638,00	$ 0,00	106,00	$ 19.783.628,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.99	CANALIZACIÓN 6 DUCTOS DE 4 PVC	ML	0,00	$ 342.643,00	$ 0,00	2,30	$ 788.079,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023 21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP16.100	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACION MANUAL	M3	0,00	$ 37.446,00	$ 0,00	548,34	$ 20.533.140,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN 40X40	UND	0,00	$ 403.342,00	$ 0,00	19,00	$ 7.663.498,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRENAJE PARA CAJA DE INSPECCIÓN EN GEOTEXTIL Y GRAVILLA DE 1"	UND	0,00	$ 34.068,00	$ 0,00	35,00	$ 1.192.380,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.103	CONSTRUCCIÓN BASE EN CONCRETO SEGÚN NORMA CODENSA AP-802, PARA MÁSTIL METÁLICO 12M	UND	0,00	$ 1.557.681,00	$ 0,00	22,00	$ 34.268.982,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA ESPACIO PÚBLICO 60W	UND	0,00	$ 3.829.587,00	$ 0,00	27,00	$ 103.398.849,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN	0,00	$ 161.184,00	$ 0,00	69,00	$ 11.121.696,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3x12AWG	ML	0,00	$ 26.865,00	$ 0,00	473,00	$ 12.707.145,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLES 20x8 CM	ML	0,00	$ 166.096,00	$ 0,00	46,00	$ 7.640.416,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMA GFCI MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, EN CABLE BAJO EN HALÓGENO EN TUBERÍA PVC. INCLUYE ACCESOROS DE INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 280.578,00	$ 0,00	5,00	$ 1.402.890,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, EN CABLE BAJO EN HALÓGENO EN TUBERÍA PVC. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 205.364,00	$ 0,00	105,00	$ 21.563.220,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMA BIFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA. NO INCLUYE TUBERÍA NI CABLEADO	UN	0,00	$ 57.423,00	$ 0,00	6,00	$ 344.538,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE ILUMINACIÓN, INCLUYE TUBERÍA EMT, PROPORCIONAL CAJAS, INTERRUPTOR, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y SISTEMA DE FIJACIÓN, CABLE BAJO EN HALÓGENOS.	UN	0,00	$ 387.038,00	$ 0,00	202,00	$ 78.181.676,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL 12+12+12T LIBRE DE HALOGENOS, INCLUYE TUBERÍA PVC.	ML	0,00	$ 60.330,00	$ 0,00	334,00	$ 20.150.220,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL 12+12+12T LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUYE TUBERÍA EMT.	ML	0,00	$ 89.650,00	$ 0,00	55,00	$ 4.930.750,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERÍA SISTEMA DE EMERGENCIA 3-22W IP40 90 MINUTOS DE AUTONOMÍA 120- 277V.	UN	0,00	$ 1.195.505,00	$ 0,00	10,00	$ 11.955.050,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 60x60CM 36W	UN	0,00	$ 235.747,00	$ 0,00	2,00	$ 471.494,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LINEAR SQUARE 50W	UN	0,00	$ 941.751,00	$ 0,00	5,00	$ 4.708.755,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENA 1/8" PARA SUSPENSIÓN DE LUMINARIAS	ML	0,00	$ 46.242,00	$ 0,00	375,00	$ 17.340.750,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.118	CAJA DE BORNERAS PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN REFLECTORES MÁSTILES CANCHA, DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR	UN	0,00	$ 8.090.752,00	$ 0,00	4,00	$ 32.363.008,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023 21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.991.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP16.119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE AISLADO 600 V, DESDE EL CIRCUITO ALIMENTADOR MÁSTILES HASTA LA LUMINARIA, 3 x No. 10	ML	0,00	$ 43.168,00	$ 0,00	544,00	$ 23.483.392,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 1,20M. INCLUYE BASE Y BORNAFS	UN	0,00	$ 443.796,00	$ 0,00	15,00	$ 6.656.940,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA PUESTA TIERRA COPERWEALD INCLUYE CONECTOR Y CABLE DESNUDO 1/0	UN	0,00	$ 359.097,00	$ 0,00	6,00	$ 2.154.582,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO IMC 1"	ML	0,00	$ 129.349,00	$ 0,00	30,00	$ 3.880.470,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE 1/0 DESNUDO PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (INCLUYE SOLDADURA CADWELLD Y MOLDE PARA SOLDADURA)	ML	0,00	$ 148.243,00	$ 0,00	120,00	$ 17.789.160,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA COBRE 5/8X2,4M PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GENERAL, SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE SOLDADURA CADWELL Y MOLDE PARA SOLDADURA Y SUELO ARTIFICIAL)	UN	0,00	$ 482.197,00	$ 0,00	4,00	$ 1.928.788,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.125	CAJA DE INSPECCIÓN PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 30X30 CM CON TAPA	UN	0,00	$ 423.759,00	$ 0,00	6,00	$ 2.542.554,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU DESNUDO 1/0	ML	0,00	$ 86.856,00	$ 0,00	203,00	$ 17.631.768,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA PUESTA TIERRA COPERWEALD INCLUYE CONECTOR Y CABLE #6 PARA ALUMBRADO PÚBLICO	UN	0,00	$ 399.783,00	$ 0,00	10,00	$ 3.997.830,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 1.890.177.396,00		$ 2.939.255.083,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
17	RED DE SUMINISTRO													
	PRELIMINARES													
17,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	446,25	$ 5.542,00	$ 2.473.118,00	543,50	$ 3.012.077,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 2.473.118,00		$ 3.012.077,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	EXCAVACIONES													
17,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2,00 M INCLUYE CARGUE	M3	156,1875	$ 68.927,00	$ 10.765.536,00	176,09	$ 12.137.355,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	33,840625	$ 248.800,00	$ 8.419.548,00	31,00	$ 7.712.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 19.185.084,00		$ 19.850.155,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	RELLENOS Y BASES													
17,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	44,625	$ 120.260,00	$ 5.366.603,00	66,50	$ 7.997.290,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	111,5625	$ 63.830,00	$ 7.121.034,00	98,13	$ 6.263.638,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 12.487.637,00		$ 14.260.928,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	TUBERIA Y ACCESORIOS													
17,6	TUBERÍA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	220,76	$ 112.216,00	$ 24.772.804,00	129,27	$ 14.506.162,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,7	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	26,47	$ 38.486,00	$ 1.018.724,00	100,00	$ 3.848.600,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023 21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
17,8	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	56,81	$ 27.820,00	$ 1.580.454,00	90,62	$ 2.521.048,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,9	TUBERÍA PVCP RDE 13,5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	93,04	$ 19.147,00	$ 1.781.437,00	22,66	$ 433.871,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,10	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	49,17	$ 16.230,00	$ 798.029,00	42,30	$ 686.529,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,11	TUBERÍA PVCP RDE 11 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	132,90	$ 13.335,00	$ 1.772.222,00	70,26	$ 936.917,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,12	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	95,00	$ 58.609,00	$ 5.567.855,00	75,00	$ 4.395.675,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,13	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	17,00	$ 70.543,00	$ 1.199.231,00	22,00	$ 1.551.946,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,14	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	49,00	$ 80.521,00	$ 3.945.529,00	49,00	$ 3.945.529,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,15	VALVULA CHEQUE CORTINA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7,00	$ 329.549,00	$ 2.306.843,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,16	VALVULA CHEQUE CORTINA 1 " SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 140.295,00	$ 420.885,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,17	VALVULA CHEQUE CORTINA 3/4 " SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	18,00	$ 101.736,00	$ 1.831.248,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE Ø 4" UM	UN	9,00	$ 270.505,00	$ 2.434.545,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 90° PVC Ø4" UM	UN	2,00	$ 180.291,00	$ 360.582,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,20	ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5,00	$ 23.548,00	$ 117.740,00	48,00	$ 1.130.304,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,21	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	59,00	$ 11.595,00	$ 684.105,00	54,00	$ 626.130,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,22	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	27,00	$ 6.038,00	$ 163.026,00	23,00	$ 138.874,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,23	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20,00	$ 3.781,00	$ 75.620,00	20,00	$ 75.620,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,24	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	20,00	$ 43.830,00	$ 876.600,00	20,00	$ 876.600,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,25	SISTEMA DE PRESION DIFERENCIAL - 50 GPM – 60 PSI	UN	2,00	$ 40.231.433,00	$ 80.462.866,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 132.170.345,00		$ 35.673.805,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP17.26	TUBERÍA PVCP RDE 21 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 85.135,00	$ 0,00	5,80	$ 493.783,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP17.27	TUBERÍA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 56.277,00	$ 0,00	67,69	$ 3.809.390,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP17.28	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 24.448,00	$ 0,00	14,90	$ 364.275,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP17.29	ACCESORIO PVCP 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 151.718,00	$ 0,00	44,00	$ 6.675.592,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP17.30	ACCESORIO PVCP 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 78.661,00	$ 0,00	3,00	$ 235.983,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP17.31	ACCESORIO PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 61.795,00	$ 0,00	27,00	$ 1.668.465,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP17.32	ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 11.404,00	$ 0,00	14,00	$ 159.656,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP17.33	VÁLVULA DE BOLA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 271.632,00	$ 0,00	4,00	$ 1.086.528,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP17.34	VÁLVULA DE BOLA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 166.961,00	$ 0,00	4,00	$ 667.844,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP17.35	VÁLVULA DE BOLA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 112.676,00	$ 0,00	2,00	$ 225.352,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032		
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 a 21 de mayo de 2024	a	11 de octubre de 2023 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023		
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com		
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.		
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.		
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024		

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP17.36	VÁLVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 35.864,00	$ 0,00	19,00	$ 681.416,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP17.37	SISTEMA DE PRESIÓN INTEGRADO, Q=160 GPM. CONFORMADO POR DOS BOMBAS, POTENCIA DE 10 HP, CDT=78 PSI, EFICIENCIA 75%, Y TANQUE HIDROACUMULADOR DE 1000L. INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES AL TANQUE Y LA RED.	UN	0,00	$ 136.146.612,00	$ 0,00	1,00	$ 136.146.612,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 0,00**		**$ 152.214.896,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	TOTAL RED SUMINISTRO				**$ 166.316.184,00**		**$ 225.011.861,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
18	**RED SANITARIA**													
	PRELIMINARES													
18,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	418,21	$ 5.542,00	$ 2.317.720,00	616,39	$ 3.416.033,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 2.317.720,00**		**$ 3.416.033,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	EXCAVACIONES													
18,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	237,30	$ 68.927,00	$ 16.356.377,00	255,41	$ 17.604.645,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	51,42	$ 248.800,00	$ 12.793.296,00	44,00	$ 10.947.200,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 29.149.673,00**		**$ 28.551.845,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	RELLENOS Y BASES													
18,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	48,96	$ 120.260,00	$ 5.887.930,00	73,62	$ 8.853.541,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	183,34	$ 63.830,00	$ 11.702.592,00	129,21	$ 8.247.474,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 17.590.522,00**		**$ 17.101.015,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO													
18,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	35,72	$ 101.390,00	$ 3.621.651,00	45,64	$ 4.627.440,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,7	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	80,26	$ 97.184,00	$ 7.799.988,00	55,44	$ 5.387.881,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,8	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	211,87	$ 47.055,00	$ 9.969.543,00	202,22	$ 9.515.462,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,9	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	9,96	$ 38.469,00	$ 383.151,00	227,14	$ 8.737.849,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,10	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	80,40	$ 26.191,00	$ 2.105.756,00	85,95	$ 2.251.116,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,11	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	325,00	$ 36.633,00	$ 11.905.725,00	203,00	$ 7.436.499,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,12	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	30,00	$ 21.249,00	$ 637.470,00	190,00	$ 4.037.310,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	73,00	$ 11.935,00	$ 871.255,00	108,00	$ 1.288.980,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	48,00	$ 88.703,00	$ 4.257.744,00	47,00	$ 4.169.041,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,15	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20,00	$ 69.525,00	$ 1.390.500,00	20,00	$ 1.390.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3"	UN	30,00	$ 70.518,00	$ 2.115.540,00	32,00	$ 2.256.576,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,17	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UN	17,00	$ 86.037,00	$ 1.462.629,00	18,00	$ 1.548.666,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,18	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	49,00	$ 86.965,00	$ 4.261.285,00	58,00	$ 5.043.970,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023 21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.551.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	SUBTOTAL				**$ 50.782.237,00**		**$ 57.691.290,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	CAJAS Y POZOS ALCANTARILLADO													
18,19	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	5,00	$ 551.503,00	$ 2.757.515,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,20	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80X 0,80 X 0,80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	6,00	$ 709.055,00	$ 4.254.330,00	3,00	$ 2.127.165,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,21	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.0 X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	2,00	$ 871.930,00	$ 1.743.860,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 8.755.705,00**		**$ 2.127.165,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP18.22	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.20 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	ML	0,00	$ 1.142.477,00	$ 0,00	8,80	$ 10.053.798,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP18.23	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UN	0,00	$ 895.220,00	$ 0,00	3,00	$ 2.685.660,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP18.24	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M, E=0.20 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO	UN	0,00	$ 1.295.330,00	$ 0,00	3,00	$ 3.885.990,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 0,00**		**$ 16.625.448,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	TOTAL RED SUMINISTRO				**$ 108.695.857,00**		**$ 125.512.796,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
19	**RED DE AGUAS LLUVIAS**													
	PRELIMINARES													
19,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	1.216,31	$ 5.542,00	$ 6.740.790,00	2.514,23	$ 13.933.863,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 6.740.790,00**		**$ 13.933.863,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	EXCAVACIONES													
19,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	156,13	$ 68.927,00	$ 10.761.573,00	613,68	$ 42.299.121,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	33,83	$ 248.800,00	$ 8.416.904,00	106,00	$ 26.372.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 19.178.477,00**		**$ 68.671.921,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	RELLENOS Y BASES													
19,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	39,11	$ 120.260,00	$ 4.703.369,00	239,21	$ 28.767.395,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	6,2208	$ 63.830,00	$ 397.074,00	330,71	$ 21.109.219,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 5.100.443,00**		**$ 49.876.614,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032		
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023	a	11 de octubre de 2023
			21 de mayo de 2024	a	20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023		
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com		
SUPERVISOR:	N. A	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.		
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A		
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024		

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	TUBERIA Y ACCESORIOS													
19,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	25,92	$ 312.236,00	$ 8.093.157,00	10,38	$ 3.241.010,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315 MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	359,22	$ 219.723,00	$ 78.928.896,00	178,11	$ 39.134.864,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN PLANAR TIPO ADS 12"X1	ML	831,17	$ 197.323,00	$ 164.008.958,00	1.780,42	$ 351.317.816,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 251.031.011,00		$ 393.693.690,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	CAJAS Y POZOS ALCANTARILLADO													
19,9	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80X 0,80 X 0,80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	4,00	$ 709.055,00	$ 2.836.220,00	6,00	$ 4.254.330,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,10	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	90,70	$ 201.753,00	$ 18.298.997,00	76,50	$ 15.434.105,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,11	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	90,70	$ 27.276,00	$ 2.473.933,00	48,60	$ 1.325.614,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 23.609.150,00		$ 21.014.049,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP19.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM Ø14" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 326.717,00	$ 0,00	93,60	$ 30.580.711,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP19.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 167.272,00	$ 0,00	397,00	$ 66.406.984,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP19.14	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO LATERAL EN CONCRETO TIPO SL-100 FUNDIDO EN SITIO	UN	0,00	$ 1.363.601,00	$ 0,00	4,00	$ 5.454.404,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP19.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 600MM Ø24" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 891.322,00	$ 0,00	22,95	$ 20.455.840,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP19.16	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 6" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ALTURAS. INCLUYE ABRAZADERAS	ML	0,00	$ 142.619,00	$ 0,00	48,60	$ 6.931.283,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP19.17	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1,50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	ML	0,00	$ 1.276.962,00	$ 0,00	56,74	$ 72.454.824,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP19.18	LOSA INFERIOR BASE PARA CÁMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=2.10 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UND	0,00	$ 1.104.693,00	$ 0,00	22,00	$ 24.303.246,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP19.19	LOSA SUPERIOR PARA CÁMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.90 M, E=0.20 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO	UND	0,00	$ 1.366.427,00	$ 0,00	22,00	$ 30.061.394,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032		
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 a 21 de mayo de 2024	a	11 de octubre de 2023 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023		
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioesparios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com		
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.		
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.		
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024		

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP19.20	CARCAMO PREFABRICADAS DE CONCRETO 100X40X35 CM TAPA EN CONCRETO. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	$ 356.185,00	$ 0,00	685,54	$ 244.179.065,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP19.21	FILTRO EN GEODREN (INC. TUBO PVC 8" PERFORADO)	ML	0,00	$ 382.716,00	$ 0,00	181,00	$ 69.271.596,00	0,00	$ 0,00	111,92	$ 42.833.575,00	111,92	$ 42.833.575,00	61,83%
NP19.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA PARA DRENAJE EN PVC SIN FILTRO DE 250MM Ø10", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML	0,00	$ 369.634,00	$ 0,00	367,80	$ 135.951.385,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 0,00**		**$ 706.050.732,00**		**$ 0,00**		**$ 42.833.575,00**		**$ 42.833.575,00**	
	TOTAL RED DE AGUAS LLUVIAS				**$ 305.659.871,00**		**$ 1.253.240.869,00**		**$ 0,00**		**$ 42.833.575,00**		**$ 42.833.575,00**	
20	**RED CONTRAINCENDIOS**													
	PRELIMINARES													
20,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	351,36	$ 5.542,00	$ 1.947.237,00	404,47	$ 2.241.573,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 1.947.237,00**		**$ 2.241.573,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	EXCAVACIONES													
20,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2,00 M INCLUYE CARGUE	M3	155,02	$ 68.927,00	$ 10.685.064,00	57,30	$ 3.949.517,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	33,59	$ 248.800,00	$ 8.357.192,00	10,00	$ 2.488.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 19.042.256,00**		**$ 6.437.517,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	RELLENOS Y BASES													
20,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	60,31	$ 120.260,00	$ 7.252.881,00	19,10	$ 2.296.966,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	161,14	$ 63.830,00	$ 10.285.566,00	37,08	$ 2.366.816,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 17.538.447,00**		**$ 4.663.782,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	TUBERÍA Y ACCESORIOS													
20,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 6" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	228,88	$ 130.229,00	$ 29.806.814,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	78,48	$ 64.779,00	$ 5.083.856,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,8	TUBERIA AC SCH 10 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	32,00	$ 91.375,00	$ 2.924.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,9	TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	4,48	$ 65.587,00	$ 293.830,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,10	ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12,00	$ 34.400,00	$ 412.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,11	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 2.467.874,00	$ 9.871.496,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,12	COUPLING PARA UNION RANURADA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	28,00	$ 23.110,00	$ 647.080,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,13	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 14.638,00	$ 58.552,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,14	ABRAZADERA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 11.636,00	$ 93.088,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,15	SISTEMA CONTRA INCENDIO NACIONAL CON CERTIFICACION RETIE Y MOTOR UL CERTIFICADO	UN	2,00	$ 130.763.945,00	$ 261.527.890,00	1,00	$ 130.763.945,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 310.719.406,00**		**$ 130.763.945,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	1 de octubre de 2023 a 11 de octubre de 2023 21 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	**OBJETO PROYECTO:**	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 66.149.591.491,00	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 29.924.445.211,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	001 de 2023
NIT:	901666597-1	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	**APOYO A LA SUPERVISION:**	N. A.
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°**	N. A.
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP20.16	TUBERÍA PVC-C900 Ø4" RDE 18 235 PSI SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	ML	0,00	$ 411.068,00	$ 0,00	112,35	$ 46.183.490,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.17	ACCESORIO HD PARA TUBERÍA C900 Ø4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	UND	0,00	$ 3.364.647,00	$ 0,00	6,00	$ 20.187.882,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.18	TUBERÍA AC SCH 10 Ø4" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN Y SOPORTE.	ML	0,00	$ 333.256,00	$ 0,00	45,27	$ 15.086.499,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.19	TUBERÍA AC SCH 10 Ø3" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN Y SOPORTE.	ML	0,00	$ 277.358,00	$ 0,00	132,52	$ 36.755.482,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.20	TUBERÍA AC SCH 10 Ø2 1/2" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN Y SOPORTE.	ML	0,00	$ 209.394,00	$ 0,00	4,94	$ 1.034.406,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.21	TUBERÍA AC SCH 40 Ø1" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN Y SOPORTE.	ML	0,00	$ 141.454,00	$ 0,00	109,39	$ 15.473.653,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.22	ACCESORIO RANURADO AC Ø4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0,00	$ 214.225,00	$ 0,00	9,00	$ 1.928.025,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.23	ACCESORIO RANURADO AC Ø3". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0,00	$ 188.452,00	$ 0,00	38,00	$ 7.161.176,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.24	ACCESORIO RANURADO AC Ø2 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0,00	$ 107.193,00	$ 0,00	6,00	$ 643.158,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.25	ACCESORIO RANURADO AC Ø1". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0,00	$ 97.210,00	$ 0,00	5,00	$ 486.050,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.26	ACCESORIO TEE MECANICA 3" X 1" RANURADA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 137.360,00	$ 0,00	59,00	$ 8.104.240,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.27	ROCIADOR PENDENT BRONCE K 5.6 D=1/2" CON ESCUDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PUNTO DE CONEXIÓN	UND	0,00	$ 127.920,00	$ 0,00	61,00	$ 7.803.120,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.28	KIT DE TRANSICIÓN C900xRAN DIAM 4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE BRIDA Y TORNILLOS	UND	0,00	$ 3.187.998,00	$ 0,00	3,00	$ 9.563.994,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.29	SISTEMA ESTACIÓN DE CONTROL CERT UL/FM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 7.898.518,00	$ 0,00	1,00	$ 7.898.518,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.30	SIAMESA DE 4 x2 1/2 X 2 1/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CHEQUE 4"	UND	0,00	$ 3.132.258,00	$ 0,00	1,00	$ 3.132.258,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.31	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO III SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 3.195.312,00	$ 0,00	2,00	$ 6.390.624,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE PRUEBA EN 4" (Inc. Válvulas y accesorios)	UND	0,00	$ 5.036.186,00	$ 0,00	1,00	$ 5.036.186,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.33	SOPORTE ANTISÍSMICO Ø4"	UND	0,00	$ 299.865,00	$ 0,00	20,00	$ 5.997.300,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.34	SOPORTE ANTISÍSMICO Ø3"	UND	0,00	$ 288.594,00	$ 0,00	74,00	$ 21.355.956,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.35	CONCRETO 3000 PSI - 20,7 MPA PARA ATRAQUE Y APOYO DE ACCESORIOS DE TUBERIA.	M3	0,00	$ 703.962,00	$ 0,00	3,90	$ 2.745.452,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 0,00**		**$ 222.967.469,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	TOTAL RED CONTRAINCENDIOS				**$ 349.247.346,00**		**$ 367.074.286,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	MANTENIMIENTO POZO DE INSPECCIÓN	GLOBAL	0,00	$ 39.900.000,00	$ 0,00	1,00	$ 39.900.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	TOTAL MANTENIMIENTO POZO DE INSPECCIÓN				**$ 0,00**		**$ 39.900.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	SUBTOTAL OBRAS A CANCHA DE LA ESPERANZA INCLUYE AIU(31%)				**$ 19.957.655.700,00**		**$ 29.559.098.331,00**		**$ 596.311.175,00**		**$ 4.952.527.923,00**		**$ 5.548.839.098,00**	

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA ACTA DE PAGO DE OBRA	Código: GES-FO-42 Vigencia: 23/04/2024 Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032		
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	02	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de octubre de 2023 21 de mayo de 2024	a a	11 de octubre de 2023 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 29.924.445.211,00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	001 de 2023		
NIT:	901666597-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com		
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISION:	N. A.		
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N. A.		
FECHA DE INICIACION:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 01 ADICIONAL 01		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS, ESPERANZA													
	CERTFICACION RETIE REDES DE MEDIA				$3.000.000,00		$3.000.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	CERTFICACION E INSPECCION DE TRANSFORMADOR				$949.266,00		$949.266,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	PRUEBA VLF CABLE DE MEDIA TENSION				$2.975.000,00		$2.975.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	RETIE USO FINAL				$7.735.000,00		$7.735.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	CERTIFICACION RETILAP				$9.496.200,00		$9.496.200,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	INSPECCION Y CERTIFICACION EMSA				$2.793.954,00		$2.793.954,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$338.397.460,00		$338.397.460,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	TOTAL CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. ESPERANZA				$ 365.346.880,00		$ 365.346.880,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	VALOR TOTAL OBRA				$20.323.002.680,00		$29.924.445.211,00		$696.311.175,00	1,99%	$4.952.527.923,00	16,55%	$5.648.839.098,00	18,54%

CONDICIONES GENERALES		
VALOR CONDICIONES ORIGINALES		$ 20.323.002.580,00
VALOR ADICIONAL		$ 9.601.442.631,00
VALOR TOTAL		$ 29.924.445.211,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS		$ 29.924.445.211,00
ANTICIPO	30,00%	$ 8.977.333.563,30
PRESENTE ACTA		$ 4.952.527.923,00
ACUMULADO		$ 5.548.839.098,00

CONDICIONES ACTUALIZADAS			
RELACIÓN DE ACTAS		AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL
PRESENTE ACTA	$ 4.952.527.923,00	$ 1.485.758.376,90	$ 3.466.769.546,10
ACTA 1	$ 596.311.175,00	$ 178.893.352,50	$ 417.417.822,50
TOTALES	$ 5.548.839.098,00	$ 1.664.651.729,40	$ 3.884.187.368,60

RESUMEN		%
EJECUTADO	$ 5.548.839.098,00	18,54%
Por ejecutar	$ 24.375.606.113,00	81,46%
Por amortizar	$ 7.312.681.833,90	81,46%
TOTALES	$ 29.924.445.211,00	100,00%

RELACIÓN DE PAGOS CONTRATO N° 963-2022				
CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
ANTICIPO	$ 8.977.333.563,30			$ 8.977.333.563,30
ACTA PARCIAL 01	$ 596.311.175,00	$ 178.893.352,50	$ 417.417.822,50	$ 9.394.751.385,80
PRESENTE ACTA PARCIAL 02	$ 4.952.527.923,00	$ 1.485.758.376,90	$ 3.466.769.546,10	$ 12.861.520.931,90
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 24.375.606.113,00			

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS MONEDA CORRIENTE.

NOTAS

1. El contador del contratista e interventor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.
3. Que la interventoría certifica que el contratista CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS identificado con el NIT 901.666.597-1 cumplió con la clausula Séptima forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.
4. El contrato de obra N°963-2022 representado legalmente por la Unión Temporal o Consorcio ESPACIOS DEPORTIVOS , durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados: SI ____ de fecha _____ NO X.
5. En la presente acta se adjunta el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta para pago, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 21 de junio de 2024

Firma
JUAN CARLOS LOZANO LEÓN
R/L CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATISTA OBRA

Firma
ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
No. De matrícula profesional A25072000-79650147

Firma
FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DEL META "IDERMETA"
DIRECTOR

Firma
HÉCTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES
R/L CONSORCIO INTERDEPORTIVOS
INTERVENTORÍA

Firma
ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
No. De matrícula profesional 25202-083337 CND

MEMORIA DE CANTIDADES Y REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	PRELIMINARES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	M2
1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ÁREA	LONGITUD	CANTIDAD	
AREAS					
GRADERIAS	12,00		75,00	1,00	900,00
CANCHA	73,00		110,00	1,00	8.030,00
PARQUEADERO NORTE		1254,50		1,00	1.254,50
ESPACIO PUBLICO ORIENTAL	18,59		19,24	1,00	357,67
ESPACIO PUBLICO SUR	22,20		98,03	1,00	2.176,27
MURO CONTENCIÓN ORIENTAL	3,00		112,73	1,00	338,19
MURO CONTENCION SUR	2,80		22,00	1,00	61,60
	2,35		26,55	1,00	62,39
	1,90		14,80	1,00	28,12
	1,00		8,60	1,00	8,60
VIENEN:				SUBTOTAL	13.217,34
PASAN:	13.217,34			TOTAL	13.217,34

OBSERVACIONES:		
1. el color de texto AZUL corresponde a lo pagado en parcial 1	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	13.819,92
2. ajuste de ancho de la cancha sintetica respecto a la parcial 1	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	13.217,34
3. ajuste de longitud total del muro de contención oriental	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	12.675,94
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	541,40
VER PLANO No. 01/03 Y 02/03 PRELIMINARES - 1/1 SECCIÓN MURO SUR	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	602,58

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

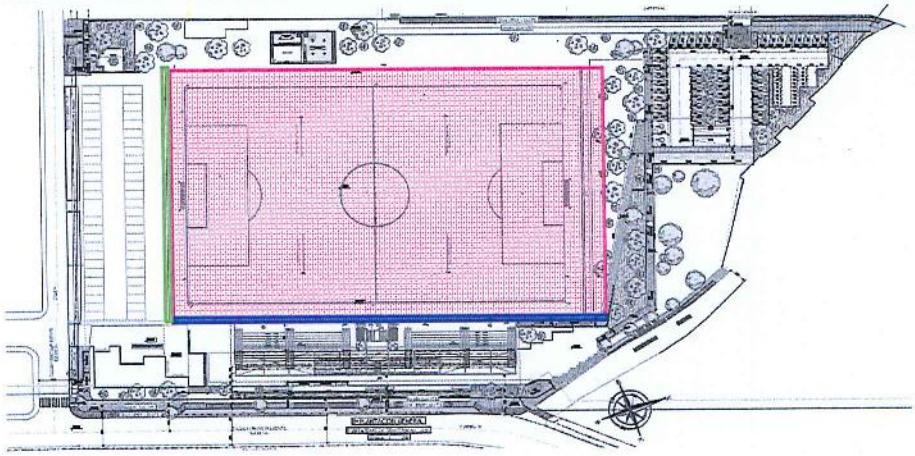

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	PRELIMINARES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	M2
1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

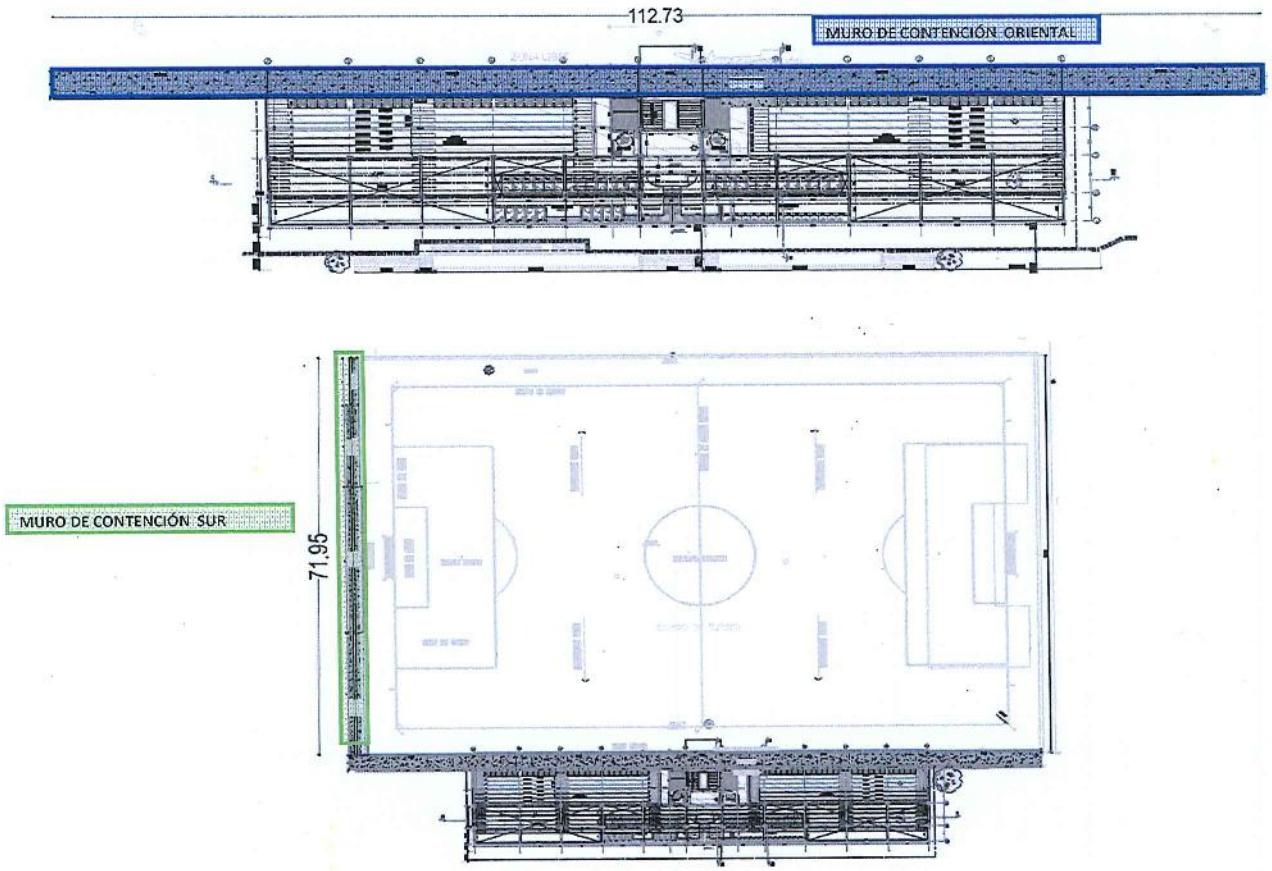

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	PRELIMINARES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	PRELIMINARES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ML
NP1.3	CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
CERRAMIENTO ZONA NORTE					
ZONA PARQUEADERO			90,00	1,00	90,00
VIENEN:				SUBTOTAL	90,00
PASAN:	90,00			TOTAL	90,00

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. VER PLANO No. 03/03 PRELIMINARES	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	90,00
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	90,00
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0,00
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	90,00
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

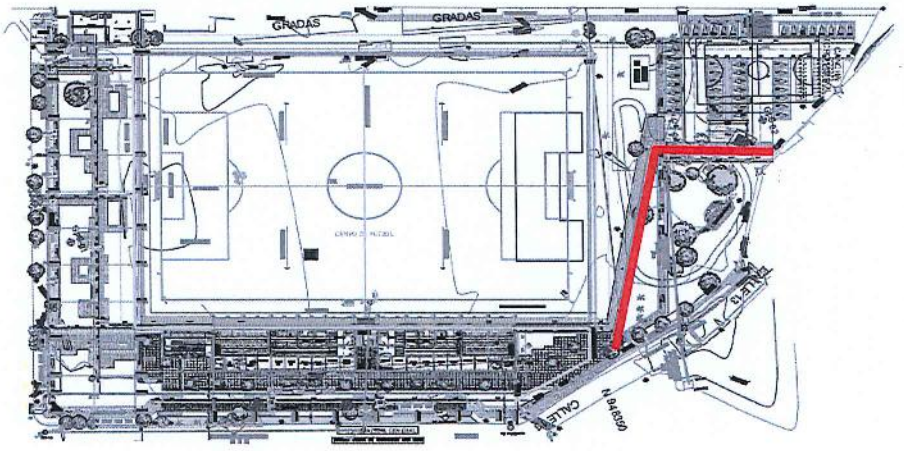

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	PRELIMINARES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ML
NP1.3	CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

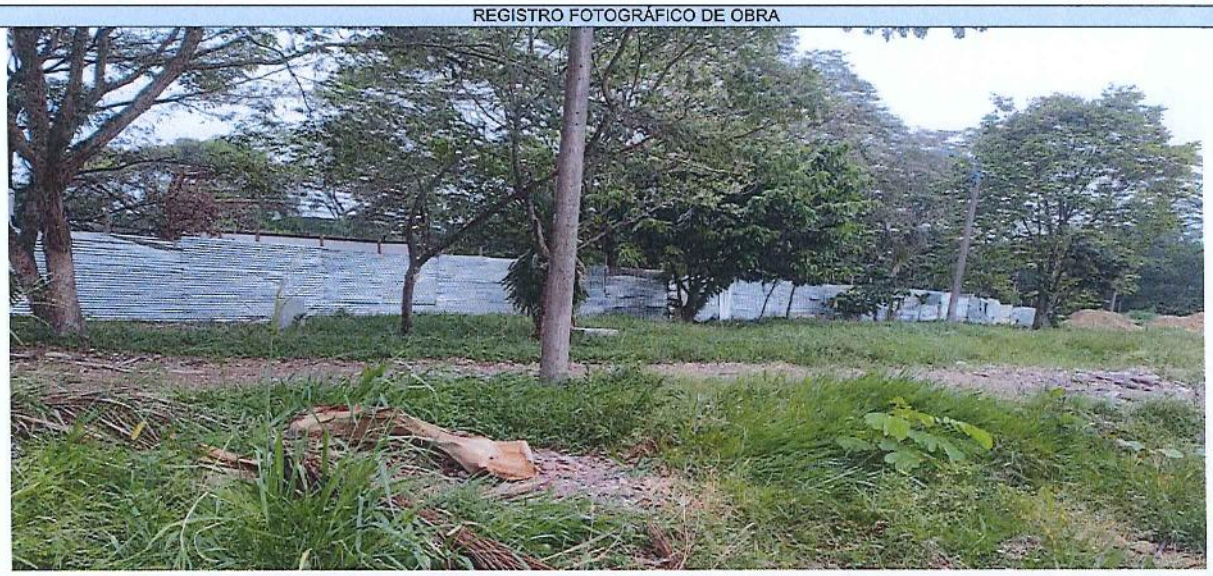





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	DESMONTE Y DEMOLICIONES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	M3
2,1	DEMOLICION GAVIONES. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
SECCIONES DE GAVIONES					
GAVION 1	2,00	1,00	1,00	17,00	34,00
GAVION 2	2,00	1,00	2,00	27,00	108,00
GAVION 3	1,00	2,36	1,00	25,00	59,00
VIENEN:				SUBTOTAL	201,00
PASAN:				TOTAL	201,00

OBSERVACIONES:		
1. el color de texto AZUL representa las cantidades pagadas en la parcial 1	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	201,00
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	201,00
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	142,00
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	59,00
VER PLANO No. 01/03 DESMONTE Y DEMOLICIONES	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

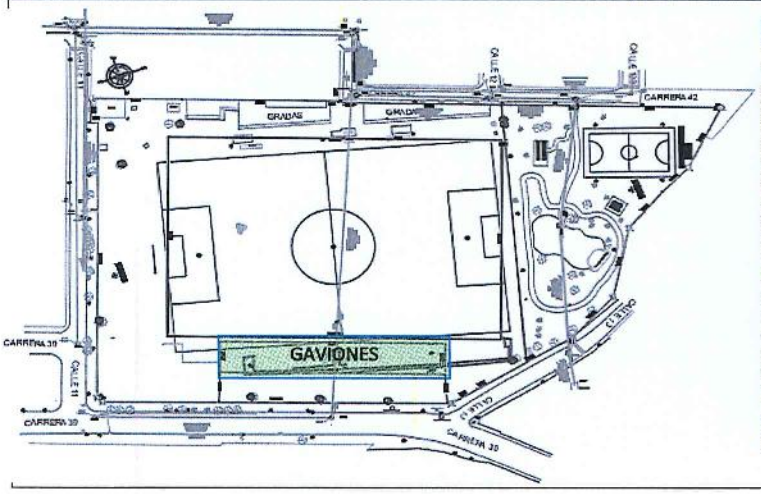



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	DESMONTE Y DEMOLICIONES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
2,1	DEMOLICION GAVIONES. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072080-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	DESMONTE Y DEMOLICIONES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	UND
NP2.4	DESMONTE DE LUMINARIA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
LUMINARIAS POSTES					
CANCHA (2 und por 6 postes en concreto)				12,00	12,00
PARQUEADERO				4,00	4,00
VIENEN:				SUBTOTAL	16,00
PASAN:				TOTAL	16,00

OBSERVACIONES:		
1. postes de iluminación para la cancha cuenta con 2 luminarias por cada una de las bases , 6 postes en concreto 2. en la zona de parqueadero actual se desmonta 4 luminarias 1 por cada poste	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	16,00
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	16,00
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0,00
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	16,00
VER PLANO No. 02/03 DESMONTE Y DEMOLICIONES	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

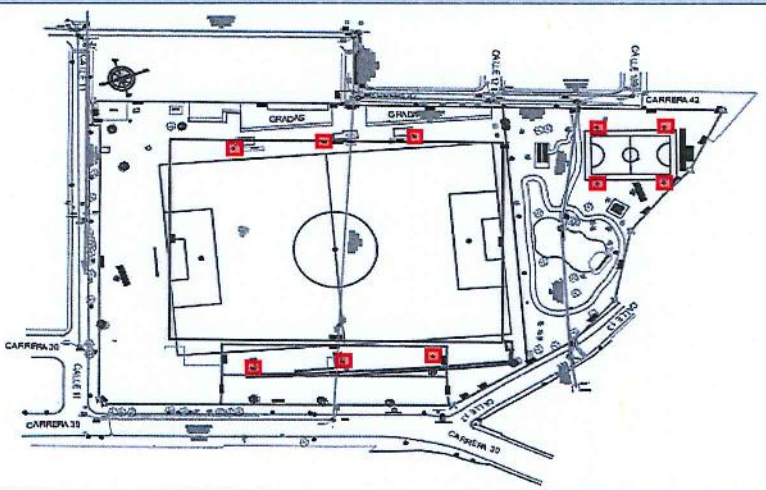

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	DESMONTE Y DEMOLICIONES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND
NP2.4	DESMONTE DE LUMINARIA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







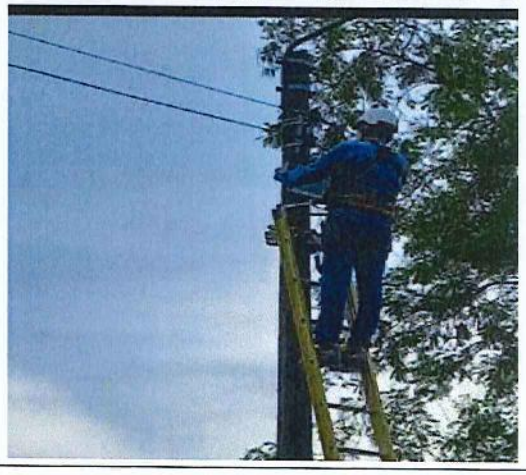

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 25202-090387 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	DESMONTE Y DEMOLICIONES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND
NP2.5	DESMONTE DE POSTE EN CONCRETO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
POSTES ILUMINACIÓN					
CANCHA				6,00	6,00
PARQUEADERO				4,00	4,00
VIENEN:				SUBTOTAL	10,00
PASAN:	10,00			TOTAL	10,00

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	10,00
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	10,00
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0,00
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	10,00
VER PLANO No. 03/03 DESMONTE Y DEMOLICIONES	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	DESMONTE Y DEMOLICIONES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND
NP2.5	DESMONTE DE POSTE EN CONCRETO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

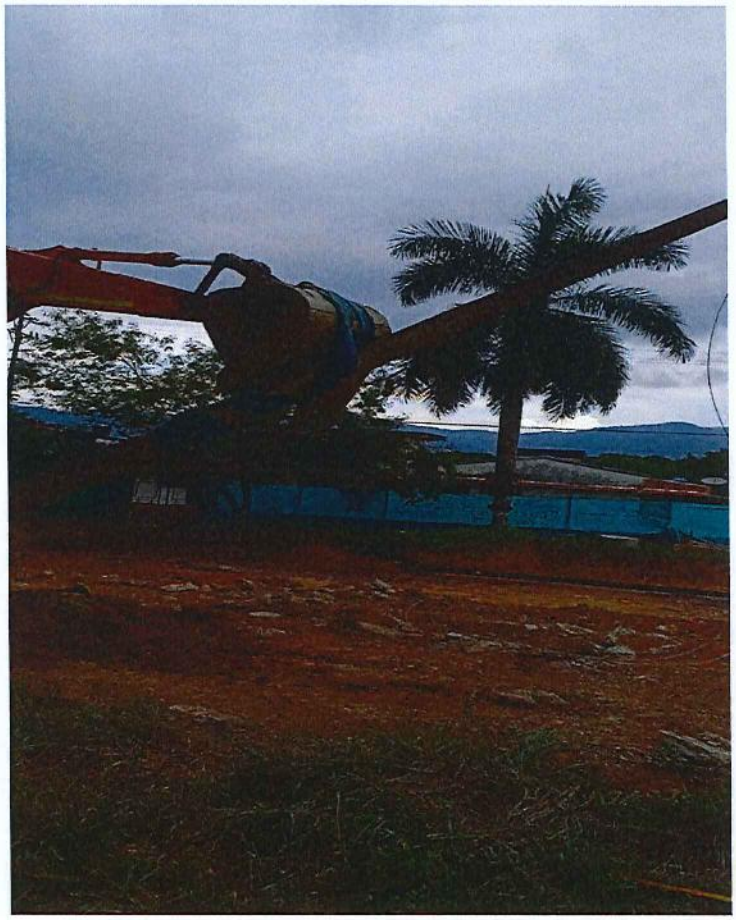





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZMARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
3.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
EXCAVACIÓN MECANICA					
ZONA DE GRADAS	20.32	1.55	76.13	1.00	2,397.79
ZONA DE PARQUEADERO	26.19	1.03	47.90	1.00	1,292.14
ESPACIO PUBLICO ORIENTAL	18.59	1.80	19.24	1.00	643.81
ESPACIO PUBLICO SUR	22.20	0.92	98.03	1.00	2,002.16
CIMENTACIÓN GRADERIAS					
EJE 1´ ZAPATAS (1.50 X 1.50)	4.91	1.50	2.50	4.00	73.65
EJE 2 ZAPATAS (2.60 X 2.60)	3.60	1.00	3.60	12.00	155.52
	2.60	0.75	2.60	12.00	60.84
EJE 3 ZAPATAS (3.00 X 3.00)	4.00	1.00	4.00	12.00	192.00
	3.00	1.10	3.00	12.00	118.80
EJE 1´ ZAPATAS (2.30 X 2.30) (ver grafico)	3.30	1.00	3.30	12.00	130.68
	2.30	1.10	2.30	12.00	69.83
VIENEN:				SUBTOTAL	7,137.22
PASAN:	7,137.22			TOTAL	7,137.22

OBSERVACIONES:		
1. el color de texto AZUL corresponde a lo pagado en parcial 1	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	9,094.90
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	7,137.22
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	6,936.71
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	200.51
VER PLANO No. 01/07 Y 02/07 EXCAVACIONES Y RELLENOS	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	1,957.68

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

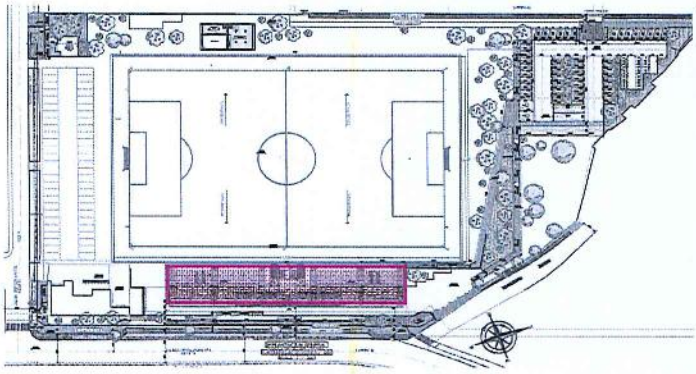



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	M3
3,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

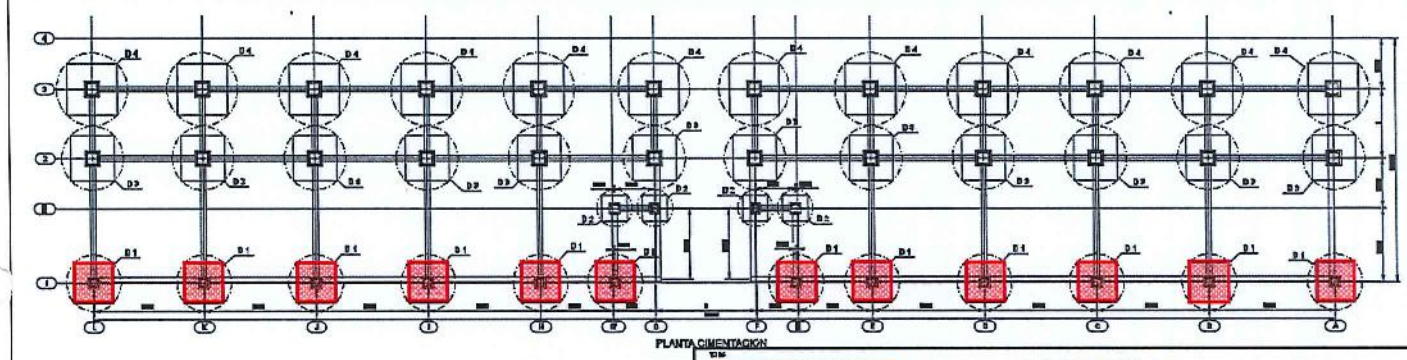

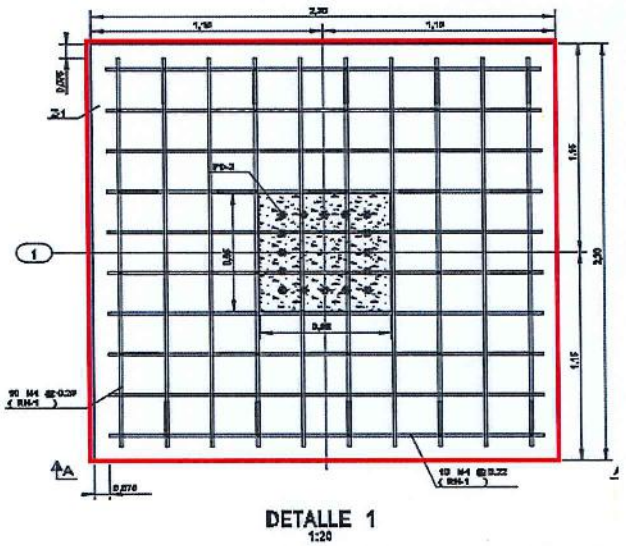

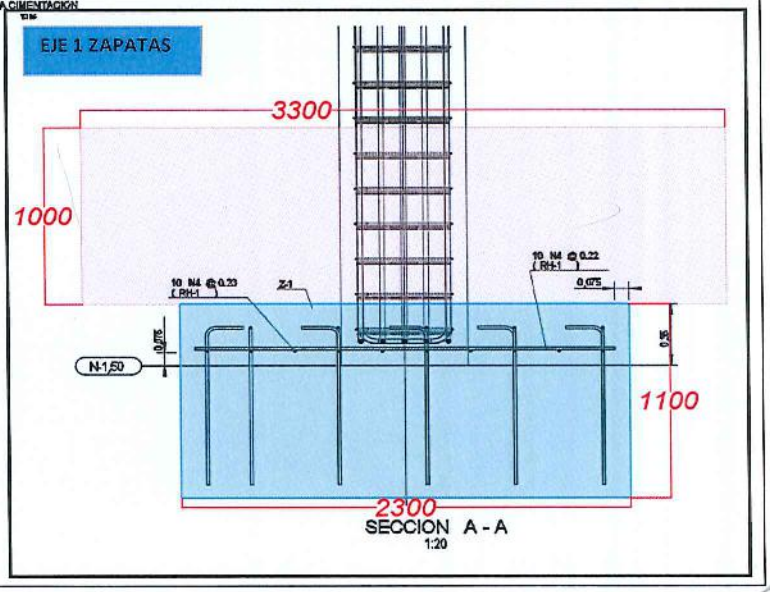

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZMARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
3.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA









Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024


Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND


Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

EXCAVACION CIMENTACION EJE-1

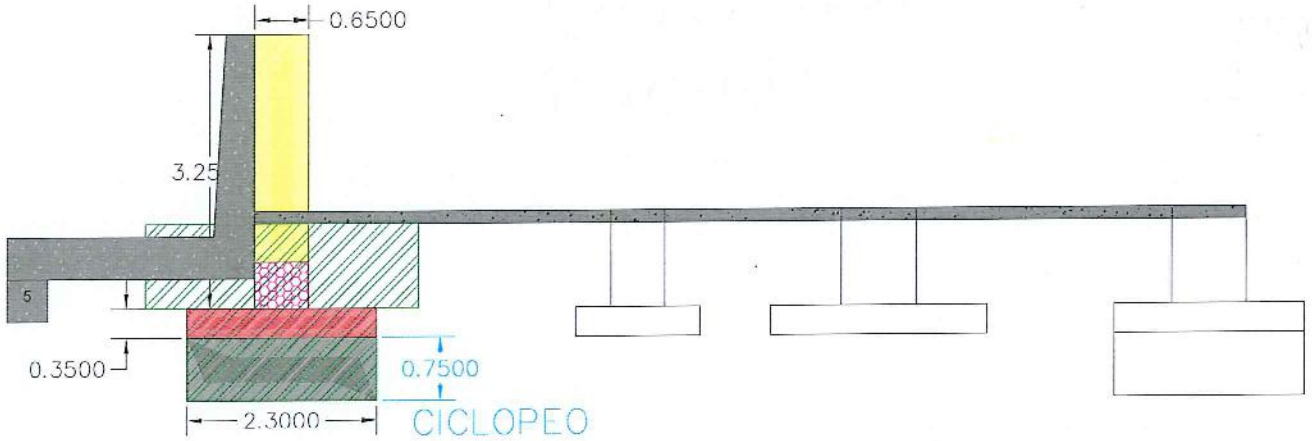

PLANTA

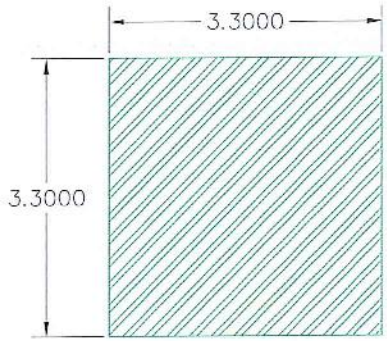


SECCION–1

VOLUMEN DE EXCAVACION

3.30*3.30*1.00= 10.89 M3

PLANTA

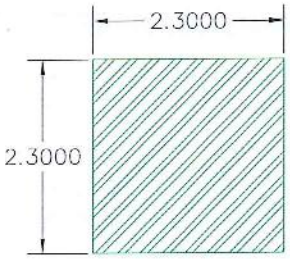


SECCION–2

VOLUMEN DE EXCAVACION

2.30*2.30*1.10= 5.82 M3

PERFIL

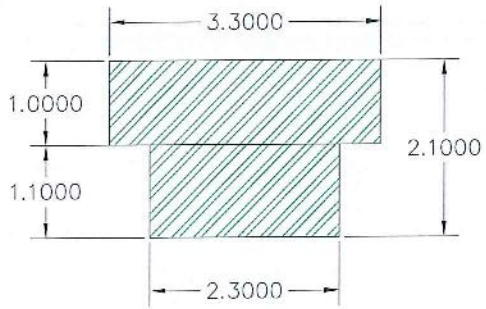

TOTAL

VOLUMEN DE EXCAVACION

TOTAL= 10.89+5.82= 16.71 M3

TOTAL= 16.71*12= 200.51 M3

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
3,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
CICLOPEOS GRADERIAS					
CICLOPEO D4	**3,00**	**0,20**	**3,00**	**12,00**	**21,60**
CICLOPEO D3	**2,60**	**0,20**	**2,60**	**12,00**	**16,22**
CICLOPEO D2	**1,50**	**0,20**	**1,50**	**4,00**	**1,80**
CICLOPEO D1	**2,30**	**0,20**	**2,30**	**12,00**	**12,70**
MURO DE CONTENCIÓN					
DENTELLON TRAMO 1	**0,50**	**0,50**	**34,55**	**1,00**	**8,64**
DENTELLON TRAMO 2	**0,50**	**0,50**	**33,55**	**1,00**	**8,39**
DENTELLON TRAMO 3	**0,50**	**0,50**	**6,00**	**1,00**	**1,50**
DENTELLON TRAMO 4	0,50	0,50	20,05	1,00	5,01
DENTELLON TRAMO 5	0,50	0,50	18,58	1,00	4,65
VIGAS DE CIMENTACION					
VF-7	0,40	0,10	6,85	1,00	0,27
VF-15	0,40	0,10	6,60	2,00	0,53
VIENEN:				SUBTOTAL	81,31
PASAN:	81,31			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
1.en esta memoria se corrige la longitud del tramo 4 de muro de contención, inicialmente escrita 19.78 m a 20.05 m debido a la extension en la zarpa y dentellón, esto para la conexión entre muro sur y muro oriental	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
2. **texto color AZUL representa cantidades pagadas parcial 1**	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
VER PLANO No. 03/07 Y 04/07 EXCAVACIONES Y RELLENOS	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

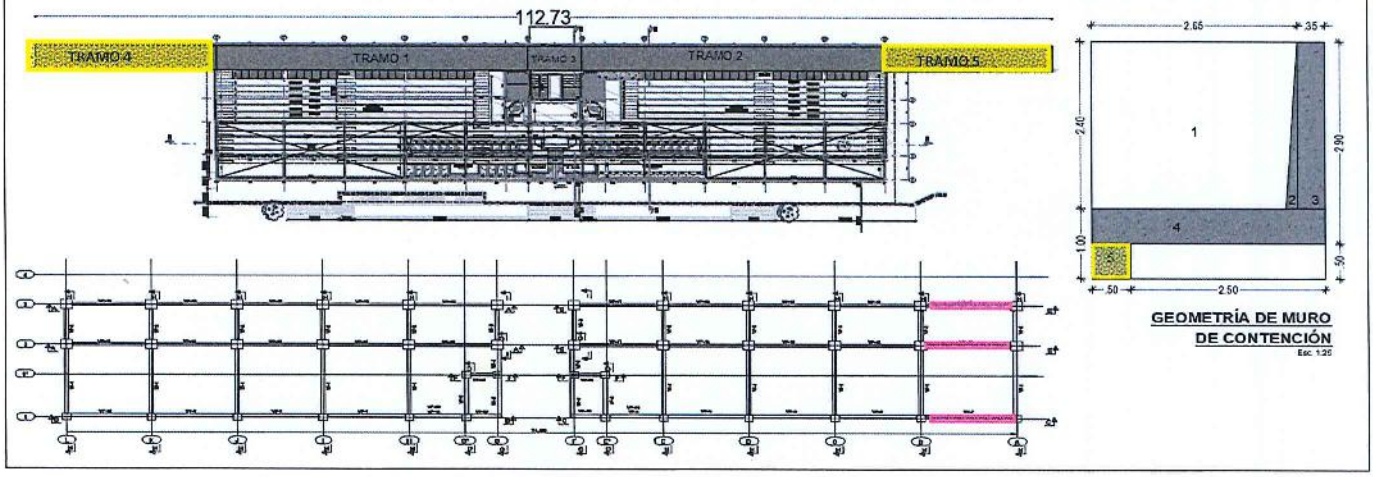

GEOMETRÍA DE MURO DE CONTENCIÓN
Esc: 1:25

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-[illegible]337 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	M3
3,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
VIGAS DE CIMENTACION					
VF-8	0,40	0,10	6,05	3,00	0,73
VF-16	0,40	0,10	5,80	6,00	1,39
VF-17	0,40	0,10	6,06	1,00	0,24
VF-9	0,40	0,10	3,90	1,00	0,16
VF-10	0,40	0,10	2,41	1,00	0,10
VF-22	0,40	0,10	1,76	1,00	0,07
VF-1	0,40	0,10	6,43	5,00	1,29
VF-2	0,40	0,10	3,10	5,00	0,62
VF-17	0,65	0,10	6,06	1,00	0,39
VF-6	0,40	0,10	3,65	2,00	0,29
VF-5	0,40	0,10	3,65	2,00	0,29
VF-4	0,40	0,10	2,13	2,00	0,17
VF-3	0,40	0,10	3,10	2,00	0,25
VIENEN:	81,31			SUBTOTAL	5,99
PASAN:	87,30			TOTAL	

OBSERVACIONES:			
		CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
		CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
		CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
		CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
VER PLANO No.04/07 EXCAVACIONES Y RELLENOS		CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

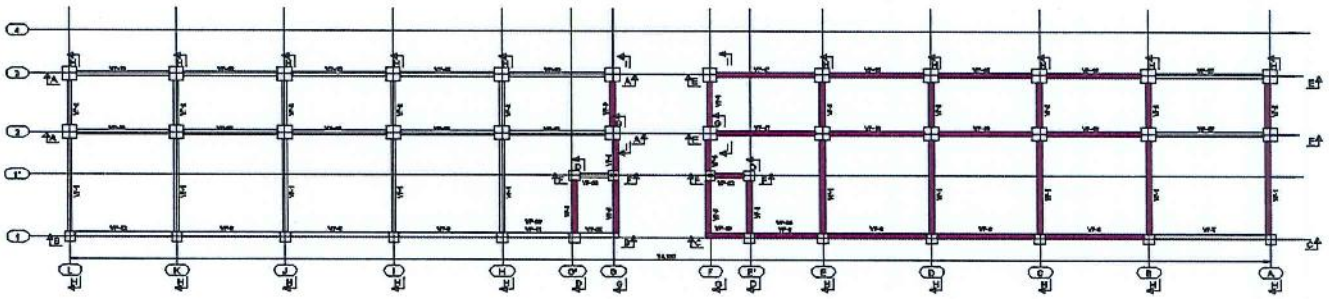

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-000387 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	M3
3,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
VIGAS DE CIMENTACION					
VF-25	0,40	0,10	2,41	1,00	0,10
VF-11	0,40	0,10	3,81	1,00	0,15
VF-22	0,40	0,10	1,76	1,00	0,07
VF-18	0,65	0,10	5,97	1,00	0,39
VF-18	0,40	0,10	5,97	1,00	0,24
VF-8	0,40	0,10	6,05	3,00	0,73
VF-16	0,40	0,10	5,80	6,00	1,39
VF-12	0,40	0,10	5,95	1,00	0,24
VF-19	0,40	0,10	5,70	2,00	0,46
VF-1	0,40	0,10	6,43	5,00	1,29
VF-2	0,40	0,10	3,10	5,00	0,62
ZARPA MURO CONTENCIÓN	2,50	0,20	112,73	1,00	56,37
VIENEN:	87,30			SUBTOTAL	62,05
PASAN:	149,35			TOTAL	149,35

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 03/07 Y 04/07 EXCAVACIONES Y RELLENOS	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	865,11
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	149,35
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	75,79
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	73,56
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	715,76

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

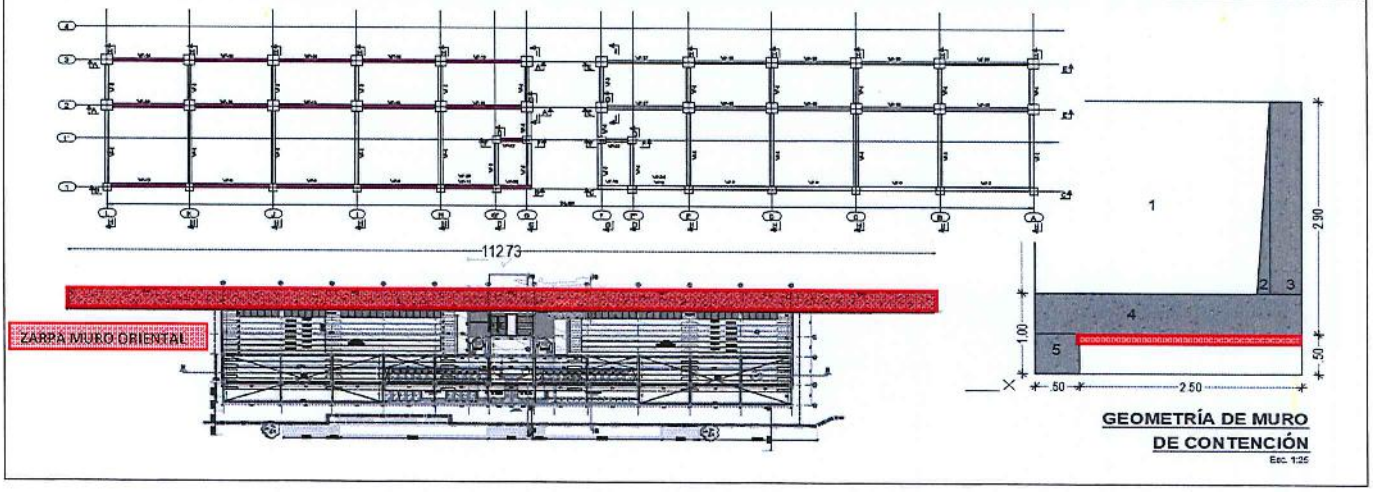

GEOMETRÍA DE MURO DE CONTENCIÓN
Esc. 1:25

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
3,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA






Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: LUZMARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	M3
3,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
AREAS DE RELLENO					
CANCHA SINTETICA	73,00	0,15	110,00	1,00	1.204,50
MURO ORIENTAL CORTE	3,60	1,79	112,73	1,00	726,43
PARQUEADERO NORTE	26,19	0,40	47,90	1,00	501,80
descuento cajones en grava para filtros cancha (zanja perimetral de tubería microperforada)	0,45	0,15	352,80	-1,00	-23,81
VIENEN:				SUBTOTAL	2.408,92
PASAN:	2.408,92			TOTAL	2.408,92

OBSERVACIONES:		
1. ajuste de altura de relleno para la cancha sintetica debido a que en parcial 1 solo se incluyeron 0.051 m.	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	3.220,25
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	2.408,92
2. ajuste del ancho de la cancha 1 m para total de 73 m	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	403,92
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	2.005,00
VER PLANO No. 01/12 AL 12/12 Excavaciones y rellenos (cortes y secciones)	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	811,33

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

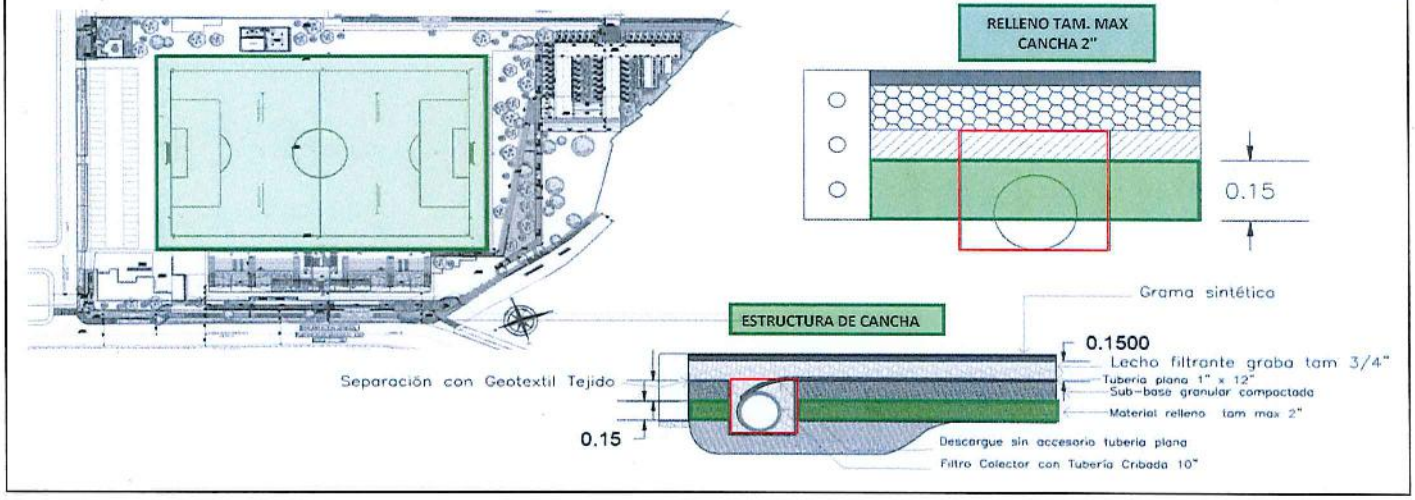

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
3,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

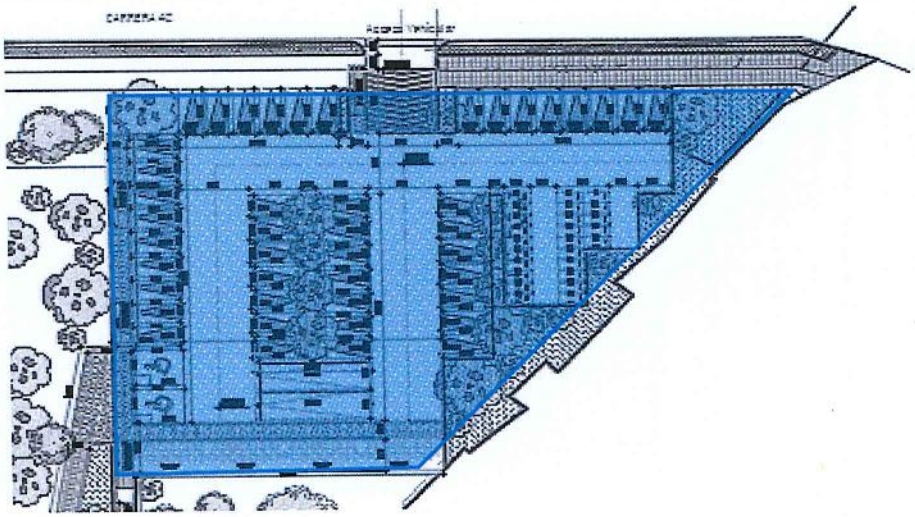

ESTRUCTURA PARQUEADEROS

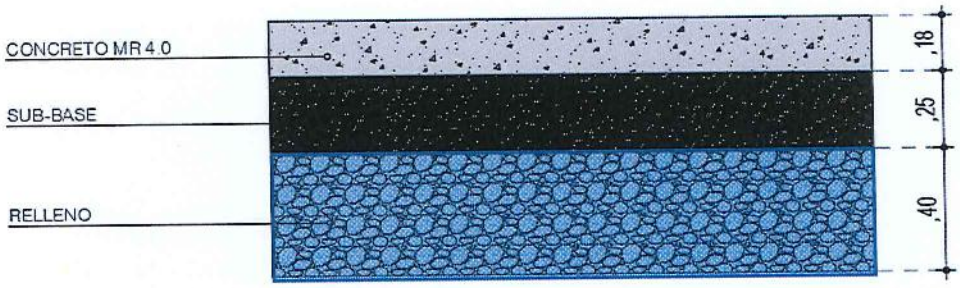

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	M3
3,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

CORTE RELLENO MURO CONTENCIÓN

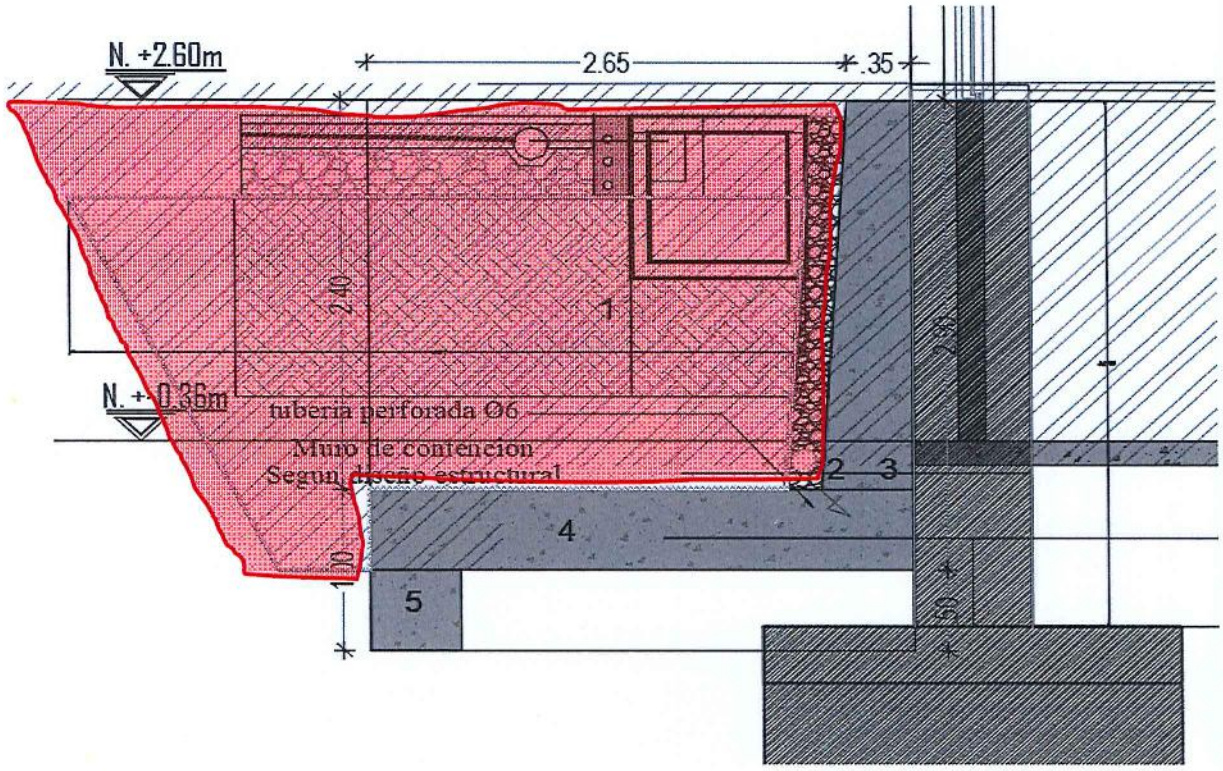

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
3,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA









Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-190337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
3,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





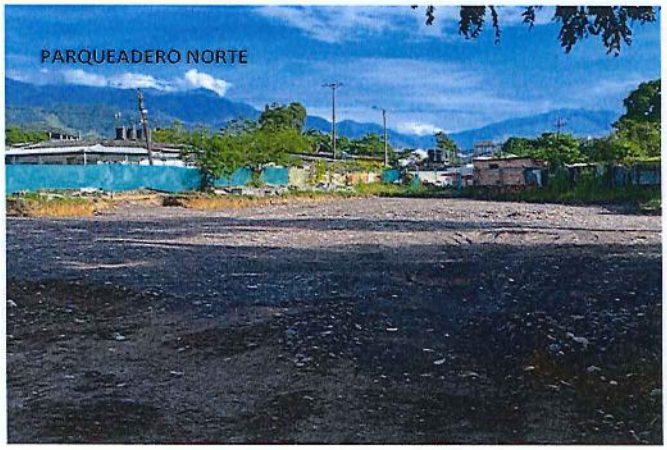



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
3.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA






Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

RELLENO CON MATERIAL DE RIO DE 2" MURO ORIENTAL				
ABSCISA	AREA	DISTANCIA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
K0+000	7.12			
K0+010	7.02	10.00	70.7	70.7
K0+020	7.02	10.00	70.2	140.9
K0+030	7.02	10.00	70.20	211.10
K0+040	7.07	10.00	70.45	281.55
K0+050	6.08	10.00	65.75	347.30
K0+060	6.06	10.00	60.71	408.01
K0+070	6.03	10.00	60.46	468.47
K0+080	6.05	10.00	60.40	528.87
K0+090	6.05	10.00	60.50	589.37
K0+100	6.02	10.00	60.35	649.72
K0+110	6.03	10.00	60.25	709.97
K0+113	6.03	2.73	16.46	726.43

TOTAL	726.43
	m3

VOLUMEN PARCIAL 1		M3
VOLUMEN ACUMULADO	726.43	M3

RELLENO MURO ORIENTAL 2 PULGADAS

CONSOLIDADO ACTUALIZADO		
RELLENO	**726.43**	m3

Vo.Bo OBRA

DUBAN ANDRES PINZON JOYA
L.P_ 01-19916

Vo.Bo
INTERVENTORIA

FANNY BARRERA GONZALEZ
L.P_ 01-10580

OK

RELLENO CON MATERIAL DE RIO DE 2" PARQUEADERO NORTE				
ABSCISA	AREA	DISTANCIA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
K0+000	3.72			
K0+005	6.88	5.00	26.50	26.50
K0+010	9.09	5.00	39.93	66.43
K0+015	11.13	5.00	50.55	116.98
K0+020	13.58	5.00	61.78	178.75
K0+025	13.47	5.00	67.63	246.38
K0+030	11.35	5.00	62.06	308.44
K0+035	11.34	5.00	56.73	365.17
K0+040	11.34	5.00	56.70	421.87
K0+045	9.55	5.00	52.23	474.09
K0+048	9.56	2.90	27.71	501.80
			TOTAL	**501.80**
				m3

VOLUMEN PARCIAL 1	0	M3
VOLUMEN ACUMULADO	**501.80**	M3

RELLENO PARQUEADERO NORTE 2 PULGADAS

CONSOLIDADO ACTUALIZADO		
RELLENO	**501.80**	m3

Vo.Bo OBRA

DUBAN ANDRES PINZON JOYA
L.P_ 01-19916

Vo.Bo
INTERVENTORIA

FANNY BARRERA GONZALEZ
L.P_ 01-10580

FOR

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	M3
3.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

PARQUEADERO NORTE

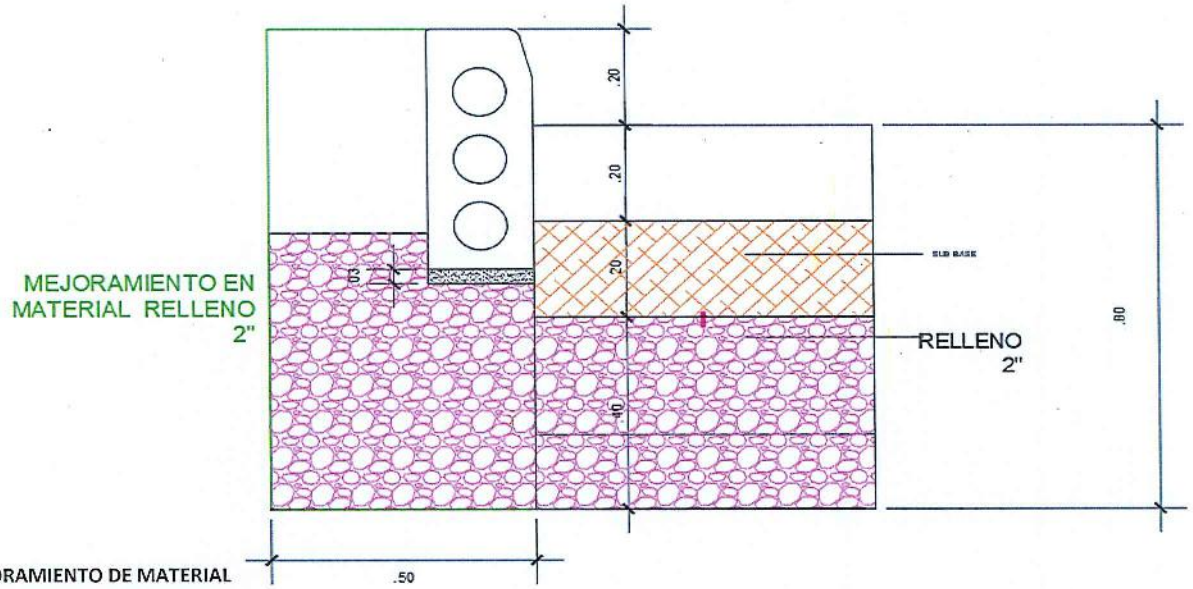

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	VJ
NP3.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
TRANSPORTE					
ITEM 3.1				7137.22	7,137.22
ITEM 3.2				149.35	149.35
ITEM 14.2				3372.60	3,372.60
Subtotal					10,659.17
Factor expansión 20%					2,131.83
Subtotal + factor de expansión					12,791.00
VIAJE 7 M3				TOTAL/VIAJE 7 M3	1,827.29
VIENEN:				SUBTOTAL	1,827.29
PASAN:	1,827.29			TOTAL	1,827.29

OBSERVACIONES:		
1. El item NP 3.5 contempla el acumulado de todas las areas expresadas en el esquema inferior, junto a su cuadro de convenciones	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	3,082.00
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	1,827.29
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0.00
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	1,827.29
VER PLANO No. 07/07 EXCAVACIONES Y RELLENOS	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	1,254.71

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

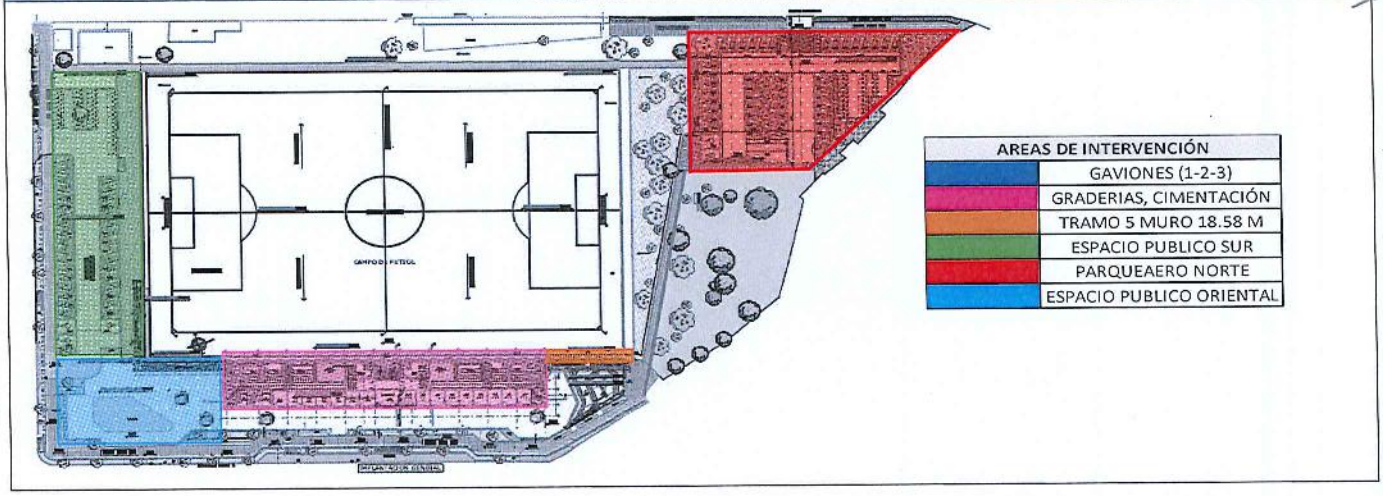

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090387 CND

Firma
Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VJ
NP3.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA






Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-098137 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	M3
NP3.5	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN SITIO AUTORIZADO	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
DISPOSICION DE MATERIALES					
MATERIAL TRANSPORTADO ITEM NP3.4				12791.00	12,791.00
					0.00
					0.00
					0.00
VIENEN:				SUBTOTAL	12,791.00
PASAN:	12,791.00			TOTAL	12,791.00

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 07/07 EXCAVACIONES Y RELLENOS	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	20,935.82
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	12,791.00
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0.00
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	12,791.00
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	8,144.82

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

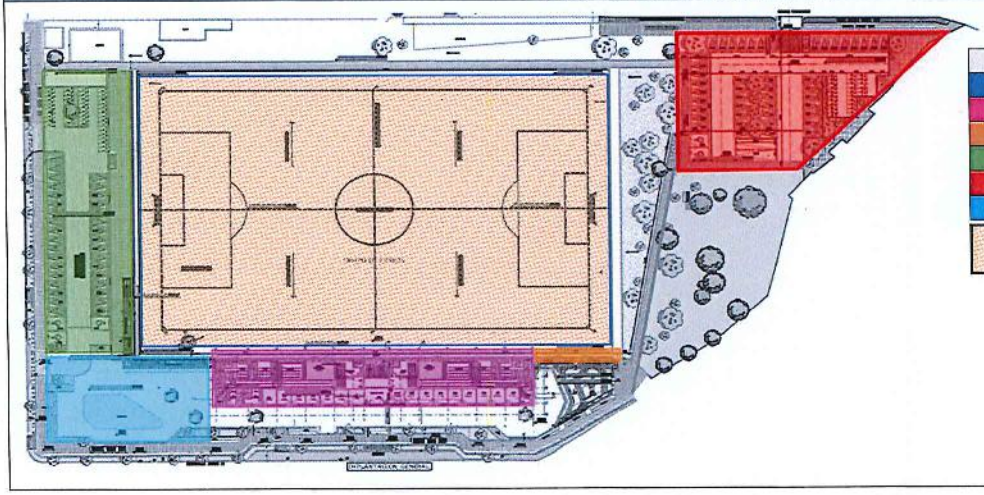

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
NP3.5	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN SITIO AUTORIZADO	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
4,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
VIGAS DE CIMENTACIÓN					
VF-7	0,40	0,05	6,85	1,00	0,14
VF-15	0,40	0,05	6,60	2,00	0,26
VF-8	0,40	0,05	6,05	3,00	0,36
VF-16	0,40	0,05	5,80	6,00	0,70
VF-17	0,40	0,05	6,06	1,00	0,12
VF-9	0,40	0,05	3,90	1,00	0,08
VF-10	0,40	0,05	2,41	1,00	0,05
VF-22	0,40	0,05	1,76	1,00	0,04
VF-1	0,40	0,05	6,43	5,00	0,64
VF-2	0,40	0,05	3,10	5,00	0,31
VF-17	0,65	0,05	6,06	1,00	0,20
VF-6	0,40	0,05	3,65	2,00	0,15
VF-5	0,40	0,05	3,65	2,00	0,15
VIENEN:				SUBTOTAL	3,20
PASAN:	3,20			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
1.Cambio de sección en la viga VF-17, anteriormente en 0.40 m a 0.65 m reposando sobre si un dado de soporte para una columna metalica 2.se corrige la cantidad de vigas VF-22 de 10 und a 1 und 3. El texto color AZUL corresponde a lo pagado en parcial 1	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
VER PLANO No. 01/10 CIMENTACION	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

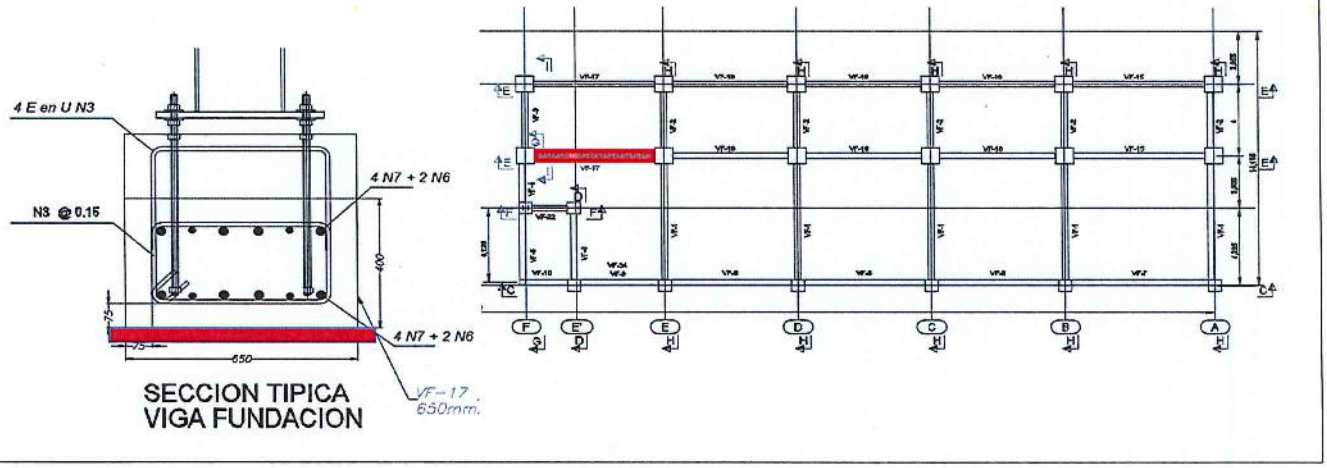

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: **ALVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090327 CND

Firma
Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
4,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
VIGAS DE CIMENTACIÓN					
VF-4	**0,40**	**0,05**	**2,13**	**2,00**	**0,09**
VF-3	0,40	0,05	3,10	2,00	0,12
VF-25	**0,40**	**0,05**	**2,41**	**1,00**	**0,05**
VF-11	**0,40**	**0,05**	**3,81**	**1,00**	**0,08**
VF-22	**0,40**	**0,05**	**1,76**	**1,00**	**0,04**
VF-18	0,65	0,05	5,97	1,00	0,19
VF-18	**0,40**	**0,05**	**5,97**	**1,00**	**0,12**
VF-8	**0,40**	**0,05**	**6,05**	**3,00**	**0,36**
VF-16	**0,40**	**0,05**	**5,80**	**6,00**	**0,70**
VF-12	**0,40**	**0,05**	**5,95**	**1,00**	**0,12**
VF-19	**0,40**	**0,05**	**5,70**	**2,00**	**0,23**
VF-1	**0,40**	**0,05**	**6,43**	**5,00**	**0,64**
VF-2	**0,40**	**0,05**	**3,10**	**5,00**	**0,31**
VIENEN:	3,20			SUBTOTAL	3,05
PASAN:	6,25			TOTAL	


OBSERVACIONES:			
1. El texto color AZUL corresponde a lo pagado en parcial 1		CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
		CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
		CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
		CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
VER PLANO No. 01/10 CIMENTACION		CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

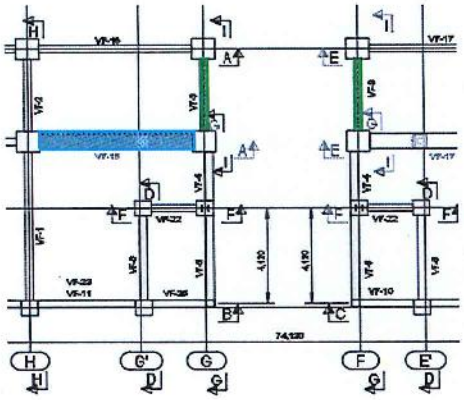



SECCION TIPICA
VIGA FUNDACION
1:15

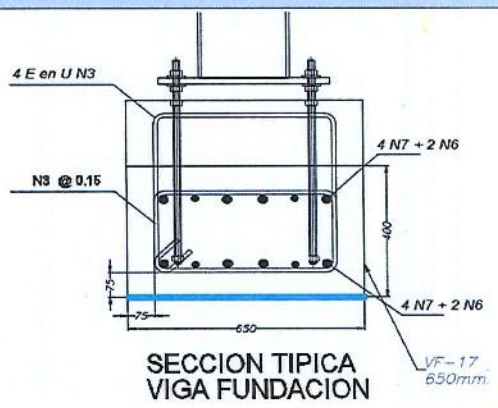

SECCION TIPICA
VIGA FUNDACION

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	M3
4,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
MURO CONTENCIÓN					
ZARPA MURO TRAMO 1 34.55 M	**2,50**	**0,05**	**34,55**	**1,00**	**4,32**
ZARPA MURO TRAMO 2 33.55 M	**2,50**	**0,05**	**33,55**	**1,00**	**4,19**
ZARPA MURO TRAMO 3, 6 M	2,50	0,05	6,00	1,00	0,75
ZARPA MURO TRAMO 4, 20.05 M	2,50	0,05	20,05	1,00	2,51
DENTELLON MURO CONTENCIÓN					
TRAMO 1, 34.55 M	0,50	0,05	34,55	1,00	0,86
TRAMO 2, 33.55 M	0,50	0,05	33,55	1,00	0,84
VIENEN:	6,25			SUBTOTAL	13,47
PASAN:	19,72			TOTAL	19,72

OBSERVACIONES:		
1. El texto color AZUL corresponde a lo pagado en parcial 1	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	19,79
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	19,72
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	14,74
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	4,98
VER PLANO No. 02/10 CIMENTACION	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	0,07

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

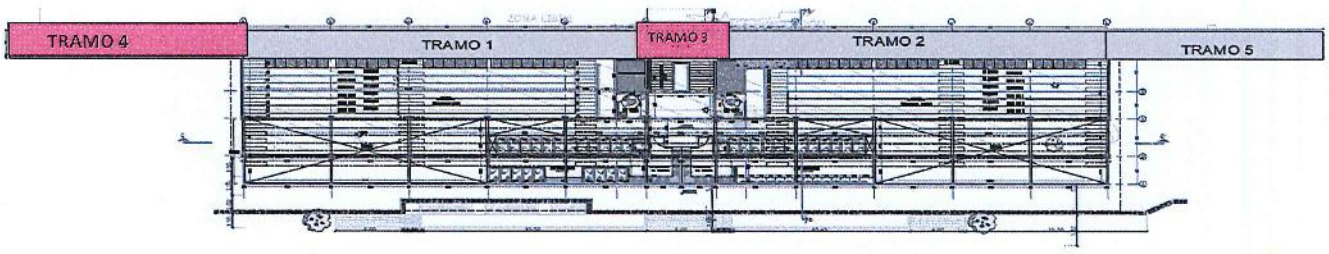

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
4,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

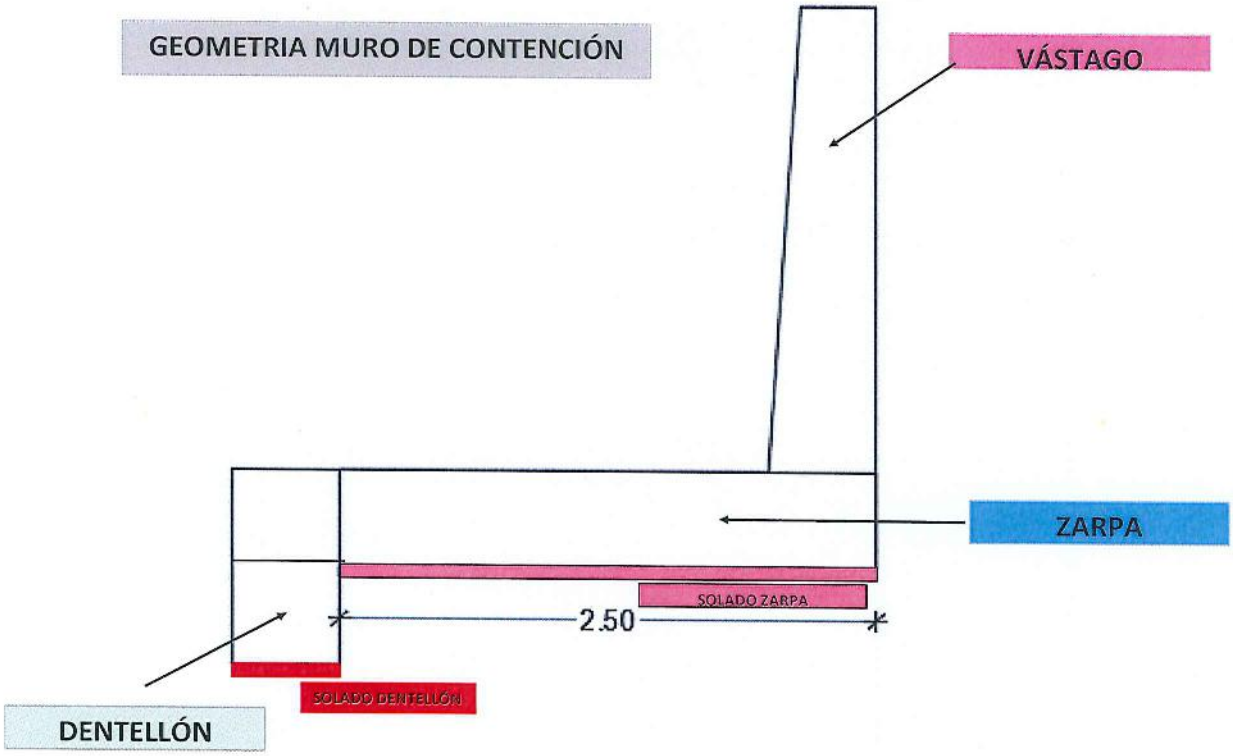

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
4,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA









Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-930337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	DIAMETRO	PESO KG/M	LONGITUD	CANTIDAD	
CICLOPEOS					
CICLOPEO D4 - RV3	1/2"	0,994	1,00	1896,00	1.884,62
CICLOPEO D1 - RV3	1/2"	0,994	1,00	360,00	357,84
PARRILLAS DE ZAPATAS					
ZP D4 - RH4	1/2"	0,994	2,85	600,00	1.699,74
ZP D3 - RH3	1/2"	0,994	2,45	336,00	818,26
ZP D2 - RH2	1/2"	0,994	1,35	48,00	64,41
ZP D1 - RH1	1/2"	0,994	2,15	240,00	512,90
VIENEN:				SUBTOTAL	5.337,77
PASAN:	5.337,77			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 03/10 Y 04/10 CIMENTACION	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

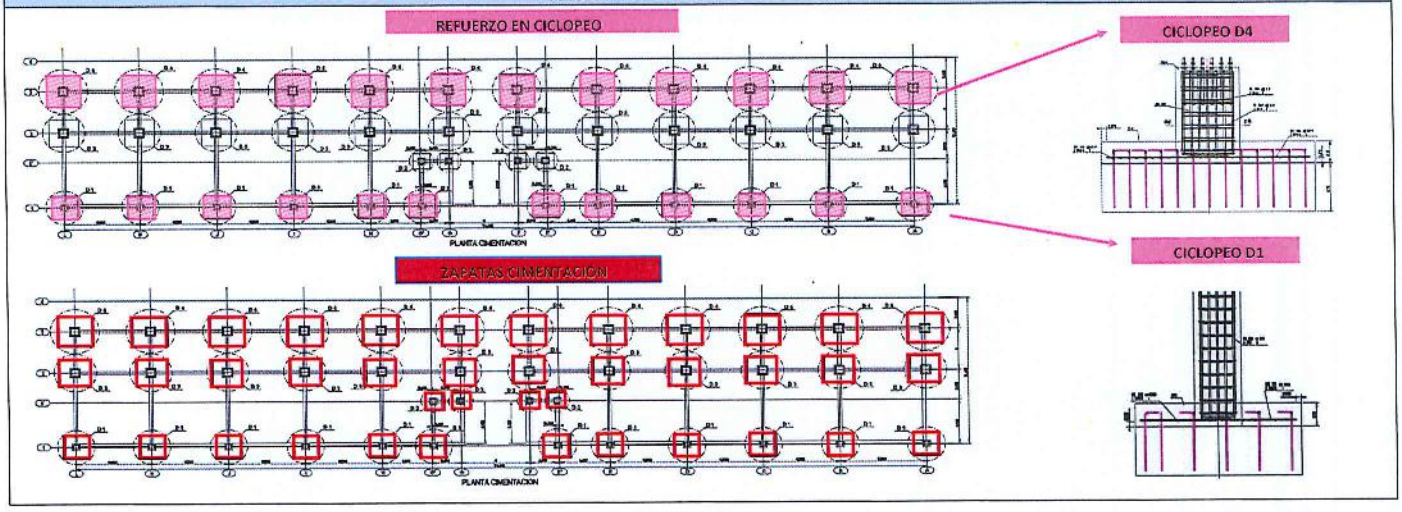

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-000337 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA




REFUERZO DE CICLOPEO D4





REFUERZO DE CICLOPEO D1

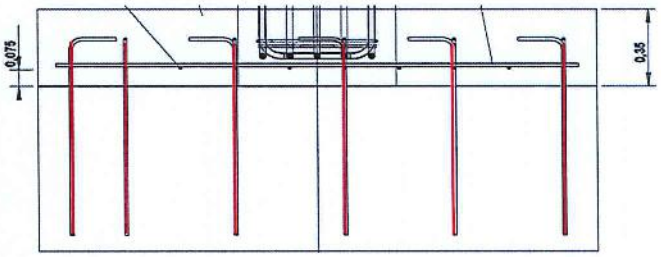

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090937 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA




ZAPATA D1

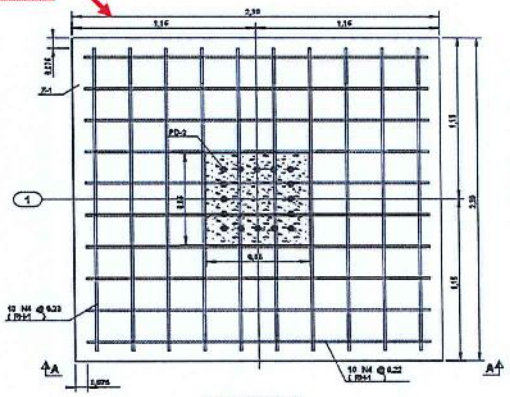

DETALLE 1

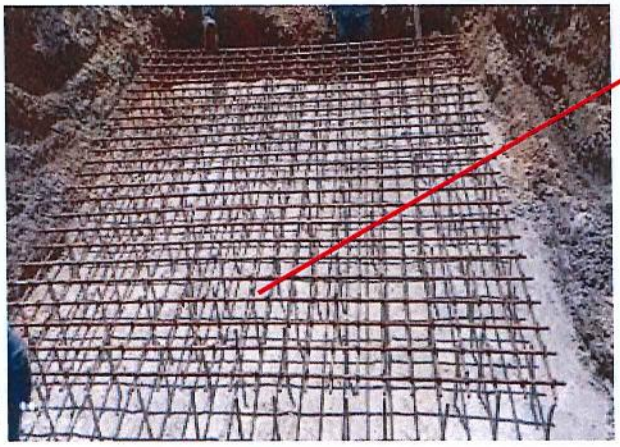

ZAPATA D4

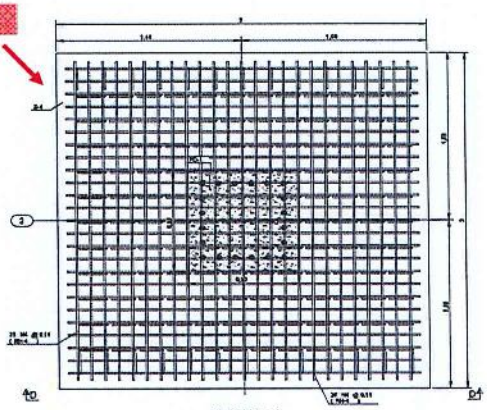

DETALLE 4

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma

Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	DIAMETRO	PESO KG/M	LONGITUD	CANTIDAD	
PEDESTALES					
RV-1 PEDESTALES (D4,D3)	7/8"	3,042	2,08	576,00	3.644,56
RV-1 PEDESTALES (D2)	7/8"	3,042	2,08	64,00	404,95
RV-2 PEDESTALES (D1)	7/8"	3,042	4,28	192,00	2.499,79
ESTRIBOS					
E-1	3/8"	0,560	3,21	168,00	302,00
E-2	3/8"	0,560	2,31	384,00	496,74
E-3	3/8"	0,560	2,21	244,00	301,97
E-4	3/8"	0,560	1,42	241,00	191,64
VIENEN:	5337,77			SUBTOTAL	7.841,65
PASAN:	13.179,42			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 05/10 CIMENTACION	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

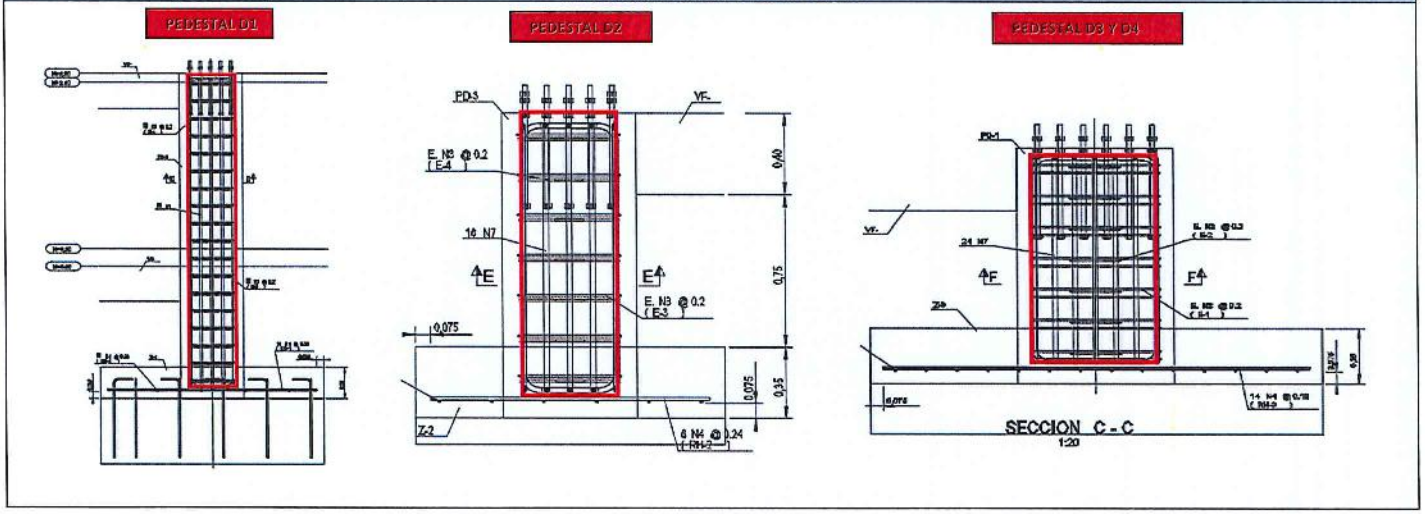

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ITEM	DESCRIPCION	KG
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



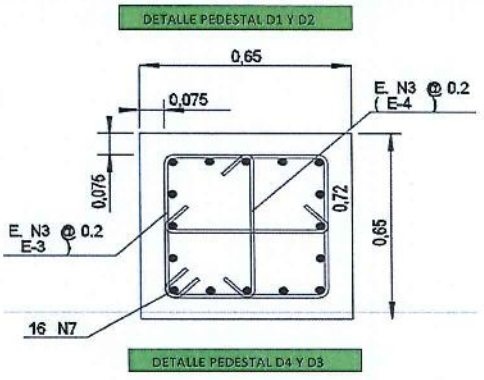



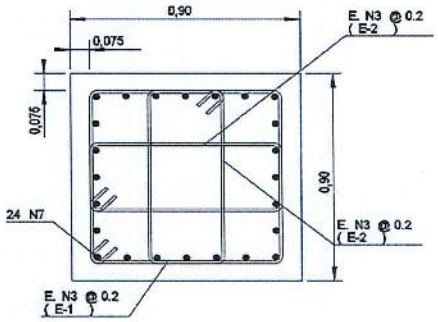



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	DIAMETRO	PESO KG/M	LONGITUD	CANTIDAD	
VIGAS DE CIMENTACIÓN					
VF-18 Sección 0.65 x 0.40 m	7/8"	3,042	7,17	4,00	87,24
	3/4"	2,235	7,72	4,00	69,02
	7/8"	3,042	7,72	4,00	93,94
VIGA VF-17 Sección 0.65 x 0.40 m	7/8"	3,042	9,47	4,00	115,23
	3/4"	2,235	7,72	4,00	69,02
	7/8"	3,042	7,72	4,00	93,94
VIGA VF-15 - RH11	7/8"	3,042	7,80	8,00	189,82
VIGA VF-7- RH11	7/8"	3,042	7,80	4,00	94,91
VIGA VF-16 - RH12	7/8"	3,042	8,00	48,00	1.168,13
VIGA VF-8 - RH12	7/8"	3,042	8,00	24,00	584,06
VIGA VF-9 - RH-13	7/8"	3,042	5,85	4,00	71,18
VIGA VF-10 - RH14	7/8"	3,042	4,67	4,00	56,82
VIGA VF-17 - RH21	7/8"	3,042	9,47	4,00	115,23
VIENEN:	13179,42			SUBTOTAL	2.808,54
PASAN:	15.987,96			TOTAL	

04

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 06/10 Y 10/10 CIMENTACION	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

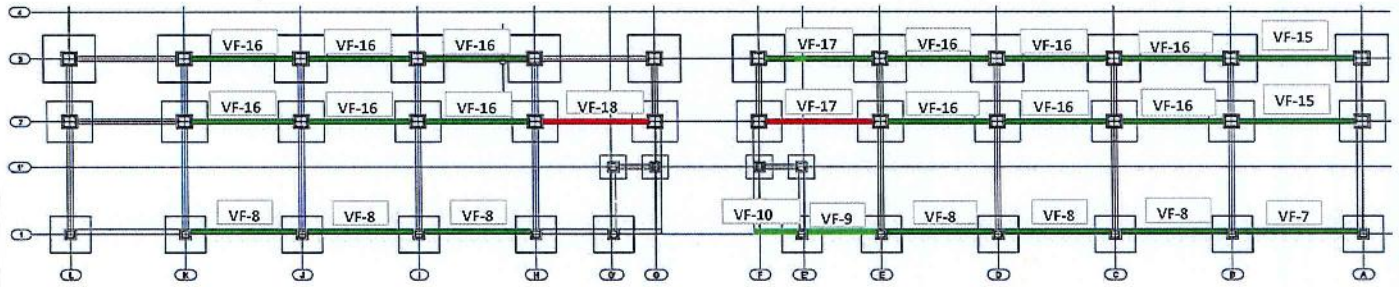

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA






VF-17 Y VF-18

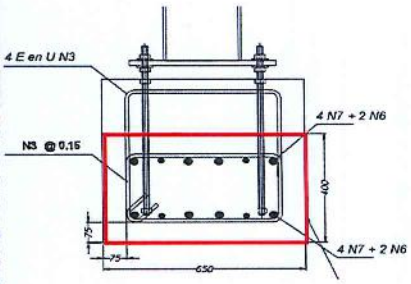





VIGA CIMENTACIÓN

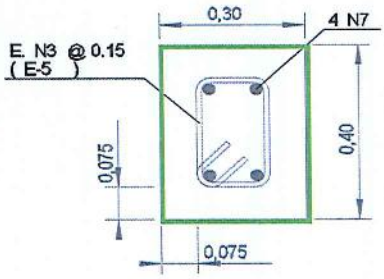

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-[illegible]337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	DIAMETRO	PESO KG/M	LONGITUD	CANTIDAD	
VIGAS DE CIMENTACIÓN					
VIGA VF-22	7/8"	3,042	3,29	8,00	80,07
VIGA VF-18	7/8"	3,042	7,17	4,00	87,24
VIGA VF-19	7/8"	3,042	9,10	8,00	221,46
VIGA VF-12 nivel 0,20	7/8"	3,042	8,85	4,00	107,69
VIGA VF-11	7/8"	3,042	5,76	4,00	70,09
VIGA VF-25	7/8"	3,042	3,29	4,00	40,03
VIGA VF-1	7/8"	3,042	7,38	40,00	898,00
VIGA VF-2	7/8"	3,042	6,51	40,00	792,14
VIGA VF-3	7/8"	3,042	5,13	8,00	124,84
VIGA VF-4	7/8"	3,042	5,29	8,00	128,74
VIGA VF-5	7/8"	3,042	4,25	8,00	103,43
VIGA VF-6	7/8"	3,042	5,17	8,00	125,82
VIENEN:	15987,96			SUBTOTAL	2.779,55
PASAN:	18.767,51			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 06/10 Y 10/10 CIMENTACION	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

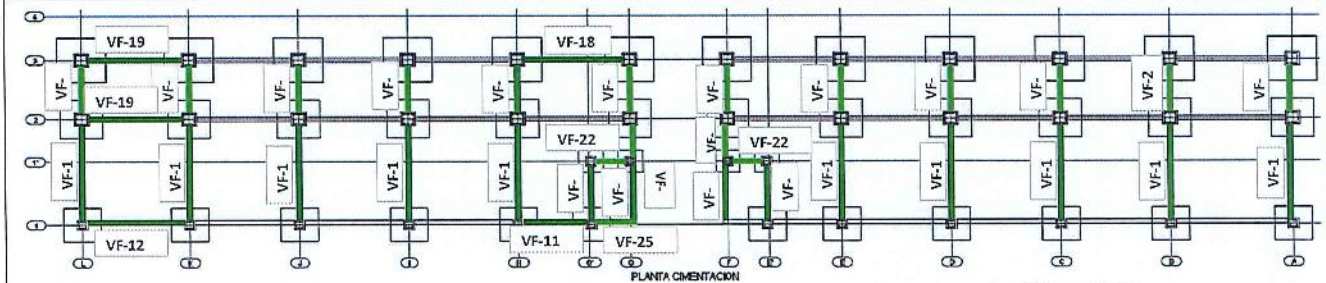



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-050337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	DIAMETRO	PESO KG/M	LONGITUD	CANTIDAD	
VIGAS DE CIMENTACIÓN					
ESTRIBOS (E-5) No 3	3/8"	0,560	1,00	1972,00	1.104,32
ESTRIBOS DE DADO EN VF-17 Y VF-18	3/8"	0,560	2,24	8,00	10,04
ESTRIBOS PARA VIGA 65X40 VF-18 Y VF-17	3/8"	0,560	1,70	102,00	97,10
TRAMO 1 MURO DE CONTENCIÓN 34.55 M					
GANCHOS DENTELLON	5/8"	1,552	1,35	344,00	720,75
LONGITUDINALES DENTELLON	5/8"	1,552	6,00	36,00	335,23
	5/8"	1,552	3,66	6,00	34,08
ZARPA LONGITUDINAL INFERIOR	3/4"	2,235	6,00	120,00	1.609,20
	3/4"	2,235	4,77	19,00	202,56
TRANSVERSALES INFERIOR	3/4"	2,235	3,45	229,00	1.765,76
ZARPA LONGITUDINAL SUPERIOR	3/4"	2,235	6,00	120,00	1.609,20
	3/4"	2,235	4,77	19,00	202,56
TRANSVERSALES SUPERIOR	3/4"	2,235	3,45	229,00	1.765,76
VIENEN:	18767,51			SUBTOTAL	9.456,56
PASAN:	28.224,07			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 02/10,06/10 Y 10/10 CIMENTACION	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

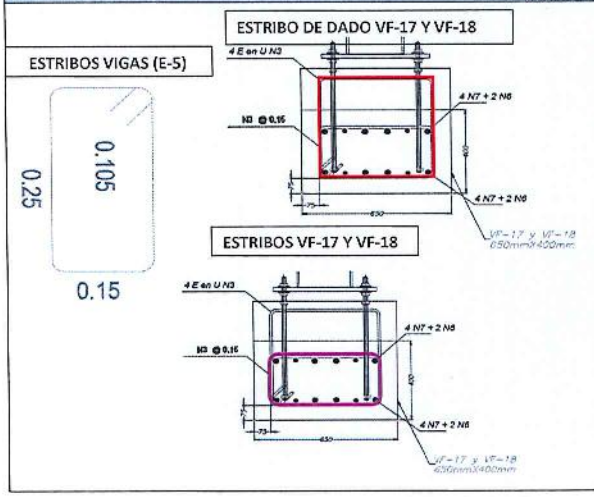

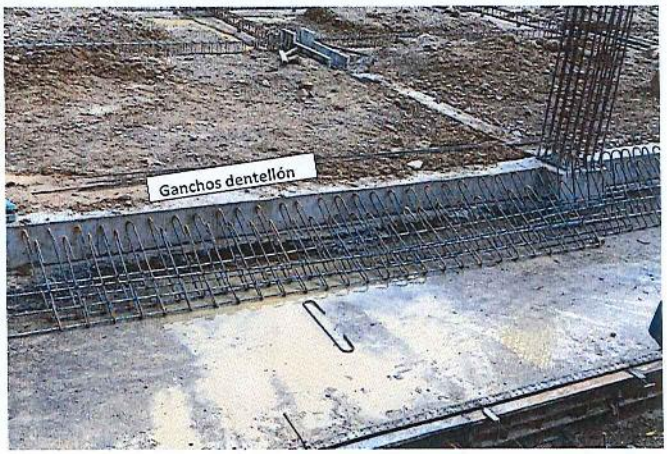

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-[illegible]337 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

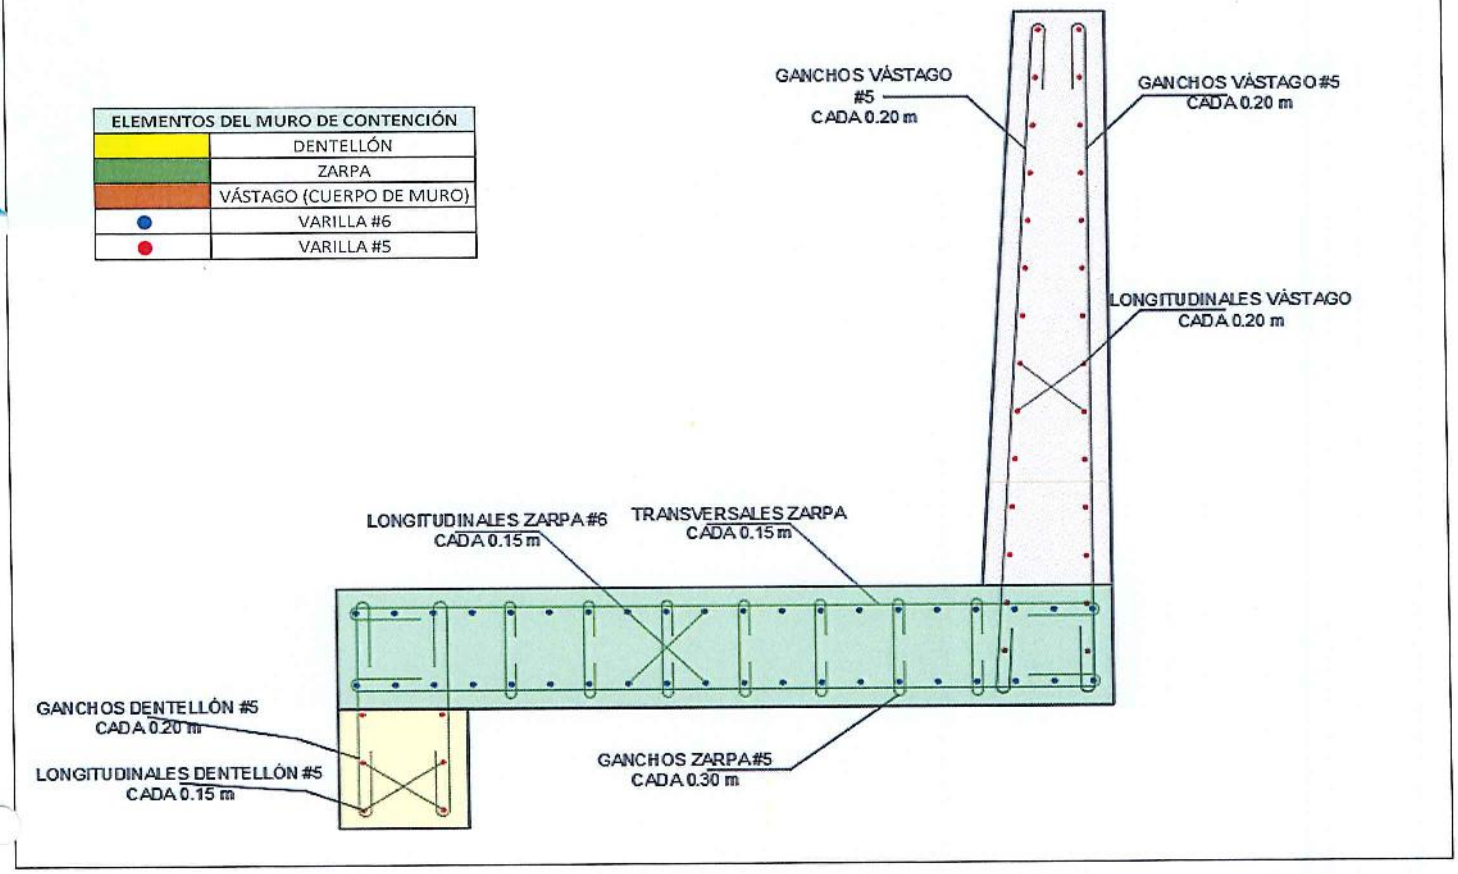

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

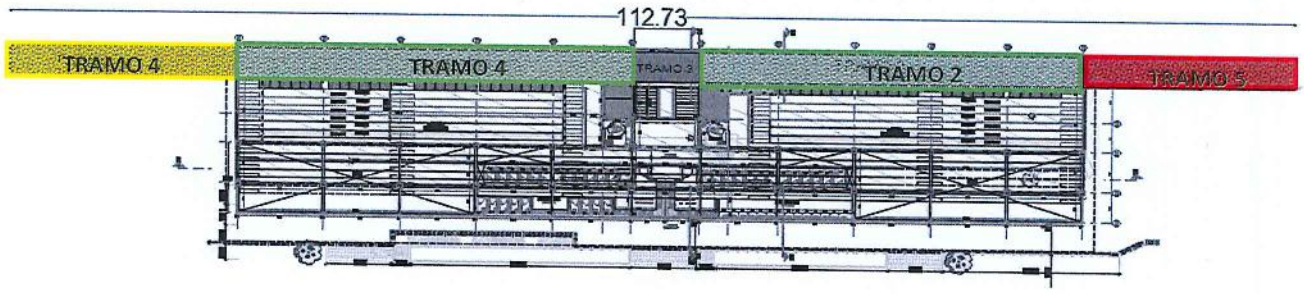

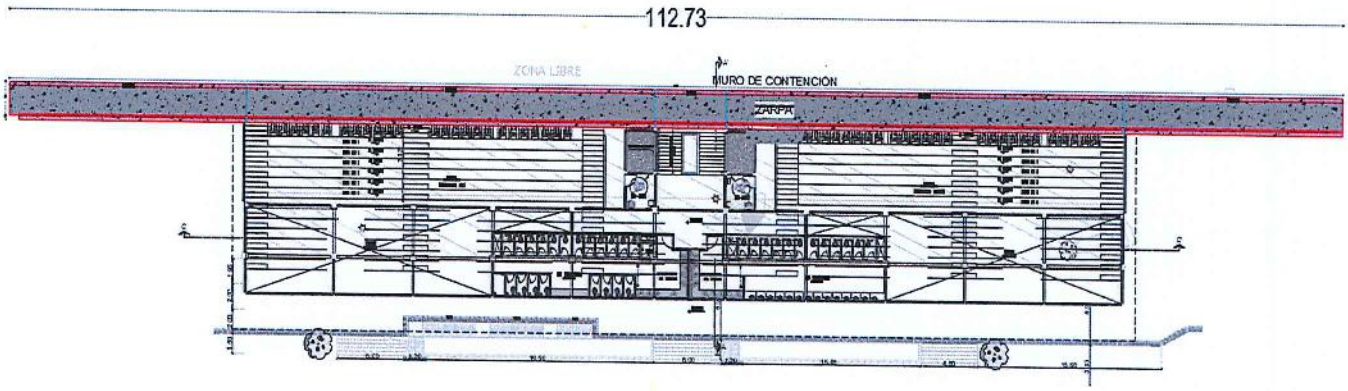

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090327 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA






Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	DIAMETRO	PESO KG/M	LONGITUD	CANTIDAD	
TRAMO 1 MURO DE CONTENCIÓN 34.55 M					
GANCHOS PARRILLA ZARPA	5/8"	1,552	0,60	809,00	753,34
BASTAGO (gancho CUERPO DE MURO)	5/8"	1,552	3,25	346,00	1.745,22
LONGITUDINALES BASTAGO	5/8"	1,552	3,20	8,00	39,73
	5/8"	1,552	6,00	168,00	1.564,42
TRAMO 2 MURO DE CONTENCIÓN 33.55 M					
GANCHOS DENTELLON	5/8"	1,552	1,35	332,00	695,61
LONGITUDINALES DENTELLON	5/8"	1,552	6,00	36,00	335,23
	5/8"	1,552	2,66	6,00	24,77
ZARPA LONGITUDINAL INFERIOR	3/4"	2,235	6,00	120,00	1.609,20
	3/4"	2,235	3,96	20,00	177,01
GANCHO TRANSVERSALES INFERIOR	3/4"	2,235	3,45	221,00	1.704,08
ZARPA LONGITUDINAL SUPERIOR	3/4"	2,235	6,00	120,00	1.609,20
	3/4"	2,235	3,96	20,00	177,01
VIENEN:	26224,07			SUBTOTAL	10.434,82
PASAN:	38.658,89			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 02/10 CIMENTACION	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-[illegible]337 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

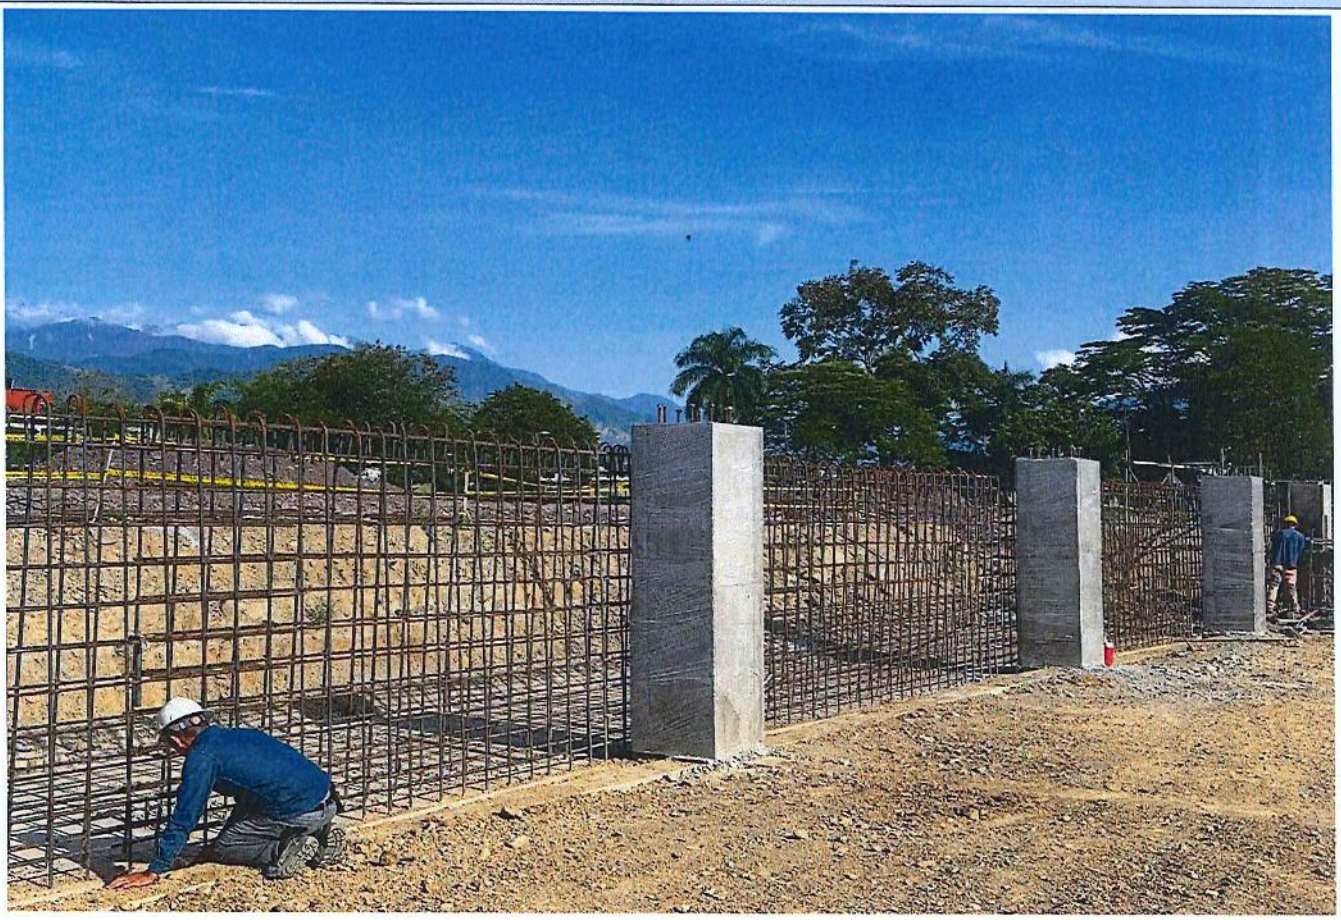

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	DIAMETRO	PESO KG/M	LONGITUD	CANTIDAD	
TRAMO 2 MURO DE CONTENCIÓN 33.55 M					
GANCHO TRANSVERSALES SUPERIOR	3/4"	2,235	3,45	221,00	1.704,08
GANCHOS PARRILLAS ZARPA	5/8"	1,552	0,60	787,00	732,85
BASTAGO (CUERPO DE MURO)	5/8"	1,552	3,25	334,00	1.684,70
LONGITUDINALES BASTAGO	5/8"	1,552	6,00	168,00	1.564,42
	5/8"	1,552	2,20	24,00	81,95
TRAMO 3 MURO DE CONTENCIÓN 6 M					
GANCHOS DENTELLÓN	5/8"	1,552	1,35	60,00	125,71
LONGITUDINALES DENTELLÓN	5/8"	1,552	6,35	6,00	59,13
ZARPA LONGITUDINAL INFERIOR	3/4"	2,235	6,45	20,00	288,32
TRANSVERSALES INFERIOR	3/4"	2,235	3,45	40,00	308,43
ZARPA LONGITUDINAL SUPERIOR	3/4"	2,235	6,45	20,00	288,32
TRANSVERSALES SUPERIOR	3/4"	2,235	3,45	40,00	308,43
GANCHOS PARRILLAS ZARPA	5/8"	1,552	0,60	140,00	130,37
VIENEN:	38658,89			SUBTOTAL	7.276,71
PASAN:	45.935,60			TOTAL	

OF

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 02/10 CIMENTACION	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2502000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	DIAMETRO	PESO KG/M	LONGITUD	CANTIDAD	
TRAMO 3 MURO DE CONTENCIÓN 6 M					
BASTAGO (CUERPO DE MURO)	5/8"	1,552	3,25	60,00	302,64
LONGITUDINALES BASTAGO	5/8"	1,552	6,00	28,00	260,74
TRASLAPO ENTRE TRAMO 1 -2-3	5/8"	1,552	2,00	48,00	148,99
TRAMO 4 ZARPA DE 20.05 M					
GANCHOS DENTELLON	5/8"	1,552	1,35	200,00	419,04
LONGITUDINALES DENTELLON	5/8"	1,552	6,00	18,00	167,62
	5/8"	1,552	4,76	6,00	44,33
ZARPA LONGITUDINAL INFERIOR	3/4"	2,235	6,00	60,00	804,60
	3/4"	2,235	5,46	20,00	244,06
TRANSVERSALES INFERIOR	3/4"	2,235	3,45	133,00	1.025,53
ZARPA LONGITUDINAL SUPERIOR	3/4"	2,235	6,00	60,00	804,60
	3/4"	2,235	5,46	20,00	244,06
TRANSVERSALES SUPERIOR	3/4"	2,235	3,45	133,00	1.025,53
VIENEN:	45935,60			SUBTOTAL	5.491,74
PASAN:	51.427,34			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 02/10 CIMENTACION	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090587 CND

Firma
Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAD

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA






Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	DIAMETRO	PESO KG/M	LONGITUD	CANTIDAD	
TRAMO 4 ZARPA DE 20.05 M					
GANCHOS PARRILLAS ZARPA	5/8"	1,552	0,60	464,00	432,08
VASTAGO (CUERPO DE MURO) 19.24 m	5/8"	1,552	3,25	192,00	968,45
LONGITUDINALES BASTAGO 19.24 m	5/8"	1,552	6,00	72,00	670,46
	5/8"	1,552	4,60	24,00	171,34
LONGITUDINALES BASTAGO BAJO ZARPA	5/8"	1,552	6,00	12,00	111,74
	5/8"	1,552	3,95	4,00	24,52
TRAMO 5 MURO CONTENCIÓN 18.58 M					
GANCHOS DENTELLON	5/8"	1,552	1,35	186,00	389,71
LONGITUDINALES DENTELLON	5/8"	1,552	6,00	18,00	167,62
	5/8"	1,552	3,29	6,00	30,64
ZARPA LONGITUDINAL INFERIOR	3/4"	2,235	6,00	60,00	804,60
	3/4"	2,235	3,99	20,00	178,35
TRANSVERSALES INFERIOR	3/4"	2,235	3,45	124,00	956,13
VIENEN:	51427,34			SUBTOTAL	4.905,64
PASAN:	56.332,98			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 02/10 CIMENTACION	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	DIAMETRO	PESO KG/M	LONGITUD	CANTIDAD	
TRAMO 5 MURO CONTENCIÓN 18.58 M					
ZARPA LONGITUDINAL SUPERIOR	3/4"	2,235	6,00	60,00	804,60
	3/4"	2,235	3,99	20,00	178,35
TRANSVERSALES SUPERIOR	3/4"	2,235	3,45	124,00	956,13
GANCHOS PARRILLAS ZARPA	5/8"	1,552	0,60	430,00	400,42
BASTAGO (CUERPO DE MURO)	5/8"	1,552	3,25	186,00	938,18
LONGITUDINALES BASTAGO	5/8"	1,552	6,00	84,00	782,21
	5/8"	1,552	3,06	28,00	132,98
VIENEN:	56332,98			SUBTOTAL	4.192,87
PASAN:	60.525,85			TOTAL	60.525,85

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 02/10 CIMENTACION	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	83.319,19
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	60.525,85
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0,00
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	60.525,85
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	22.793,34

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



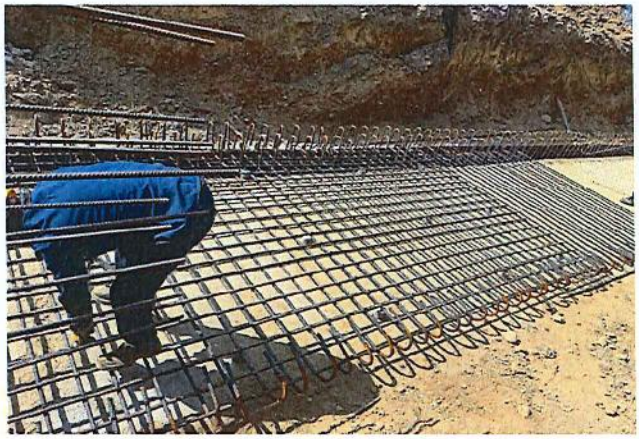


Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
NP4.8	PEDESTALES EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
PEDESTALES CIMENTACIÓN					
EJE 3	0,90	1,15	0,90	12,00	11,18
EJE 2	0,90	1,15	0,90	12,00	11,18
DADO SOBRE VIGA V-17 Y VF-18	0,65	0,20	0,45	2,00	0,12
EJE 1´	0,65	1,15	0,65	4,00	1,94
EJE 1 entre A y F	0,65	3,35	0,65	6,00	8,49
VIENEN:				SUBTOTAL	32,91
PASAN:	32,91			TOTAL	32,91

OBSERVACIONES: VER PLANO No. 07/10 CIMENTACION		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	33,85
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	32,91
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0,00
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	32,91
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	0,94

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

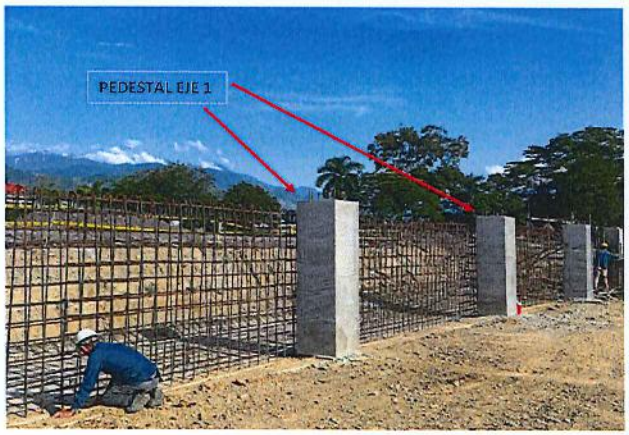



PEDESTAL EJE 3 PEDESTAL EJE 2

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
NP4.8	PEDESTALES EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



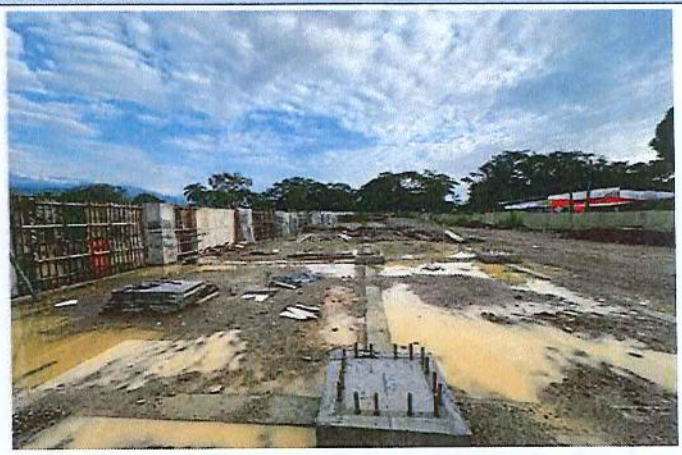





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	M3
NP4.9	ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
CIMENTACIÓN GRADERIAS					
EJE 3 (D4)	3,00	0,35	3,00	12,00	37,80
EJE2 (D3)	2,60	0,35	2,60	12,00	28,39
EJE 1´ (D2)	1,50	0,35	1,50	4,00	3,15
EJE 1 (D1)	2,30	0,35	2,30	12,00	22,22
VIENEN:				SUBTOTAL	91,56
PASAN:	91,56			TOTAL	91,56

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 08/10 CIMENTACION	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	91,56
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	91,56
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0,00
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	91,56
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

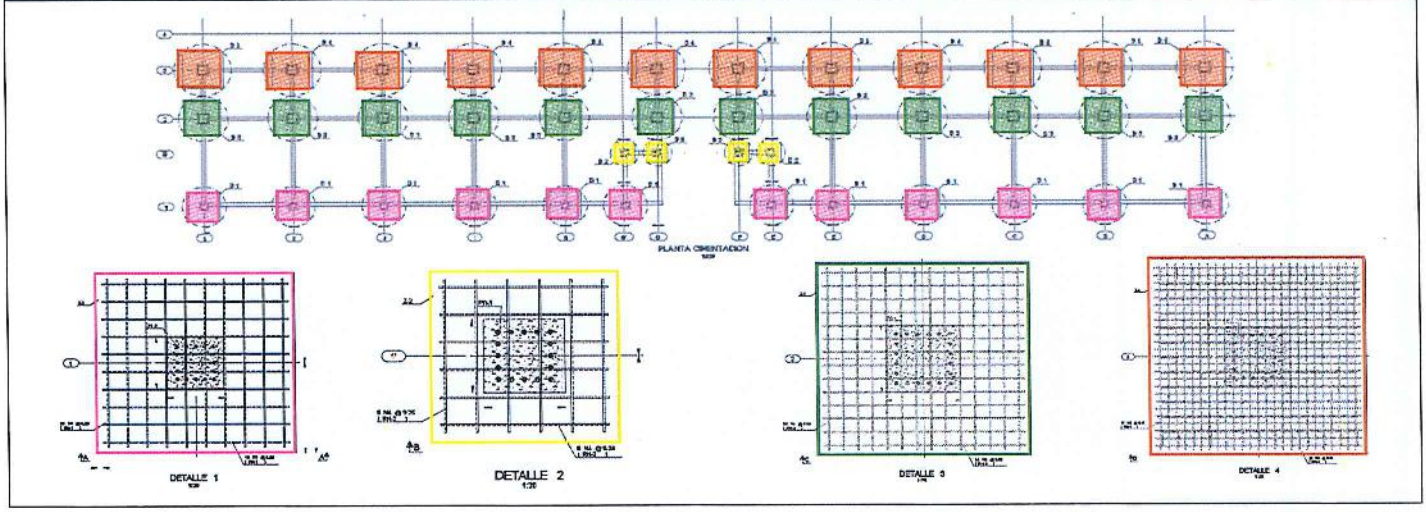

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-000337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
NP4.9	ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

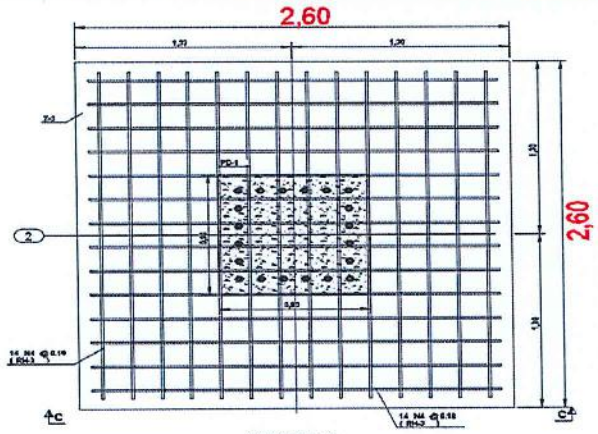

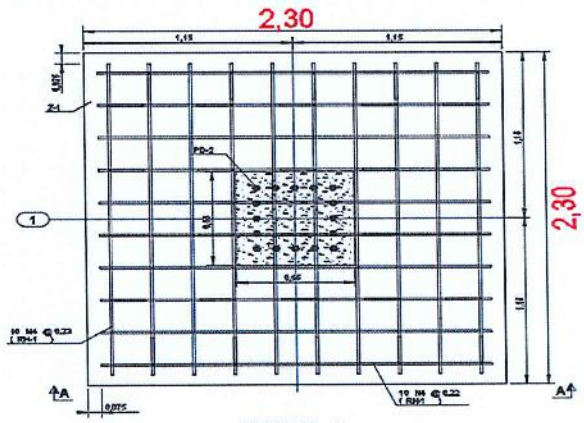

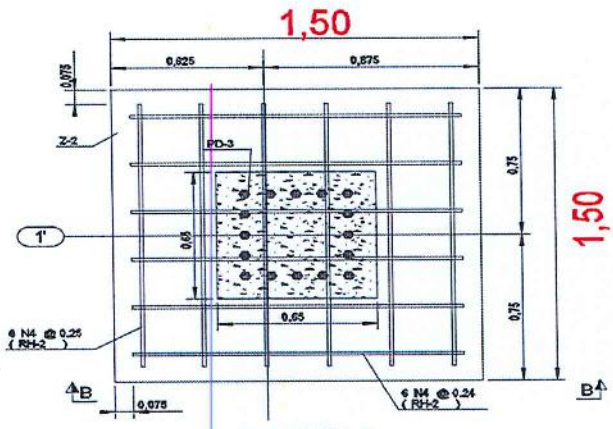

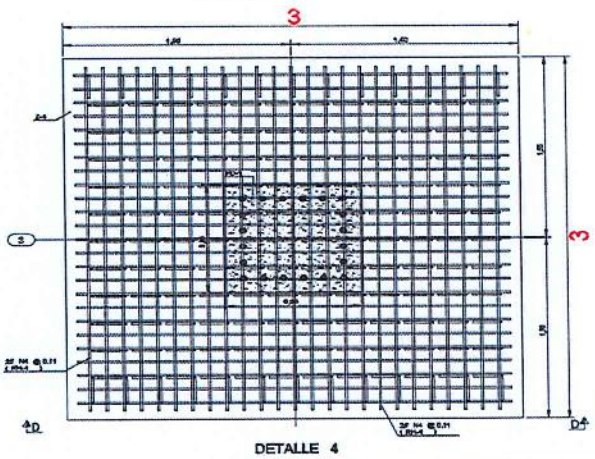

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	M3
NP4.9	ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA






Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-000337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	M3
NP4.10	VIGA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
VIGAS EJE 1 (A-L)					
VF-7	0,30	0,40	6,85	1,00	0,82
VF-8	0,30	0,40	6,05	3,00	2,18
VF-9	0,30	0,40	3,90	1,00	0,47
VF-10	0,30	0,40	2,41	1,00	0,29
VF-25	0,30	0,40	2,41	1,00	0,29
VF-11	0,30	0,40	3,81	1,00	0,46
VF-8	0,30	0,40	6,05	3,00	2,18
VF-12	0,30	0,40	5,95	1,00	0,71
EJE 1´					
VF-22	0,30	0,40	1,76	2,00	0,42
EJE 2					
VF-15	0,30	0,40	6,60	1,00	0,79
VF-16	0,30	0,40	5,80	3,00	2,09
VIENEN:				SUBTOTAL	10,70
PASAN:	10,70			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 09/10 CIMENTACION	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

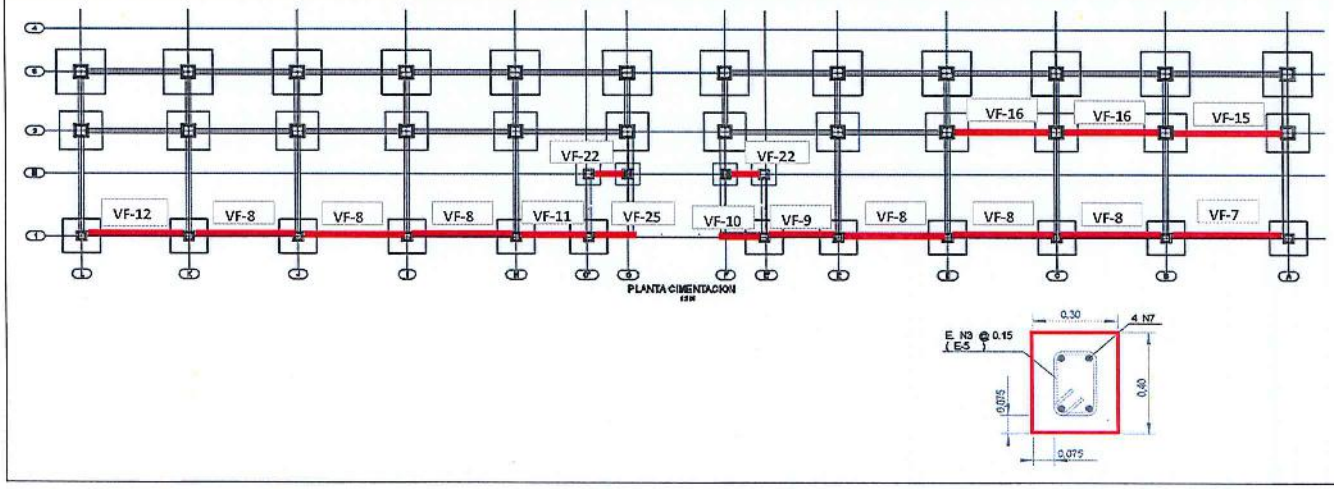

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	M3
NP4.10	VIGA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
EJE 2					
VF-17	0,65	0,40	6,06	1,00	1,58
VF-18	0,65	0,40	5,97	1,00	1,55
VF-16	0,30	0,40	5,80	3,00	2,09
VF-19	0,30	0,40	5,70	1,00	0,68
EJE 3					
VF-15	0,30	0,40	6,60	1,00	0,79
VF-16	0,30	0,40	5,80	3,00	2,09
VF-17	0,30	0,40	6,06	1,00	0,73
VF-18	0,30	0,40	5,97	1,00	0,72
VF-16	0,30	0,40	5,80	3,00	2,09
VF-19	0,30	0,40	5,70	1,00	0,68
EJE A,B,C,D,E					
VF-1	0,30	0,40	6,43	5,00	3,86
VIENEN:	10,70			SUBTOTAL	16,86
PASAN:	27,56			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 09/10 CIMENTACION	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

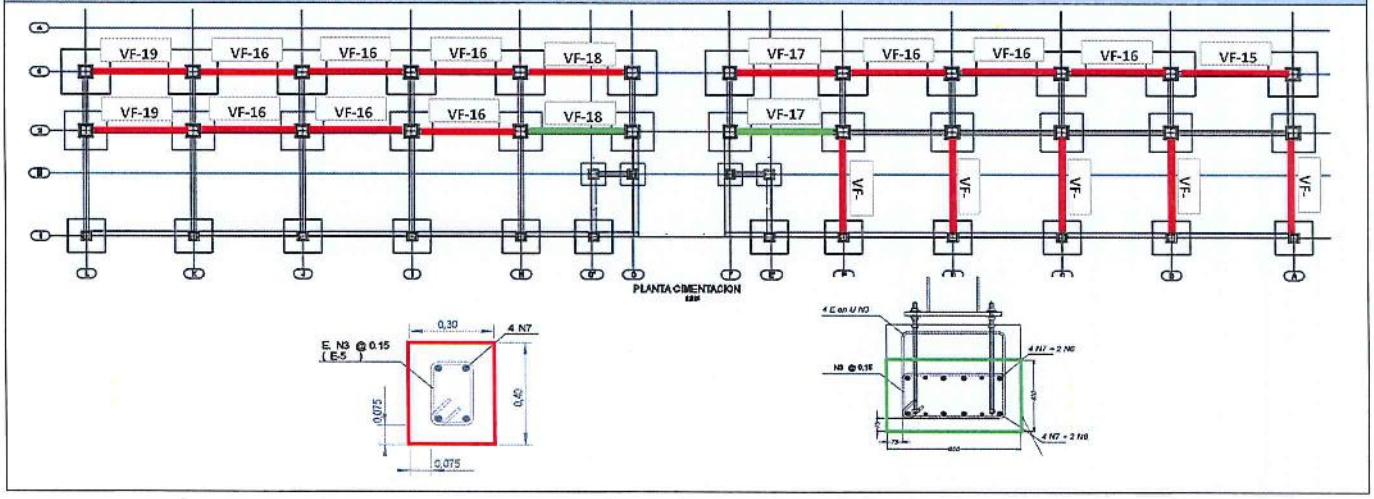

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
NP4.10	VIGA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
EJE A,B,C,D,E					
VF-2	0,30	0,40	3,10	5,00	1,86
EJE E´					
VF-6	0,30	0,40	3,65	1,00	0,44
EJE F					
VF-5	0,30	0,40	3,65	1,00	0,44
VF-4	0,30	0,40	2,13	1,00	0,26
VF-3	0,30	0,40	3,10	1,00	0,37
EJE G					
VF-5	0,30	0,40	3,65	1,00	0,44
VF-4	0,30	0,40	2,13	1,00	0,26
VF-3	0,30	0,40	3,10	1,00	0,37
EJE G´					
VF-6	0,30	0,40	3,65	1,00	0,44
VIENEN:	27,56			SUBTOTAL	4,88
PASAN:	32,44			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 09/10 CIMENTACION	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

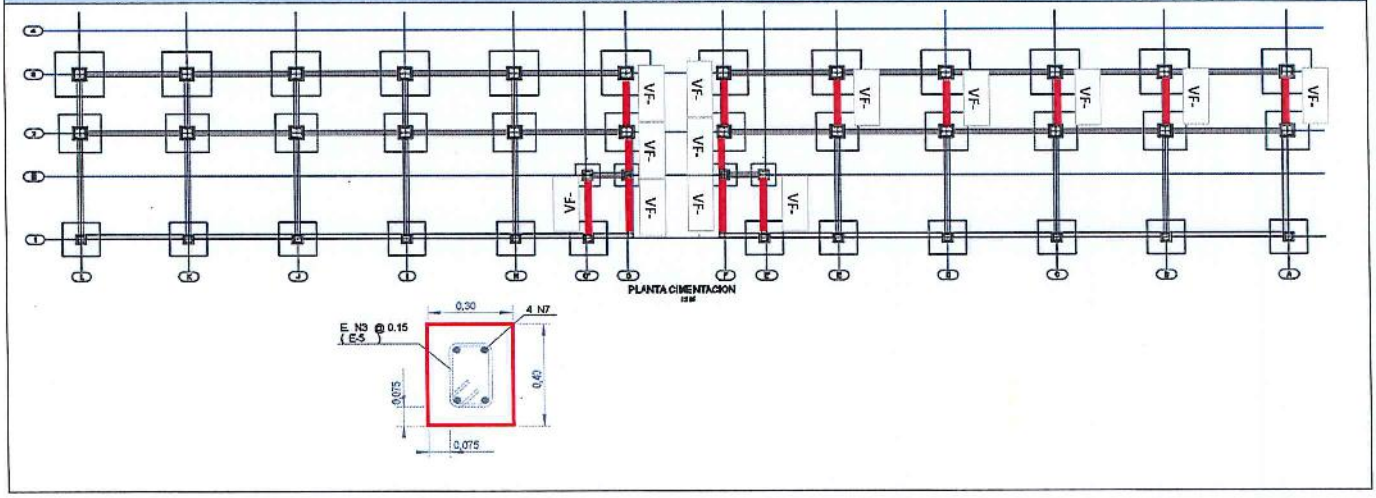

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507 2000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-990837 CND

Firma
Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	M3
NP4.10	VIGA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
EJE H,I,J,K,L					
VF-1	0,30	0,40	6,43	5,00	3,86
VF-2	0,30	0,40	3,10	5,00	1,86
VIENEN:	32,44			SUBTOTAL	5,72
PASAN:	38,16			TOTAL	38,16

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 09/10 CIMENTACION	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	38,16
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	38,16
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0,00
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	38,16
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

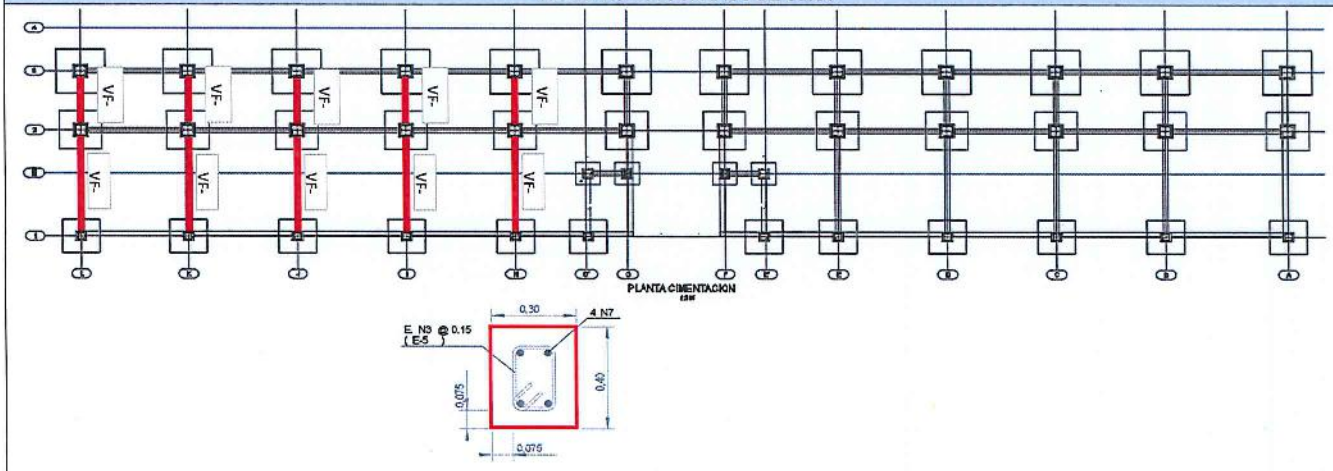

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
NP4.10	VIGA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA









Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090387 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
NP4.11	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLADO EN OBRA	

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				TOTAL
		ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
CICLOPEOS CIMENTACIÓN						
CICLOPEO PARA D4	EJE 3	3,00	0,75	3,00	12,00	81,00
CICLOPEO PARA D3	EJE 2	2,60	0,40	2,60	12,00	32,45
CICLOPEO PARA D2	EJE 1"	1,50	0,15	1,50	4,00	1,35
CICLOPEO PARA D1	EJE 1	2,30	0,75	2,30	12,00	47,61
VIENEN:					SUBTOTAL	162,41
PASAN:		162,41			TOTAL	162,41

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 08/10 CIMENTACION	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	162,41
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	162,41
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0,00
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	162,41
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

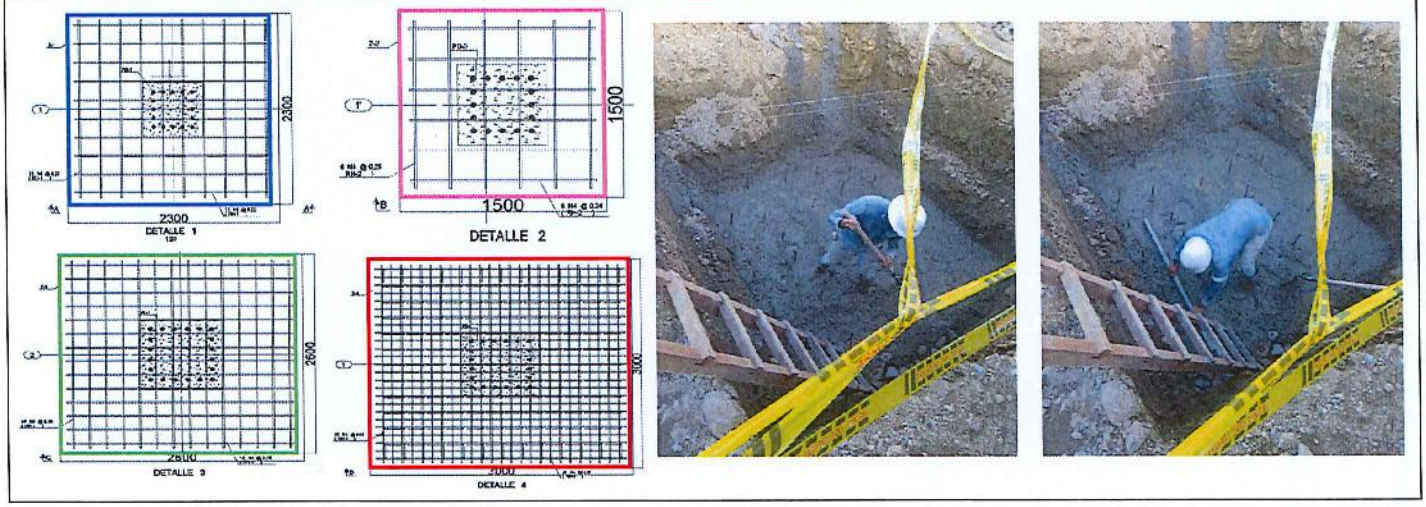

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
NP4.11	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLADO EN OBRA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA









Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
NP4.11	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLADO EN OBRA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA









Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-000337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
NP5.4	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
MURO DE CONTENCIÓN ORIENTAL					
DENTELLON TRAMO 34.55 M	0,50	0,50	34,55	1,00	8,64
DENTELLON TRAMO 33.55 M	0,50	0,50	33,55	1,00	8,39
DENTELLON TRAMO 6 M	0,50	0,50	6,00	1,00	1,50
DENTELLON TRAMO 20.05 M	0,50	0,50	20,05	1,00	5,01
DENTELLON TRAMO 18.58 M	0,50	0,50	18,58	1,00	4,65
ZARPA MURO ORIENTAL					
TRAMO 34.55 M	3,00	0,50	34,55	1,00	51,83
TRAMO 33.55 M	3,00	0,50	33,55	1,00	50,33
TRAMO 6 M	3,00	0,50	6,00	1,00	9,00
TRAMO 20.05 M	3,00	0,50	20,05	1,00	30,08
TRAMO 18.58 M	3,00	0,50	18,58	1,00	27,87
BASTAGO TRAPEZOIDAL					
TRAMO 34.55 M (A: PROM (B1+B2)/2)	0,43	2,40	34,55	1,00	35,66
VIENEN:				SUBTOTAL	232,96
PASAN:	232,96			TOTAL	232,96


OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 01/01 ESTR. EN CONCRETO	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

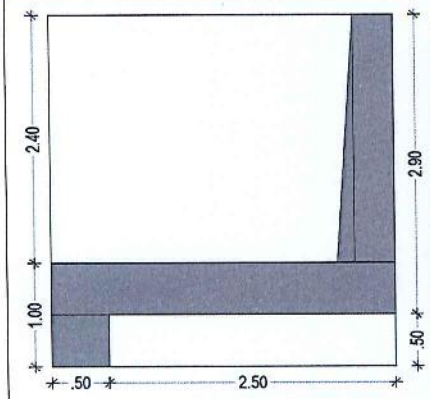

GEOMETRÍA DE MURO DE CONTENCIÓN



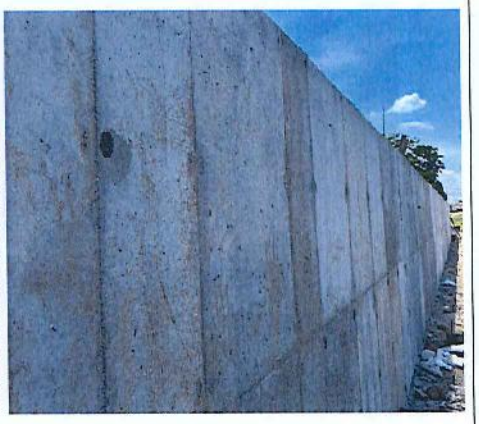

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
NP5.4	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
BASTAGO TRAPEZOIDAL					
TRAMO 33.55 M (A: PROM (B1+B2)/2)	0,43	2,40	33,55	1,00	34,62
TRAMO 6 M (A: PROM (B1+B2)/2)	0,43	2,40	6,00	1,00	6,19
TRAMO 19.24 M (A: PROM (B1+B2)/2)	0,43	2,40	19,24	1,00	19,86
TRAMO 18.58 M (A: PROM (B1+B2)/2)	0,43	2,40	18,58	1,00	19,17
VIENEN:	232,96			SUBTOTAL	79,84
PASAN:	312,80			TOTAL	312,80

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 01/01 ESTR. EN CONCRETO	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	501,37
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	312,80
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0,00
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	312,80
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	188,57

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

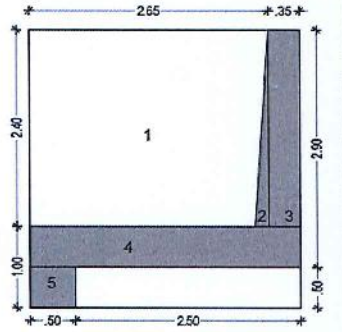

GEOMETRÍA DE MURO DE CONTENCIÓN
Esc. 1:25





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
NP5.4	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA









Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
NP5.4	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

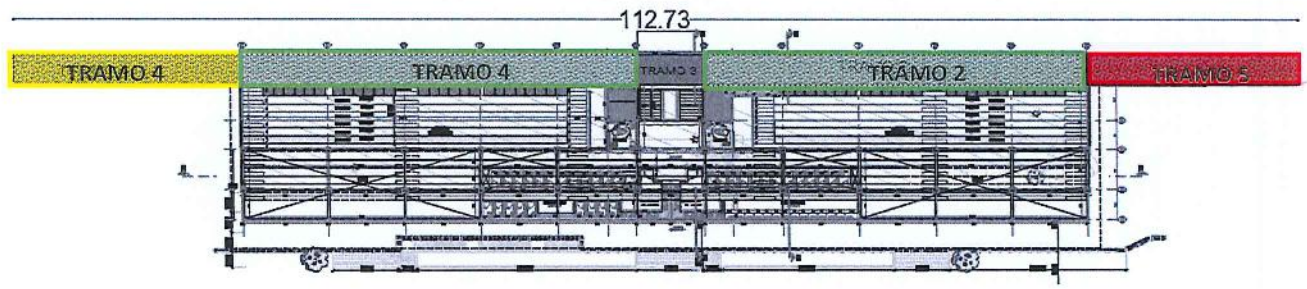

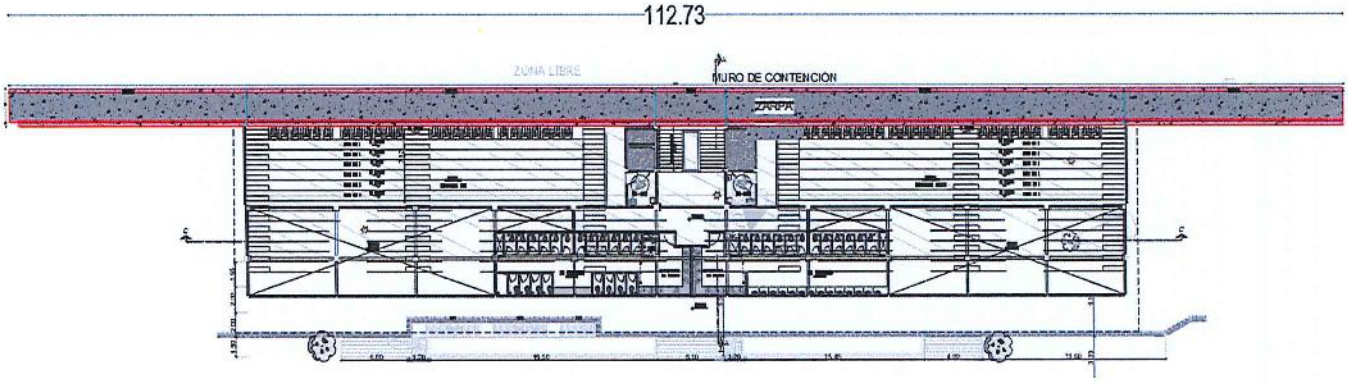

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-098337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ML
NP5.7	CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑA FLEXIBLE CON BANDA ENGOMADA CON FILTRO, RESISTENTE A LOS ÁLCALIS Y MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL MONOCOMPONENTE FLEXIBLE	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
MURO ORIENTAL					
LONGITUDINAL MURO			111,92	1,00	111,92
VIENEN:				SUBTOTAL	111,92
PASAN:	111,92			TOTAL	111,92

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 01/01 ESTR. EN CONCRETO	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	119,94
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	111,92
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0,00
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	111,92
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	8,02

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma

Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090387 CND

Firma

Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ML
NP5.7	CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑA FLEXIBLE CON BANDA ENGOMADA CON FILTRO, RESISTENTE A LOS ÁLCALIS Y MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL MONOCOMPONENTE FLEXIBLE	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







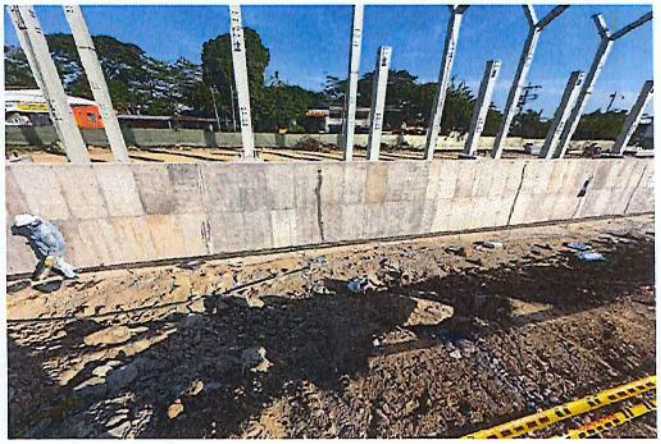

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LONGITUD	CANTIDAD	
ESTRUCTURA DE GRADERIAS					
AN-207 PERNO ANCLAJE (VF-17 Y VF-18)	6	1,62		8,00	12,96
AN-202 PERNO ANCLAJE PD EJE 2 Y 3	5	3,86		384,00	1.482,24
AN-201 PERNO ANCLAJE PD EJE 1 Y 1´	4	2,55		128,00	326,40
VIENEN:				SUBTOTAL	1.821,60
PASAN:	1821,60			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 01 - 25 ESTRUCTURAL	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

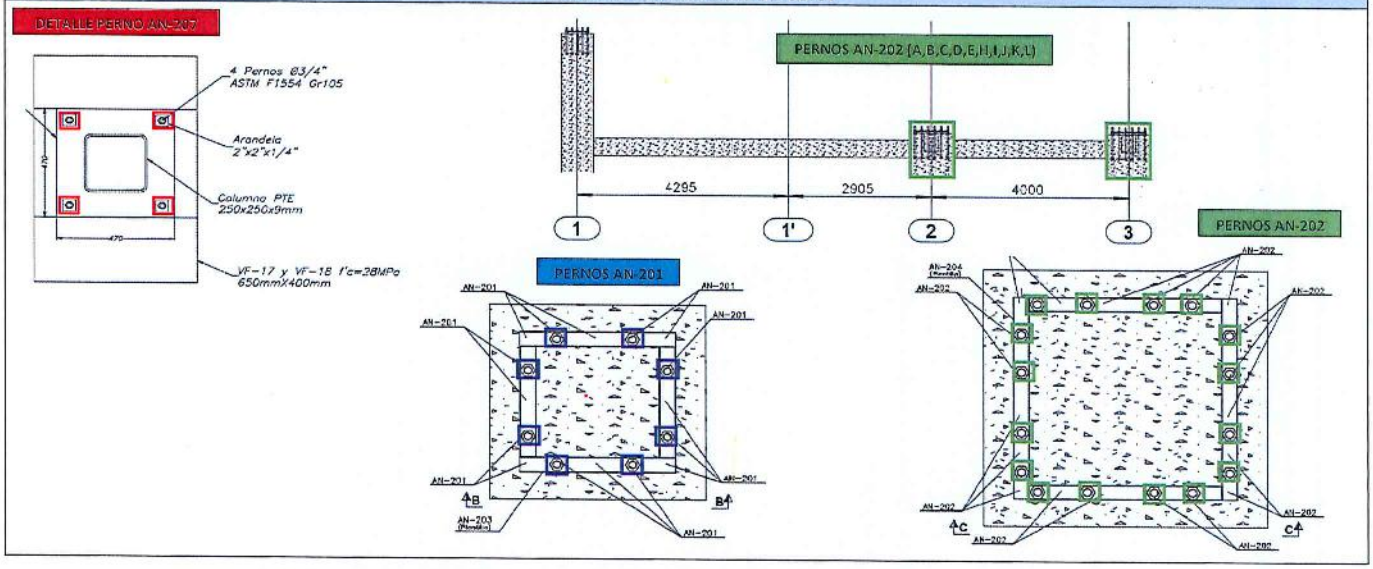

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad exoresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma
Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

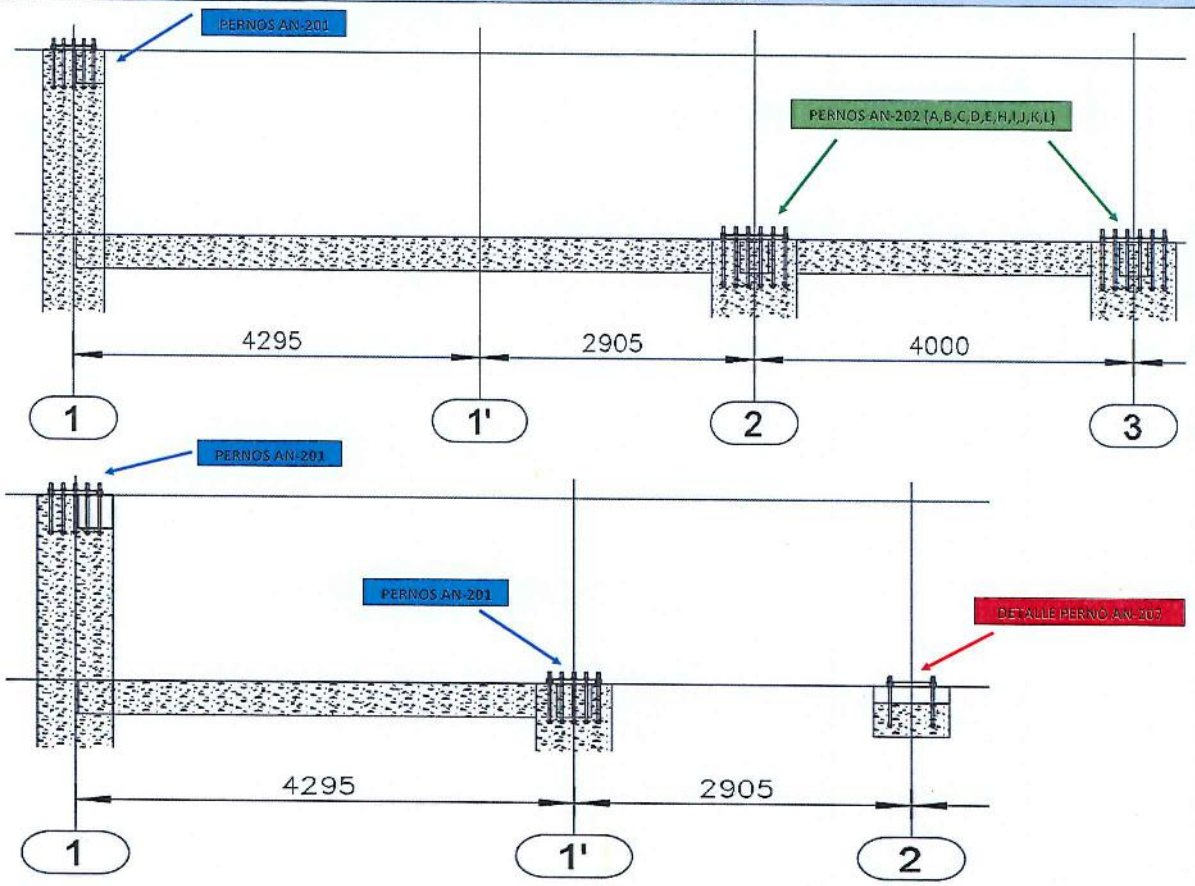

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA









Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LONGITUD	CANTIDAD	
COLUMNAS METALICA					
K-218 EJE A	7	1801.97		1.00	1,801.97
K-212 EJE A	8	1975.83		1.00	1,975.83
K-219 EJE A	9	1882.02		1.00	1,882.02
K-217 EJE A	10	1208.88		1.00	1,208.88
K-211 EJE B,C	11	1918.83		2.00	3,837.66
K-220 EJE B,C	12	1759.99		2.00	3,519.98
K-221 EJE B,C	13	1849.56		2.00	3,699.12
K-217 EJE B,C	10	1208.88		2.00	2,417.76
VIENEN:	1,821.60			SUBTOTAL	20,343.22
PASAN:	22,164.82			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 01 - 25 ESTRUCTURAL	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

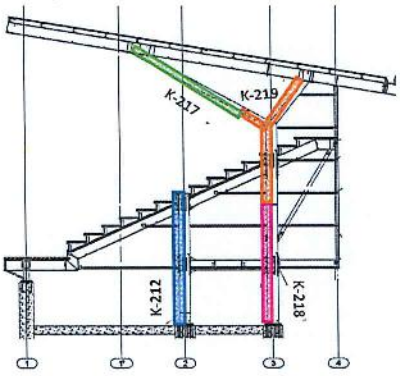

SECCION EJE A

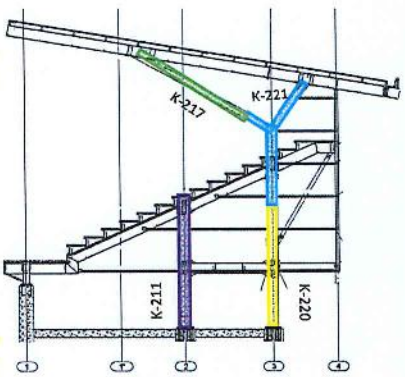

SECCION EJE B - C



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090387 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LONGITUD	CANTIDAD	
COLUMNAS METALICA					
K-211 EJE D,E	11	1918.83		2.00	3,837.66
K-222 EJE D,E	14	1759.99		2.00	3,519.98
K-221 EJE D,E	13	1849.56		2.00	3,699.12
K-217 EJE D,E	10	1208.88		2.00	2,417.76
K-213 EJE F	15	2005.47		1.00	2,005.47
K-222 EJE F	14	1759.99		1.00	1,759.99
K-223 EJE F	16	1850.80		1.00	1,850.80
K-217 EJE F	10	1208.88		1.00	1,208.88
K-206 EJE E"	17	755.42		1.00	755.42
K-215 EJE E"	18	557.93		1.00	557.93
VIENEN:	22,164.82			SUBTOTAL	21,613.01
PASAN:	43,777.83			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 01 - 25 ESTRUCTURAL	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	


REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

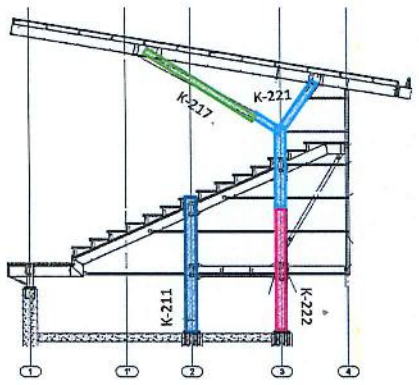

SECCION EJE D,E

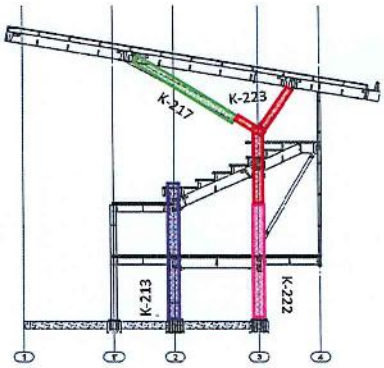

SECCION EJE F

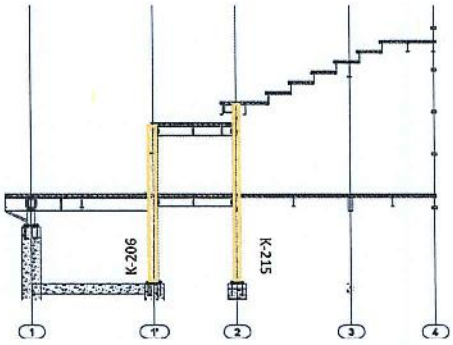

SECCION EJE E"


Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

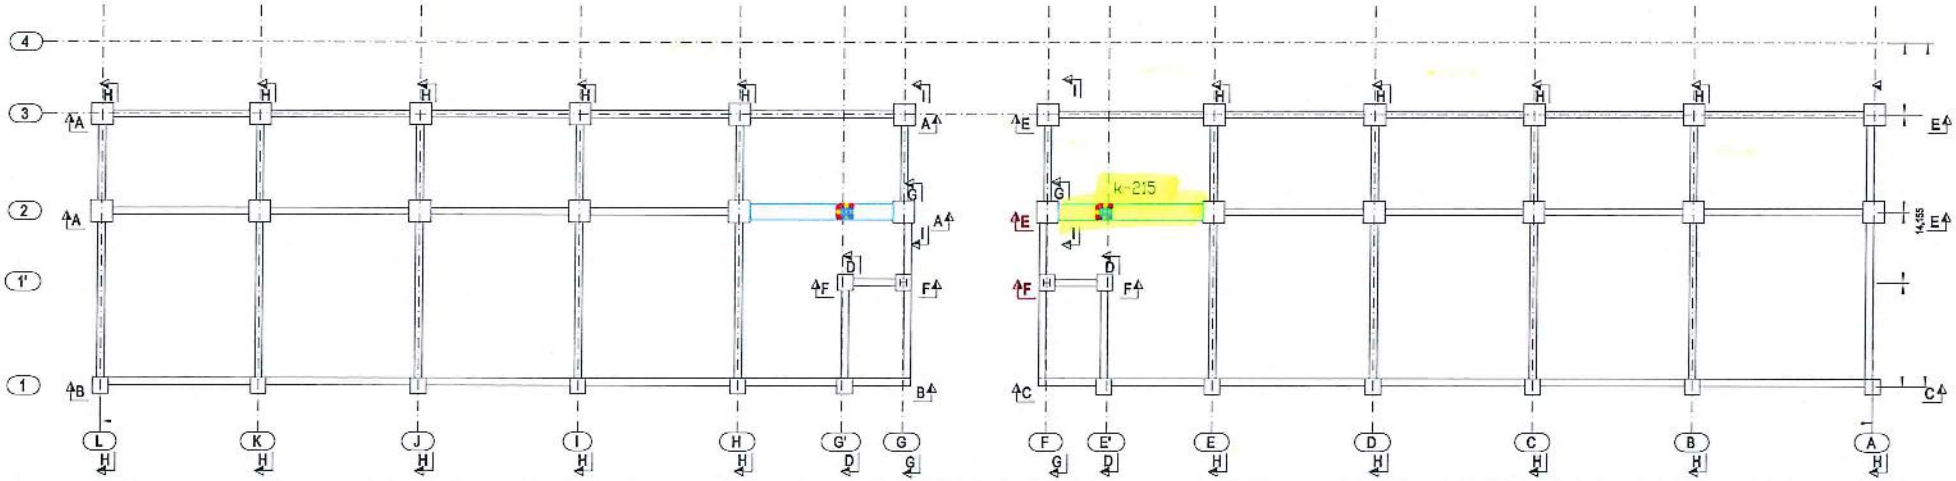

PLANTA CIMENTACION

1:125

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LONGITUD	CANTIDAD	
COLUMNAS METALICA					
K-227 EJE G	19	2005.47		1.00	2,005.47
K-222 EJE G	14	1759.99		1.00	1,759.99
K-224 EJE G	20	1850.80		1.00	1,850.80
K-217 EJE G	10	1208.88		1.00	1,208.88
K-211 EJE H,I	11	1918.83		2.00	3,837.66
K-222 EJE H,I	14	1759.99		2.00	3,519.98
K-221 EJE H,I	13	1849.56		2.00	3,699.12
K-217 EJE H,I	10	1208.88		2.00	2,417.76
K-209 EJE G"	21	755.42		1.00	755.42
K-216 EJE G"	22	557.93		1.00	557.93
VIENEN:	43,777.83			SUBTOTAL	21,613.01
PASAN:	65,390.84			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 01 - 25 ESTRUCTURAL	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	


REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

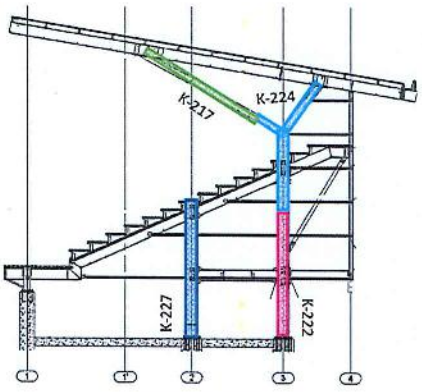

SECCION EJE G

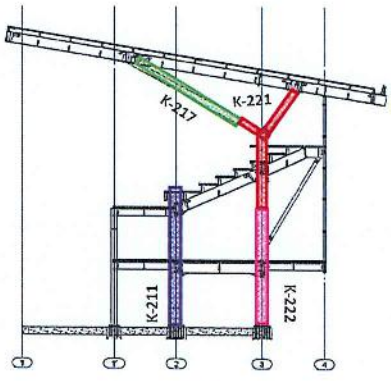

SECCION EJE H,I

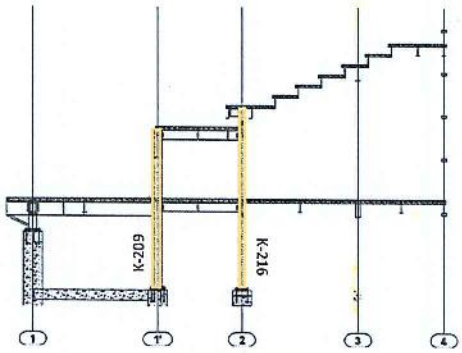

SECCION EJE G"


Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

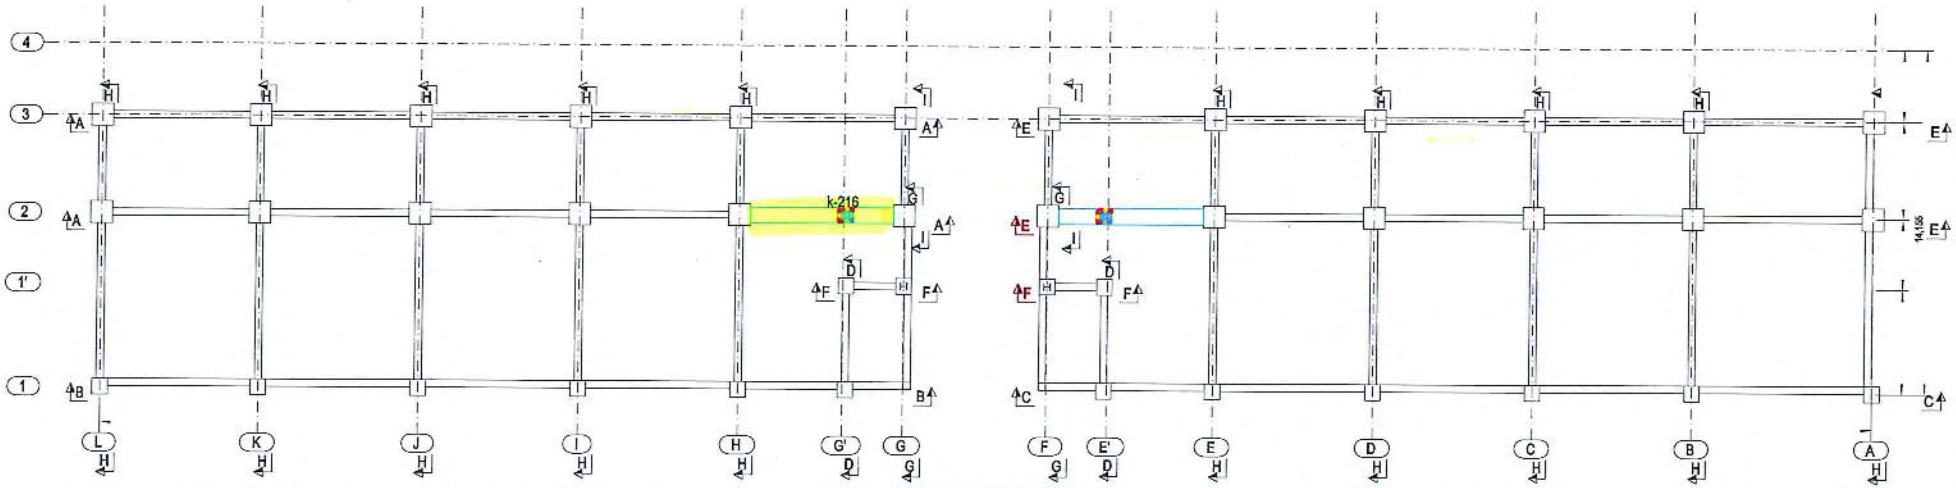

PLANTA CIMENTACION
1:125

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ITEM	DESCRIPCION	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LONGITUD	CANTIDAD	
COLUMNAS METALICA					
K-211 EJE J,K	11	1918,83		2,00	3.837,66
K-220 EJE J,K	12	1759,99		2,00	3.519,98
K-221 EJE J,K	13	1849,56		2,00	3.699,12
K-217 EJE J,K	10	1208,88		2,00	2.417,76
K-214 EJE L	23	1975,83		1,00	1.975,83
K-225 EJE L	24	1801,97		1,00	1.801,97
K-226 EJE L	25	1880,88		1,00	1.880,88
K-217 EJE L	10	1208,88		1,00	1.208,88
VIENEN:	65.390,84			SUBTOTAL	20.342,08
PASAN:	85.732,92			TOTAL	85.732,92
			TOTAL	90%	77.159,63

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 01 - 25 ESTRUCTURAL	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	296.660,73
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	77.159,63
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0,00
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	77.159,63
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	219.501,10

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

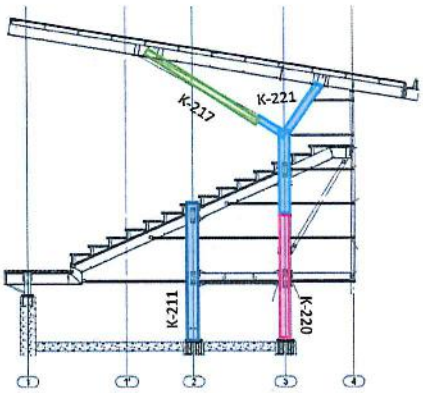

SECCION EJE J,K

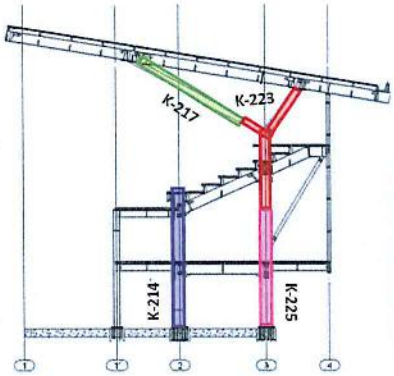

SECCION EJE L



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



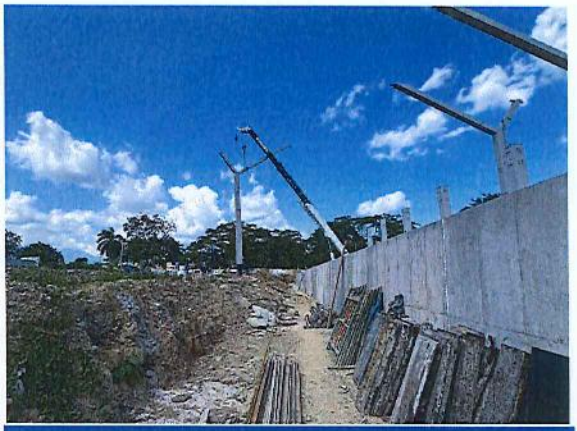





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-90337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA






Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-000337 CND

Firma
Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	OBRAS EXTERIORES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ML
NP11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
SARDINEL					
PARQUEADERO NORTE			186,00	1,00	186,00
VIENEN:				SUBTOTAL	186,00
PASAN:	186,00			TOTAL	186,00

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 01/01 OBRAS EXTERIORES	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	675,33
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	186,00
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0,00
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	186,00
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	489,33

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

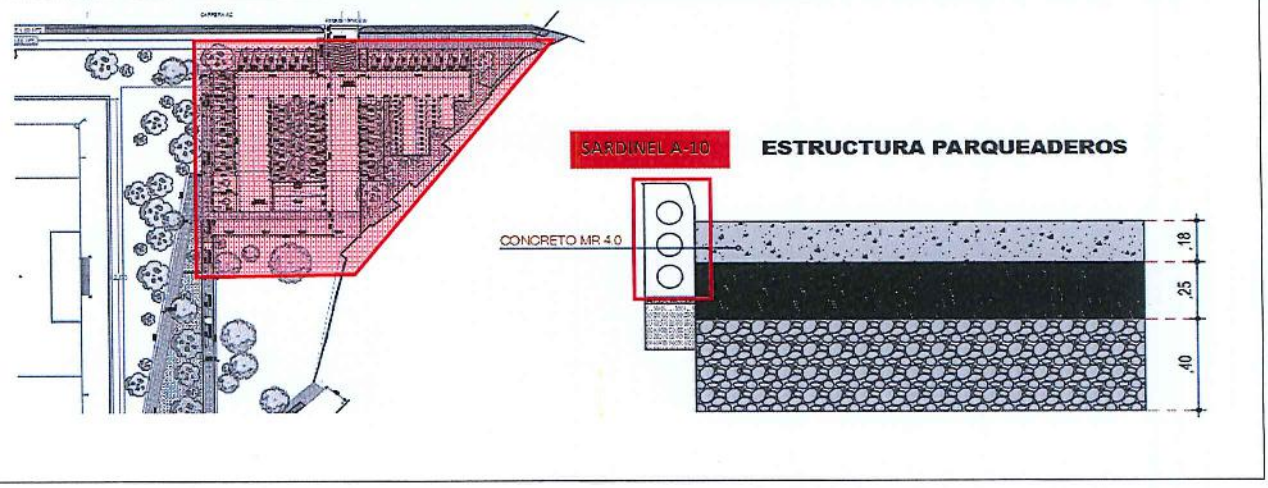

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2572000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 25202-090327 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	OBRAS EXTERIORES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ML
NP11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA






Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-[illegible] CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CANCHA CESPED SINTETICO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
14.2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
CANCHA SINTETICA					
AREA EXC.					3,372.60
nota: ver cortes en planos topograficos					
VIENEN:				SUBTOTAL	3,372.60
PASAN:	3,372.60			TOTAL	3,372.60

OBSERVACIONES:		
1. corrección de ancho de la cancha a 73 m 2. Ajuste de la profundidad	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	5,760.00
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	3,372.60
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	1,773.78
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	1,598.82
VER PLANO No. 01/01 CANCHA CESPED SINTETICO	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	2,387.40

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

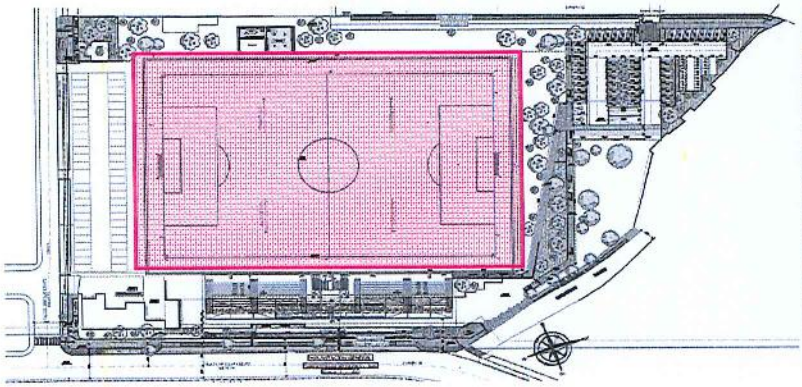



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CANCHA CESPED SINTETICO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
14,2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA






Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO CANCHA				
ABSCISA	AREA	DISTANCIA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
K0+008	32.6			
K0+010	32.17	2.25	72.86	72.86
K0+020	33.3	10.00	327.34	400.20
K0+030	32.93	10.00	331.15	731.35
K0+040	33	10.00	329.65	1061.00
K0+050	32.55	10.00	327.75	1388.75
K0+060	32.58	10.00	325.65	1714.40
K0+070	33.37	10.00	329.75	2044.15
K0+080	32.2	10.00	327.85	2372.00
K0+090	32.65	10.00	324.25	2696.25
K0+100	32.89	10.00	327.70	3023.95
K0+111	33.52	10.50	348.65	3372.60
			TOTAL	**3372.60** m3

VOLUMEN PARCIAL 1	1773.78	M3
VOLUMEN ACUMULADO	**3372.60**	M3
VOLUMEN PARCIAL 2	**1598.82**	M3

VOLUMEN DE EXCAVACION CANCHA

CONSOLIDADO ACTUALIZADO		
EXCAVACION	**3372.60**	m3

Vo.Bo OBRA

DUBAN ANDRES PINZON JOYA
L.P_ 01-19916

Vo.Bo
INTERVENTORIA

FANNY BARRERA GONZALEZ
L.P_ 01-10580

OK

RELLENO CON MATERIAL DE RIO DE 2" CANCHA				
ABSCISA	AREA	DISTANCIA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
K0+000	7.28			
K0+010	7.28	10.00	72.78	72.78
K0+020	7.28	10.00	72.78	145.56
K0+030	7.28	10.00	72.78	218.34
K0+040	7.28	10.00	72.78	291.12
K0+050	7.28	10.00	72.78	363.90
K0+060	7.28	10.00	72.78	436.68
K0+070	7.28	10.00	72.78	509.46
K0+080	7.28	10.00	72.78	582.24
K0+090	7.28	10.00	72.78	655.02
K0+100	7.28	10.00	72.78	727.80
K0+110	7.28	10.00	72.78	800.58
			TOTAL	**800.58**
				m3

VOLUMEN PARCIAL 1	403.92	M3
VOLUMEN ACUMULADO	**1204.50**	M3

VOLUMEN RELLENO 2 PULGADAS

CONSOLIDADO ACTUALIZADO		
RELLENO	**800.58**	m3

Vo.Bo OBRA

DUBAN ANDRES PINZON JOYA
L.P_ 01-19916

Vo.Bo
INTERVENTORIA

FANNY BARRERA GONZALEZ
L.P_ 01-10580

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	RED DE AGUAS LLUVIAS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	ML
NP19.21	FILTRO EN GEODREN (INC. TUBO PVC 8" PERFORADO)	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
MURO CONTENCIÓN					
MURO ORIENTAL			111,92	1,00	111,92
VIENEN:				SUBTOTAL	111,92
PASAN:	111,92			TOTAL	111,92

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 01/01 REDES AGUAS LLUVIAS	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	181,00
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	111,92
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0,00
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	111,92
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	69,08

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

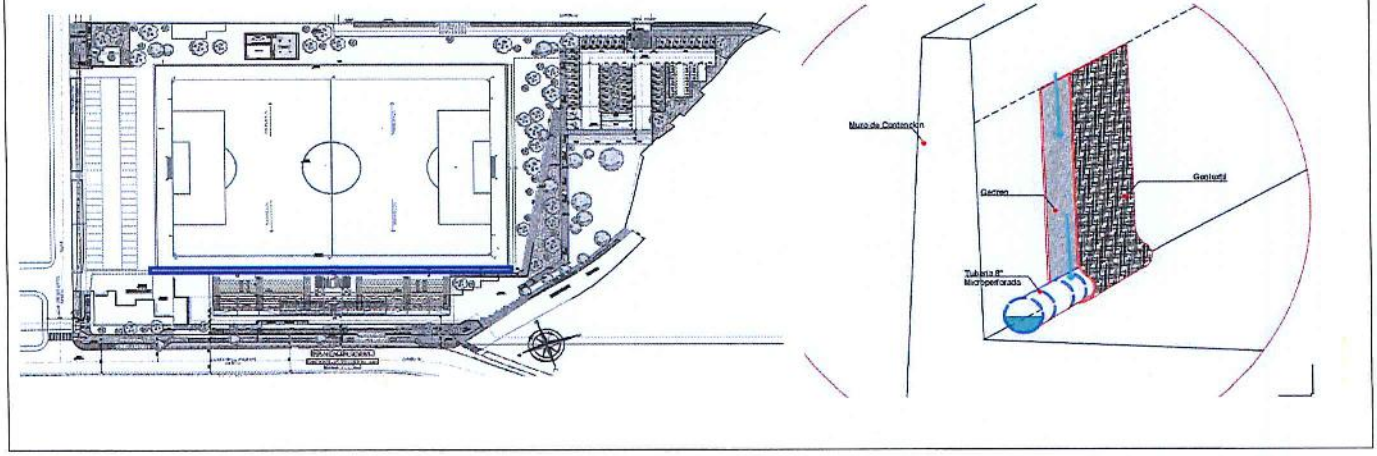

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	RED DE AGUAS LLUVIAS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ML
NP19.21	FILTRO EN GEODREN (INC. TUBO PVC 8" PERFORADO)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA






Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/04/2025

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	RED DE AGUAS LLUVIAS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ML
NP19.21	FILTRO EN GEODREN (INC. TUBO PVC 8" PERFORADO)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LUZ MARINA OSPITIA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU
