PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO EMPRESARIAL

SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

PRIMER INFORME DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE ACTIVIDADES CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO EMPRESARIAL SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024	
Nombre Proyecto	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO EMPRESARIAL SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024
Vigencia	2024
Territorio	Municipio de Santa Rosa (Bolívar).
Entidad	Alcaldía del Municipio de Santa Rosa (Bolívar).
Ejecutor	Fundación Biopsicosocial Jesucristo Rebaño de Paz
Población a Intervenir	Usuarios en General, Emprendedores, Microempresarios Juveniles, Microempresarios.
Aporte Entidad	$ 785.000.000 de Pesos M/cte.
Aporte Esal	$336.428.571 de Pesos M/cte.
Líneas de Atención	Emprendimiento. Emprendimiento Juvenil. Formalización de Empresas. Fomento Empresarial. Apoyo Psicosocial. Consultorías y Asesorías Especializadas.

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

ÁREA DE EMPRENDIMIENTO

En el marco del desarrollo del convenio "SIEMPRENDE 2024" realizado entre la Alcaldía Municipal de Santa Rosa y la Fundación Biopsicosocial Jesucristo Rebaño de Paz. Se viene desarrollando el área de emprendimiento, la cual inicio actividades el día 23 de mayo del año 2024.

AREAS	PROCESO	ACTIVIDADES	USUARIOS	AVANCE MES	AVANCE %	AVANCE %AREA
EMPRENDIMIENTO	Diagnostico	Atencion de Usuarios Área Emprendimiento	70	126	180%	37%
		Sensibilización Del Programa Siemprende Santa Rosa	70	95	136%	
		Diagnóstico Del Perfil Emprendedor	70	95	136%	
		Descubre Si Eres Una Persona Emprendedora	70	75	107%	
		Identifica Tu Idea De Negocio	70	74	106%	
		1.Pre-Ideación	70		0%	
		2.Fuente De Generación De Ideas (Necesidades, Conocimiento Y Experiencia)	70		0%	
		3.Evaluacion Técnica (Saberes) Y Mercado (Estudio De Mercado)	70		0%	
		4.Brainstorming	70		0%	
	Asesoría	Asesoría en Mercadeo	70		0%	
		Asesoría Convierte Tu Idea De Negocio En Una Oportunidad De Mercado	70		0%	
		Asesoría Modelo De Negocio Y Validación Con Los Clientes	70		0%	
		Asesoría En Elaboración De Planes De Negocio	70		0%	
		Asesoría y Seguimiento A Unidades Productivas Emprendimiento (Capital Semilla 2023)	70		0%	
	Prototipados	Visitas De Seguimiento Emprendimiento 2024	50		0%	
		Emprendimientos Prototipados 2024	50		0%	
	Acompañamiento y Seguimiento	Acompañamiento Y Seguimiento A Unidades Productivas Proceso De Capital Semilla 2022-2023	35		0%	
		Visitas De Seguimiento Proceso De Capital Semilla 2022-2023	35		0%	

USUARIOS ATENDIDOS - ÁREA EMPRENDIMIENTO

Durante el periodo de ejecución del convenio SIEMPRENDE 2024 y con la finalidad de iniciar un nuevo período dentro del programa, el centro de emprendimiento inicia un nuevo año de actividades manteniendo su compromiso de aportar significativamente al desarrollo socioeconómico del municipio de Santa Rosa.

Iniciando primeramente con la jornada de inscripciones la cual se llevó a cabo en los días comprendidos entre el 30 de mayo al 14 de junio, durante el proceso de inscripción los emprendedores presentaron una entrevista estructurada, la cual estuvo a cargo del asesor de Emprendimiento.

Para esta actividad se utilizaron instrumentos para la recolección de información, tales como un cuestionario, mediante el cual se recopilaron datos generales de los

postulados como son: nombre, apellido, edad y número de identificación, los cuales son importantes al momento de que se requiera contactar al emprendedor, otros aspectos a tener en cuenta son, el tiempo de operatividad del emprendimiento, con que herramientas cuenta el emprendedor para desarrollar la actividad económica y si han realizado algún tipo de formación que aporte al crecimiento y desarrollo de sus emprendimientos.

Esto con fin de conocer, el estado actual de sus unidades productivas, su estabilidad y rentabilidad, ya que para nosotros es muy importante evaluar las bases iniciales con las que se presentan los emprendedores. Este proceso tuvo lugar en las instalaciones del centro de emprendimiento SIEMPRENDE, con una duración de 15 días teniendo en cuenta que se hizo un receso durante los feriados de semana santa, logrando un total de 126 emprendedores.

Aunque parecen simples los requisitos que se necesitan para participar del programa hay condiciones que no son negociables y que estrictamente el emprendedor debe cumplir, las cuales son:

- Ser mayor de edad.
- Ser nativo del municipio de Santa Rosa o estar inscritos en el Sisbén.
- Que la unidad productiva o emprendimiento se encuentre en funcionamiento.

Para este año 2024, seguiremos trabajando con los mismos sectores económicos, teniendo en cuenta que estos han mostrado resultados exitosos, algunas de las actividades económicas que comprenden estos sectores son restaurantes, panaderías y repostería, confecciones, barberías, peluquerías y estáticas, talleres mecánicos y metalmecánicos.

Como soporte de esta actividad se diligenciaron los documentos de, listado de asistencia y ficha de inscripción al programa SIEMPRENDE, documentos que serán

anexados al presente de forma digital y que reposan de manera física en los archivos de las oficinas del centro de emprendimiento SIEMPRENDE**.**

Terminada la jornada de inscripciones pudimos identificar que el género femenino se interesa más en los procesos formativos y de emprendimiento, ya que de los emprendedores inscritos al programa para el año 2024, la mayoría pertenecen al género femenino.

Tabla N°1 RELACIÓN DE GENERO

GENERO	
FEMENINO	**112**
MASCULINO	**14**
TOTAL	**126**

TOTAL, 126 DE EMPRENDEDORES ATENDIDOS ÁREA DE EMPRENDIMIENTO.

Además de la anterior caracterización por género, realizamos una caracterización con el fin de identificar cuales sectores económicos se vienen desarrollando y fortaleciendo en el municipio de Santa Rosa durante el año 2024.

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**


Tabla N°2 RELACIÓN DE SECTORES ECONOMICOS

ACTIVIDAD ECONOMICA	CANTIDAD	TOTAL
CONFECCIONES	**16**	**126**
RESTAURANTES	**15**	
PELUQUERIAS	**5**	
ESTETICAS	**12**	
ARTESANIAS	**2**	
EMPRENDIMIENTO DIGITAL	**6**	
ELABORACION DE ALIMENTOS	**31**	
PANADERIA Y REPOSTERIA	**9**	
OTROS	**30**	

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL “SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024”	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



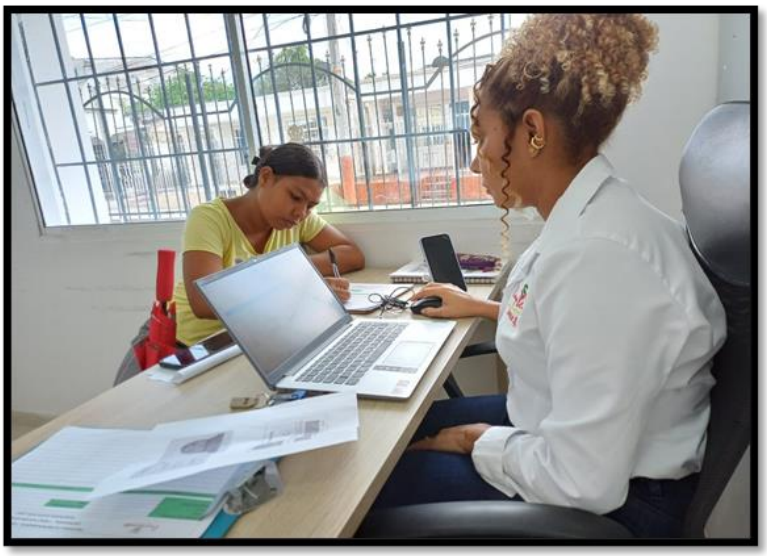

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

SENSIBILIZACIÓN DEL PROGRAMA SIEMPRENDE SANTA ROSA

El día 20 de junio se llevó a cabo la sensibilización del programa SIEMPRENDE SANTA ROSA, para la vigencia de este año 2024.

A este encuentro asistieron 95 emprendedores, los cuales pasarían a ser parte del proceso de formación y capacitación del año 2024. En el desarrollo de esta actividad se socializaron temas muy puntuales como, los requisitos y condiciones de permanencia en el programa, además, se mencionaron las responsabilidades que cada emprendedor deben asumir durante su estadía en el centro de emprendimiento, como por ejemplo la asistencia a las capacitaciones y asesorías en el tiempo y la fecha en las que se le sean asignadas, las condiciones básicas con las que debe cumplir el emprendimiento, como tener un tiempo de operación mínimo de 2 años, estar ubicado en el municipio de Santa Rosa y contar con una inversión inicial.

Teniendo en cuenta que el programa está dirigido al fortalecimiento de los emprendimientos más no a la financiación del mismo, por otro lado, el emprendedor debe ser residente del municipio y estar sisbenizado en el mismo.

TOTAL, 95 EMPRENDEDORES ASISTIERON A LA SENSIBILIZACION DEL PROGRAMA SIEMPRENDE.

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL “SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024”	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS





PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

DIAGNÓSTICO DEL PERFIL EMPRENDEDOR

La realización del diagnóstico del perfil emprendedor es una de las actividades más importantes que deben realizar los emprendedores. Para este año tuvimos una recepción de 95 diagnósticos.

El diagnóstico del perfil emprendedor es un formato elaborado con el fin de conocer las habilidades y características que posee cada emprendedor, cuáles deben ser afianzadas y cuales aprendidas. Dependiendo del resultado de este documento desde el área de emprendimiento crea una guía pedagógica, que nos permita trabajar los temas pertinentes teniendo en cuenta las falencias encontradas.

A través de este documento, el cual es diligenciado únicamente por el emprendedor logramos obtener datos generales no solo del emprendedor sino también de los emprendimientos ya que nos proporciona información como:

- En qué estado se encuentra el proyecto, si en la etapa de ideación o ya está en funcionamiento.
- Cuál es la necesidad u oportunidad detectada en el mercado, para la cual está desarrollada la Idea de negocio.
- Quiénes son los principales clientes de la unidad productiva
- A qué franja de la población va enfocada la idea de negocio
- Cuáles son los recursos que necesita para elaborar o comercializar su bien, producto o servicio a sus clientes o usuarios.
- Grado de formación académica del emprendedor.
- Qué actividad económica desempeña
- Si ha realizado un estudio de mercado o un plan financiero

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

Tabla N°3 CARACTERIZACIÓN DEL FORMATO DIAGNÓSTICO DEL PERFIL EMPRENDEDOR.

CARACTERIZACION EMPRENDEDORES SIEMPRENDE SANTA ROSA "Diagnostico Básico Del Perfil Para Emprendedores Y Comerciantes"			
CONCEPTO	**CRITERIO**	**CANTIDAD**	**PORCENTAJE**
GÉNERO	**FEMENINO**	83	86%
	MASCULINO	13	14%
	SUBTOTAL	96	100%
GRADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA	**SIN ESTUDIO**	1	1%
	PRIMARIA	13	14%
	BACHILLERATO	57	59%
	TÉCNICO	19	20%
	TECNÓLOGO	3	3%
	UNIVERSITARIO	3	3%
	POST GRADO	0	0%
	SUBTOTAL	96	100%
SITUACIÓN LABORAL ACTUAL:	**EMPLEADO**	0	0%
	DESEMPLEADO	2	0%
	INDEPENDIENTE	94	100%
	SUBTOTAL	96	100%
CLASIFICACION DEL SECTOR ECONOMICO	**MANUFACTURAS**	15	16%
	SERVICIOS	23	24%
	AGROINDUSTRIAL	41	43%
	ARTESANIA	3	3%
	INDUSTRIAL	9	9%
	TECNOLOGIAS	5	5%
	SUBTOTAL	96	100%

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

ACTIVIDAD ECONOMICA	**CONFECCIONES**	15	16%
	PELUQUERIA Y BELLEZA	5	5%
	RESTAURANTE	23	24%
	PANADERIAS Y REPOSTERIA	6	6%
	TALLER METALMECANICO	3	3%
	ELABORACION DE PRODUCTO	4	4%
	ARTESANIA	3	3%
	EDUCACION	3	3%
	ELABORACION DE ALIMENTOS	12	13%
	COMERCIO DETALLISTA	2	2%
	MANICURE	12	13%
	CONSTRUCCION	1	1%
	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1	1%
	REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	1	1%
	SERVICIOS TECNOLOGICOS	5	5%
	SUBTOTAL	96	100%
HA DESARROLLADO UN ESTUDIO DE MERCADO (OFERTA Y DEMANDA)	**SI**	24	25%
	NO	72	75%
	SUBTOTAL	96	100%
ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO	**SI**	21	22%
	NO	75	78%
	SUBTOTAL	96	100%
PLAN FINANCIERO	**SI**	23	24%
	NO	73	76%
	SUBTOTAL	96	100%
REGISTRO MERCANTIL:	**SI**	2	2%
	NO	94	100%
	SUBTOTAL	96	102%

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

NÚMEROS DE EMPLEADOS	**1**	47	50%
	2	27	29%
	3	13	14%
	4	7	7%
	5	0	0%
	SUBTOTAL	94	100%
VENTAS DEL ÚLTIMO AÑO	**$ 1.000.000**	45	47%
	$ 2.000.000	12	13%
	$ 3.000.000	9	9%
	$ 5.000.000	30	31%
	SUBTOTAL	96	100%
VALORES DEL ACTIVO DE LA EMPRESA	**$ 500.000**	44	46%
	$ 1.000.000	18	19%
	$ 2.000.000	34	35%
	SUBTOTAL	96	100%

NOTA:

Teniendo en cuenta los datos arrojados por el diagnostico podemos resaltar la siguiente información para este año 2024, los emprendedores en su mayoría son mujeres ocupando un **86%** de la población de emprendedores

En lo referente al nivel de formación el **60%** de los emprendedores son bachilleres.

Por otro lado, la actividad económica con la que más están participando son los restaurantes, con un **23%.** En cuanto a generación de empleos en estos momentos el **51%** de los emprendedores solo están generando un autoempleo, pero proyectados a crecer como empresa y por generar nuevos empleos, contribuyendo así al desarrollo económico del municipio.

TOTAL 95 DIAGNÓSTICOS DEL PERFIL EMPRENDEDOR, REALIZO EL ÁREA DE EMPRENDIMIENTO

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS





PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

DESCUBRE SI ERES UNA PERSONA EMPRENDEDORA

En los días 25 y 26 de junio el centro de emprendimiento SIEMPRENDE SANTA ROSA dio inicio a la jornada de capacitaciones dirigida a los emprendedores que harán parte de proceso de formativo del año lectivo 2024, para este primer encuentro tuvimos una asistencia de 75 emprendedores. El objetivo de este procedimiento es que el emprendedor conozca cuáles son esas cualidades que necesita para forjar su perfil como persona emprendedora.

Además, que nosotros como entidad podamos identificar fortalezas y debilidades en ser como emprendedor y poder trabajar en base a eso, que como entidad podamos contribuir a la construcción de un emprendedor exitoso con las cualidades idóneas para seguir desarrollando su actividad económica con éxito.

Este eje temático es considerado pertinente para bordar al inicio del proceso, ya que partiendo del perfil el emprendedor podrá descubrir si realmente se identifica con este estilo de vida y forma de trabajo. En este contenido temático se socializaron los siguientes subtemas:

- Descubre el perfil emprendedor
- La actividad emprendedora
- La actividad empresarial
- El emprendedor como persona creativa e innovadora
- Barreras de la creatividad
- La creatividad si puede ser enseñada
- Características de la innovación

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

EVALUACION DESCUBRE EL PERFIL EMPRENDEDOR

Terminada la jordana formativa, para nosotros como entidad es importante constatar si hay claridad en cuanto los conceptos e información impartida, para esto se realizó un test que nos permitió tener una descripción más que todo cualitativa y descriptiva de los emprendedores.
Para esto utilizamos el siguiente instrumento de valoración

INSTRUCCIONES

a) Marcar con una "X" bajo el número que mejor califique a cada pregunta.
b) Al finalizar contar las "X" de cada columna de calificación y multiplicar por el número de la columna.
c) Ejemplo: si tiene cinco marcas "X" en la columna cuatro, multiplicar 5x4=20.
d) Luego, sumar los totales de cada columna y colocar el puntaje final.
e) El valor total indicará la capacidad emprendedora, a mayor puntaje mayor capacidad.

Cómo calificar: 4= Sí. 3= Bastante o a Menudo. 2= Algo o Alguna Vez. 1= No.

	Calificación					Calificación			
Pregunta	**4**	**3**	**2**	**1**	**Pregunta**	**4**	**3**	**2**	**1**
¿Te consideras una persona adaptable a cambios?					¿Sabes trabajar en equipo?				
¿Tienes confianza en tus posibilidades y capacidades?					¿Sabes administrar tusrecursos económicos?				

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

¿Es importante disponer de autonomía en el trabajo?					¿Tienes facilidad paranegociar con éxito?				
¿Tienes facilidad decomunicación?					¿Te relacionas fácilmente conpersonas que no conoces?				
¿Te consideras unapersona creativa?					¿Planificas acciones concretas para el desarrollo de un proyecto?				
¿Afrontas los problemas con optimismo?					¿Te planteas los temas con visión de futuro?				
¿Tomas iniciativas antesituaciones complejas nuevas?					¿Cumples los plazos que te fijas para realizar un trabajo?				
¿Tienes predisposiciónpara asumir riesgos?					¿Sientes motivación por conseguir objetivos?				
¿Tomas notas escritassobre tus proyectos?					¿Te consideras bueno en aquello que sabes hacer?				
¿Arriesgarías recursos propios si pusieras en marcha un proyecto?					¿Sacrificarías tu tiempo libre si el trabajo lo demanda?				
¿Te resulta fácil asignartareas a los demás?					¿Normalmente son otros los que deciden, yo solo sigo?				
Sub total					Sub total				
					Puntaje total				

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

IDENTIFICA TU IDEA DE NEGOCIO

Los días 2 y 3 de julio, se realizó la asesoría basada en la temática "identifica tu idea de negocio", a la cual asistieron 74 emprendedores, cabe resaltar que en cada uno de los encuentros formativos se desarrollan las temáticas pertinentes de acuerdo al proceso de crecimiento que se pretende que logren los emprendedores.

Durante estos días se trabajó la temática de **"IDENTIFICA TU IDEA DE NEGOCIO"** en esta ocasión los emprendedores tuvieron la oportunidad de trabajar temas como:

- De la idea de negocio a la empresa.
- Innovación, creatividad y microempresa.
- La idea de negocio y la empresa.
- Herramientas tecnológicas básicas para tu microempresa.

TOTAL, 74 EMPRENDEDORES RECIBIERON LA ASESORIA: "IDENTIFICA TU IDEA DE NEGOCIO".

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL “SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024”	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS





PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

ÁREA DE EMPRENDIMIENTO DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL

ENTREGABLES ÀREA DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL (POBLACION EN EDADES DE 18 A 28 AÑOS)						
EMPRENDIMIENTO JUVENIL	Diagnostico	Atencion de Usuarios Área Emprendimiento Juvenil	35	47	134%	30%
		Sensibilización Del Programa Siemprende Santa Rosa	35	35	100%	
		Diagnóstico Del Perfil Emprendedor	35	35	100%	
		Descubre Si Eres Una Persona Emprendedora	35	35	100%	
		Identifica Tu Idea De Negocio	35	35	100%	
	Formación	1.Pre-Ideación	35		0%	
		2.Fuente De Generación De Ideas (Necesidades, Conocimiento Y Experiencia)	35		0%	
		3.Evaluacion Técnica (Saberes) Y Mercado (Estudio De Mercado)	35		0%	
		4.Brainstorming	35		0%	
	Asesoría	Asesoría en Mercadeo	35		0%	
		Asesoría Convierte Tu Idea De Negocio En Una Oportunidad De Mercado	35		0%	
		Asesoría Modelo De Negocio Y Validación Con Los Clientes	35		0%	
		Asesoría En Elaboración De Planes De Negocio	35		0%	
		Asesoría y Seguimiento A Unidades Productivas Emprendimiento Juvenil (Capital Semilla 2022)	35		0%	
	Prototipados	Visitas De Seguimiento Emprendimiento Juvenil 2024	20		0%	
		Emprendimientos juveniles Prototipados 2024	20		0%	
	Acompañamiento y Seguimiento	Acompañamiento Y Seguimiento A Unidades Productivas Proceso De Capital Semilla 2022-2023	10		0%	
		Visitas De Seguimiento Proceso De Capital Semilla 2022-2023	10		0%	

USUARIOS ATENDIDOS ÁREA DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL

En el marco del desarrollo económico del municipio de Santa Rosa de Lima Norte de Bolívar, se ejecuta el convenio de capitalización de unidades productivas SIEMPRENDE SANTA ROSA.

En este proceso de crecimiento empresarial se aborda el área de Emprendimiento Juvenil, el cual está dirigido a fomentar estrategias que los jóvenes puedan utilizar dentro de su unidad productiva y que les permita tener un manejo de experiencia y habilidades desde edades tempranas, puesto que emprender es encontrar en la necesidad una oportunidad. Emprender no es fácil, suele convertirse en un reto de gran disciplina y responsabilidad y más para la población juvenil.

Teniendo en cuenta que la precariedad laboral va en aumento y las garantías en el trabajo que actualmente tienen los jóvenes se ven reducidas en los diferentes ámbitos, lo que lleva al interés por realizar un balance en materia de emprendimiento y reconocer las tendencias de producción académica y los desafíos que enfrentan los jóvenes al querer emprender bajo el complejo contexto social, político y económico del país. Desde SIEMPRENDE SANTA ROSA, junto con un equipo interdisciplinario, se busca formar un amplio espacio de capacitación con el

cual el emprendedor juvenil, logre crecer sobre su negocio ya organizado y llevarlo a un proceso de formalización legal.

Como primera medida, se llevó a cabo la elaboración del plan de trabajo del área de emprendimiento juvenil y se procedió a dar inicio en las actividades establecidas en los entregables del convenio.

PROCESO DE INSCRIPCION AREA DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL 2024

Se inició convocatoria de inscripción a emprendedores jóvenes en edades comprendidas de 18 a 28 de edad. Durante el periodo comprendido entre el 30 de mayo al 14 de junio de 2024, Proceso liderado por el equipo interdisciplinario del centro de emprendimiento SIEMPRENDE SANTA ROSA.

El proceso de inscripción se realizó por medio de una herramienta de recolección de datos y el diligenciamiento del formato de inscripción; donde se tuvo en cuenta diferentes puntos dentro de la franja de emprendimiento e información personal del emprendedor joven tales como:


- Datos personales del emprendedor joven
- Dirección de la unidad productiva
- Dirección de residencia
- Nivel de formación educativo
- Fecha de inicio del emprendimiento- tiempo de operación de la unidad productiva
- Herramientas básicas con las que cuenta dentro de la unidad productiva

El formato de inscripción aplicado al emprendedor joven nos permite conocer datos precisos del estado actual de las diferentes unidades productivas y de la misma forma identificamos los sectores económicos en los cuales el emprendedor joven realiza su inscripción, resaltando los siguientes sectores económicos: BARBERIAS, PELUQUERIA, ESTETICA, RESTAURANTE, ARTESANIAS, EMPRENDIMIENTO

DIGITAL, ELABORACION DE ALIMENTOS, PANADERIA, REPOSTERIA ENTRE OTROS.

EN TOTAL, 47 EMPRENDEDORES JUVENILES SE ATENDIERON, POR PARTE DEL ÁREA DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN EL PROGRAMA SIEMPRENDE 2024

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

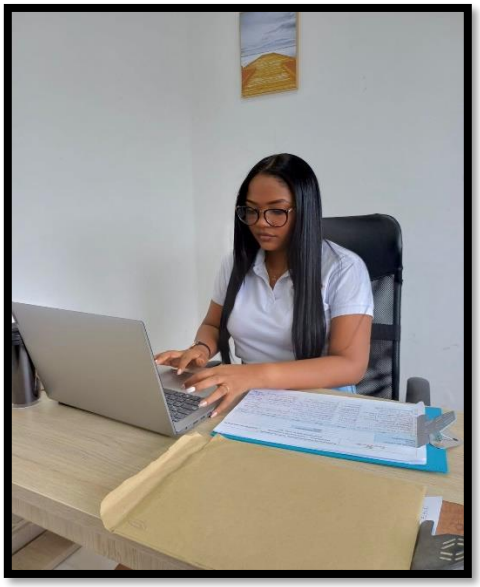



PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

Tabla N°1 RELACIÓN POR GENERO

GENERO	
FEMENINO	**37**
MASCULINO	**10**
TOTAL	**47**

Tabla N°2 RELACIÓN POR ACTIVIDAD ECONOMICO

ACTIVIDAD ECONOMICA	CANTIDAD	TOTAL
CONFECCIONES	**4**	**47**
RESTAURANTES	**5**	
PELUQUERIAS	**7**	
ESTETICAS	**5**	
ARTESANIAS	**2**	
EMPRENDIMIENTO DIGITAL	**0**	
ELABORACION DE ALIMENTOS	**3**	
PANADERIA Y REPOSTERIA	**3**	
BARBERIAS	**6**	
OTROS	**11**	

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

SENSIBILIZACIÓN DEL PROGRAMA SIEMPRENDE 2024 ÁREA DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL

Dentro del cumplimiento de las actividades programadas por el centro de emprendimiento SIEMPRENDE SANTA ROSA, se estableció la actividad de sensibilización enfocada en el área de emprendimiento juvenil.

En esta actividad se socializaron todos los lineamientos y requerimientos exigidos por el programa; en el cual, se les da la bienvenida a los emprendedores jóvenes. Posteriormente, se les informan los parámetros de permanencia para garantizar su continuidad dentro del programa; tales como: La importancia de la asistencia del emprendedor juvenil, cumplimiento de la documentación pertinente, responsabilidad con la entrega de las actividades asignadas, entre otros.

Este proceso es liderado por el equipo de profesionales del centro de emprendimiento, resaltando la participación de la líder de emprendimiento juvenil, quien estará a cargo de guiar, asesorar, direccionar el cumplimiento y compromiso de los jóvenes en el programa. De la misma forma, socializamos el proceso de capacitación de manera global; además de las diferentes áreas que la conforman.
El fortalecimiento de las unidades productivas, es la principal apuesta del programa SIEMPRENDE desde el área juvenil, por tanto, la constancia del emprendedor en alcanzar esta meta, es vital; ya que la disciplina y la innovación promueven un mayor impacto en el desarrollo de la unidad productiva.

Es así, como el proceso de sensibilización, nos permite acercarnos al desarrollo pleno de un conocimiento, en donde el emprendedor tiene amplio bagaje de temáticas jurídicas, financieras y administrativas que serán el resultado de su proceso de formación en el programa SIEMPRENDE 2024.

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

TOTAL, 35 DE EMPRENDEDORES JUVENILES, FUERON SENSIBILIZADOS ÁREA DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





DIAGNOSTICO DEL PERFIL EMPRENDEDOR ÁREA DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL

En el desarrollo de la actividad y diligenciamiento del FORMATO DIAGNOSTICO PERFIL EMPRENDEDOR; busca conocer datos relevantes del emprendedor joven y funcionamiento de su unidad productiva, con el fin de hacer un estudio de caso al emprendedor; identificar sus datos personales, el nivel de formación académica, el estado actual de su situación laboral, el perfil del proyecto a nivel de (estado financiero, estudio de mercado, estudio técnico del proyecto, tiempo de operación, utilidades en los últimos años, valores activos de la empresa entre otros).

Todos los criterios antes mencionados nos ayudan a verificar la viabilidad de las unidades productivas conformadas por jóvenes que en el año 2024 se encuentran inscritas en el programa SIEMPRENDE Santa Rosa.

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

El diagnostico ejecutado mediante el Perfil Emprendedor, es un tipo documento en donde se establecen preguntas de índole cualitativo y cuantitativo, que permiten conocer la percepción de la realidad del emprendedor juvenil.
Por ende, se establecen parámetros de evaluación de los datos cuantitativos, con el fin de determinar la estabilidad financiera con la que se mantienen algunos de ellos.

Mientras, que el esquema cualitativo es eje conector entre lo que "nació como una idea" y lo que "ha crecido dicha idea". Esta lectura del contexto, es importante; puesto que, la determinación del emprendedor joven con los desafíos que concierne la preparación y el conocimiento en habilidades de formación son los principales propulsores para alcanzar la meta del fortalecimiento con el capital semilla.

EN TOTAL, A 35 EMPRENDEDORES JÓVENES SE LES APLICO EL FORMATO DIAGNOSTICO PERFIL EMPRENDEDOR.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

CARACTERIZACIÓN DE EMPRENDEDORES
ÁREA DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL

En el cumplimiento de la tabulación de los datos cuantitativos arrojados mediante el desarrollo del perfil emprendedor, tenemos la siguiente tabla, la cual sustrae la información más técnica con respecto al estado actual del emprendimiento según su categorización de elementos básicos para el sostenimiento de su unidad productiva en un área comercial.

El tipo de emprendimiento catalogado según su sector y actividad económica, el índice económico sobre la cual prevalece el desarrollo de las unidades productivas presentes, además; del marco legal en el que se mueven, son algunos puntos de los cuales se cuantifican en la siguiente tabla. Aunque el factor de la informalidad suele ser muy común en dichos procesos de emprendimiento; sin embargo, esto no es un impedimento para el crecimiento de la unidad productiva en el mercado económico, tanto del municipio como del departamento en general.

Santa Rosa, es un municipio, que, al contar con la cercanía a la ciudad de Cartagena, el índice de fortalecimiento económico es bastante fluido y con un alto nivel de interacción social. La reinvención de espacios, la adaptabilidad de contextos según las necesidades del cliente, son algunos factores que les han garantizado a los emprendedores jóvenes abrirse paso en una estructura costumbrista de manejo del comercio local. Por ende, el emprendimiento juvenil, fomenta un valor agregado, significativo a la vanguardia de las necesidades del cliente y la oferta demanda presente en el sector social. Para lo cual, la siguiente tabla, da cuenta de la movilidad financiera de dichas unidades productivas.

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

CARACTERIZACION USUARIOS SIEMPRENDE SANTA ROSA
Diagnostico Básico Del Perfil Para Emprendedores Y Comerciantes

CONCEPTO	CRITERIO	CANTIDAD	PORCENTAJE
GÉNERO	FEMENINO	26	74%
	MASCULINO	9	26%
	SUBTOTAL	35	100%
GRADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA	SIN ESTUDIO	0	0%
	PRIMARIA	1	3%
	BACHILLERATO	16	46%
	TÉCNICO	10	29%
	TECNÓLOGO	3	9%
	UNIVERSITARIO	5	14%
	POST GRADO	0	0%
	SUBTOTAL	35	100%
SITUACIÓN LABORAL ACTUAL:	EMPLEADO	0	0%
	DESEMPLEADO	1	0%
	INDEPENDIENTE	34	100%
	SUBTOTAL	35	100%
CLASIFICACION DEL SECTOR ECONOMICO	MANUFACTURAS	3	9%
	SERVICIOS	17	49%
	AGROINDUSTRIAL	10	29%
	ARTESANIA	3	9%
	INDUSTRIAL	0	0%
	ECONOMIA NARANJA	1	3%
	TECNOLOGIAS	1	3%
	SUBTOTAL	35	100%
ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCIONES	3	9%
	PELUQUERIA Y BELLEZA	12	34%
	BARBERIAS	5	14%
	RESTAURANTE	5	14%
	PANADERIAS Y REPOSTERIA	1	3%
	TALLER METALMECANICO	0	0%

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

	ELABORACION DE PRODUCTO	4	11%
	ARTESANIA	3	9%
	EDUCACION	0	0%
	TAPICERIA	0	0%
	TATOO	0	0%
	COMERCIO DETALLISTA	1	3%
	SERVICIOS TECNOLOGICOS	1	3%
	SUBTOTAL	35	100%
HA DESARROLLADO UN ESTUDIO DE MERCADO (OFERTA Y DEMANDA)	**SI**	7	23%
	NO	28	90%
	SUBTOTAL	31	113%
ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO	**SI**	5	14%
	NO	30	86%
	SUBTOTAL	35	100%
PLAN FINANCIERO	**SI**	4	11%
	NO	31	89%
	SUBTOTAL	35	100%
REGISTRO MERCANTIL:	**SI**	0	0%
	NO	35	100%
	SUBTOTAL	35	100%
NÚMEROS DE EMPLEADOS	**1**	21	60%
	2	10	29%
	3	2	6%
	4	2	6%
	5	0	0%
	SUBTOTAL	35	100%
VENTAS DEL ÚLTIMO AÑO	**$ 1.000.000**	15	43%
	$ 2.000.000	0	0%
	$ 3.000.000	5	14%

	$ 5.000.000	15	43%
	SUBTOTAL	35	100%
VALORES DEL ACTIVO DE LA EMPRESA	**$ 500.000**	11	31%
	$ 1.000.000	9	26%
	$ 2.000.000	15	43%
	SUBTOTAL	35	100%

DESCUBRE EL PERFIL EMPRENDEDOR
ÁREA DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL

Dando inicio a los procesos de capacitación, se genera un primer espacio de formación en el cual, se les contextualiza a los emprendedores jóvenes de términos como emprendimiento, emprendedor y toda una seria de expresiones técnicas que dan razón de ser a sus unidades productivas.

Ahora bien, en este espacio de formación, los emprendedores juveniles inician un proceso de reconocimiento del estado actual de su negocio, de las dificultades que se han afrontado durante el proceso de capacitación, de sus retos y se empieza a reforzar la idea de comprender el mercado laboral tan cambiante que se tiene hoy en día, además; de los compromisos que implica reinventarse en los nuevos esquemas de innovación basados en la creatividad como forma de diferenciación en el mercado económico.

Cuando se inicia un negocio, el emprendedor joven se basa en una necesidad de independencia, de superación personal y de crecimiento financiero. Aunque los comienzos no son fáciles, se convierten en la base, sobre la cual, se establecen la

ejecución de dicha idea. Atreverse a incursionar en un mercado económico tan cambiante; ya que en sí; esa sola idea es un riesgo. Pero a su vez, la certeza de creer en lo que se quiere y luchar por lo que se sueña.

Por lo anterior; este primer espacio de fortalecimiento de conocimientos básicos del contexto de emprendimiento; los oriento a entender la dinámica económica y social sobre la cual, se mueven. Ser flexibles, ser abiertos, mantener una escucha activa, ser creativos, ser buenos administradores y ser innovadores son puntos cruciales, que garantizan la estabilidad de una unidad productiva.

Durante este espacio de formación, los jóvenes emprendedores, mostraron un gran interés al momento de ir socializando los inicios de sus ideas de negocio, la forma como nació esta pasión o gusto por una actividad representativa de su arte o una habilidad, que hoy en día los mantiene y solventa económicamente.

Los seres humanos, capaces de crear infinidad de alternativas cuando de superación económica se trata; dado que la adaptabilidad y la competencia en el campo es de manera constante e individualista, genera una serie de complejidades financieras; pero que para estos jóvenes emprendedores y pertenecientes al programa SIEMPRENDE SANTA ROSA, desde el área de emprendimiento juvenil, no son una barrera para quedarse atrás; ya que con sus unidades productivas, se pueden trabajar grandes en grandes apuestas de fortalecimiento a nivel comercial.

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS





IDENTIFICA TU IDEA DE NEGOCIO

En este espacio se trabajó, el fortalecimiento de esas ideas; que ya se tienen en funcionamiento y que son rentables para nuestros emprendedores jóvenes, respetando el marco de competencia comercial, al que están sujetos; tal cual, como se mueve un mercado laboral.

Temas como la presentación de su producto bien o servicio de acuerdo a las clasificaciones de innovación que se puedan brindar. Siendo precisamente este, el tema principal de la actividad. El plano de la innovación en un mundo económico tan cambiante es crucial para generar alternativas de reconocimiento o diferenciación.

Ahora bien, hablemos de la importancia de tener claro en qué sector económico o actividad económica están ubicados los jóvenes emprendedores hoy en día. El contexto de Santa Rosa el tema del sector servicio es amplio y con múltiples alternativas por ende este ejemplo implica que deben de ser vanguardistas, para mantener a su tipo de clientes y así estar constantemente innovando sus productos

o servicios, en caso dado generar promociones o lugares que atrapen al cliente brindándole una experiencia satisfactoria por la cual ellos decidan volver.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS





PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

ÁREA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Diagnostico	Atencion de Usuarios Área Fortalecimiento Empresarial	70	173	247%
	Diagnostico De Unidades Productivas Establecidas	70	125	179%
	Linea Base Del Negocio En Marcha	70	125	179%
Formación	1. Componente Productivo	70		0%
	2. Componente Organizacional	70		0%
	3. Componente Mercadeo o comercial	70		0%
	4. Componente Financiero	70		0%
Asesorias	Asesoría y Diseño de Plan Económico y Financiero	70		0%
	Asesoría y Proyecion de Flujo De Caja - Evalúacion De La Viabilidad Del Negocio	70		0%
	Asesoría Elaboracion Modelo De Plan Economico - Implementación Del Plan De Negocio	70		0%
	Asesoria Para La Elaboracion Del Plan Economico y Financiero.	70		0%
	Asesoria Para La Formalizacion De Unidades Productivas	70		0%
Prototipados	Elaboracion De Plan Economico y Financiero	70		0%
Acompañamiento y Seguimiento	Acompañamiento Y Seguimiento A Unidades Productivas Proceso De Capital Semilla 2022-2023	80		0%
	Visitas De Seguimiento Proceso De Capital Semilla 2022-2023	80		0%

USUARIOS ATENDIDOS ÁREA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Con la finalidad de dar inicio a un nuevo periodo el Centro De Emprendimiento SIEMPRENDE SANTA ROSA, abre sus puertas nuevamente a los emprendedores del municipio de Santa Rosa, en primera medida se llevó acabo la inscripción de los nuevos emprendedores y se procedió a dar inicio a las actividades establecidas en los entregables del convenio.

Para el cumplimiento de esta actividad las inscripciones se llevaron a cabo de manera presencial en las instalaciones de SIEMPRENDE COLOMBIA entre los días del 30 de mayo al 14 de junio del año 2024.

Para dar inicio a los procesos del programa SIEMPRENDE COLOMBIA 2024, se establecieron unos requisitos básicos para la inscripción de aquellas personas que quieren ser parte de este proceso, los cuales fueron:

- Ser mayor de edad.
- Estar radicado o domiciliado en el municipio de Santa Rosa.
- Tener Sisbén actualizado del municipio de Santa Rosa.
- Tener una unidad productiva o emprendimiento en funcionamiento.

Para este proceso de inscripción se utilizó como instrumento de recolección de información, un cuestionario digital y planillas impresas donde se recolectaron datos generales de los postulantes como son: datos personales y específicos de los emprendedores como nombre, apellido, número de identificación, dirección, numero de contacto, nombre de la unidad productiva o emprendimiento, los cuales son importantes al momento de que se requiera contactar al emprendedor, otros aspectos a tener en cuenta son: el tiempo de operatividad del emprendimiento, con que herramientas cuenta el emprendedor para desarrollar la actividad económica y si han realizado algún tipo de formación que aporte al crecimiento y desarrollo de sus microempresas y que les ayude a optimizar el producto o la prestación del servicio al que se dedica.

Esto con fin de conocer, el estado actual de sus unidades productivas, su estabilidad y rentabilidad, ya que el programa tiene en cuenta los emprendimientos que muestren mayor potencial y que puedan ser sostenible en el tiempo y logren generar empleo.

EN TOTAL, 173 USUARIOS FUERON ATENDIDOS POR EL ÁREA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y REACTIVACION ECONOMICA.

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL “SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024”	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**





PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

DIAGNOSTICO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ESTABLECIDAS

Siguiendo con las actividades establecidas en el plan de trabajo del CENTRO DE EMPRENDIMIENTO SIEMPRENDE, se llevó a cabo para los días del 20 al 21 de junio del 2024 el inicio de la sensibilización y DIAGNOSTICO PARA LA REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDADES PRODUCTIVAS ESTABLECIDAS, a todos los emprendedores que fueron seleccionados para participar en este proceso por el CENTRO DE EMPRENDIMIENTO SIEMPRENDE. Dichos emprendedores se les llamo telefónicamente donde se les explicó en que horario debían asistir, para lo cual asistieron en varios grupos de dos horarios (9:00 am y 2:00 pm).

En esta actividad procedimos a presentar el equipo SIEMPRENDE 2024 y al responsable de cada área, con el fin de darnos a conocer y también de conocerlos a ellos, cuáles son las expectativas que tienen para el periodo formativo 2024**,** explicarles cómo funciona SIEMPRENDE, el tiempo que dura la capacitación, los temas que se les darán en el transcurso que reciban las capacitaciones.

Para la actividad de diagnóstico procedimos a aplicarles un formato de DIAGNÓSTICO BASICO FINANCIERO Y DE INVERSION INICIAL EMPRENDEDORES Y COMERCIANTES, el cual contenía sus datos personales, sector económico al que pertenece su emprendimiento o unidad de negocio, volúmenes de ventas diarias y semanales que manejan las unidades productivas, operación del negocio: que días y donde funciona el negocio, si genera empleo, si lleva a cabo un encadenamiento productivo con alguna otra entidad, que recursos posee para que funcione, cuanto fue la inversión inicial para empezar a funcionar su Unidad Productiva y por último, firma del emprendedor y asesor encargado.

TOTAL 125 EMPRENDEDORES SE LES APLICO FORMATO DE DIAGNOSTICO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ESTABLECIDAS.

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL “SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024”	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**





PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

LINEA BASE NEGOCIO EN MARCHA

En cumplimiento de las actividades se desarrolló la actividad de LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE NEGOCIO EN MARCHA, en la misma se realizó el diligenciamiento del formato de línea base del negocio en marcha, en el cual se solicita sus datos personales, si genera empleo, que productos o servicio ofrece, cantidades que vende en el mes, cuáles son los gastos y costos que generan, si llevan contabilidad, si están inscritos ante la cámara de comercio, tienen créditos con alguna entidad financiera, que cursos les gustaría realizar, que requieren para que su emprendimiento mejore.

Esto con el fin de conocer su unidad productiva más a fondo y así mirar cómo mejorarla para que genere más ingresos e incluso empleo en el municipio de Santa Rosa.

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

TABLA No.1 FICHA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A EMPRENDEDORES 2024, SEGÚN GENERO, ÁREA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA

FICHA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A EMPRENDEDORES SEGÚN SU GENERO			
CONCEPTO	**CRITERIO**	**CANTIDAD**	**PORCENTAJE**
GÉNERO	**FEMENINO**	102	68%
	MASCULINO	23	32%
	TOTAL	**125**	**100%**

TABLA No. 2 FICHA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A EMPRENDEDORES 2024, SEGÚN LA CLASIFICACION DEL SECTOR ECONOMICO, ÁREA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA

FICHA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A EMPRENDEDORES SEGÚN LA CLASIFICACION DEL SECTOR ECONIMICO			
CLASIFICACION DEL SECTOR ECONOMICO	**MANUFACTURAS**	16	22%
	SERVICIOS	40	45%
	AGROINDUSTRIAL	39	24%
	ARTESANIA	9	4%
	INDUSTRIAL	16	3%
	TECNOLOGIAS	5	2%
	TOTAL	**125**	**100%**

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

TABLA No. 3 FICHA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A EMPRENDEDORES 2024, SEGÚN LA ACTIVIDAD ECONOMICA, ÁREA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA

FICHA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A EMPRENDEDORES SEGÚN LA ACTIVIDAD ECONOMICA			
ACTIVIDAD ECONOMICA	**CONFECCIONES**	15	12%
	ELABORACION DE CALZADO	1	1%
	SALA DE ESTETICAS	17	14%
	PELUQUERIAS	10	8%
	BARBERIAS	6	5%
	ELABORACION DE PRODUCTOS	13	10%
	ELABORACION DE ALIMENTOS	10	8%
	RESTAURANTE	22	18%
	PANADERIAS	8	6%
	EDUCACION	3	2%
	CONSTRUCCION	1	1%
	ASESORIAS Y RECARGA	1	1%
	TALLER MECANICO	3	2%
	ARTESANIA	9	7%
	SERVICIOS TECNOLOGICOS	5	4%
	COMERCIO DETALLISTA	1	1%
	TOTAL	**125**	**100%**

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

TABLA No. 4 FICHA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A EMPRENDEDORES 2024, SEGÚN DIAS DE FUNCIONAMIENTO, ÁREA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA

FICHA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A EMPRENDEDORES SEGÚN DIAS DE FUNCIONAMIENTO			
QUE DIA FUNCIONA EL NEGOCIO	TODOS LOS DIAS	83	66%
	LUNEAS A VIERNES	21	17%
	SABADO Y DOMINGO	21	17%
	TOTAL	**125**	**100%**

TABLA No. 5 FICHA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A EMPRENDEDORES 2024, SEGÚN LUGAR DE FUNCIONAMIENTO, ÁREA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA

FICHA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A EMPRENDEDORES SEGÚN LUGAR DE FUNCIONAMIENTO			
DONDE FUNCIONA EL NEGOCIO	VIVIENDA	89	71%
	LOCAL PROPIO	16	13%
	LOCAL ARRENDADO	15	12%
	NO TIENE LOCAL	0	0%
	OTRO	5	4%
	TOTAL	**125**	**100%**

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

TABLA No. 6 FICHA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A EMPRENDEDORES 2024, SEGÚN LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA UIDAD PRODUCTIVA, ÁREA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA

FICHA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A EMPRENDEDORES SEGÚN LUGAR DE FUNCIONAMIENTO			
CUANTAS PERSONAS TRABAJAN CON USTED EN EL NEGOCIO	1	63	50%
	2	39	31%
	3	13	10%
	4	7	6%
	5	1	1%
	6	2	2%
	TOTAL	**125**	**100%**

TABLA No. 6 FICHA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A EMPRENDEDORES 2024, SEGÚN GENERACION DE ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO, ÁREA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA

FICHA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A EMPRENDEDORES SEGÚN LUGAR DE FUNCIONAMIENTO			
GENERA ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO	**SI**	10	8%
	NO	115	92%
	TOTAL	**125**	**100%**

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

ÁREA DE APOYO PSICOSOCIAL

Diagnostico	Atencion de Usuarios Área Apoyo Psicosocial	80	100	125%	**37%**
	Diagnostico Psicosocial a Usuarios	80	100	125%	
	Levantamiento Linea Base De Entrada	80	100	125%	
	Diagnóstico Línea Base De Entrada	80	100	125%	
Formación	1.Encuentro: Empatía y Asertividad. Autoestima y autoconcepto, Presentación personal	80		0%	
	2. Encuentro Flexibilidad y OptimismoManejo de conflicto - manejo de emociones Temática Decido Ser	80		0%	
	3. Encuentro Trabajo En Equipo. Orientación Al Logro. Circulo De La Confianza.	80		0%	
	4. Capacidad De Relacionamiento y Comunicación. Comunicación Asertiva - Técnicas De Expresión Oral y Corporal, Servicio Al Cliente Dialogo Opinión y Palabra	80		0%	
Asesorias	Asesoría Psicosocial a Usuarios	80		0%	
	Asesoría Para la Presentacion PITCH	80		0%	
	Linea Base De Salida	80		0%	
Acompañamiento y Seguimiento	Acompañamiento Y Seguimiento A Unidades Productivas Proceso De Capital Semilla 2022-2023	60		0%	
	Visitas De Seguimiento Proceso De Capital Semilla 2022-2023	60	11	18%	

USUARIOS ATENDIDOS POR EL ÁREA DE APOYO PSICOSOCIAL
DIAGNOSTICO PSICOSOCIAL A USUARIOS
APLICACIÓN DE PRUEBA PSICOTÉCNICA
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS LÍNEA BASE DE ENTRADA

El área de apoyo psicosocial del programa SIEMPRENDE 2024, se encargó de apoyar al equipo de trabajo, en el tema de acompañamiento transversal a los usuarios, interviniendo desde el aspecto psicosocial.

El apoyo psicosocial del programa SIEMPRENDE, consiste en ayudarles a los usuarios a entender el tipo de estrés que afrontan en su papel de emprendedores y microempresarios, para que adquieran la capacidad de superarlo. Se trata de darles información sobre cuidado personal y de enseñarles a pedir ayuda a las personas de su entorno, por ejemplo, mediante la instauración de sistemas de apoyo.

La Intervención Psicosocial desarrollada, trato de comprender, predecir y cambiar la conducta social de los usuarios, así como modificar aquellos aspectos nocivos de su entorno, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de estos y su entorno familiar y social.

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

Se les aplico la prueba psicotécnica línea base de entrada a 100 Emprendedores – Micro – empresarios que se encuentran en el proceso del proyecto de emprendimiento, fortalecimiento empresarial y reactivación económica año 2024. Esta aplicación se distribuyó en grupos de las jornadas de la mañana y tarde, los días martes y jueves del presente año.

TOTAL 100 USUARIOS ATENDIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE: USUARIOS ATENDIDOS POR EL ÁREA DE APOYO PSICOSOCIAL, DIAGNOSTICO PSICOSOCIAL A USUARIOS, APLICACIÓN DE PRUEBA PSICOTÉCNICA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS LÍNEA BASE DE ENTRADA.

VISITAS DE SEGUIMIENTO PROCESO DE CAPITAL SEMILLA 2022-2023

Estas visitas de seguimiento se ejecutaron directamente hacia los Emprendedores y Microempresarios ganadores de los procesos de capital semilla años 2022-2023, en sus lugares de residencia o en las unidades productivas establecidas.

Se les aplico a cada Emprendedor y Microempresario, el formato de visita y acompañamiento psicosocial, para conocer a profundidad aspectos importantes dentro del rol como persona, Emprendedor, Microempresario que tienden a presentárseles situaciones cotidianas en su vida.

Indagar sobre el grupo familiar, la acogida del emprendimiento en el Municipio de Santa Rosa y otros lugares, la motivación que tiene cada Emprendedor y Microempresario a seguir en marcha con su emprendimiento, la reapertura y proceso de reactivación económica del impacto personal y empresarial que le traído, conocer si se encuentra pasando por algún suceso o situación que amerite atención inmediata.

También con los recursos recibidos en el programa capital semilla, mirar el avance que se ha tenido, el proceso significativo desde las áreas de trabajo de SIemprende

que les aporto y como Emprendedores y Microempresarios proyectados a salir adelante, conocer si desean tener las unidades productivas con otra sede o irse para otro lugar con todo el emprendimiento completo. Entre otras.

Estos acompañamientos en las unidades productivas, eran de mucho provecho y extensa duración, aproximadamente de 30 minutos a una hora. Tanto del Asesor (Psicóloga), como el Emprendedor y Microempresario tuvieron la oportunidad de tener una conversación sólida y en privacidad para expresar y resolver inquietudes.

Se realizaron 11 visitas de acompañamiento psicosocial para este mes de mayo, ya que en próximos días se estarán culminando las restantes, para así relacionar la información de cada unidad productiva en el próximo mes.

TOTAL, SE VISITARON 11 UNIDADES PRODUCTIVAS DEL PROCESO CAPITAL SEMILLA 2022-2023, RECIBIERON ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA DE APOYO PSICOSOCIAL.

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

ÁREA DE COMUNICACIONES

Asesoría	Asesoría En Manejo De Redes Sociales a Emprendedores	80		0%	**94%**
	Asesoría Para La Presentación Personal y Correcta Comunicación del PITCH	50		0%	
	Asesoría En Diseño y Creación de logos a Emprendedores	50	98	196%	
Manejo Del Area De Comunicación Del Programa	Manejo de Imagen del Programa - Actualizacion de Redes Sociales	10	6	60%	
	Instagram).	20	7	35%	
	Reportajes De Casos De Éxito Del Programa De Años Anteriores	10		0%	
	Archivo Fotografico	12	4	33%	
	Evidenciar a través de nuestras publicaciones el trabajo constante que se hace en nuestro centro, así como las evoluciones y avances de las actividades.	12	6	50%	

En el marco del desarrollo del convenio SIEMPRENDE 2024 realizado entre la Alcaldía Municipal de Santa Rosa y la Fundación Biopsicosocial Jesucristo Rebaño de Paz cuyas actividades desarrolladas fueron:

MANEJO DE IMAGEN DEL PROGRAMA - ACTUALIZACION DE REDES SOCIALES




Al momento de recibir el acceso de las redes sociales del programa SIEMPRENDE 2024, solo tuvimos acceso al perfil y pagina de Facebook del programa @SiemprendeColombia, pues no tenía acceso a la plataforma de Instagram.

Teniendo en cuenta que la plataforma de página de Facebook, tenía dos mil trecientos cuarenta y un seguidores al momento de reactivar actividades, de lo cual pasó un lapso de más de cinco meses.

Realicé el cambio de nombre del perfil de la entidad, cambio de foto de perfil y de portada. Así como la desvinculación de la cuenta de Instagram con el perfil, ya que no se puedo, por muchos intentos y métodos utilizados, acceder a dicha cuenta. Por tanto, se resolvió, cancelar la cuenta de Instagram y crear uno nuevo. No obstante,

también tuvimos algunas dificultades para la creación del nuevo perfil, pues, las plataformas de meta no permitían la creación de nuevos perfiles. Solo hasta el martes 11 de junio, después de reiterados intentos, logramos crear la nueva cuenta de Instagram y enlazarla con la página de Facebook de SIEMPRENDE SANTA ROSA.

Ahora, ambas paginas comparten información, de hecho, la foto de perfil es la misma, y se pueden administrar desde el panel profesional (Meta Business suite) de meta para las informaciones métricas que se requieran.

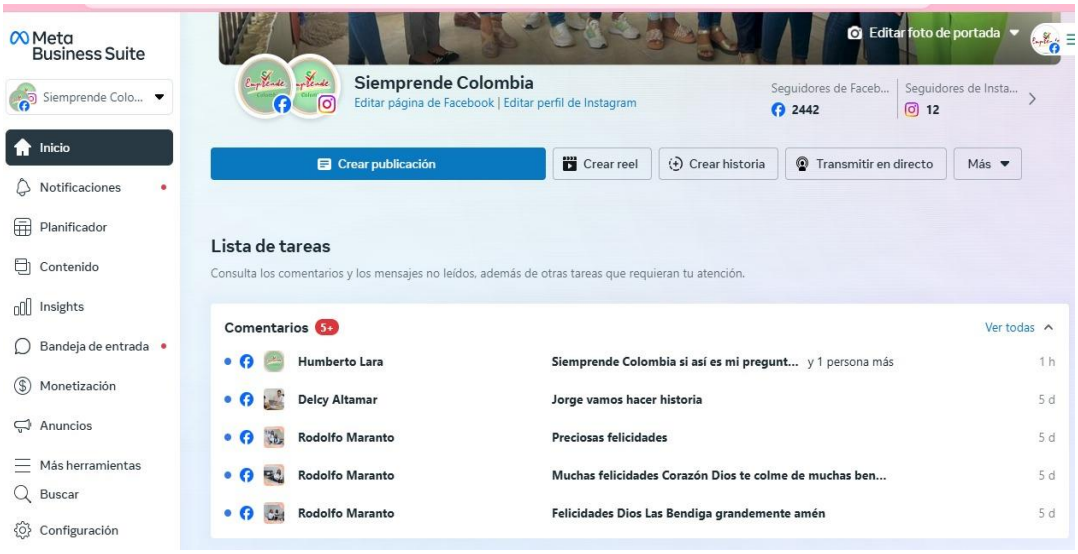

A la fecha, en la página de Facebook se han alcanzado nuevos 100 seguidores aproximadamente, y se han realizado 15 publicaciones en el Feed, incluyendo Videos, Fotografías, Posters y Reels (fijas en el panel de noticias) y 13 historias, las cuales cabe mencionar tiene una duración de publicación de 24 horas, y se borran de manera automáticas.

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

Entre las publicaciones realizamos: cambio de perfiles y de portada, publicación de videos de apertura de programa e inscripciones para ser parte del programa de SIEMPRENDE SANTA ROSA para el fortalecimiento y capitalización de este 2024, reiteración de las convocatorias; convocatorias del Sena y de actividades de emprendimiento en la alcaldía municipal de Santa Rosa.

Además de imágenes organizadas por áreas de trabajo para esta vigencia, y dos videos institucionales para la descripción por áreas de trabajo. Ya publicadas con los videos corporativos son las áreas: jurídica y de Fortalecimiento empresarial y de reactivación económica. Nos llegó un mensaje a la página de Facebook, donde por el alcance y la dinámica que se inició a través de las publicaciones, pudimos cumplir con algunos requisitos para realizar el proceso de monetización, el cual pudo concretarse.



En el marco del desarrollo de las funciones, hago el acompañamiento de actividades de las otras áreas, para la generación del contenido respectivo y de la posterior publicación. Entre las salidas realizadas asistimos a la ceremonia de graduación del programa técnico de Auxiliar de enfermería del Sena, que tuvo lugar en la cancha parque de la plaza principal.

El motivo de nuestra asistencia a esta actividad fue porque el programa SIEMPRENDE SANTA ROSA fue invitado especial y recibió un reconocimiento en agradecimiento a la disposición del programa por ayudarlos durante su proceso formativo.

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

Así mismo, realicé el acompañamiento de las actividades de sensibilización Estrategia de Liderazgo Transformador y Atención al público Estrategia de Liderazgo transformador, liderada por el área jurídica del programa y que se desarrollaron con los estudiantes de undécimo grado de las II.EE IETANSECAR e INEDUSARLI. Realizamos acompañamiento a las visitas de seguimiento del área psicosocial, jurídica y demás.

Realizamos la creación y habilitación de la plataforma del canal de YouTube SIEMPRENDE SANTA ROSA, la cual vamos actualizando con los video institucionales creados que también se publican en nuestras redes sociales. Esta plataforma, al igual que Instagram, es relativamente nueva, por consiguiente, aún tiene pocos suscriptores. Trabajaremos para promocionar las plataformas a fin de poder darla a conocer y tener mayor alcance.


Avanzamos además en la organización de los planes de estudios para los procesos de formación en los temas asignados al área de comunicación que son: Branding: Creación de marcas (logos), redes sociales (canales masivos de comercialización) y expresión oral -presentación personal. Estas han estado en continua revisión y actualización a fin de proporcionar a los emprendedores aprendices una formación optima y de alto impacto para ellos y sus unidades productivas.

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL “SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024”	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Actualización de redes sociales:

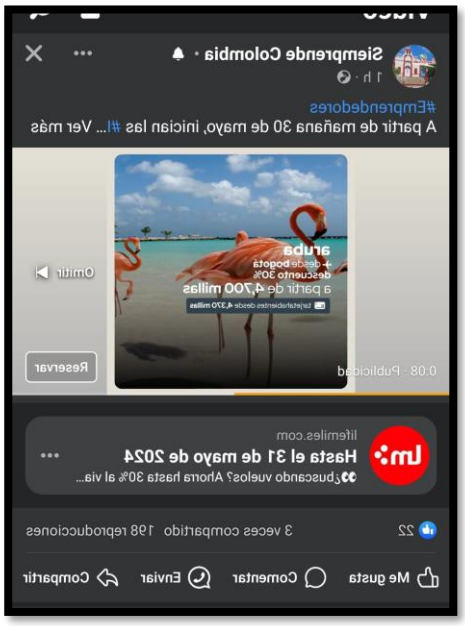



PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

Fotografia y diseño de presentación por áreas:







Acompañamiento a las actividades SIEMPRENDE

SANTA ROSA:



PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL “SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024”	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

Creación de poster publicitarios.





PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

MANEJO DE IMAGEN DEL PROGRAMA - ACTUALIZACION DE REDES SOCIALES



En cuanto a las redes sociales, continuamos con las publicaciones de las actividades realizadas desde el programa, en esta oportunidad la inducción a los emprendedores inscritos este 2024, así como el inicio de las capacitaciones en temas de emprendimiento. Además de las clases de la escuela de liderazgo juvenil.

En cuanto más podamos continuar publicando vamos generando mayor interactividad y aumento del alcance de las publicaciones. Pues ya en lo corrido llegamos a los 2511 seguidores en nuestra página de Facebook.

La publicación con mayor alcance fue el video realizado en el marco de la celebración de los 288 años de fundación del municipio de Santa Rosa, el cual obtuvo 4859 personas alcanzadas y una interacción de 599.

Continuamos también con los videos corporativos perfiles de las áreas del programa para este 2024. Ya son tres los publicados: área jurídica, área de emprendimiento y área psicosocial. Faltan tres videos de este tipo para abarcar todas las áreas.

Además, hemos avanzado en la solicitud de la creación del portal territorial y/o página web de SIEMPRENDE SANTA ROSA. La cual se realizó ante MINTIC y cuyo hosting ya se compró ante Cointer.co El dominio a utilizar seria: http//: www.siemprendecolombia.org.co.

Se diligenció también los formularios pertinentes para el mismo, siguiendo las indicaciones correspondientes al proceso; ya agotados todos los procedimientos,

solo nos resta esperar la validación de la información enviada para que nos autorice y habilite el uso del hosting y dominio.

ASESORÍA EN DISEÑO Y CREACIÓN DE LOGOS A EMPRENDEDORES

Se desarrolló la primera capacitación y asesorías a los emprendedores bajo el nombre "Branding: Creación de marca memorables". Un espacio donde se orientó a los emprendedores sobre la necesidad de construcción de una identidad y creación de una marca que la represente. Con criterios y valores específicos, elementos representativos y colores acorde al área de negocio.

Para ellos se brindó información sobre que es un logo, tipos de logos y cuál se puede adaptar mejor y/o aplicar mejor desde su misión y visión empresarial. Además, socializamos y compartimos el uso de la herramienta CANVAS como un aliado estratégico para la construcción de dicho logo.

Esta capacitación, que tuvieron lugar en la sede de SIEMPRENDE SANTA ROSA, durante los días 9 y 10 de julio, se dividió en dos sesione: una parte más estructural y teórica, donde se definieron los conceptos y la segunda sesión donde se desarrolló de manera práctica el uso de la herramienta CANVAS (desde el celular y pc).

Durante las jornadas de mañana y tarde, asistieron 98 emprendedores asistentes en total. Algunos de ellos se les ayudó en la construcción de su logo, obedeciendo a las indicaciones que ellos dieron (definiendo sus colores, elementos-formas-figuras etc.) Y a su vez, sirvieron como ejemplo para dar la clase del manejo de CANVAS.

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL “SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024”	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

REPORTAJES DE CASOS DE ÉXITO DEL PROGRAMA DE AÑOS ANTERIORES

En el marco del desarrollo de las obligaciones contractuales, específicamente en el desarrollo de las actividades de: "Reportajes de Casos De Éxito Del Programa De Años Anteriores", he propuesto, desde el área de comunicaciones, la realización de un programa institucional, que será transmitido en vivo a través de la página web de SIEMPRENDE SANTA ROSA, el cual se denomina "CASO DE ÉXITO SIEMPRENDE".

A través de este programa, se busca, además del objetivo principal que es evidenciar por medio de reportajes los casos de éxitos del programa, poder promocionarlos a ellos y promover la interactividad con nuestros seguidores, quienes son además potenciales emprendedores para nosotros y potenciales clientes para nuestros entrevistados.

Para el desarrollo de esta actividad se hace necesaria un incentivo para nuestra audiencia, a fin de que se mantengan conectados e interactuar con ellos. Este incentivo será a través del sorteo de regalos (productos y servicios), los cuales serán comprados al emprendimiento que se esté entrevistando.

De esta manera seguimos contribuyendo al crecimiento del emprendedor en la promoción de sus productos y/o servicios, al mismo tiempo que creamos alianzas estratégicas para nuestro crecimiento, obteniendo así un beneficio conjunto.


La meta de este objeto del contrato es de diez reportajes de caso de éxitos, los cuales se realizaría uno por semana (todos los jueves a las 2:00 pm, en el lugar del emprendimiento invitado.) Por lo cual se necesitaría diez incentivos de cincuenta mil pesos cada uno. El primero está programado para el jueves 18 de julio del 2024, a las 2:00 pm a través de la página de Facebook de SIEMPRENDE SANTA ROSA, con el emprendimiento de ASOFRUPA en la vereda de Paiva.

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL “SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024”	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Manejo de redes sociales



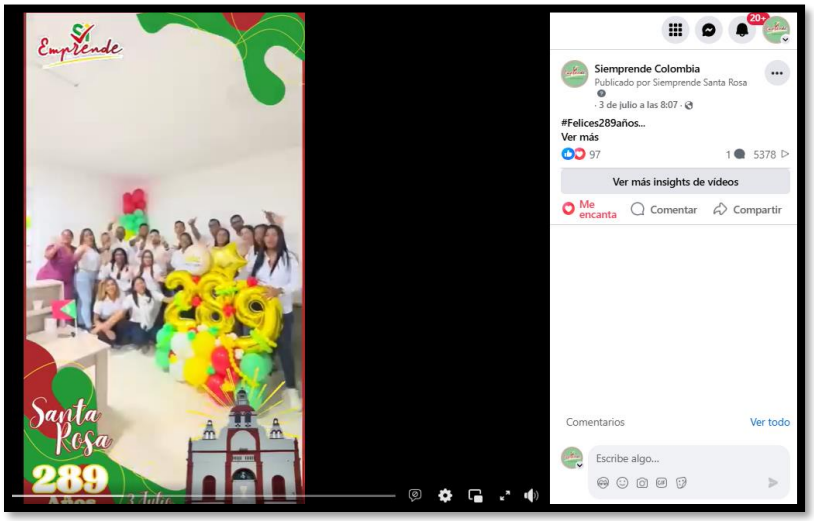

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL “SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024”	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

Asesoría de creación de logo






PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL “SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024”	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

Reportaje caso de éxito



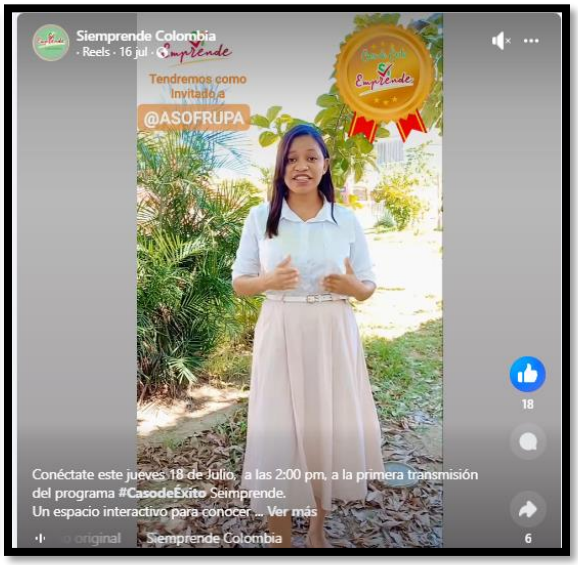

Acompañamiento a actividades de SIEMPRENDE SANTA ROSA





PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

ESCUELA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR

Diagnostico	Sensibilización Estrategia de Liderazgo Transformador	30	132	440%	**132%**
	Atención al Público Estrategia de Liderazgo Transformador	30	113	377%	
Asesorias	Asesoria Para la Identificacion de Lideres	30	36	120%	
	Asesoría Para el Trabajo en Equipo	30	36	120%	
	Asesoria en Mecanismos de Participacion Ciudadana	30		0%	
	Asesoría En Comunicación Verbal y Escrita	30		0%	
Acompañamiento y Seguimiento	Taller de Liderazgo Transformador (Juvenil, Social y Cultural).	3		0%	
	Visitas a Instituciones Educativas Para promover el Liderazgo Transformador	3		0%	

TRANSFERENCIA DE LA METODOLOGIA DEL PROGRAMA SIEMPRENDE.

En cumplimiento de esta actividad se llevó a cabo una reunión informativa y de socialización transferencia de la metodología con el equipo de talento humano del programa SIEMPRENDE SANTA ROSA.

En esta actividad se realizó la socialización de la ruta metodológica, las actividades a desarrollar y los entregables de cada área en particular, así como las funciones, los roles y responsabilidades de cada integrante del programa.

Asesoría en Liderazgo Transformador programa SIEMPRENDE SANTA ROSA, se desarrolló la primera asesoría a los jóvenes basada bajo el tema de liderazgo transformador, se les brindo la asesoría en donde se les socializo que es un líder, importancia de un líder, y las diferencias de un verdadero líder logrando que los jóvenes comprendan su rol como un líder en la sociedad.

SENSIBILIZACION ESTRATEGIA DE ESCUELA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR

Dentro de las actividades establecidas dentro de la estrategia de Escuela de Liderazgo Transformador, se llevó a cabo la socialización de la nueva línea de acción del programa Siemprende Santa Rosa 2024, denominada Escuela de Liderazgo Transformador.

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

Con esta actividad se buscó incentivar a los jóvenes estudiantes de grado once de las instituciones educativas del municipio de Santa Rosa, Bolívar: IETANSECAR e INEDUSARLI; a vincularse al novedoso proyecto del programa Siemprende Santa Rosa 2024, denominado Escuela de Liderazgo para Jóvenes, detallando y explicando el impacto positivo que dicho proyecto puede llegar a tener en sus vidas, contribuyendo a su crecimiento personal, social y académico.

Dentro de la estrategia Escuela de Liderazgo Para Jóvenes se brindó a los jóvenes una asesoría para el trabajo en equipo programa SIEMPRENDE SANTA ROSA.

Se desarrollo la segunda asesoría de trabajo en equipo donde se les brindo la asesoría bajo la socialización de la importancia de trabajar en equipo para logar resultados dentro de rol como líder o dentro su área social y comunitaria, y que diferenciaran la importancia de trabajo en grupo y la importancia del trabajo en equipo, donde asistieron 36 jóvenes inscritos a la Escuela de Liderazgo Transformador,

ATENCION AL PUBLICO ESTRATEGIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR

En cumplimiento de esta actividad se brindó atención a los jóvenes interesados en vincularse al novedoso campo de acción del programa SIEMPRENDE SANTA ROSA, a la estrategia denominada Escuela de Liderazgo Transformador.

Durante esta actividad se brindó orientación y guía para la inscripción de los jóvenes estudiantes de grado once de las instituciones educativas del municipio de Santa Rosa, IETANSECAR e INEDUSARLI; interesados en participar de la Escuela de Liderazgo Transformador del programa SIEMPRENDE SANTA ROSA.

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

Se llevo a cabo reunión de concertación con el coordinador de juventudes trazando metas y estrategias para fortalecer, estructurar y posicionar a la Escuela de Liderazgo Transformador como un programa nuevo innovador líder en el municipio.

Con esta reunión buscamos concretar una alianza estratégica con el fin de empezar a articular las distintas políticas municipales con la estrategia de la Escuela de Liderazgo Transformador del programa SIEMPRENDE SANTA ROSA, como un programa líder e innovador en esta materia en el municipio de Santa Rosa.

LOGROS/RESULTADOS O IMPACTOS ALCANZADOS.

1. Se lograron establecer escenarios de diálogos y comunicación entre los integrantes del equipo del programa SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024.
2. Se lograron desarrollar las dos primeras actividades correspondientes al entregable del contrato de manera eficiente y articulada, cumpliendo las metas establecidas.
3. Se lograron conocer en las dos asesorías desarrolladas ir identificando esos jóvenes líderes que serán seleccionados para el programa líder de Escuela de Liderazgo del programa SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024.
4. Se lograron desarrollar las dos primeras asesorías de manera exitosa y satisfactoria.

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL “SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024”	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL "SIEMPRENDE SANTA ROSA 2024"	
PERIODO: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2024.	FECHA ENTREGA:23 de julio 2024
PRIMER INFORME TECNÍCO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**CONV-AS-00-01 DE 2024 DEL 21 DE MAYO DE 2024**
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	**CONTRATISTA: FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ**

Se entrega el presente informe, a los veintitrés (23) días del mes de Julio de 2024.

Atentamente,

DIANA ROSA JIMENEZ JULIO
C.C. 45.543.343
