
DIAGRAMA DE GANTT "80 UNIDADES SANITARIAS ESPINO"

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**UNIDADES SANITARIAS ESPINO**	**325,9 días**	**sáb 20/01/24**	**lun 4/11/24**
2		**PRELIMINARES**	**325,9 días**	**sáb 20/01/24**	**lun 4/11/24**
3		LOCALIZACIÓN Y REPLANATEO OBRA ARQUITECTONICA	18 días	lun 5/02/24	mié 21/02/24
4		**CIMENTACIÓN Y DESAGUES**	**325,9 días**	**sáb 20/01/24**	**lun 4/11/24**
5		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (INVLUYE RETIRO)	19 días	dom 18/02/24	mié 6/03/24
6		CONCRETO CICLOPEO 14MPA (2000 PSI) RELACION 60C/40P	10 días	sáb 2/03/24	lun 11/03/24
7		CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPA SECCION RECTANGULAR va>	10 días	sáb 23/03/24	mié 10/04/24
8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA. XX 257ueva>	10 días	vie 3/05/24	dom 12/05/24
9		SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=2"	10 días	mar 9/04/24	vie 3/05/24
10		SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4	10 días	mar 9/04/24	vie 3/05/24
11		**ESTRUCTURAS**	**325,9 días**	**sáb 20/01/24**	**lun 4/11/24**
12		COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI)	15 días	mié 3/04/24	sáb 27/04/24
13		VIGA AMARRE 21 MPA -(3000 PSI)	15 días	vie 7/06/24	vie 21/06/24
14		VIGA AEREA 21 MPA (3000 PSI)	15 días	vie 21/06/24	jue 4/07/24
15		SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	30 días	dom 10/03/24	vie 5/04/24
16		**MAMPOSTERIA**	**325,9 días**	**sáb 20/01/24**	**lun 4/11/24**
17		LADRILLO ESTRUCTURAL PERFORACION VERTICAL	14 días	dom 26/05/24	vie 7/06/24
18		**PAÑETES**	**325,9 días**	**sáb 20/01/24**	**lun 4/11/24**
19		PAÑETE LISO MUROS 1:4	10 días	jue 4/07/24	sáb 13/07/24
20		**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**	**325,9 días**	**sáb 20/01/24**	**lun 4/11/24**
21		PUNTO HIDRAULICO DE 1/2 (Lavamanos, sanitario y ducha)	7 días	mar 9/04/24	jue 2/05/24
22		SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE 3/4	7 días	sáb 20/01/24	vie 26/01/24
23		PUNTO DESAGUES D=2"	7 días	mar 9/04/24	mié 1/05/24
24		PUNTO DESAGUES D= 4"	7 días	mar 9/04/24	mié 1/05/24
25		**INSTALACIONES ELECTRICAS LUMINARIAS -LAMPARAS -POSTES**	**325,9 días**	**sáb 20/01/24**	**lun 4/11/24**
26		SALIDA LAMPARA PVC COMPLETA	5 días	mar 9/04/24	mar 30/04/24
27		SALIDA TOMA GFCI PVC COMPLETA	5 días	mar 9/04/24	mar 30/04/24
28		PARCIAL EN RED CIRCUITO EXISTENTE A LA VIVIENDA 10	5 días	mar 17/09/24	sáb 21/09/24
29		**CAP.8:PINTURA**	**325,9 días**	**sáb 20/01/24**	**lun 4/11/24**
30		VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	10 días	mié 14/08/24	vie 23/08/24

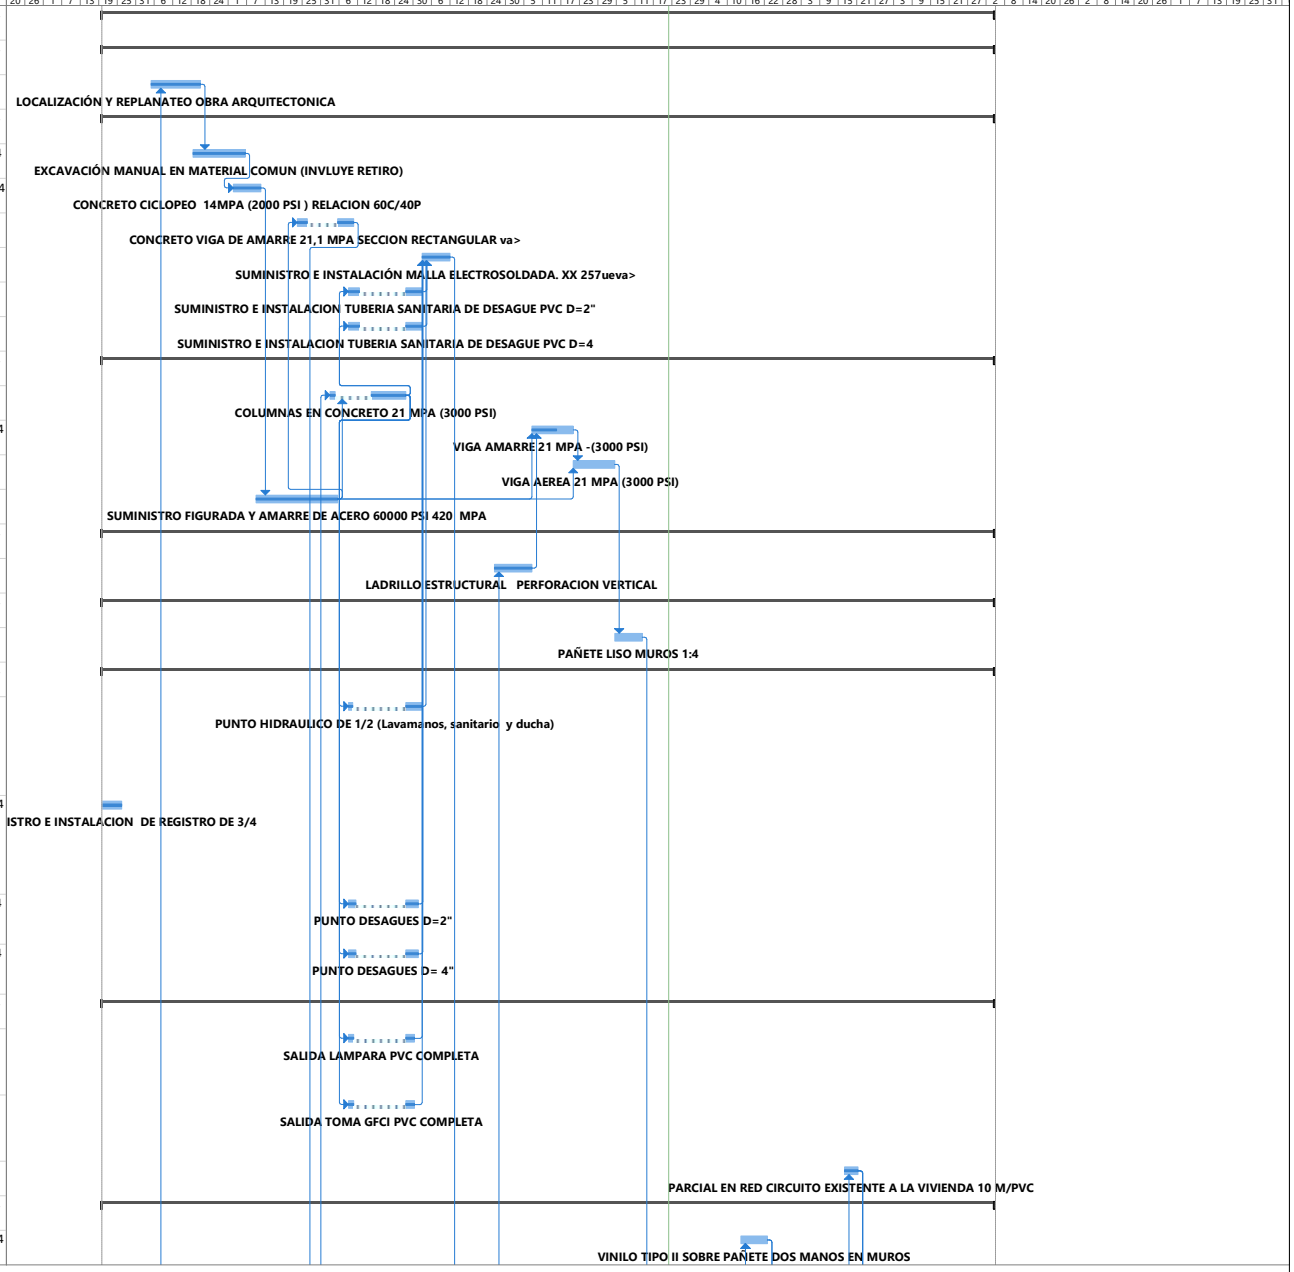


Proyecto: CRONOGRAMA DE O
Fecha: lun 22/07/24

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso

DIAGRAMA DE GANTT "80 UNIDADES SANITARIAS ESPINO"

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
31		**ENCHAPES**	**325,9 días**	**sáb 20/01/24**	**lun 4/11/24**
32		SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE OLIMPIA 20*20 SIMILAR (MURO)	8 días	vie 23/08/24	vie 30/08/24
33		MURETE DUCHA 0,10 *0,20 MTS	5 días	vie 30/08/24	mar 3/09/24
34		SUMINISTRO E INSTALACION DE REGILLA PLASTICA	5 días	mar 3/09/24	dom 8/09/24
35		**PISOS - BASES - ACABADOS**	**325,9 días**	**sáb 20/01/24**	**lun 4/11/24**
36	✓	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	10 días	sáb 30/03/24	jue 18/04/24
37	✓	PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.08 3000	10 días	dom 12/05/24	lun 20/05/24
38	✓	ALISTADO PISO E=0.04 MTS - 1:5	6 días	lun 20/05/24	dom 26/05/24
39		PISO CERAMICA 0,20*0,20	6 días	vie 23/08/24	mié 28/08/24
40		**CUBIERTA**	**325,9 días**	**sáb 20/01/24**	**lun 4/11/24**
41		PERFIL LSMINS (CORREAS) ASTM A653/ASTM A1011 CON	5 días	sáb 13/07/24	mié 17/07/24
42		TEJA ARQUITECTONICA ACESCO 0,80*2,44 ESPESOR 3MM CALIBRE	5 días	dom 4/08/24	jue 8/08/24
43		**CARPINTERIA METALICA**	**325,9 días**	**sáb 20/01/24**	**lun 4/11/24**
44		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=0.90 MTS CAL 18 INC.	6 días	jue 8/08/24	mié 14/08/24
45		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA	6 días	jue 8/08/24	mié 14/08/24
46		SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR. (CON	6 días	jue 8/08/24	mié 14/08/24
47		**APARATOS SANITARIOS**	**325,9 días**	**sáb 20/01/24**	**lun 4/11/24**
48		SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO	10 días	dom 8/09/24	mar 17/09/24
49		DUCHA SENCILLA	10 días	dom 8/09/24	mar 17/09/24
50		**VIDRIOS Y CERRADURAS**	**325,9 días**	**sáb 20/01/24**	**lun 4/11/24**
51		ESPEJO 4 MM SIN BICEL	12 días	dom 8/09/24	mié 18/09/24
52		**TANQUE DE ALMACENAMIE**	**325,9 días**	**sáb 20/01/24**	**lun 4/11/24**
53		SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE	20 días	mié 17/07/24	dom 4/08/24
54		**SISTEMA DE TRATAMIENT DE AGUAS RESIDUALES (TRAMPA DE GRASAS- CJA DE DISTRIBUCION SEPTICO-POZ ANAEROBICO**	**325,9 días**	**sáb 20/01/24**	**lun 4/11/24**
55		TRAMPA DE GRASAS	20 días	sáb 21/09/24	mié 9/10/24
56		CAJA DE DISTRIBUCI 250 litros	20 días	sáb 21/09/24	mié 9/10/24

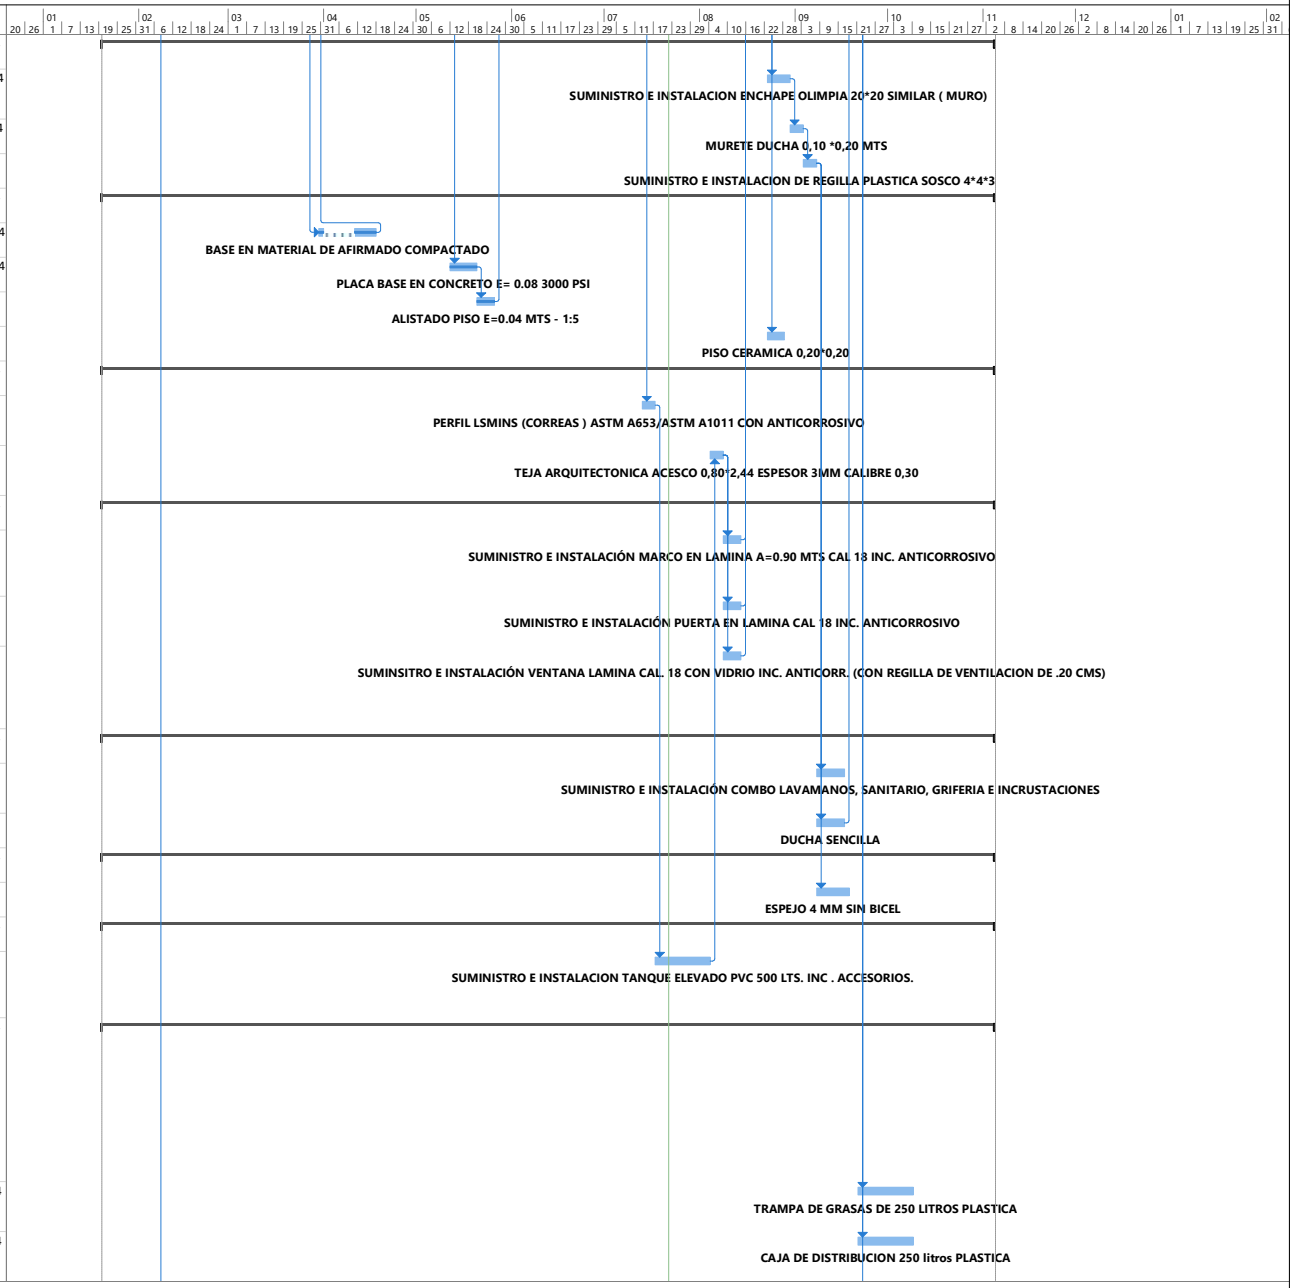


Proyecto: CRONOGRAMA DE O
Fecha: lun 22/07/24

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso

DIAGRAMA DE GANTT "80 UNIDADES SANITARIAS ESPINO"

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
57		POZO SEPTICO PREFABRICADO 2000 LITROS INTEGRADO (INLCUYE DOS TAPAS, JUEGO DE ACCESORIOS ENTRADA Y SALIDA, TUBU 4"	30 días	sáb 21/09/24	vie 18/10/24
58		CAMPO DE FILTRACION TUBERIA DRENAJE 4" INCLUYE	20 días	vie 18/10/24	lun 4/11/24
59		**TRANSPOR**	**20 días**	**sáb 20/01/24**	**mar 6/02/24**
60		TRANSPO A SITIO DE CADA UNIDAD	20 días	sáb 20/01/24	mar 6/02/24
61			1 día	sáb 20/01/24	dom 21/01/24

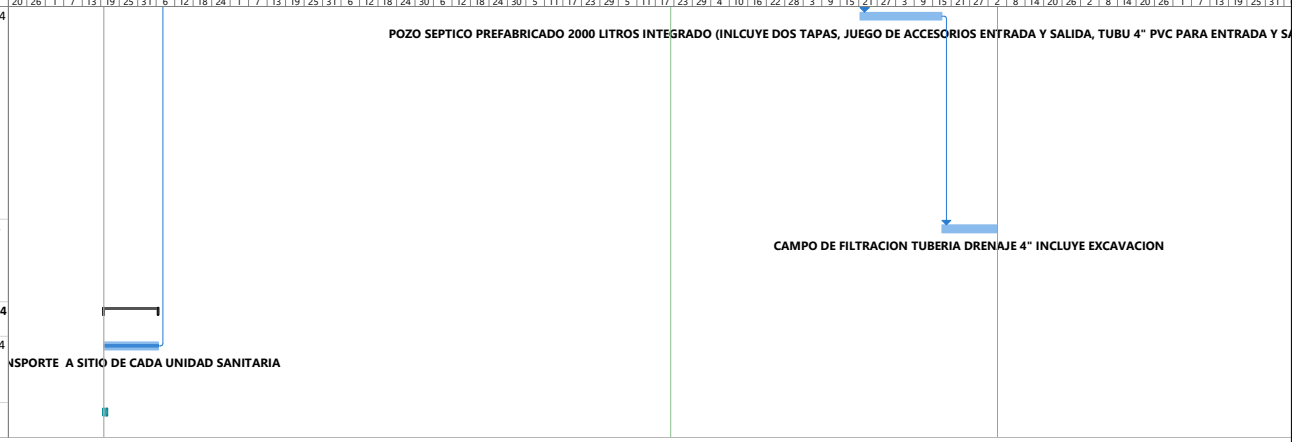

Proyecto: CRONOGRAMA DE O
Fecha: lun 22/07/24

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Progreso manual		
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite			
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso			
