MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BASPA 25	INFORME DE SUPERVISIÓN No. (03) (LAPSO 28 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2023)
	FECHA DEL INFORME: 28 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 182 -CENACAVIACIÓN-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 24 DE JULIO 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA", CELEBRADO CON LA EMPRESA GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA CON NIT NO. 901298546-7)

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	PRECIO UNITARIO
1	41114410	1702788	6660-00- 168-0280	EQUIPO DE METEOROLOGÍ A AERONÁUTICA	1	UNO	$259.663.865,5 5	$49.336.134,45	$309.000.000,00

2. VALOR DEL CONTRATO: TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE

VIGENCIA 2023: TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE, ($309.000.000,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS O DOLARES)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL PESOS
PRINCIPAL	$ 309.000.000,00	N/A	$309.000.000,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION No X	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	**$ 309.000.000,00**	**N/A**	**$309.000.000,00**

- SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago TOTAL	2023	$ 309.000.000,00					0,00	$ 309.000.000,00
TOTAL SALDO ACUERDO								
TOTAL ADICION								
TOTAL		$ 309.000.000,00					0,00	$ 309.000.000,00

Powered by CamScanner

- **RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION RELOJES	2023	8923	16-feb-23	92423	27-jul-23	$ 309.000.000,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$ 309.000.000,00**

- **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: El plazo máximo de ejecución del contrato es el 30 de noviembre del año 2023.

NOTA: A la fecha no se han recibido bienes y/o servicios objeto del contrato.

- **BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS**

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION RELOJES	10	CSF	**$ 309.000.000,00**	0,00	$0,00	**$ 309.000.000,00**
TOTAL RUBRO CRP			**$309.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**$ 309.000.000,00**

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA		0,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		0,00
PENDIENTE POR RECIBIR		**$309.000.000,00**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$309.000.000,00**

- **RESUMEN DE PÓLIZAS**

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No. 18-44-101091061 Anexo 0**
Aseguradora: **Seguros del Estado NIT.860.009.578-6**
Fecha de expedición: 25-**JULIO-2023**
Fecha certificado de aprobación: **28-JULIO-2023**
Fecha de aprobación: **28-JULIO-2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	24/07/2023	31/05/2024	92.700.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	24/07/2023	30/11/2026	15.450.000,00
Calidad y Correcto Funcionamiento del bien (*)	SI AMPARA 1 AÑO, 0 MESES, 0 DIAS		92.700.000,00

Nota: Este amparo inicia una vez finalizado el contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción de los bienes y/o servicios.

Garantía única de Responsabilidad Civil Extracontractual **No. 18-40-101067098 Anexo 1**
Aseguradora: **Seguros del Estado NIT.860.009.578-6**
Fecha de expedición: **25-JULIO-2023**

Powered by CamScanner

Fecha certificado de aprobación: **28-JULIO-2023**
Fecha de aprobación: **28-JULIO-2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	24/07/2023	30/11/2023	232.000.000,00
Contratistas y Subcontratistas	24/07/2023	30/11/2023	232.000.000,00
Responsabilidad civil patronal	24/07/2023	30/11/2023	232.000.000,00

- **TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- Se le pide un informe a la EMPRESA GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA del estado de ejecución de los equipos y las pruebas realizadas.


- El día 19/10/2023 se recepciona informe solicitando el estado de ejecución de los equipos de "METEOROLOGÍA AERONÁUTICA" por parte de la EMPRESA GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA, donde adjunta: tabla para configuración del sistema, 04 imágenes de los equipos e imagen de la prueba de conexión del sistema meteorológico AWOS.
- Se pide informe de ejecución con avances en los equipos y registro fotográfico del despecho de los equipos.
- Se pide documento de guía de exportación de los equipos hacia Colombia para llevar control del desplazamiento de estos.

- **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 309.000.000,00	0 %	0 %

- **CRONOGRAMA DE EJECUCION**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
1		**CONTRATO 182 CENACAVIACIÓN 2023**	**137 days**	**5 Jul '23**	**18 Nov '23**
2		Inicio	0 days	5 Jul '23	5 Jul '23
3		Visita de replanteo	1 day	5 Jul '23	5 Jul '23
4		Firma del acta de inicio	1 day	28 Jul '23	28 Jul '23
5		Inicio y finalización de la Fabricación de todos los equipos.	49 days	29 Jul '23	15 Sep '23
6		Inicio y finalización instalacion de Software GECI MET	5 days	18 Sep '23	22 Sep '23
7		Despacho de los equipos hacia Colombia y recepción de los equipos en la ADUANA en Colombia	10 days	16 Sep '23	25 Sep '23
8		Nacionalización de los equipos y recepción en el sitio de instalación - Base militar tolemaida	15 days	26 Sep '23	10 Oct '23
9		Inicio y finalizacion de instalación de los equipos y obra civil	30 days	11 Oct '23	9 Nov '23
10		Inicio y finalizacion Entrenamiento en sitio - OJT	7 days	10 Nov '23	16 Nov '23
11		Recepcion final supervisor	1 day	17 Nov '23	17 Nov '23
12		Radicación facturaCENACAVIACION	1 day	18 Nov '23	18 Nov '23
13		Fin	0 days	18 Nov '23	18 Nov '23

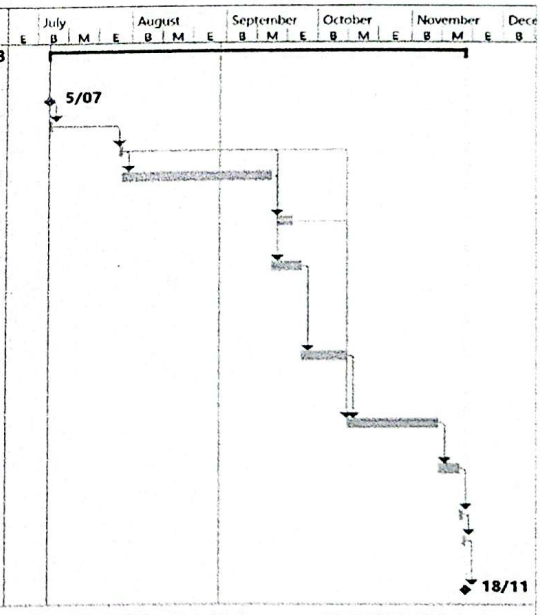

Project: Cronograma contrato 1
Date: 30 Aug '23

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | Inactive Task | Inactive Milestone
Inactive Summary | Manual Task | Duration only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only
External Tasks | External Milestone | Deadline | Critical | Critical Split | Progress | Manual Progress

Page 1

Powered by CamScanner

- **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

- Se toma contacto con la señora CLAUDIA MARIA OLIVEROS ZAPATA identificada con cedula de ciudadanía No. 31.421.106 representante legalmente de la EMPRESA GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA con NIT NO. 901298546-7; Refiriendo que tenía retrasos en la nacionalización de los equipos.
- Por lo anterior se le pide un informe a la EMPRESA GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA del estado de ejecución de los equipos.

- **ANEXOS AL INFORME**

- Cronograma de actividades

ST. MONTILLA PARRA DANIELA CATALINA
Cargo: Comandante de Pelotón BASPA25
Supervisor Contrato No. 182-CENACAVIACIÓN-2023
Celular:3214049343

Powered by CamScanner
