
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	
OBJETO DEL INFORME	Informe de supervisión Convenio No. 20233707
NOMBRE DEL PROYECTO	Convenio Interadministrativo No. 20233707
FECHA DEL INFORME	01 de Abril de 2024 al 30 de Abril de 2024
PERSONAL QUE ADELANTA EL INFORME - SUPERVISOR	**Mayor. German Albeiro Quevedo García** **Supervisor Convenio Interadministrativo No.20233707**
II. DATOS GENERALES DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
CONVENIO O CONTRATO N°	Convenio Interadministrativo No. 20233707
INTERVINIENTES	Alcaldía Municipal de Pasto Brigada de Ingenieros de Construcciones **Batallón de Ingenieros de Construcción No.52 "General. Francisco Tamayo Cortes"**
OBJETO DEL CONVENIO	"Anuar esfuerzos técnicos administrativos y financieros, entre el municipio de Pasto y el Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional – Comando de Ingenieros – Brigada de Ingenieros de Construcciones – Batallón de Ingenieros de Construcciones No.52 (BICON52) a través de la CENAC – ING, con el fin de realizar mantenimiento y mejoramientos en la vías urbanas y rurales de la ciudad de San Juan de Pasto – Nariño".
CANTIDAD A EJECUTAR	Mantenimiento y reparación estructura pavimento rígido y flexible (Longitud 1078,7 m), intervención vías rurales Longitud (77,800 m).
UNIDAD EJECUTORA	Batallón de Ingenieros de Construcciones No.52 "Gral. Francisco Tamayo Cortes" (BICON52)
POBLACION BENEFICIADA	La población que se beneficiara con el proyecto de "mantenimiento y mejoramiento de la malla vial rural vigencia 2023 del municipio de Pasto, el cual se planea ejecutar mediante un convenio interadministrativo, se estima en 26.888 personas beneficiadas de manera directa, en los corregimientos de Calambuco, Jongovito, Gualmatan, Abonuco y Mapachico.

FECHA DE SUSCRIPCION	27 de Junio de 2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 2.637.247.844,00 millones de pesos**
FECHA DE ACTA DE INICIO	13 diciembre de 2023
FECHA DE ENTREGA	29 de Noviembre de 2024
MODIFICATORIOS	Prorroga el convenio hasta 29 de noviembre 2024,a partir del vencimiento del convenio principal es decir desde el 1 de enero de 2024 hasta el 29 de noviembre de 2024

III. UBICACIÓN DEL PROYECTO

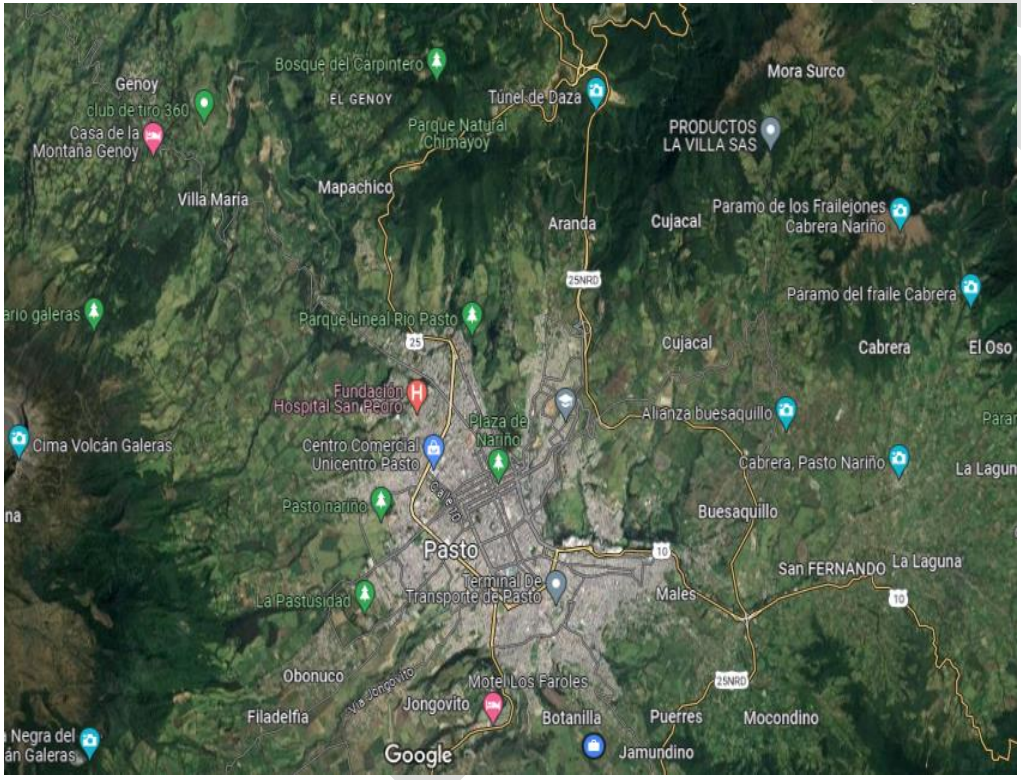

"Las actividades se llevarán a cabo en el departamento de Nariño, específicamente en el casco urbano de la ciudad de Pasto y en 8 veredas cercanas a la misma."

IV. INFORMACION JURIDICA

Se han llevado a cabo dos comités técnicos operativos donde se han identificado diversas necesidades de documentación (actas de vecindad y socializaciones de las áreas de intervención)

V. INFORMACIÓN FINANCIERA

RELACIÓN DE TODOS LOS CONTRATOS GENERADOS POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y SU ESTADO

1. RELACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL OBRA, BIENES Y SERVICIOS	VALOR OBRA, SUMINISTRO Ó BIEN	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINO	CONTRATO	POLIZA	APROB. POLIZA	ACTA DE INICIO	PAGADO
20234397	AB Y AR SAS	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR - ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y MATERIALES DE SEGURIDAD VIAL	$ 99.500.000	23 de noviembre de 2023	29 de noviembre de 2024	SUMINISTRO	41-44101277537	SI	901072140	$ 20.090.770
20234397	PANAVIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA	MATERIALES PETROS Y CONCRETOS	$ 625.000.000	23 de noviembre de 2023	29 de noviembre de 2024	SUMINISTRO	21-44-101431475	SI	891201840-6	$ 40.865.800
119015	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL BANCO DE MAQUINARIA, VEHICULOS DE CARGA Y OTROS PERTENECIENTES AL EJÉRCITO NACIONAL EN DESARROLLO DEL CONVENIO	$ 94.328.500	02 de noviembre de 2023	29 de noviembre de 2024	SUMINISTRO	2051196	SI	NO	$ 12.294.902

BORRADOR

20240584	RIGOBERTO LEON REALPA	APOYO TECNICO (MAESTRO Y MECANICO)	$ 3.800.000	19 de Enero de 2024	29 de febrero de 2024	PRESTADOR DE SERVICIOS	NO	NO	12970228	$ 3.800.000
20240642	MARIO FERNANDO CUCHALA JOJOA	APOYO TECNICO (MAESTRO Y MECANICO)	$ 5.000.000	19 de Enero de 2024	29 de febrero de 2024	PRESTADOR DE SERVICIOS	NO	NO	1085287108	$ 5.000.000
20234638	ANGELA GABRIELA ENRRIQUEZ ARROYO	PERSONAL PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUPERVISION	$ 2.500.000	12 de disiembre de 2023	31 de disiembre de 2023	PRESTADOR DE SERVICIOS	NO	NO	NO	$ 2.500.000
20240582	JORGE ALEXANDER DIAZ VARGAS	PERSONAL PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUPERVISION	$ 5.000.000	15 de enero de 2024	29 de febrero de 2024	PRESTADOR DE SERVICIOS	NO	NO	87061355	$ 5.000.000
20234424	MARÍA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE PARTES, REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES	$ 158.980.000	20 de noviembre de 2023	29 de noviembre de 2024	SUMINISTRO	41-44101277500	SI	1085295821	$ 42.871.200
			$ 994.108.500							**$ 132.422.672**

2. MATERIAL RECIBIDO

A continuación, se relacionan **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- UNIDAD EJECUTORA** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista **ST. CORTES GÓMEZ DIEGO MAURICIO** de acuerdo al concepto técnico:

NO.	ELEMENTO	ORDEN DE COMPRA/CONTRATO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE MOTOR 15W40	20234424	GAL	36	$ 98.000,00	$ 3.528.000,00
2	ACEITE MOTOR 15W40	20234424	GAL	41	$ 98.000,00	$ 4.018.000,00
3	ACEITE MOTOR 20W50	20234424	GAL	55	$ 118.000,00	$ 6.490.000,00
4	ACEITE HIDRAULICO ISO68	20234424	GAL	39	$ 85.000,00	$ 3.315.000,00

BIGONE2

5	ACEITE 80W90	20234424	GAL	40	$	115.600,00	$	4.624.000,00
6	GRASA KP 2 G 40 (EP2)	20234424	LB	10	$	32.000,00	$	320.000,00
7	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO BF970 BALDWIN	20234424	UND	1	$	89.600,00	$	89.600,00
8	FILTRO AIRE PRIMARIO RS3544 BALDWIN	20234424	UND	3	$	310.600,00	$	931.800,00
9	FILTRO AIRE SECUNDARIO RS3545 BALDWIN	20234424	UND	3	$	227.900,00	$	683.700,00
10	FILTRO ACEITE BT339 BALDWIN	20234424	UND	1	$	89.600,00	$	89.600,00
11	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO TIPO CARTUCHO PF7748 BALDWIN	20234424	UND	6	$	180.600,00	$	1.083.600,00
12	FILTRO AIRE PRIMARIO RS4862 BALDWIN	20234424	UND	3	$	376.200,00	$	1.128.600,00
13	FILTRO AIRE SECUNDARIO RS4863 BALDWIN	20234424	UND	3	$	435.200,00	$	1.305.600,00
14	FILTRO HIDRAULICO B5134 BALDWIN	20234424	UND	3	$	78.900,00	$	236.700,00
15	FILTRO ACEITE BD7154 BALDWIN	20234424	UND	3	$	321.300,00	$	963.900,00
16	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO BF1226 BALDWIN	20234424	UND	1	$	125.600,00	$	125.600,00
17	FILTRO AIRE PRIMARIO PA2474 BALDWIN	20234424	UND	1	$	564.500,00	$	564.500,00
18	FILTRO AIRE SECUNDARIO PA2836 BALDWIN	20234424	UND	1	$	345.600,00	$	345.600,00
19	FILTRO HIDRAULICO BT 9422 BALDWIN	20234424	UND	1	$	538.600,00	$	538.600,00
20	FILTRO ACEITE P502465 DONALSSON	20234424	UND	1	$	135.600,00	$	135.600,00
21	FILTRO ACEITE OLP-014	20234424	UND	1	$	61.500,00	$	61.500,00
22	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO FLP-340	20234424	UND	1	$	23.500,00	$	23.500,00
23	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO FLP-317	20234424	UND	1	$	24.600,00	$	24.600,00
24	FILTRO AIRE PRIMARIO AIP-543	20234424	UND	1	$	94.300,00	$	94.300,00
25	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO FLP-472 OILO FILTERS (CAMIONETA DMAX)	20234424	UND	1	$	68.600,00	$	68.600,00
26	FILTRO AIRE PRIMARIO AIP-961 OIL FILTERS (CAMIONETA DMAX)	20234424	UND	1	$	42.600,00	$	42.600,00
TOTAL							**$**	**30.833.100,00**

BICON52

NO.	ELEMENTO	ORDEN DE COMPRA/CONTRATO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 18" MIXTO	20234397	UND	9	$ 500.000,00	$ 4.500.000,00
2	PALA CUADRADA # 4	20234397	UND	3	$ 48.000,00	$ 144.000,00
3	KIT DE SEÑALIZACION (CONO, PALETAS)	20234397	UND	1	$ 203.000,00	$ 203.000,00
4	GAFAS DE PROTECCION	20234397	UND	12	$ 13.000,00	$ 156.000,00
5	TAPAOIDOS	20234397	UND	9	$ 7.000,00	$ 63.000,00
6	CIMBRA	20234397	UND	1	$ 9.000,00	$ 9.000,00
TOTAL						**$ 5.075.000,00**

ITEM	ELEMENTO	ORDEN DE COMPRA	MEDIDA	CANTIDAD
1	COMBUSTIBLE ACPM	119015	GALON	693
2	COMBUSTIBLE GASOLINA		GALON	16
TOTAL				**709**

3. DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL CONVENIO O CONTRATO N° 20233707

A la fecha se ha cancelado lo siguiente:

DESEMBOLSOS EFECTUADOS	CONCEPTO	FECHA	VALOR
PAGO N° 1	OMITIDO	OMITIDO	$ 0
TOTAL			**$ 0**

4. BALANCE CONTRACTUAL

ITEM	FECHA	VALOR
VALOR TOTAL CONTRATO Y/O CONVENIO	30 ABRIL DE 2024	$ 2.637.247.844
VALOR DISPONIBLE OBRA		$ 2.504.825.172
VALOR COMPROMETIDO		$ 0
VALOR POR COMPROMETER		$ 0
TOTAL, CONTRATOS		8

VI. INFORMACIÓN TECNICA


Para el presente mes el Batallón de Ingenieros de Construcciones No.52 “Gral. Francisco Tamayo Cortes” realizó las siguientes actividades:

- **NO SE REALIZAN ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.**

Se continua con las actividades de ejecución del convenio de acuerdo a la presentación de la línea de tiempo (programación en Project) donde se discrimina las **ACTIVIDADES PRELIMINARES Y CONSTRUCTIVAS** que se contemplan proyectadas dentro de la ejecución del convenio N°20233707 con fecha de culminación el 29 de noviembre del 2024, Así:

- **A EJECUTAR: 0 METROS**
- **EJECUTADO: 0 METROS**
- **% EJECUTADO** = 71,5
- **VR. EJECUTADO =** $ 132.422.672

PROGRAMACION DE OBRA CONVENIO N°20233707 PASTO – NARIÑO

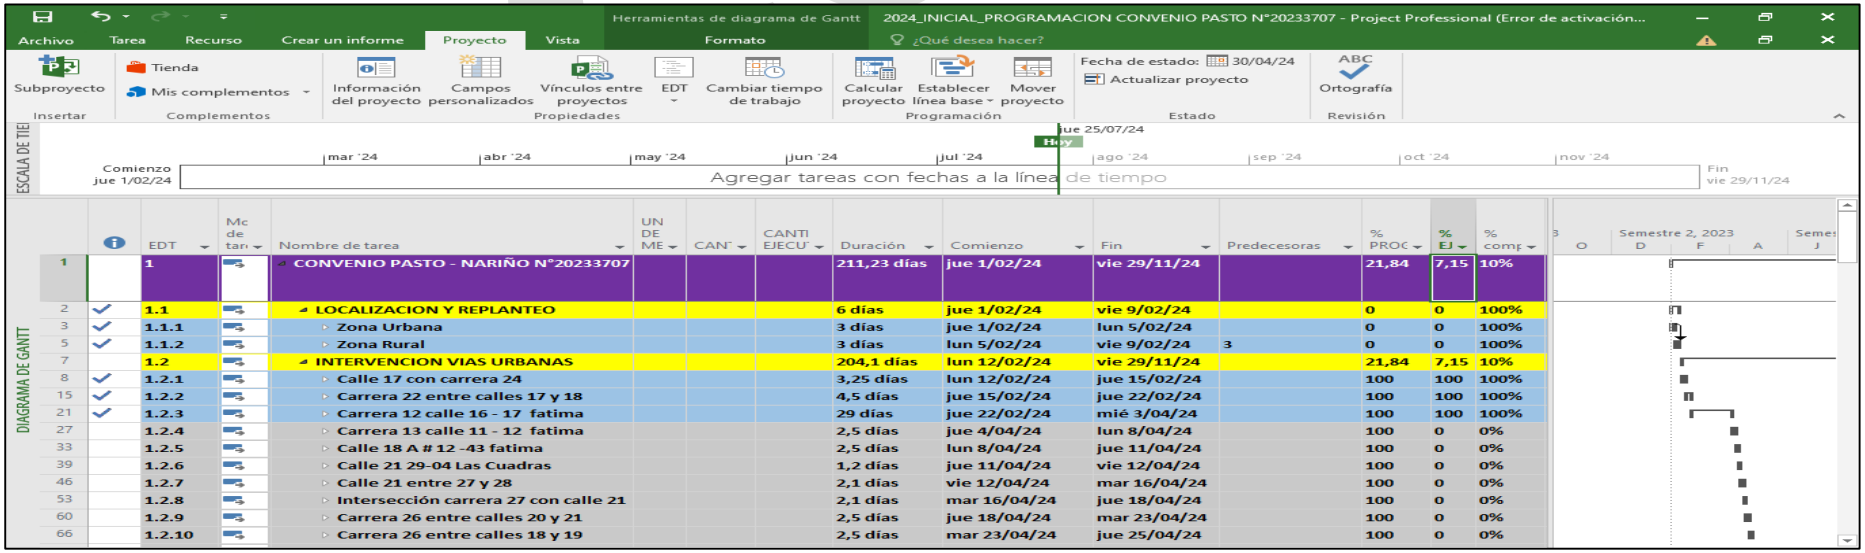

VII. EVIDENCIAS VISUALES

RESEÑA FOTOGRÁFICA	DESCRIPCIÓN
	Se realizan mesas técnicas de trabajo con la Alcaldía de Pasto – Nariño con la finalidad de verificar la contratación derivada del convenio y la firma de un posible modificatorio del convenio.

VIII. INFORMACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Omitido

IX. INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

La Alcadia de Pasto- Nariño entrego certificaciones donde especifica que los residuos sólidos provenientes de la reposición de pavimentos o excavaciones de los tramos viales incluidos en el mantenimiento y mejoramiento de la malla vial urbana se dispondrán en las escombreras que se encuentran legalizadas y disponibles para su disposición final.

La Alcadia de Pasto- Nariño certifico que no se generan residuos sólidos diferentes a la disposición de material sobrante producto de excavaciones las cuales ya están definidas en su disposición final, por tanto no se requiere la intervención de las empresas de servicio público.

X. INFORMACIÓN SALUD OCUPACIONAL - SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIONES REALIZADAS				
ACTA N°	**FECHA**	**TEMA**	**CANTIDAD PERSONAL CAPACITADO**	**OBSERVACIONES**
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

BIGON52

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
ELEMENTO ENTREGADO	**FECHA**	**CANTIDAD**	**PERSONAL QUE RECIBE EPP**	**TIPO (PRIMERA VEZ O REPOSICIÓN)**	**OBSERVACIONES**
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO
ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO					
FECHA	**TIPO (ACCIDENTE O INCIDENTE)**	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**PERSONAL AFECTADO**	**MEDIDA CORRECTIVA**
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

XI. CONSIDERACIONES ESPECIALES

Se solicita a la Alcaldía de Pasto – Nariño se proyecte el modificatorio del convenio.

XII. CONCLUSIONES

Se solicita reconsideración de los contratos derivados no adjudicados como papelería, escombreras y computo.

XIII. RECOMENDACIONES

Se ha solicitado a la Alcaldía de Pasto – Nariño que suministre la entrega del paquete técnico (DISEÑOS Y MEMORIAS DE CALCULO) avalado para garantizar la ejecución del convenio.

personal involucrado.

FIRMA _____

ST. CORTES GÓMEZ DIEGO MAURICIO
ING. RESIDENTE DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°20233707

FIRMA _____

MY. QUEVEDO GARCÍA GERMAN
SUPERVISOR DE LA OBRA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°20233707
