Bogotá D.C., julio 09 de 2024

Señor(a)
ALBA MARINA GONZÁLEZ HIDALGO
Supervisor Contrato No. CPS-620-2023
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**
Bogotá D.C.

***Referencia:*** *Contrato No. CPS-620-2023, cuyo objeto es: " INV-C-12 PRESTAR EL SERVICIO DE FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA CONDUCCIÓN DE AUTOMOTORES DE CATEGORÍA A2, C1 O C2 PARA MUJERES EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS: 2111 KENNEDY POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y 2079 KENNEDY CUIDADORA; Y PARA PERSONAS QUE CONFORMAN Y/O REPRESENTAN A LAS MIPYMES Y/O EMPRENDIMIENTOS DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2061 KENNEDY PRODUCTIVA".*

***Asunto****: Solicitud de Prorroga – Contrato No. CPS-620-2023*

PEDRO ANTONIO AVILA MONDRAGON, identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.533.691 de Bogotá, obrando en su calidad de representante legal de **VISION & PROYECTOS S.A.S.**, por medio de la presente de forma respetuosa en el marco de ejecución del contrato CPS-620-2023, solicitamos modificación contractual de la cláusula “TERCERA – PLAZO DE EJECUCION” en el sentido de prorrogar el contrato, en los siguientes términos:

**1. ANTECEDENTES:**

- El 11 de agosto de 2023, VISION & PROYECTOS S.A.S. y el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY, celebraron el Contrato No. CPS-620-2023 cuyo objeto es: " INV-C-12 PRESTAR EL SERVICIO DE FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA CONDUCCIÓN DE AUTOMOTORES DE CATEGORÍA A2, C1 O C2 PARA MUJERES EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS: 2111 KENNEDY POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y 2079 KENNEDY CUIDADORA; Y PARA PERSONAS QUE CONFORMAN Y/O REPRESENTAN A LAS MIPYMES Y/O EMPRENDIMIENTOS DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2061 KENNEDY PRODUCTIVA".

- El 11 de septiembre de 2023, se firmó acta de inicio del contrato CPS-620-2023.

- La cláusula “TERCERA – PLAZO DE EJECUCION” del contrato CPS-620-2023, establece como termino de ejecución el pazo de ocho (8) meses a partir de la suscripción del acta de inicio.

- Que el 09 de febrero de 2024 se firmó solicitud de modificación del Contrato de Prestación de Servicios No. 620-2023, con el fin de:

  1. Adicionar al valor del contrato CPS-620-2023, la suma de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000).

  2. Extender la ejecución del contrato por tres (3) meses, contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo pactado: es decir, desde el 11/05/2024 hasta el 10/08/2024.

Socialmente responsables

## 2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

VISIÓN & PROYECTOS ha ejecutado las actividades contractuales de forma debida, cumpliendo con los entregables descritos en el anexo técnico. A continuación, se detallan las etapas y fases ejecutadas por nuestro equipo de trabajo:

**Etapa 1. Alistamiento, convocatoria e inscripción:**

**Fase I. Alistamiento:** teniendo en cuenta el anexo técnico se generó el plan de trabajo que permitió lograr las metas de cobertura de la población objeto, se creó la guía operativa con los requisitos, puntaje habilitante, documentos a presentar para cada categoría de licencia (A2, C1, C2). Se estableció el plan de trabajo.

**Fase II. Convocatoria:** a partir de una estrategia de divulgación amplia, a través de redes sociales, se publicó la guía operativa, los espacios de información e inscripción.

Durante el período de convocatoria del proceso fue necesario extenderlo, debido a la saturación de la plataforma de la Secretaría Distrital de Gobierno para emitir los certificados de residencia, requisito fundamental para participar en esta segunda edición del proyecto. La causa de esto fue el desarrollo simultaneo de cuatro procesos de fortalecimiento que estaba ofertando el FDLK para beneficio de la comunidad, lo que generó retrasos en el tiempo de generación de los certificados, por la demanda excesiva en la infraestructura física de la Alcaldía Local de Kennedy y de la plataforma virtual de la Secretaría teniendo en cuenta que la convocatoria tuvo un alcance de 8.265 personas.

**Fase III. Inscripción:** Recepción y revisión preliminar de documentos en los puntos establecidos, los cuales se realizaron en la Alcaldía Local de Kennedy y de manera virtual en el enlace al formulario de inscripción dispuesto para ello para la inscripción de 8.265 personas.

**Etapa 2. Selección y evaluación:** una vez seleccionadas las mujeres, emprendimientos y mipymes, se procede a realizar una evaluación de cumplimiento de requisitos y puntaje a otorgar que permita la clasificación de beneficiarios, los cuales fueron clasificados en dos grupos así:

> **Para MiPymes y emprendimientos:** dirigido a 524 personas que conforman, hacen parte, desarrollan y/o representan a las MiPymes y/o emprendimientos de la Localidad de Kennedy interesados en participar en el proceso.
>
> **Para mujeres:** dirigido a 263 mujeres cuidadoras, mujeres vulnerables, así como mujeres que hacen parte de procesos organizativos priorizadas de la localidad de Kennedy.

Durante la etapa de selección y evaluación se presentaron retrasos en la presentación del listado de mujeres, emprendimientos y MiPymes seleccionados como beneficiarios, debido a las múltiples dificultades para contactar a las mujeres y representantes de los emprendimientos y MiPymes que se postularon en el proyecto, esto por la temporada navideña y las vacaciones de inicio de año, durante las cuales muchas las personas estaban inmersas en sus actividades comerciales que usualmente son más altas en diciembre, como también en actividades recreativas y de descanso. Dificultando el contacto con los representantes de las unidades económicas postuladas para llevar a cabo la subsanación de documentos, actividad esencial dentro del proceso, para garantizar una selección de mujeres, emprendimientos y MiPymes acorde a los criterios técnicos definidos en el proyecto.

**Etapa 3. Inscripción al RUNT y examen médico:** en este punto del proceso los y las beneficiarias recibieron el acompañamiento para el trámite de inscripción al RUNT y posteriormente se realizaron los exámenes médicos a las 787 personas beneficiarias del proyecto, con el acompañamiento del personal a cargo.



Tel: (57) (1) 218 1316
Móvil: (57) 318 248 0550
Info@visionyproyectos.com
www.visionyproyectos.com
Calle 98 A # 51 - 72 Oficina 501
Bogotá D.C. - Colombia

**Etapa 4. Formación: esta fase se compone de dos etapas:**

**Fase I. Formación en conducción:** en esta etapa se incluye el aprendizaje para el desarrollo, aprobación y posterior certificación de los cursos de conducción para automotores de categoría A2 a 130 beneficiarios de los cuales a la fecha 98 personas culminaron el curso de conducción; para la categoría C1 dirigida a 637 beneficiarios, culminaron 537 personas; y para la categoría C2 dirigida a 20 beneficiarias, culminaron 17 personas. Lo cual representa un avance del 85%. Dichos cursos son impartidos por los -CEA- aprobados.

Durante esta etapa, se debieron realizar el reemplazo de 26 beneficiarios, entre los cuales se encuentran personas que desertaron del proceso y/o no fueron aptos para el curso de conducción, situación que genero reprocesos en este ciclo de formación.

**Fase II. Seminario en autonomía:** dirigido a todas las mujeres beneficiarias (del cual ya se realizó 1ra. sesión) cuyo objetivo de fortalecer habilidades para la vida. Así mismo, teniendo en cuenta que el proyecto cuenta con enfoque de género de manera transversal y específica, se realizaron actividades de sensibilización y/o formación en enfoque de género para todo el equipo de trabajo, liderado por la Secretaría Distrital de la Mujer.

De igual manera, los instructores y las instructoras del curso de conducción en cualquier categoría participaron de (2) espacios de sensibilización cada uno de 2 horas, sobre enfoque de género teniendo como referencia la política pública de mujer y equidad de género “PPMYEG” la cual fue realizada por las profesionales con enfoque de género vinculadas al proyecto.

**Etapa 5. cierre del proceso y ciclo de formación:** que de manera anticipada a la etapa 5, a la fecha se ha realizado la entrega 420 licencias de conducción distribuidas en 328 licencias en la categoría C1; 81 licencias de categoría A2 y 11 licencias de conducción de categoría C2, lo cual representa un avance del 54% de licencias entregadas.

VISIÓN & PROYECTOS®
Consultorías Organizacionales

**3. ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR**

Para esta última etapa, VISIÓN & PROYECTOS tiene pendiente desarrollar las actividades de la etapa 4 formación, 5 cierre del proceso y ciclo de formación y 6 seguimiento y evaluación. A continuación, se detallan cada una de las actividades y acciones a realizar para dar cumplimiento:

**Etapa 4. Formación: esta fase se compone de dos etapas:**

**Fase I. Formación en conducción:** que durante la ejecución de esta etapa, se han presentado situaciones ajenas a VISION & PROYECTOS, en las cuales se ha presentado dificultad en cuanto a la disponibilidad y/o contacto con los beneficiarios y beneficiarias del proceso, tanto por situaciones de fuerza mayor como por disposición de los mismos para el agendamiento y participación en las clases impartidas por los Centros de Enseñanza Automovilística vinculados al proceso, para lo cual se está realizando el acompañamiento y seguimiento respectivo a las 132 personas beneficiarias.

A su vez, se ha presentado retrasos por parte de la plataforma del Ministerio de Transporte, ente encargado de recibir el cargue de los soportes y toma de huellas necesarias para el proceso de registro de la certificación en la plataforma dispuesta para ello, lo que ha generado congestión y malestar entre los beneficiarios, por una situación ajena a nuestra disposición de certificación y entrega de licencias.

**Etapa 5. cierre del proceso y ciclo de formación:** Se llevará a cabo la 2° sesión del seminario de autonomía y se realizará el cierre del proceso con la entrega de las licencias a los 368 beneficiarios pendientes por certificar.



Tel: (57) (1) 218 1316
Móvil: (57) 318 248 0550
Info@visionyproyectos.com
www.visionyproyectos.com
Calle 98 A # 51 - 72 Oficina 501
Bogotá D.C. - Colombia

**Etapa 6. seguimiento y evaluación:** Cabe indicar que el seguimiento al proceso ha sido constante a través del acompañamiento de los profesionales en cada una de las etapas; adicionalmente se está finalizando la caracterización de todas las y los beneficiarios, emprendimientos y mipymes de acuerdo a lo contemplado en el anexo técnico, así como encuesta de satisfacción y finalmente se presentará evaluación final que contenga el análisis de la encuesta y caracterización y demás aspectos identificados durante toda la ejecución.

**Adición prorroga y otro si al contrato:** que a la fecha se han registrado 40 beneficiarias para examen medico con el fin de realizar el proceso de formación con el CEA, las cuales 27 ya realizaron la firma del contrato y enrolamiento con la academia para el inicio del ciclo de formación. Para esta actividad, contamos con un mes para culminar todas las actividades requeridas para el ciclo de formación y entrega de licencias, tiempo en el cual se pueden presentar dificultades como las que ya hemos tenido con el grupo de 787 beneficiarios iniciales, en los cuales el agendamiento, toma de clases teóricas y prácticas, la comunicación con la beneficiaria, la cuales son mujeres cuidadoras que requieren programar sus tiempos con el sustituto, para suplir el cuidado de su persona a cargo, lo cual pondría en riesgo el cumplimiento para la obtención de la licencia de conducción.

## 4. JUSTIFICACIÓN DE LA PRÓRROGA

Expuesto lo anterior, VISION & PROYECTOS S.A.S. y su equipo de colaboradores en cabeza del coordinador del proyecto, se encuentra en este momento realizando todas las acciones necesarias para cumplir con la finalización de la etapa 4 formación, 5 cierre del proceso y ciclo de formación y 6 seguimiento y evaluación, anteriormente mencionadas; teniendo en cuenta, lo expuesto anteriormente, en cuanto al poco tiempo que nos queda (1 mes) para ejecutar en debida forma las actividades pendientes, solicitamos muy amablemente una prórroga de dos (2) meses, es decir del 11 de agosto al 11 de octubre de 2024.

Lo anterior sustentado en las dificultades presentadas en la etapa de convocatoria y selección, los reprocesos causados por la deserción y/o no aprobación de los beneficiarios, a su vez la dificultad y disposición de atender llamados por parte de los beneficiarios, situación que genera demoras y represamientos a la hora de agendar a clases a los mismos.

Por lo anteriormente mencionado, consideramos viable y con el fin de no verse afectado el cronograma de ejecución y continuar con el cumplimiento de las actividades contractuales faltantes, modificar la cláusula TERCERA – PLAZO" del contrato CPS-620-2023, en el sentido de prorrogar la fecha de finalización del contrato por dos (2) meses más.

## 5. COMPROMISOS DURANTE LA PRORROGA

VISIÓN & PROYECTOS se compromete a implementar un plan de contingencia y acción para el desarrollo de las actividades, junto con un cronograma[1] minucioso de las actividades que realizarán durante la prórroga.

Queremos evidenciar un mensaje de compromiso y tranquilidad a la Entidad, sobre la inmutable intención de la sociedad de cumplir el contrato suscrito con el FDLK, sin embargo, y tal como lo hemos aquí manifestado, surge la necesidad contractual de prorrogar el contrato, lo cual es una situación normal y viable en los términos de la jurisprudencia nacional.

[1] Ver Anexo No. 1 Cronograma Prorroga V001 y Cronograma Ampliación Prorroga V001 120724

Socialmente responsables

*En efecto, por regla general,* ***los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado****, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la* ***sentencia C - 949 de 2001****, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación-* ***pueden constituyen un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal****. Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en* ***concepto del 13 de agosto de 2009****:*

*"La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que* ***la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo****. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado".*

***(Subrayado y negrilla fuera del texto).***

Pues es precisamente bajo este contexto LEGAL y JURISPRUDENCIAL y específico para la contratación estatal, que VISION & PROYECTOS S.A.S., solicita una prórroga[2] del contrato, pues es la forma de GARANTIZAR el cumplimiento de la finalidad del contrato suscrito, lo cual se reafirma, cuando **los costos de dicha prorroga SON ASUMIDOS EXPRESAMENTE Y DE MANERA TOTAL POR EL CONTRATISTA**.

De igual manera, la misma corporación en la consulta citada, agregó que la ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución.

Por esto utiliza soluciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. *"A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar … diferencias, (ibídem), evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14);* etc. Nótese que, sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar.

Estos requisitos con base LEGAL y puestos de presente por la jurisprudencia, **por supuesto que se cumplen con la presente reiteración de prórroga**, veamos:

**a.** Las condiciones técnicas del contrato se mantienen, es más, se aseguran con una mayor calidad, con los servicios y productos que ha entregado y entregará el contratista.
**b.** Por supuesto, NO implica una mayor onerosidad, pues tal como lo hemos sostenido, la

[2] *Fundamentada con base a la ley 80 de 1993 y en concordancia con el código civil colombiano.*



Tel: (57) (1) 218 1316
Móvil: (57) 318 248 0550
Info@visionyproyectos.com
www.visionyproyectos.com
Calle 98 A # 51 - 72 Oficina 501
Bogotá D.C. - Colombia

prórroga del contrato no determinará costos adicionales para la administración

**c.** La entidad con la prórroga, NO renuncia a sus facultades legales, por lo que continuará realizando el control al contratista y a sus productos.

**d.** Y finalmente, el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY, GARANTIZARÁ que el servicio y productos que contrató, se recibirán.

**Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato**, esto es el que, no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que, si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. **El plazo es, por tanto, un elemento accidental** del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato

Así las cosas, reiteramos la necesidad y viabilidad jurídica de la prórroga del contrato por un término de dos (2) meses adicionales, con el fin de no perjudicar el cronograma de ejecución y de esta forma dar cabal cumplimiento al Contrato CPS-620-2023 y sus actividades contractuales.


Cordialmente,

**VISION & PROYECTOS S.A.S.**
NIT: 900.226.876-0
Representante Legal
PEDRO ANTONIO AVILA MONDRAGON

VISIÓN & PROYECTOS®
Consultorías Organizacionales

# ANEXO No. 1
# CRONOGRAMAS

| Id | | EDT | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **1** | | **PROYECTO LICENCIAS LOCALIDAD DE KENNEDY** | **285 días** | **lun 11/09/23** |
| 2 | | **1.1** | | **ETAPA 1 - CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN** | **57 días** | **lun 11/09/23** |
| 3 | | **1.1.1** | | **Fase I - Alistamiento** | **25 días** | **lun 11/09/23** |
| 4 | | 1.1.1.1 | | Firma Acta de Inicio | 1 día | lun 11/09/23 |
| 5 | | 1.1.1.2 | | Reunión de Inicio del Proyecto | 1 día | mar 19/09/23 |
| 6 | | 1.1.1.3 | | Realizar Plan de Trabajo del Proyecto | 10 días | mié 20/09/23 |
| 7 | | 1.1.1.4 | | Realizar Cronograma | 10 días | mié 20/09/23 |
| 8 | | 1.1.1.5 | | Preparación Comunicaciónal Presentación Pública | 6 días | mar 26/09/23 |
| 9 | | 1.1.1.6 | | Realizar Convocatoria Presentación Pública | 7 días | mié 4/10/23 |
| 10 | | 1.1.1.7 | | Realizar Logista de la Presentación Pública | 7 días | mié 4/10/23 |
| 11 | | 1.1.1.8 | | Instalación Comité Técnico | 1 día | vie 6/10/23 |
| 12 | | 1.1.1.9 | | Recibir Capacitación Secretaria de la Mujer | 1 día | lun 9/10/23 |
| 13 | | 1.1.1.10 | | Presentación Pública del Proyecto | 1 día | vie 13/10/23 |
| 14 | | 1.1.1.11 | | Diseñar Guía Operativa | 11 días | lun 25/09/23 |
| 15 | | 1.1.1.12 | | Preparar Piezas Comunicativas Convocatoria | 10 días | lun 2/10/23 |
| 16 | | 1.1.1.13 | | Diseñar Herramientas para la Gestión del Proyecto | 10 días | lun 25/09/23 |
| 17 | | **1.1.2** | | **Fase II - Convocatoria** | **22 días** | **lun 30/10/23** |
| 18 | | 1.1.2.1 | | Realizar Concovatoria del Proyecto en la Comunidad | 22 días | lun 30/10/23 |
| 19 | | 1.1.2.2 | | Recolectar Información de la Población Beneficiaria | 17 días | lun 6/11/23 |
| 20 | | **1.1.3** | | **Fase III - Inscripción** | **30 días** | **mié 18/10/23** |
| 21 | | 1.1.3.1 | | Disponer Logística para Inscripción | 30 días | mié 18/10/23 |
| 22 | | 1.1.3.2 | | Realizar Registro de los Participantes | 19 días | jue 2/11/23 |
| 23 | | **1.2** | | **ETAPA 2 - SELECCIÓN Y EVALUACIÓN** | **37 días** | **mié 29/11/23** |
| 24 | | 1.2.1 | | Analizar Inscripciones Realizadas | 5 días | mié 29/11/23 |
| 25 | | 1.2.2 | | Realizar Evaluación Según Criterios | 5 días | mié 6/12/23 |
| 26 | | 1.2.3 | | Realizar Selección de Beneficiarios | 13 días | mié 13/12/23 |
| 27 | | 1.2.4 | | Publicación de las listas de beneficiarios | 4 días | mar 26/12/23 |
| 28 | | 1.2.5 | | Informar a los Beneficiarios Seleccionados | 13 días | lun 1/01/24 |
| 29 | | 1.2.6 | | Definición de CRC | 25 días | vie 15/12/23 |
| 30 | | **1.3** | | **ETAPA 3 - INSCRIPCIÓN AL RUNT Y EXAMEN MEDICO** | **102 días** | **jue 18/01/24** |
| 31 | | 1.3.1 | | Realizar Registro en el RUNT de los Bneficiarios | 10 días | jue 18/01/24 |
| 32 | | 1.3.2 | | Programar Examen Médico | 5 días | jue 18/01/24 |
| 33 | | 1.3.3 | | Realizar Examen Medico | 20 días | jue 18/01/24 |
| 34 | | 1.3.4 | | Agendar cita en el SIM | 10 días | jue 1/02/24 |
| 35 | | 1.3.5 | | Realizar Acompañamiento al SIM | 20 días | jue 1/02/24 |
| 36 | | 1.3.6 | | Realizar Caracterización de los Beneficiarios | 101 días | vie 19/01/24 |
| 37 | | **1.4** | | **ETAPA 4 - FORMACIÓN** | **142 días** | **jue 15/02/24** |
| 38 | | **1.4.1** | | **Fase I - Formación en Conducción** | **142 días** | **jue 15/02/24** |
| 39 | | 1.4.1.1 | | Coordinar capacitación con los CEA | 5 días | jue 15/02/24 |
| 40 | | 1.4.1.2 | | Realizar Capacitaciones | 142 días | jue 15/02/24 |
| 41 | | **1.4.2** | | **Fase II - Seminario en Autonomía** | **24 días** | **lun 6/05/24** |
| 42 | | 1.4.2.1 | | Preparar Logistica Seminario de Autonomia | 23 días | lun 6/05/24 |
| 43 | | 1.4.2.2 | | Primer Seminario de Autonomia | 1 día | jue 6/06/24 |
| 44 | | **1.5** | | **ETAPA 5 - CIERRE DEL PROCESO Y CICLO DE FORMACIÓN** | **67 días** | **jue 13/06/24** |
| 45 | | 1.5.1 | | Entrega de Licencias de Conducción | 67 días | jue 13/06/24 |
| 46 | | 1.5.2 | | Preparación Foro Paridad de Genero | 13 días | vie 28/06/24 |
| 47 | | 1.5.3 | | Realización Foro Paridad de Género | 0 días | vie 19/07/24 |
| 48 | | 1.5.4 | | Preparar Logistica 2° Seminario de Autonomia | 10 días | mar 6/08/24 |
| 49 | | 1.5.5 | | Segundo Seminario de Autonomia | 0 días | vie 23/08/24 |
| 50 | | **1.6** | | **ETAPA 6 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN** | **22 días** | **mié 11/09/24** |
| 51 | | 1.6.1 | | Realizar Evaluación de Satisfacción | 5 días | mié 11/09/24 |
| 52 | | 1.6.2 | | Preparar Informe Satisfacción | 5 días | jue 19/09/24 |
| 53 | | 1.6.3 | | Realizar Evaluación Final | 5 días | jue 26/09/24 |
| 54 | | 1.6.4 | | Preparar Informe Final | 5 días | jue 3/10/24 |
| 55 | | 1.6.5 | | Cierre del Proyecto | 0 días | vie 11/10/24 |

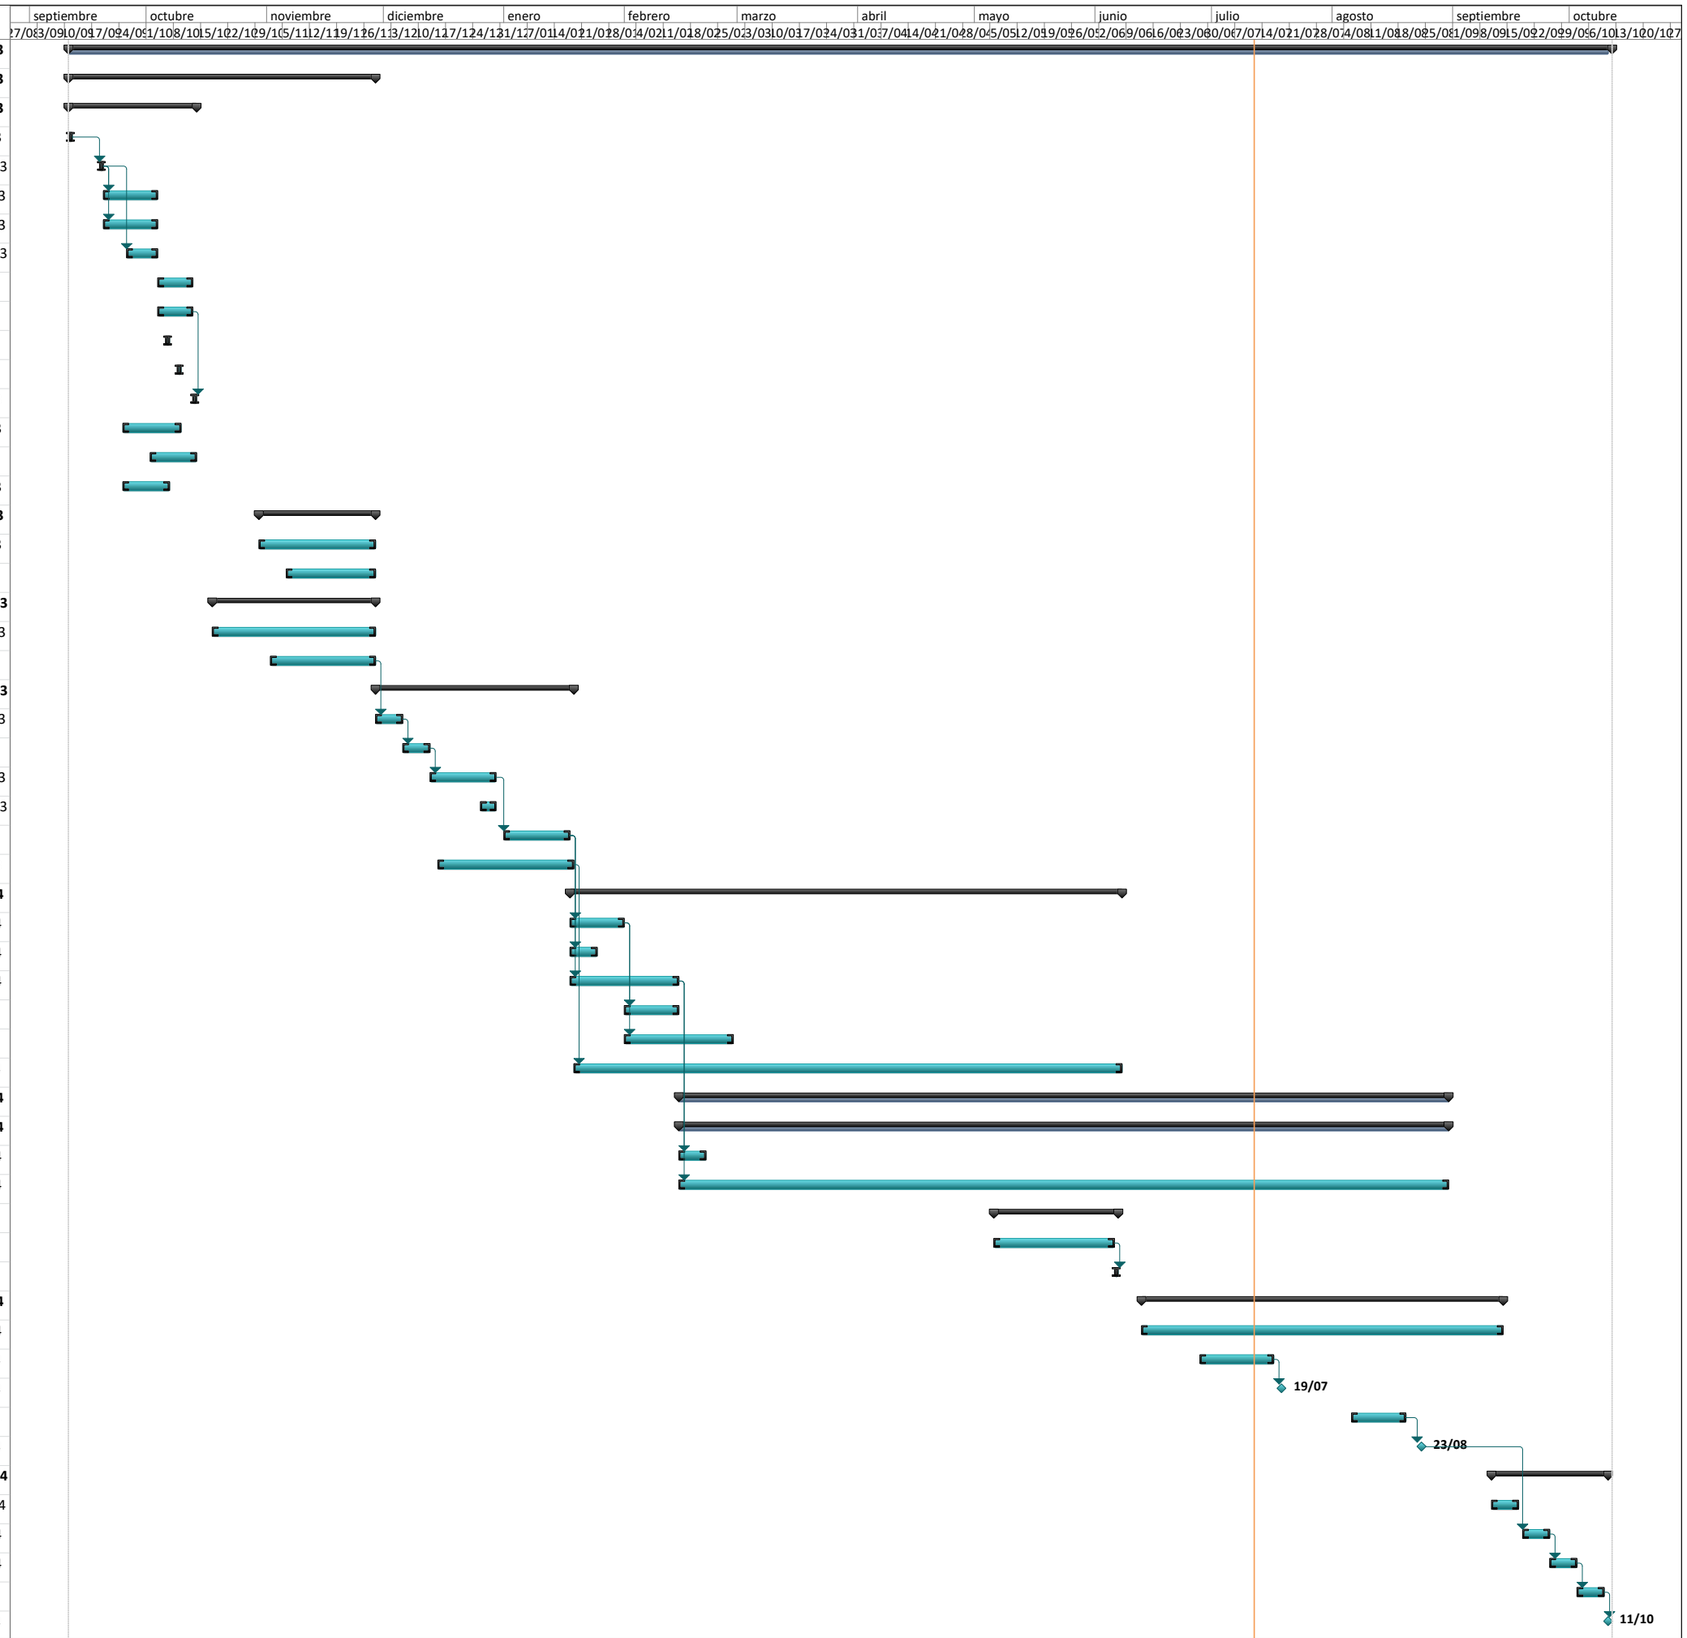

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **PROYECTO LICENCIAS LOCALIDAD DE KENNEDY ADICIÓN** | **110 días** | **lun 13/05/24** | **vie 11/10/24** |
| 2 | | **ETAPA 1 - PLANEACIÓN** | **3 días** | **lun 13/05/24** | **mié 15/05/24** |
| 3 | | Realizar Cronograma Ampliación | 1 día | lun 13/05/24 | lun 13/05/24 |
| 4 | | Presentación de Cronograma | 1 día | mar 14/05/24 | mar 14/05/24 |
| 5 | | Aprobación del Cronograma | 1 día | mié 15/05/24 | mié 15/05/24 |
| 6 | | **ETAPA 2 - SELECCIÓN Y EVALUACIÓN** | **18 días** | **mié 15/05/24** | **vie 7/06/24** |
| 7 | | Análisis Base de Datos Inscrpciones | 16 días | mié 15/05/24 | mié 5/06/24 |
| 8 | | Publicación de las listas de beneficiarios | 1 día | jue 6/06/24 | jue 6/06/24 |
| 9 | | Informar a los Beneficiarios Seleccionados | 1 día | vie 7/06/24 | vie 7/06/24 |
| 10 | | **ETAPA 3 - INSCRIPCIÓN AL RUNT Y EXAMEN MEDICO** | **53 días** | **mié 29/05/24** | **vie 9/08/24** |
| 11 | | Realizar Registro en el RUNT de los Beneficiarios | 33 días | lun 10/06/24 | jue 25/07/24 |
| 12 | | Programar Examen Médico | 34 días | lun 10/06/24 | vie 26/07/24 |
| 13 | | Realizar Examen Medico | 43 días | mié 12/06/24 | vie 9/08/24 |
| 14 | | Agendar cita en el SIM | 30 días | lun 17/06/24 | sáb 27/07/24 |
| 15 | | Realizar Acompañamiento al SIM | 29 días | mar 18/06/24 | dom 28/07/24 |
| 16 | | Realizar Caracterización de los Beneficiarios | 27 días | jue 20/06/24 | dom 28/07/24 |
| 17 | | **ETAPA 4 - FORMACIÓN** | **71 días** | **vie 7/06/24** | **vie 13/09/24** |
| 18 | | **Fase I - Formación en Conducción** | **71 días** | **vie 7/06/24** | **vie 13/09/24** |
| 19 | | Coordinar capacitación con los CEA | 38 días | mar 18/06/24 | vie 9/08/24 |
| 20 | | Realizar Capacitaciones Teorico Prácticas de Conducción | 61 días | vie 21/06/24 | vie 13/09/24 |
| 21 | | **Fase II - Seminario en Autonomía** | **26 días** | **dom 21/07/24** | **vie 23/08/24** |
| 22 | | Preparar 3er Seminario de Autonomia | 6 días | mié 14/08/24 | mié 21/08/24 |
| 23 | | Tercer Seminario de Autonomia | 0 días | vie 23/08/24 | vie 23/08/24 |
| 24 | | **ETAPA 5 - CIERRE DEL PROCESO Y CICLO DE FORMACIÓN** | **70 días** | **lun 24/06/24** | **vie 27/09/24** |
| 25 | | Entrega de Licencias de Conducción | 67 días | jue 27/06/24 | vie 27/09/24 |
| 26 | | Preparar Logistica 4° Seminario de Autonomia | 6 días | mié 11/09/24 | mié 18/09/24 |
| 27 | | Cuarto Seminario de Autonomia | 0 días | vie 20/09/24 | vie 20/09/24 |
| 28 | | **ETAPA 6 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN** | **60 días** | **lun 22/07/24** | **vie 11/10/24** |
| 29 | | Realizar Evaluación de Satisfacción | 5 días | lun 16/09/24 | vie 20/09/24 |
| 30 | | Preparar Informe Satisfacción | 2 días | lun 23/09/24 | mar 24/09/24 |
| 31 | | Realizar Evaluación Final | 5 días | sáb 28/09/24 | jue 3/10/24 |
| 32 | | Preparar Informe Final | 2 días | dom 6/10/24 | lun 7/10/24 |
| 33 | | Cierre del Proyecto | 0 días | vie 11/10/24 | vie 11/10/24 |

