

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		**PRESUPUESTO TEATRO SERVITA - Localidad de Usaquen**	**86.88 días**	**jue 14/09/23**	**lun 18/12/23**		**$ 319,624,051.00**
2		INICIO	0 días	jue 14/09/23	jue 14/09/23		$ 0.00
3		ETAPA DE DIAGNOSTICO	28 días	jue 14/09/23	sáb 14/10/23	2	$ 0.00
4		**PRELIMINARES**	**47.5 días**	**mié 04/10/23**	**vie 24/11/23**		**$ 9,760,616.00**
5		CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	23.63 días	mié 04/10/23	jue 09/11/23	3	$ 2,668,233.00
6		DESMONTE DE PUERTAS METÁLICAS FACHADA PRINCIPAL, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	1 día	mar 10/10/23	mar 10/10/23	5	$ 550,470.00
7		DESMONTE DE VENTANAS METÁLICAS FACHADA PRINCIPAL, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	2 días	mié 01/11/23	jue 02/11/23	5	$ 392,489.00
8		DESMONTE DE PUERTAS INTERNAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	2 días	vie 20/10/23	lun 23/10/23	5	$ 92,036.00
9		DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO: LAVAMANOS, SANITARIOS, ORINAL, ETC., INCLUYE DISPOSICIÓN, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	1 día	vie 20/10/23	sáb 21/10/23	8CC	$ 239,076.00
10		PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15CM, PROFUNDIDAD <= 10CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE, RETIRO DE ESCOMBROS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	2 días	mar 10/10/23	mié 11/10/23	11	$ 1,121,493.00
11		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	3 días	mié 04/10/23	vie 06/10/23		$ 473,944.00
12		DESMONTE DE PISO	4 días	mar 21/11/23	vie 24/11/23		$ 4,031,690.00
13		DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	6 días	mié 15/11/23	mar 21/11/23	15	$ 191,185.00
14		**MUROS TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	49.13 días	vie 20/10/23	mié 13/12/23		**$ 29,973,494.00**
15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO PARA MUROS INTERIORES	14 días	vie 20/10/23	mar 14/11/23	5	$ 25,177,078.00
16		ENCHAPE 25 X 35	15 días	lun 27/11/23	mié 13/12/23	27	$ 4,796,416.00
17		**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**3 días**	**mar 05/12/23**	**jue 07/12/23**		**$ 5,339,996.00**
18		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE INSTALACION EP/ES, ASIENTO SANITARIO)	1 día	mar 05/12/23	mié 06/12/23	92CC+5 días	$ 1,931,105.00
19		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	1 día	mié 06/12/23	jue 07/12/23	92CC+6 días	$ 443,054.00
20		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, BRAZO SOPORTE Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN ACOPLE, SIFÓN EN P, DESAGÜE Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	1 día	jue 07/12/23	jue 07/12/23	92CC+5 días	$ 1,641,234.00
21		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	1 día	mar 05/12/23	mié 06/12/23	92CC+5 días	$ 1,216,614.00
22		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO DE 8" SENCILLOS PARA LAVAPLATOS	1 día	mar 05/12/23	mié 06/12/23	92CC+5 días	$ 107,989.00
23		**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ALCANTARILLADO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**70.63 días**	**jue 14/09/23**	**jue 30/11/23**		**$ 1,346,227.00**
24		REGISTRO CORTINA 3/4"	3 días	lun 27/11/23	jue 30/11/23	27	$ 237,162.00
25		PUNTO SANITARIO 2"	5 días	jue 14/09/23	mar 19/09/23		$ 507,190.00
26		TUBERIA PVCP RDE 9 DE ½" INCLUYE ACCESORIOS	3 días	mié 22/11/23	vie 24/11/23	11	$ 142,179.00
27		punto hidraulico de agua Fria de 1/2"	2 días	vie 24/11/23	lun 27/11/23	26	$ 459,696.00
28		**INSTALACIONES ELECTRICAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**3 días**	**mié 15/11/23**	**vie 17/11/23**		**$ 854,900.00**

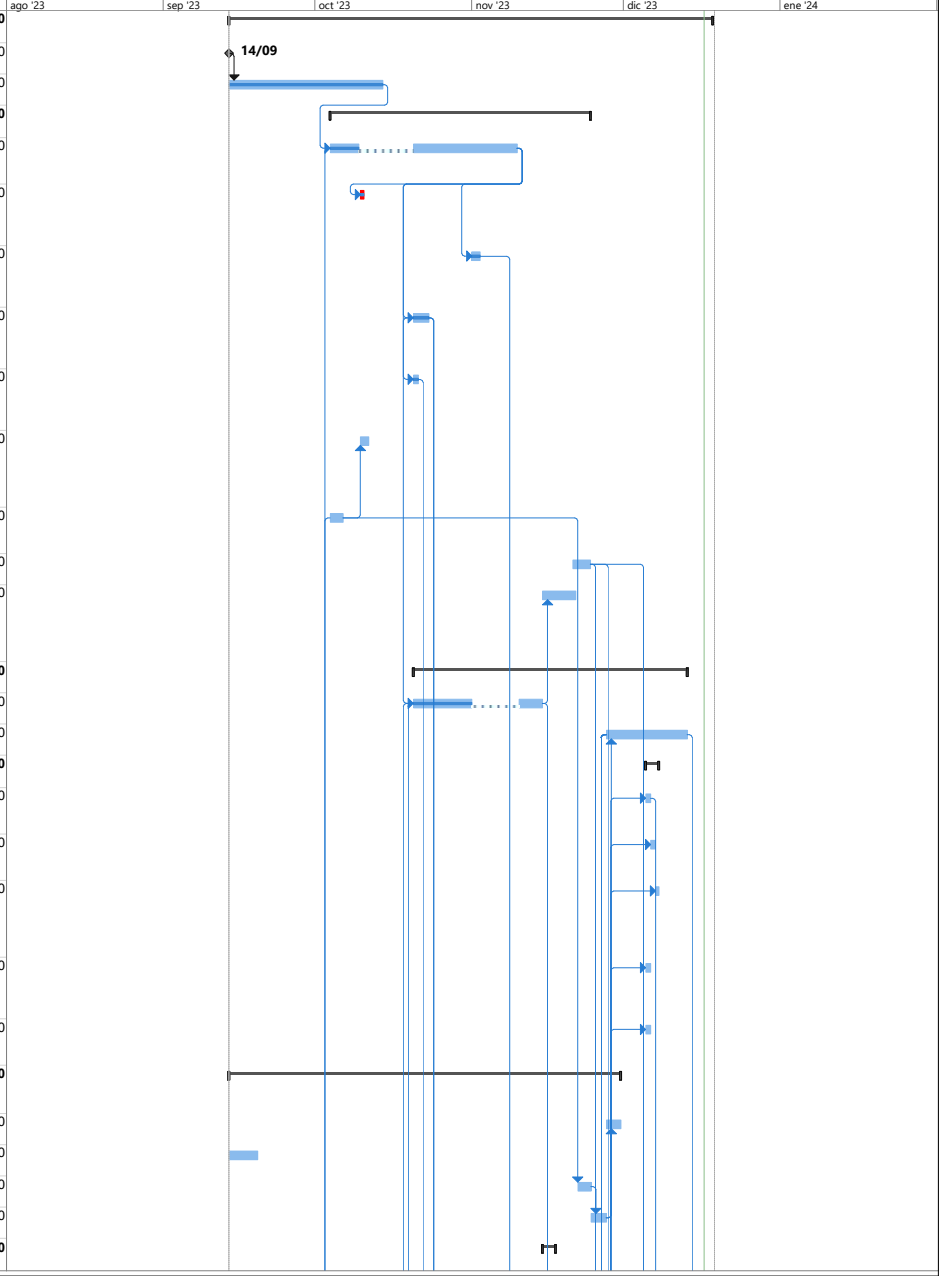

Proyecto: Programación Servita
Fecha: dom 17/12/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Línea base
Hito de línea base
Resumen de línea base
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
29		SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORS, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN	3 días	mié 15/11/23	vie 17/11/23	44	$ 854,900.00
30		**PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**51.38 días**	**lun 23/10/23**	**lun 18/12/23**		**$ 16,339,476.00**
31		PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA ANTEPECHO DE FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	1 día	lun 18/12/23	lun 18/12/23		$ 2,355,472.00
32		VINILO TIPO 1 TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	25 días	lun 23/10/23	lun 20/11/23	15CC+2 días	$ 13,984,004.00
33		**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**2 días**	**mié 13/12/23**	**jue 14/12/23**		**$ 13,972,877.00**
34		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	2 días	mié 13/12/23	jue 14/12/23		$ 13,424,458.00
35		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS INDUSTRIAL, LÍNEA MODULAR MUEBLE Y ENTREPAÑO EN ACERO INOX, CON DIMENSIONES: DE ANCHO 0.60, ALTO: 0.90M LONGITUD EN ML, CAL. 16, SALPICADERO 10 CM, PATAS EN TUBO DE ACERO INOX. CON NIVELADOR. UNA POCETA DE 50 X50X30,	1 día	jue 14/12/23	jue 14/12/23		$ 548,419.00
36		**SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA**	**2 días**	**jue 30/11/23**	**sáb 02/12/23**		**$ 3,217,240.00**
37		SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA CAL 20	2 días	jue 30/11/23	sáb 02/12/23	81	$ 3,217,240.00
38		**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**17 días**	**mié 15/11/23**	**lun 04/12/23**		**$ 1,048,563.00**
39		CIELO RASO PANEL 84R MADERABE HUNTER DOUGLAS INCLUYE ESTRUCTURA DE ALISTADO Y ELEMENTO DE FIJACION	17 días	mié 15/11/23	lun 04/12/23	64CC	$ 1,048,563.00
40		**NO PREVISTOS**	**86.88 días**	**jue 14/09/23**	**lun 18/12/23**		**$ 237,770,662.00**
41		PAÑETES LISO MUROS 1:3 (e=0,03m)	4 días	mié 06/12/23	sáb 09/12/23	56	$ 2,776,590.00
42		DILATACIÓN PLASTICA EN Z	7 días	sáb 02/12/23	lun 11/12/23	37	$ 271,418.00
43		MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EXISTENTE, INCLUYE LAVADO CON RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO, APLICACIÓN DE HIDROFUGO 10 AÑOS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN Y LIMPIEZA).	12 días	lun 13/11/23	sáb 25/11/23		$ 19,845,829.00
44		DESMONTE DE APARATOS ELÉCTRICOS (CABLES, TOMAS, INTERRUPTORES, LUMINARIAS).	5 días	mié 01/11/23	lun 06/11/23	11CC	$ 40,480.00
45		DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE LÁMPARA CUALQUIER TAMAÑO, (INCLUYE LIMPIEZA Y AJUSTE SI SE REQUIERE)	2 días	lun 20/11/23	mar 21/11/23	32	$ 1,208,324.00
46		PUNTO SANITARIO PVC (4")	8 días	jue 14/09/23	vie 22/09/23		$ 578,510.00
47		DESMONTE Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDOS EXISTENTES A DOBLE ALTURA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS).	40 días	mar 24/10/23	mié 06/12/23		$ 1,116,226.00
48		DESMONTE, INSTALADA, PULIDA, LACADA Y SELLADO DE GUARDA ESCOBA DE MADERA	6 días	mar 05/12/23	lun 11/12/23	12	$ 251,258.00
49		BARRA DE SEGURIDAD FIJA EN ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	4 días	sáb 02/12/23	jue 07/12/23	16CC+5 días	$ 1,106,628.00
50		BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	2 días	sáb 02/12/23	mar 05/12/23	16CC+5 días	$ 539,335.00
51		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRA HIDRAULICA PARA PUERTA PRINCIPAL DE FACHADA.	4 días	jue 14/09/23	lun 18/09/23		$ 2,630,436.00
52		COLUMNETA DE CONFINAMIENTO PARA MAMPOSTERIA. CONCRETO F'C 21 MPA - 0.12x0.15 M.	10 días	jue 14/09/23	lun 25/09/23		$ 767,824.00
53		DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE GRIFERIA DE LAVAMANOS (INCLUYE REINTALACIÓN DE SISTEMA DE SENSOR DE GRIFERIA)	8 días	mié 06/12/23	jue 14/12/23	93	$ 460,480.00
54		DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISO E=4CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	6 días	sáb 21/10/23	vie 27/10/23	9	$ 366,580.00
55		DEMOLICION MUROS MAMPOSTERIA 0.15M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	3 días	lun 23/10/23	jue 26/10/23	8	$ 171,736.00
56		MURO EN BLOQUE N° 5 E=0,12M	12 días	jue 26/10/23	mié 08/11/23	55	$ 759,041.00
57		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA, PISO CERAMICA (SEGUN PISO INSTALADO)	8 días	lun 04/12/23	mar 12/12/23	92	$ 350,002.00
58		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA PVC COLOR EXISTENTE O SIMILAR	7 días	vie 24/11/23	sáb 02/12/23	32FC+5 días	$ 951,013.00
59		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTON CORRUGADO	10 días	vie 13/10/23	mar 24/10/23	5CC	$ 907,139.00

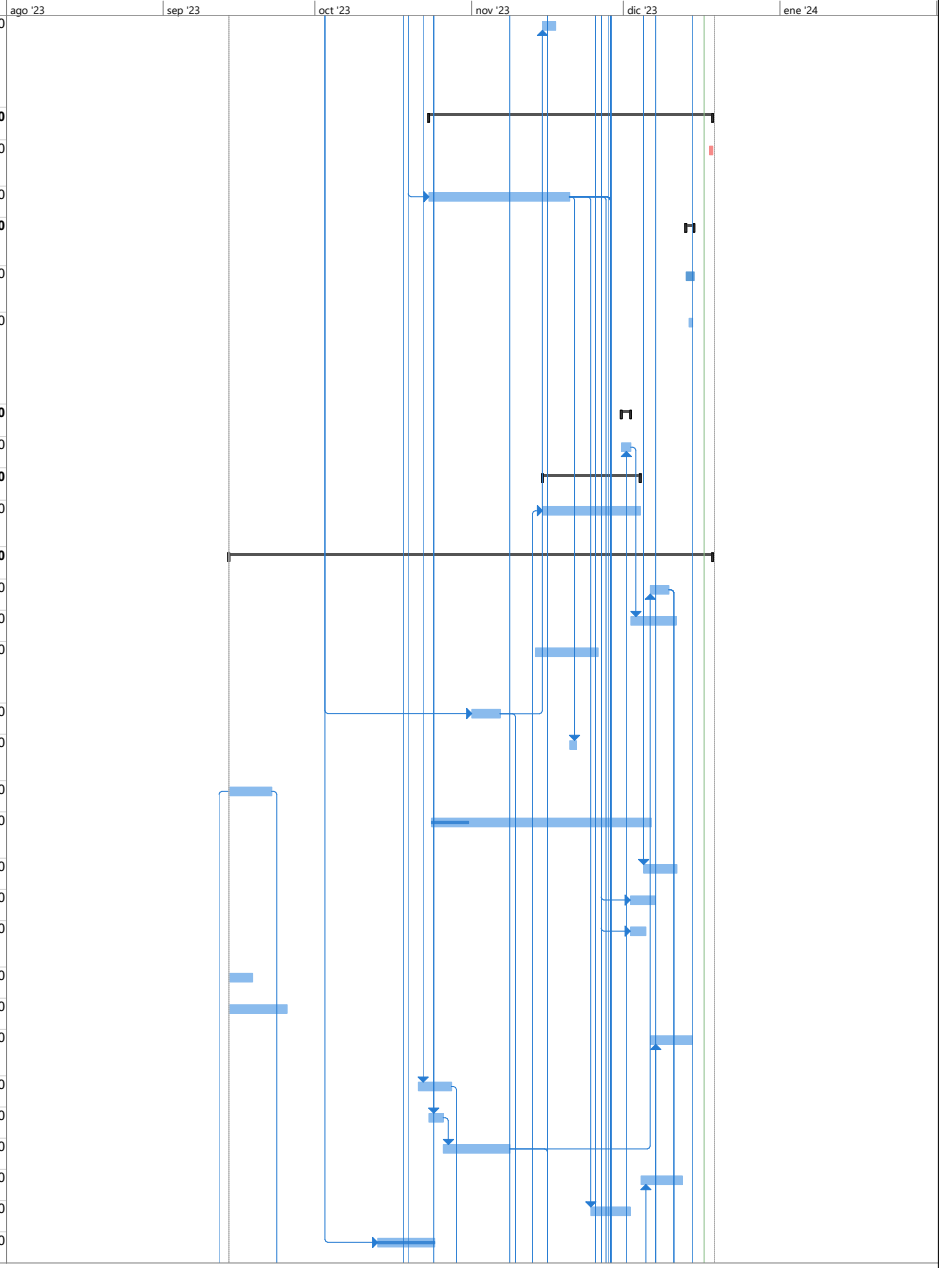

Proyecto: Programación Servita
Fecha: dom 17/12/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Línea base
Hito de línea base
Resumen de línea base
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
60		MEDIA CAÑA FUNDIDO EN SITIO Y PULIDO (GRANITO PULIDO a= 0,1 m)	5 días	lun 04/12/23	vie 08/12/23	92	$ 1,805,914.00
61		SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO PVC-S 3"	6 días	jue 14/09/23	mié 20/09/23	46CC	$ 285,402.00
62		EXCAVACIÓN MANUAL CON RETIRO SUELO BLANDO	8 días	sáb 28/10/23	lun 06/11/23	54	$ 152,929.00
63		GRANITO ANCHO MAX 0.15(INCLUYE PULIDA)	5 días	jue 28/09/23	mar 03/10/23	70	$ 217,955.00
64		MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TODO CIELO RASO PANEL 84R MADERABE HUNTER DOUGLAS	15 días	mié 15/11/23	jue 30/11/23	15	$ 67,405,692.00
65		SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO TUBO PVC (INCLUYE INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO+CABLE+CAJA)	4 días	jue 16/11/23	lun 20/11/23	56	$ 264,630.00
66		ESTRUCTURA METALICA PARA RECUBRIMIENTO EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO Y TRATAMIENTO DE JUNTAS.	30 días	vie 20/10/23	mié 22/11/23	15CC	$ 15,218,906.00
67		SALIDA CON LUMINARIA PANEL LED RD 24 W	2 días	jue 09/11/23	sáb 11/11/23	44	$ 676,305.00
68		DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJO	5 días	lun 23/10/23	vie 27/10/23	8	$ 25,167.00
69		ESPEJOS EN BAÑOS DE 4 MM FLOTADOS CON ESTRUCTURA E	5 días	mié 06/12/23	lun 11/12/23	18	$ 974,335.00
70		ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	5 días	vie 22/09/23	jue 28/09/23	46	$ 502,317.00
71		BASE PLACA CONCRETO POBRE 1500 PSI, ACELERANTE E IMPERMEABILIZANTE	5 días	vie 24/11/23	jue 30/11/23	12	$ 3,465,377.00
72		NIVELACIÓN DE ESTRUCTURA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PULIDO, SELLADO, Y LACADO DE PISO EN MADERA NATURAL MACIZA GUAIMARO	9 días	sáb 02/12/23	mar 12/12/23	71	$ 52,286,000.00
73		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA MADERA NATURAL MACIZA GUAIMARO	4 días	vie 08/12/23	mié 13/12/23	72CC+6 días	$ 2,035,800.00
74		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA EN ALUMINIO NEGRO Y VIDRIO 3+3 (INCLUYE VENTANAS PARA TAQUILLA Y PERCIANAS DE BAÑOS)	3 días	mar 12/12/23	jue 14/12/23		$ 22,180,267.00
75		PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ZOCALO NEGRO EN ALUMINIO (INCLUYE MANIJA Y CHAPAS DE SEGURIDAD).	2 días	mié 13/12/23	vie 15/12/23	74CC+2 días	$ 9,357,589.00
76		PAPEL VINILICO FROSTED PARA VENTANA	1 día	jue 14/12/23	vie 15/12/23	74	$ 730,374.00
77		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, PARA DISCAPACITADOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	2 días	lun 04/12/23	mié 06/12/23	16CC+6 días	$ 711,070.00
78		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR, BAÑO NIÑOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	2 días	lun 04/12/23	mié 06/12/23	16CC+6 días	$ 434,782.00
79		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA NIÑOS, (INCLUYE VALVULA DE DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	2 días	lun 04/12/23	mié 06/12/23	16CC+6 días	$ 666,941.00
80		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR PARA BEBES HORIZONTAL	2 días	mié 13/12/23	vie 15/12/23	16	$ 1,914,232.00
81		REPLANTEO, EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y NIVELACIÓN DE SUELO BAJO TARIMA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)	3 días	mar 28/11/23	jue 30/11/23	12	$ 5,161,287.00
82		CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 (SUM E INSTALACIÓN).	2 días	lun 11/12/23	mar 12/12/23	41	$ 280,507.00
83		ESTUCO SOBRE PAÑETE	3 días	lun 11/12/23	mié 13/12/23	41	$ 52,604.00
84		LUZ EMERGENCIA LED R1 2X1.6W (SUM E INSTALACIÓN).	6 días	lun 27/11/23	lun 04/12/23	32FC+7 días	$ 409,572.00
85		LAMPARA LED 6W TIPO TORTUGA (SUM E INSTALACIÓN).	6 días	mar 28/11/23	lun 04/12/23	32FC+7 días	$ 57,024.00
86		REFLECTOR LED (100W) (SUM+INSTALACIÓN) EN ALTURA	6 días	mar 28/11/23	lun 04/12/23	32FC+7 días	$ 1,184,988.00
87		REFLECTOR LED (50W) (SUM+INSTALACIÓN) EN ALTURA	6 días	mar 28/11/23	lun 04/12/23	32FC+7 días	$ 239,651.00
88		PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E=0.025 A<0.60 M **	3 días	mié 08/11/23	sáb 11/11/23	7FC+5 días	$ 252,927.00
89		PERFIL PERFORADO ANGULO ESQUINERO	20 días	mar 24/10/23	mié 15/11/23	15CC+3 días	$ 545,964.00
90		PUERTA METÁLICA EN CALIBRE 18 CON PINTURA BLANCA, CON CHAPA DE SEGURIDAD Y MANIJAS, INSTALADA. BATIENTE	2 días	jue 14/12/23	vie 15/12/23	74CC+2 días	$ 3,928,795.00

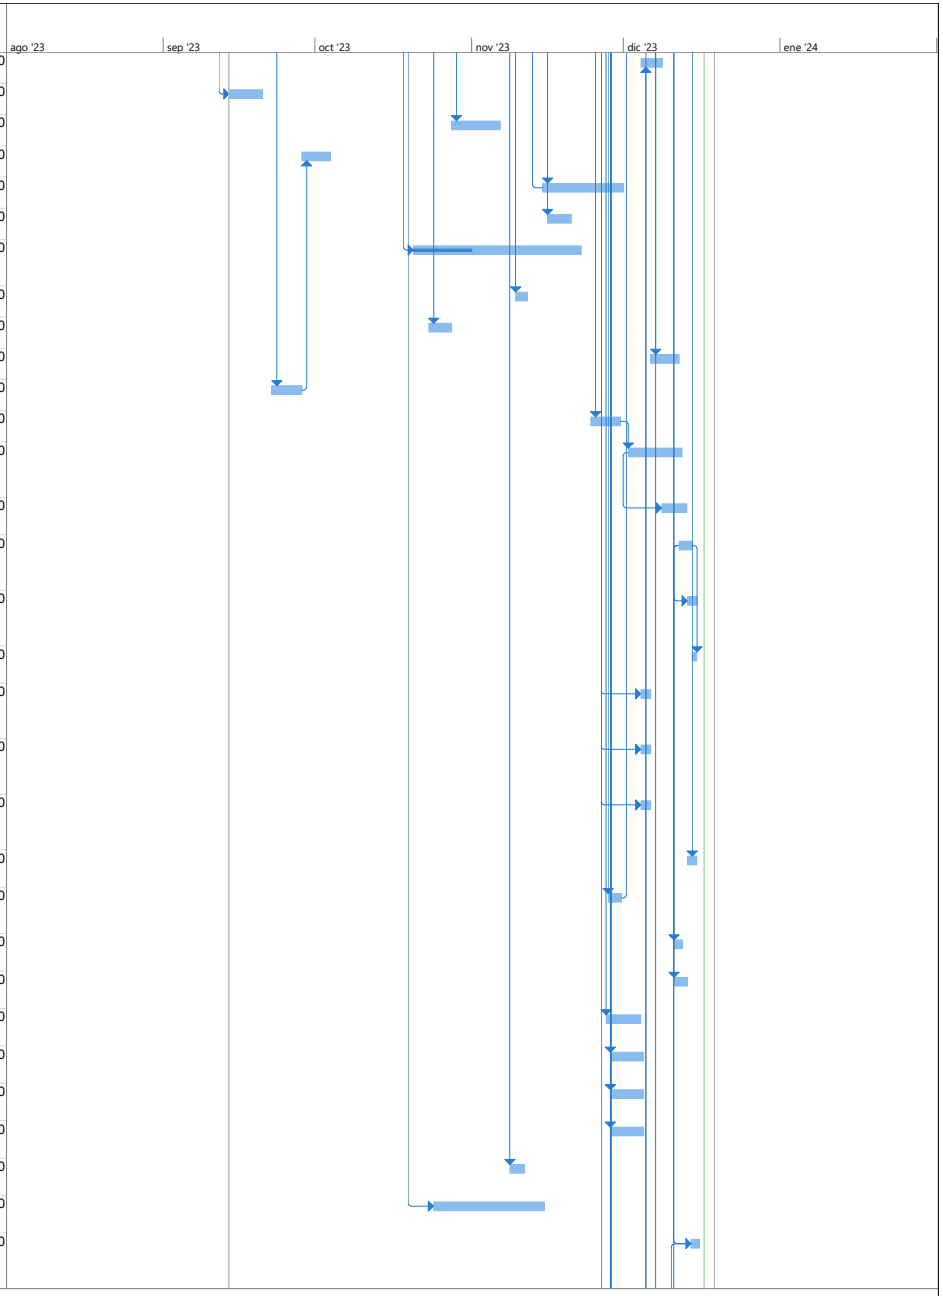

Proyecto: Programación Servita
Fecha: dom 17/12/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Línea base
Hito de línea base
Resumen de línea base
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
91		PUERTA METÁLICA EN CALIBRE 18 CON PINTURA BLANCA, CON CHAPA DE SEGURIDAD Y MANIJAS, INSTALADA. CORREDIZA	2 días	jue 14/12/23	vie 15/12/23	74CC+2 días	$ 1,969,000.00
92		PISO CERAMICA, FORMATO 60 X 60 (COLORES VARIOS)	4 días	mié 29/11/23	lun 04/12/23	16CC+2 días	$ 2,948,594.00
93		MESON LAVAMANOS CORIAN	3 días	sáb 02/12/23	mié 06/12/23	16CC+5 días	$ 4,328,916.00
94		ASEO GENERAL	5 días	mar 12/12/23	lun 18/12/23	90CC-2 días	$ 0.00
95		FIN	1 día	lun 18/12/23	lun 18/12/23	93CC+1 día	$ 0.00



Proyecto: Programación Servita
Fecha: dom 17/12/23

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Hito de línea base				
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas	Resumen de línea base				
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica	Progreso				
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Línea base	Progreso manual				
