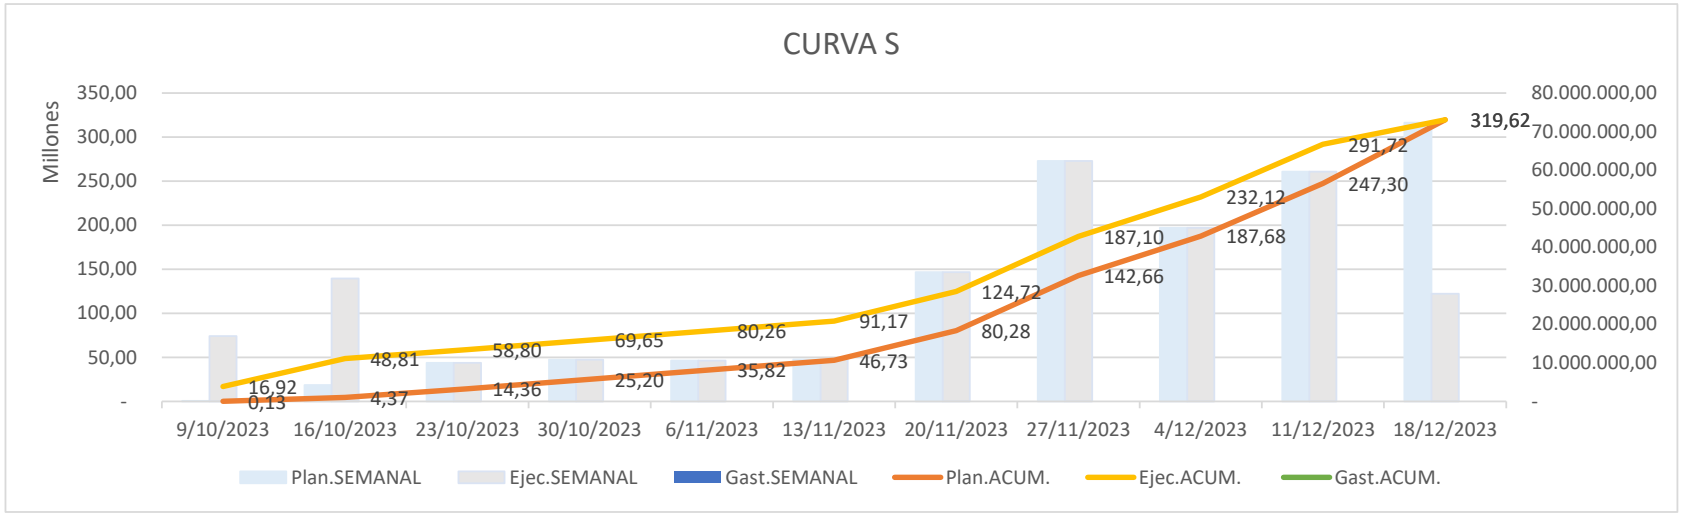
SEMANA	(PV) PLANIFICADO (B/.)		(EV) EJECUTADO (B/.)		(AC) COSTOS ACTUALES (B/.)	
	Plan.SEMANAL	Plan.ACUM.	Ejec.SEMANAL	Ejec.ACUM.	Gast.SEMANA	Gast.ACUM.
9/10/2023	128.916,00	**128.916,00**	16.915.999,00	**16.915.999,00**		
16/10/2023	4.239.113,72	**4.368.029,72**	31.893.705,00	**48.809.704,00**		
23/10/2023	9.991.789,69	**14.359.819,41**	9.991.789,69	**58.801.493,69**		
30/10/2023	10.843.647,53	**25.203.466,94**	10.843.647,53	**69.645.141,22**		
6/11/2023	10.617.363,77	**35.820.830,71**	10.617.363,77	**80.262.504,99**		
13/11/2023	10.904.564,82	**46.725.395,53**	10.904.564,82	**91.167.069,81**		
20/11/2023	33.555.946,81	**80.281.342,34**	33.555.946,81	**124.723.016,62**		
27/11/2023	62.378.859,27	**142.660.201,61**	62.378.859,27	**187.101.875,89**		
4/12/2023	45.019.166,03	**187.679.367,64**	45.019.166,03	**232.121.041,92**		
11/12/2023	59.619.964,97	**247.299.332,61**	59.600.000,00	**291.721.041,92**		
18/12/2023	72.324.719,39	**319.624.052,00**	27.903.010,35	**319.624.052,27**		

CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4
CONTRATISTA

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4
CONTRATISTA



CURVA S
Millones
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
-
80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
-
16,92
48,81
58,80
69,65
80,26
91,17
124,72
187,10
232,12
291,72
319,62
0,13
4,37
14,36
25,20
35,82
46,73
80,28
142,66
187,68
247,30
9/10/2023
16/10/2023
23/10/2023
30/10/2023
6/11/2023
13/11/2023
20/11/2023
27/11/2023
4/12/2023
11/12/2023
18/12/2023
Plan.SEMANAL
Ejec.SEMANAL
Gast.SEMANAL
Plan.ACUM.
Ejec.ACUM.
Gast.ACUM.

FLUJO DE CAJA SEMANAL

SEMANA	COSTO POR SEMANA	COSTO ACUMULADO
9/10/2023	$ 128.916,00	$ 128.916,00
16/10/2023	$ 4.239.113,72	$ 4.368.029,72
23/10/2023	$ 9.991.789,69	$ 14.359.819,41
30/10/2023	$ 10.843.647,53	$ 25.203.466,94
6/11/2023	$ 10.617.363,77	$ 35.820.830,71
13/11/2023	$ 10.904.564,82	$ 46.725.395,53
20/11/2023	$ 33.555.946,81	$ 80.281.342,34
27/11/2023	$ 62.378.859,27	$ 142.660.201,61
4/12/2023	$ 45.019.166,03	$ 187.679.367,64
11/12/2023	$ 59.619.964,97	$ 247.299.332,61
18/12/2023	$ 72.324.719,39	$ 319.624.052,00

$ 176.963.850,39

CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4
TEATRO SERVITÁ - USAQUEN

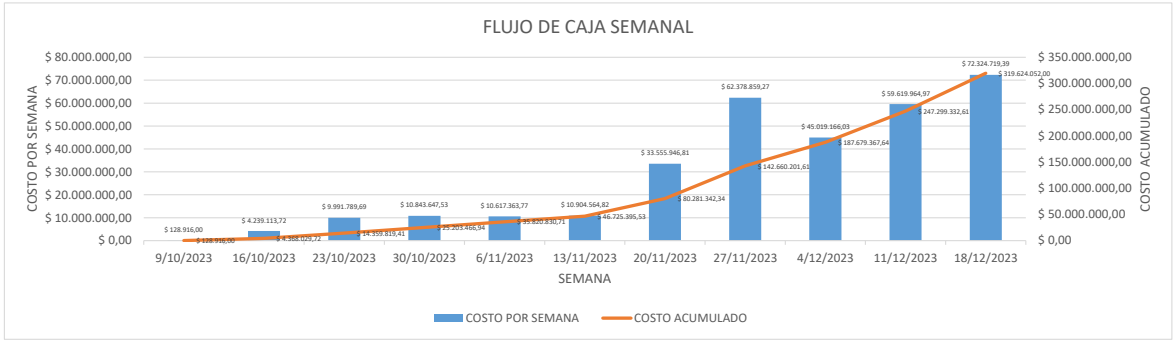


CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4
CONTRATISTA

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4
CONTRATISTA

FLUJO DE CAJA MENSUAL

MES	COSTO POR MES	COSTO ACUMULADO
sep-23	$ 4.368.029,72	$ 4.368.029,72
oct-23	$ 20.835.437,22	$ 25.203.466,94
nov-23	$ 117.456.734,67	$ 142.660.201,61
dic-23	$ 176.963.850,39	$ 319.624.052,00

CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4
TEATRO SERVITÁ - USAQUEN

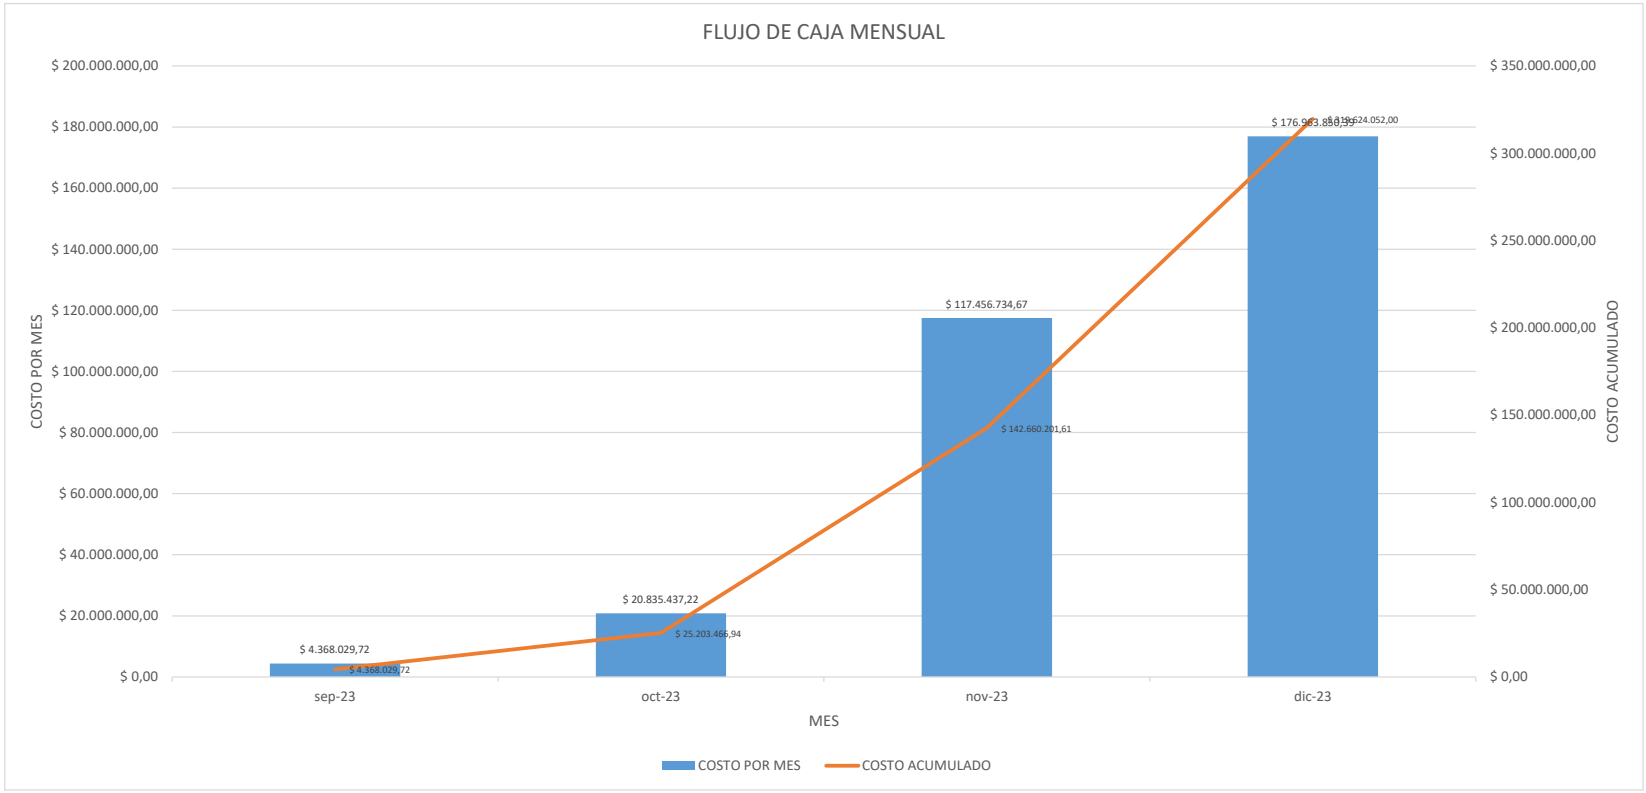

CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4
CONTRATISTA

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4
CONTRATISTA
