

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

Reporte de Avance

Julio 09, 2024

Elevate the power of your work.™


IRON MOUNTAIN®



1. Hitos del proyecto
2. Avance por actividad ORIPs
3. Avance general por actividades
4. Avance general contrato
5. Actualización
6. Registros fotográficos a áreas de procesamiento

Elevate the power of your work.™ IRON MOUNTAIN®


Hitos del Proyecto

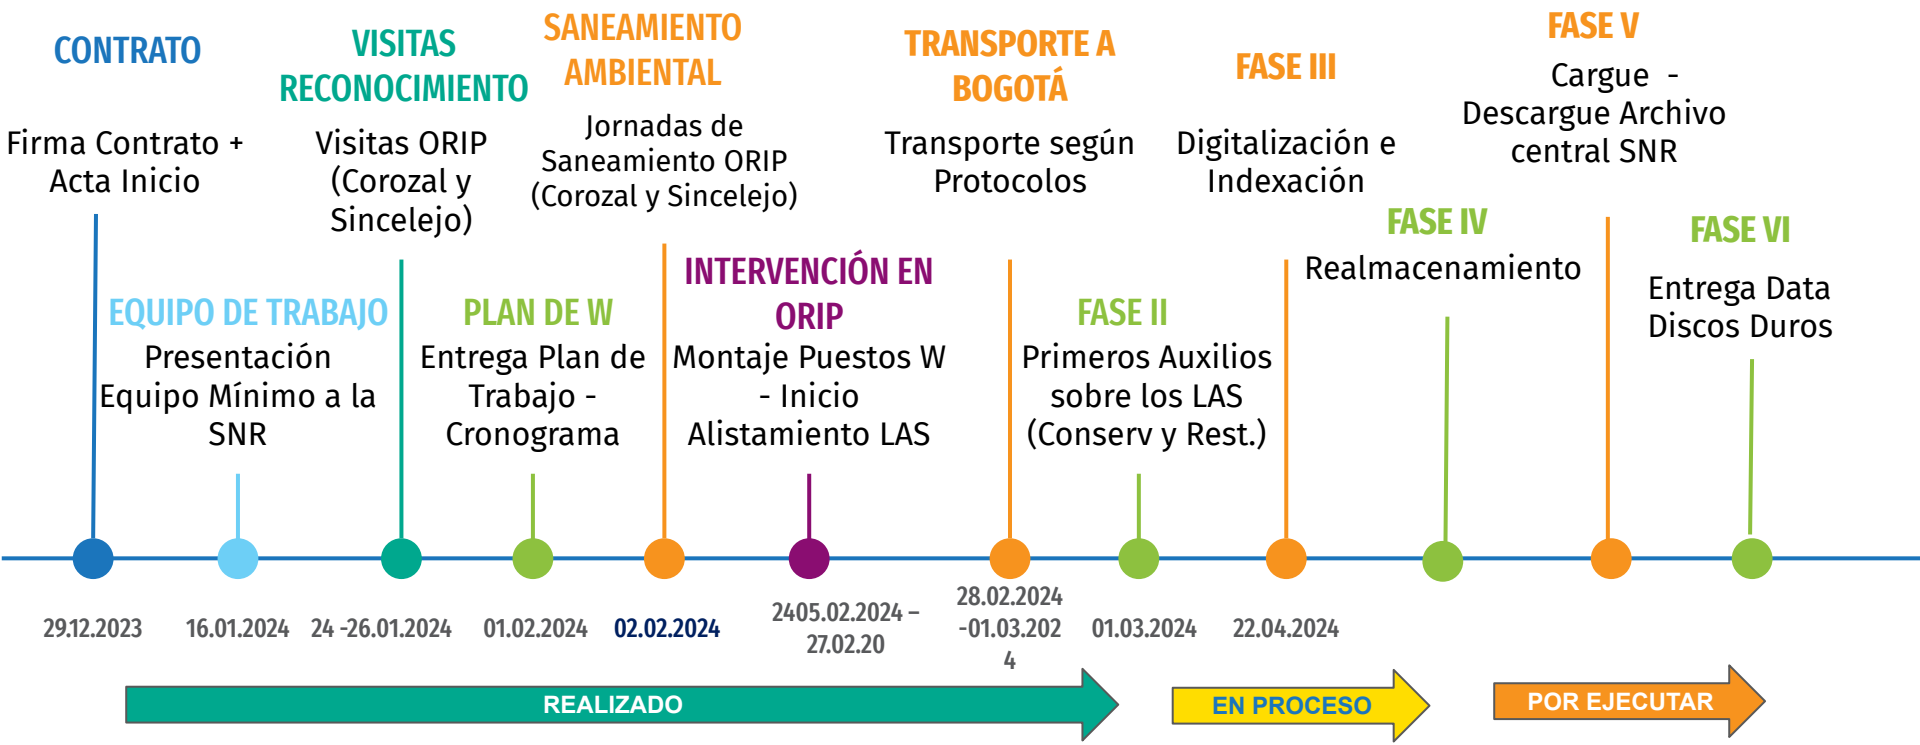

© 2023 Iron Mountain, Incorporated and/or its affiliates ("Iron Mountain"). All rights reserved.

IRON MOUNTAIN

Hitos del Proyecto

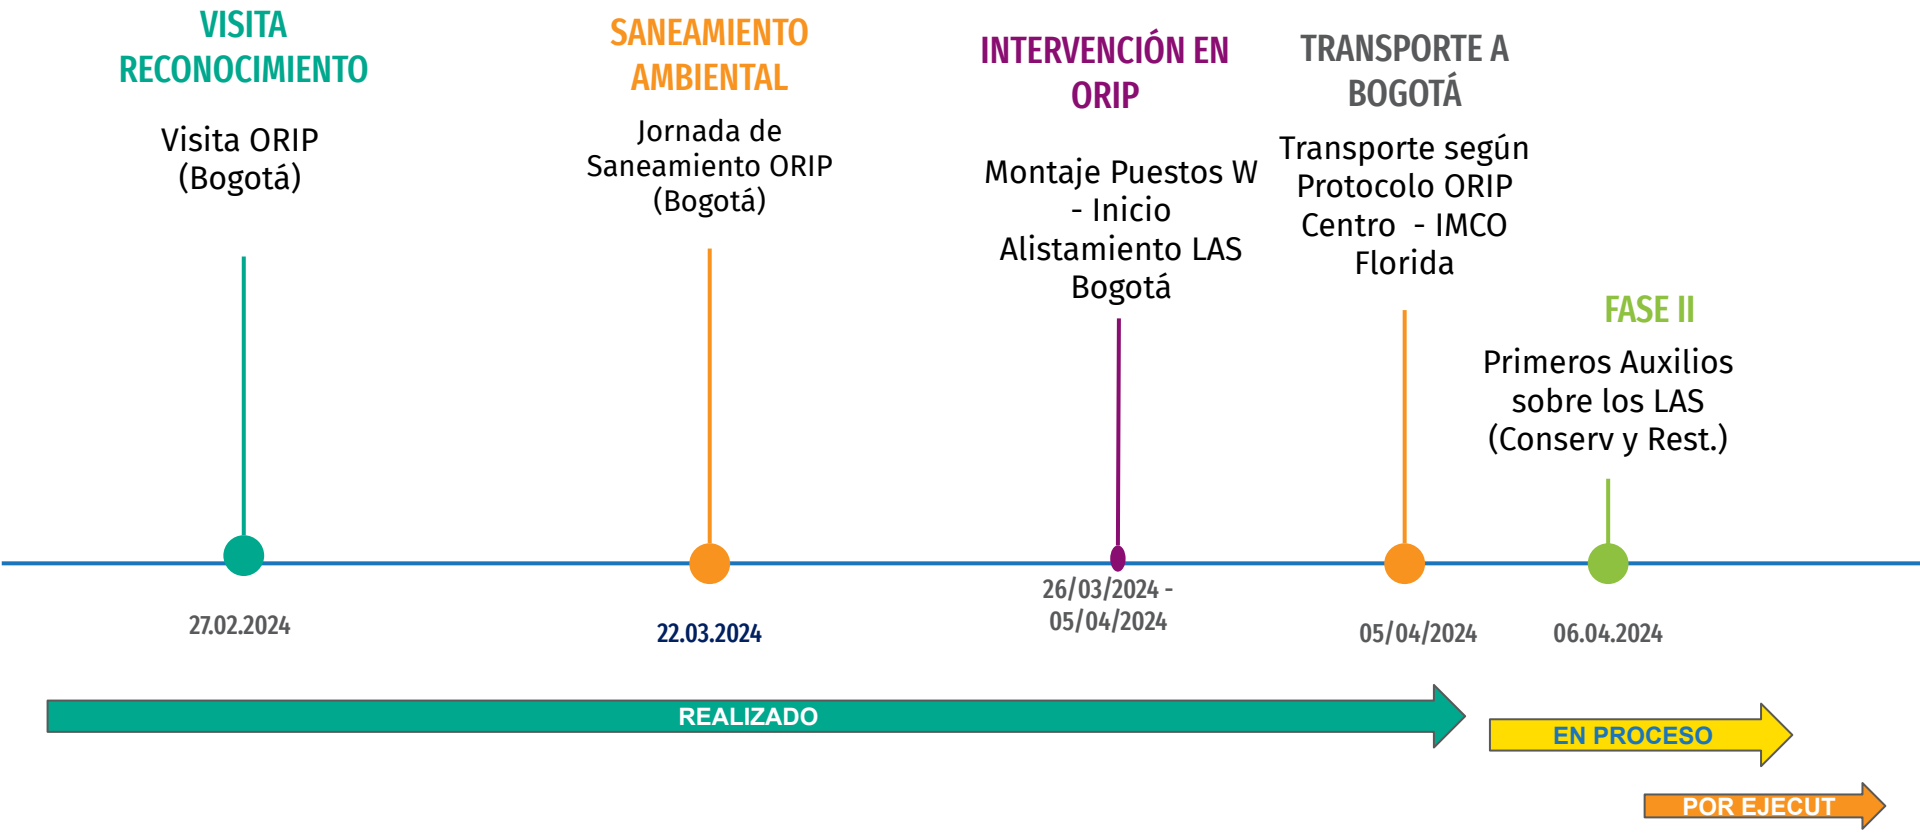

© 2023 Iron Mountain, Incorporated and/or its affiliates ("Iron Mountain"). All rights reserved.

IRON MOUNTAIN

1. Avance por actividad

Cronograma SNR			LAS Especiales	
Total Libros	1.045	Equivalencia LAS	148	Equivalencia LAS
Total Folios	258.987	863,29	21.310	71
Actividad	**Avance Libros**	**Avance Folios**	**Equivalencia LAS**	**Total Avance**
Folio a Folio Diligenciamiento	960	242.438	808,13	92%
Primeros Auxilios	950	230.018	766,73	91%

© 2023 Iron Mountain, Incorporated and/or its affiliates ("Iron Mountain"). All rights reserved.

IRON MOUNTAIN

2. LAS Especiales

LAS/Ud Especiales										
ORIP´s		Sincelejo			Bogotá			Corozal		
LAS	Folios	LAS	Avance	Folios	LAS	Avance	Folios	LAS	Avance	Folios
1.045	258.987	62		9.969	7		2.221	79	0	19.223
Equivalencia	863,29			33,23			7,40			64,077
Totales	*LAS*	148								
	Folios	31.413								
	Equivalencia	104,71								
	Avance	0								
		0,00%								

Nota: Identificados 148 LAS especiales, son conceptos internos de las profesionales, se debe realizar la mesa técnica con SNR para elaboración del acta especial.

© 2023 Iron Mountain, Incorporated and/or its affiliates ("Iron Mountain"). All rights reserved.

IRON MOUNTAIN

3. Entregas Conservaciones Iron Mountain a SNR

LAS CON PROCESOS DE CONSERVACIÓN ENTREGADAS SNR				947	239.086	
Fecha	*Sincelejo*	*Corozal*	*Bogotá*	*LAS*	*Folios*	*Actas*
15 de abril de 2024	10			10	2.757	1
22 de abril de 2024	50			50	11.151	2
24 de abril de 2024	70			70	19.327	3
30 de abril de 2024	90			90	19.044	4
02 de mayo de 2024			30	30	9.030	5
10 de mayo de 2024	31	5	116	152	46.537	6_7_8
17 de mayo de 2024		12	30	42	10.739	9_10
21 de mayo de 2024	52			52	11.679	11
24/27de mayo de 2024	138			138	33.594	12
30 de mayo de 2024	28			28	7.373	14
31 de mayo de 2024		73		73	16.527	13
05/06 de junio de 2024	27	58		85	20.043	15_16
12 de junio de 2024	4	43		47	12.253	17_18
14 de junio de 2024		9	7	16	4.509	19_20
21 de junio de 2024	5	11		16	4.164	21_22
28 de junio de 2024	15	9	1	25	5.854	23_24_25
05 de julio de 2024		5		5	1.541	26
08 de julio de 2024	15	3		18	2.964	27_28

© 2023 Iron Mountain, Incorporated and/or its affiliates ("Iron Mountain"). All rights reserved.

IRON MOUNTAIN

3. Entregas SNR - Digitalización Iron Mountain

LAS Entregas a Digitalización		Total	155.858	634
ORIP	Fecha	Entrega	Folios	LAS
Sincelejo	24 abril	1	2.757	10
Sincelejo	30 abril	2	11.151	50
Sincelejo	08 mayo	3	19.327	70
Sincelejo	15 mayo	4	19.044	90
Bogotá	15 mayo	5	9.030	30
Corozal	15 mayo	8	1.141	5
Sincelejo	16 mayo	7	6.528	31
Bogotá	23 mayo	6	30.868	116
Bogotá	23 mayo	9	8.272	30
Corozal	23 mayo	10	2.467	12
Sincelejo	05 junio	11	11.679	52
Sincelejo	05 junio	12	33.594	138

© 2023 Iron Mountain, Incorporated and/or its affiliates ("Iron Mountain"). All rights reserved.

IRON MOUNTAIN


3. Entregas Iron Mountain Digitalización - SNR

LAS Digitalizadas Entregadas IRM a SNR		Total	36.414	159
ORIP	Fecha	Entrega	Folios	LAS
Sincelejo	20 Mayo	1	2.818	11
Sincelejo	31 Mayo	2	1.177	6
Sincelejo	05 Junio	3	868	5
Sincelejo	11 junio	4	2.092	9
Sincelejo	11 junio	5	6.302	25
Sincelejo	18 junio	6	6.008	24
Sincelejo	26 junio	7	6.098	25
Sincelejo	2 julio	8	6.983	26
Bogotá	2 julio	9	703	3
Sincelejo	5 julio	10	1.199	5
Bogotá	5 julio	11	2.166	8
Sincelejo	9 julio	12	3.101	10
Bogotá	9 julio	13	538	2

© 2023 Iron Mountain, Incorporated and/or its affiliates ("Iron Mountain"). All rights reserved.

IRON MOUNTAIN

3. Consultas ORIP

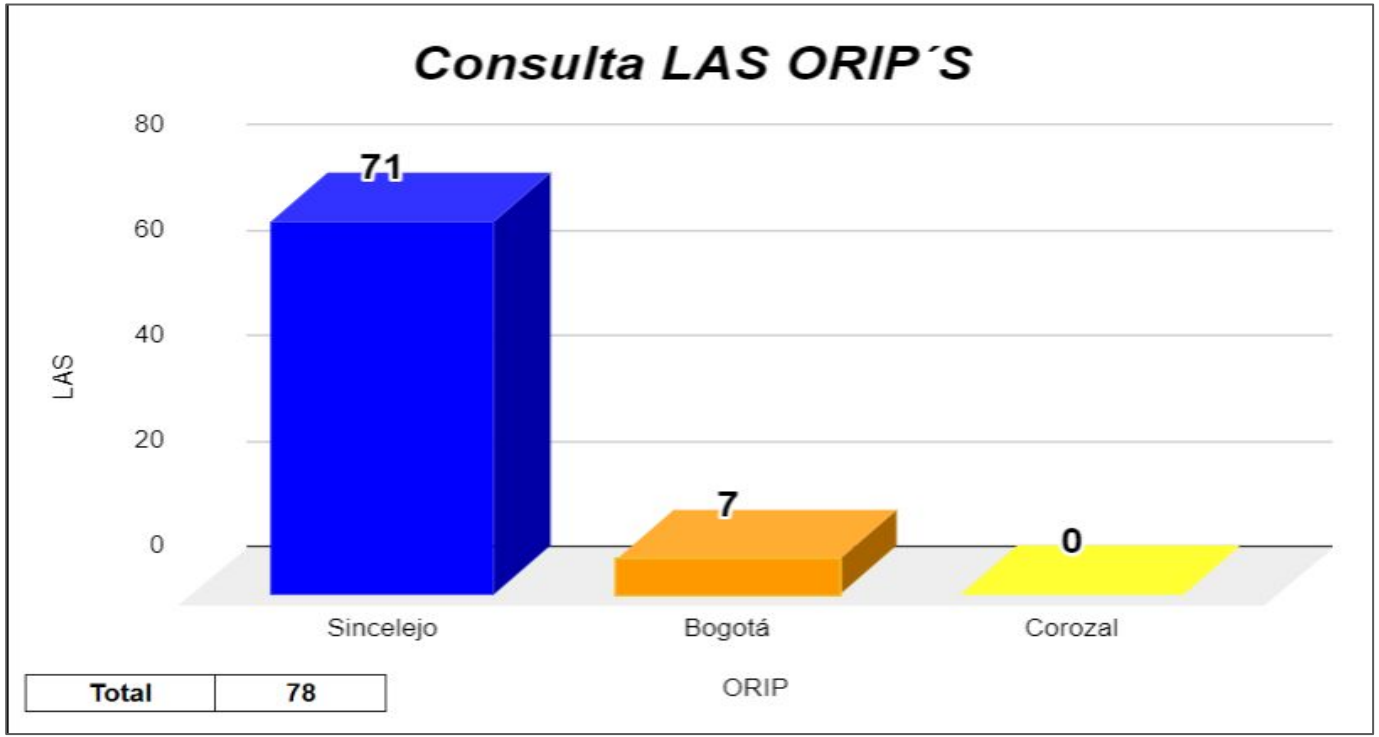

© 2023 Iron Mountain, Incorporated and/or its affiliates ("Iron Mountain"). All rights reserved.

IRON MOUNTAIN

4. Avance General

No.	Proceso General	%	No. De Act.	Actividad	% Por Actividad	LAS DE AVANCE	% DE AVANCE
1	Saneamiento ambiental en sitio, inventario diagnóstico de conservación, alistamiento y traslado a las instalaciones del contratista.	5%	1.1	Visitas de Reconocimiento	1.3%	863	1.3%
			1.2	Jornadas de saneamiento ambiental	1.3%	863	1.3%
			1.3	Inventario Diagnóstico	1.3%	863	1.25%
			1.4	Alistamiento y traslado a la bodega del contratista	1.3%	863	1.3%
2	Entrega de LAS terminados con los Procesos técnicos de Conservación documental, digitalización, indexación, inventario documental, almacenamiento y re almacenamiento.	80%	2.1	Procesos Técnicos de Conservación	30%	867	30.1%
			2.2	Procesos Técnicos de Digitalización e Indexación	30%	159	5.5%
			2.3	Inventario Documental	10%		0.0%
			2.4	Almacenamiento y Re almacenamiento	10%		0.0%
3	Cargue, Traslado y descargue en el archivo central de la SNR	5%	3.1	Carga, traslado y descargue	5%		0.0%
4	Proceso de entrega en discos duros 2 copias originales de la data estructurada y no estructurada, por ORIP.	10%	4.1	Entrega de Data Estructurada y No Estructurada - SQL (Discos)	10%		0.0%
TOTAL		**100%**			**100%**		**40.67%**

© 2023 Iron Mountain, Incorporated and/or its affiliates ("Iron Mountain"). All rights reserved.

IRON MOUNTAIN

5. Actualización

Próximos pasos

- Continuidad al proceso de intervención por parte de la microbiología de LAS de Sincelejo, Corozal y Bogotá.

Prioridades

- Dar continuidad y seguimiento al plan de trabajo
- Definir plan de Entrega Digitalización.
- Se continua con la descripción de los libros proceso de DIAGNÓSTICO

Pendientes SNR

- Continuar con la descripción de los libros proceso de DIAGNÓSTICO.

© 2023 Iron Mountain, Incorporated and/or its affiliates ("Iron Mountain"). All rights reserved.

IRON MOUNTAIN

6. Registros fotográficos áreas de procesamiento



PRIMEROS AUXILIOS



DIAGNÓSTICO FOLIO A FOLIO

© 2023 Iron Mountain, Incorporated and/or its affiliates ("Iron Mountain"). All rights reserved.

IRON MOUNTAIN

6. Registros fotográficos áreas de procesamiento



ÁREA DIGITALIZACIÓN



ÁREA DIGITALIZACIÓN

© 2023 Iron Mountain, Incorporated and/or its affiliates ("Iron Mountain"). All rights reserved.

IRON MOUNTAIN

6. Registros fotográficos áreas de procesamiento



PUESTOS DE TRABAJO SUPERVISIÓN

© 2023 Iron Mountain, Incorporated and/or its affiliates ("Iron Mountain"). All rights reserved.

IRON MOUNTAIN



¡Gracias!

Elevate the power of your work.™

IRON MOUNTAIN®
