
AMHS

Actualizar, Integrar y Poner en Servicio AMHS (VIGENCIA FUTURA)

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	% completac
1		**CONTRATO 23001326 H3 2023 (AMHS)**	**220 días**	**vie 29/12/23**	**jue 31/10/24**	**60%**
2		**Etapa Administrativa**	**165 días**	**vie 29/12/23**	**jue 15/08/24**	**0%**
3		Firma del Contrato	0 días	vie 29/12/23	vie 29/12/23	100%
4		Aprobación de Polizas	0 días	lun 5/02/24	lun 5/02/24	100%
5		Acta de Inicio	0 días	mié 7/02/24	mié 7/02/24	100%
6		Recibo de Equipos en Colombia	0 días	vie 2/08/24	vie 2/08/24	0%
7		Nacionalización y movimiento a Bodegas Aerocivil	10 días	vie 2/08/24	jue 15/08/24	0%
8		Ingreso al Almacen de Aerocivil	0 días	jue 15/08/24	jue 15/08/24	0%
9		**Etapa de Planeación**	**49 días**	**mié 7/02/24**	**mar 16/04/2**	**100%**
10		Elaboración de Diseño final del Sistema	18 días	mié 7/02/24	vie 1/03/24	100%
11		Aprobación del diseño	0 días	vie 8/03/24	vie 8/03/24	100%
12		Emision de OC	5 días	mié 7/02/24	mar 13/02/2	100%
13		Levantamiento de información actualizada	10 días	lun 4/03/24	vie 15/03/24	100%
14		Elaboración del Protocolo de Pruebas FAT	10 días	lun 1/04/24	vie 12/04/24	100%
15		Aprobación del Protocolo de pruebas FAT	0 días	mar 16/04/2	mar 16/04/2	100%
16		**Etapa de Alistamiento**	**143 días**	**mié 14/02/2**	**vie 30/08/24**	**77%**
17		Adquisición del Hardware	45 días	mié 14/02/2	mar 16/04/2	100%
18		Envio de Backup actualizados	1 día	mié 17/04/2	mié 17/04/2	100%
19		Configuración y alistamiento de Componentes	15 días	jue 18/04/24	mié 8/05/24	100%
20		Importación y Nacionalización de Equipos y Licencias	25 días	lun 24/06/24	vie 26/07/24	100%
21		Entrega de Equipos en Almacén	1 día	vie 2/08/24	vie 2/08/24	0%
22		Proceso interno AEROCIVIL	5 días	lun 5/08/24	vie 9/08/24	0%
23		Aceptación de equipos en Almacén	1 día	lun 12/08/24	lun 12/08/24	0%
24		Visita de Inspección (Site Survey)	2 días	jue 1/08/24	vie 2/08/24	0%
25		Instalación de infraestructura requerida	15 días	lun 12/08/24	vie 30/08/24	0%
26		Instalación de equipos en puntos temporales	2 días	mar 20/08/2	mié 21/08/2	0%
27		**Etapa de Pruebas**	**79 días**	**lun 10/06/24**	**jue 26/09/24**	**25%**
28		Pruebas FAT	5 días	lun 10/06/24	vie 14/06/24	100%
29		Acta de aprobación de Pruebas FAT	0 días	vie 14/06/24	vie 14/06/24	100%
30		Pruebas SAT	5 días	lun 2/09/24	vie 6/09/24	0%
31		Acta de aprobación de Pruebas SAT	0 días	vie 6/09/24	vie 6/09/24	0%
32		Pruebas Aerocivil	10 días	vie 13/09/24	jue 26/09/24	0%
33		**Capacitaciones**	**18 días**	**mié 11/09/2**	**vie 4/10/24**	**0%**
34		Capacitación en Sitio	2 días	mié 11/09/2	jue 12/09/24	0%
35		Capacitación Remota 1	1 día	mar 24/09/2	mar 24/09/2	0%
36		Capacitación Remota 2	1 día	vie 4/10/24	vie 4/10/24	0%
37		**Etapa de Transicion y entrega**	**39 días**	**lun 9/09/24**	**jue 31/10/24**	**0%**
38		Transicion entre AMHS Antiguo y Nuevo	15 días	vie 11/10/24	jue 31/10/24	0%
39		Elaboración y Entrega de Documentación	20 días	lun 9/09/24	vie 4/10/24	0%
40		Acta de Entrega	0 días	jue 31/10/24	jue 31/10/24	0%

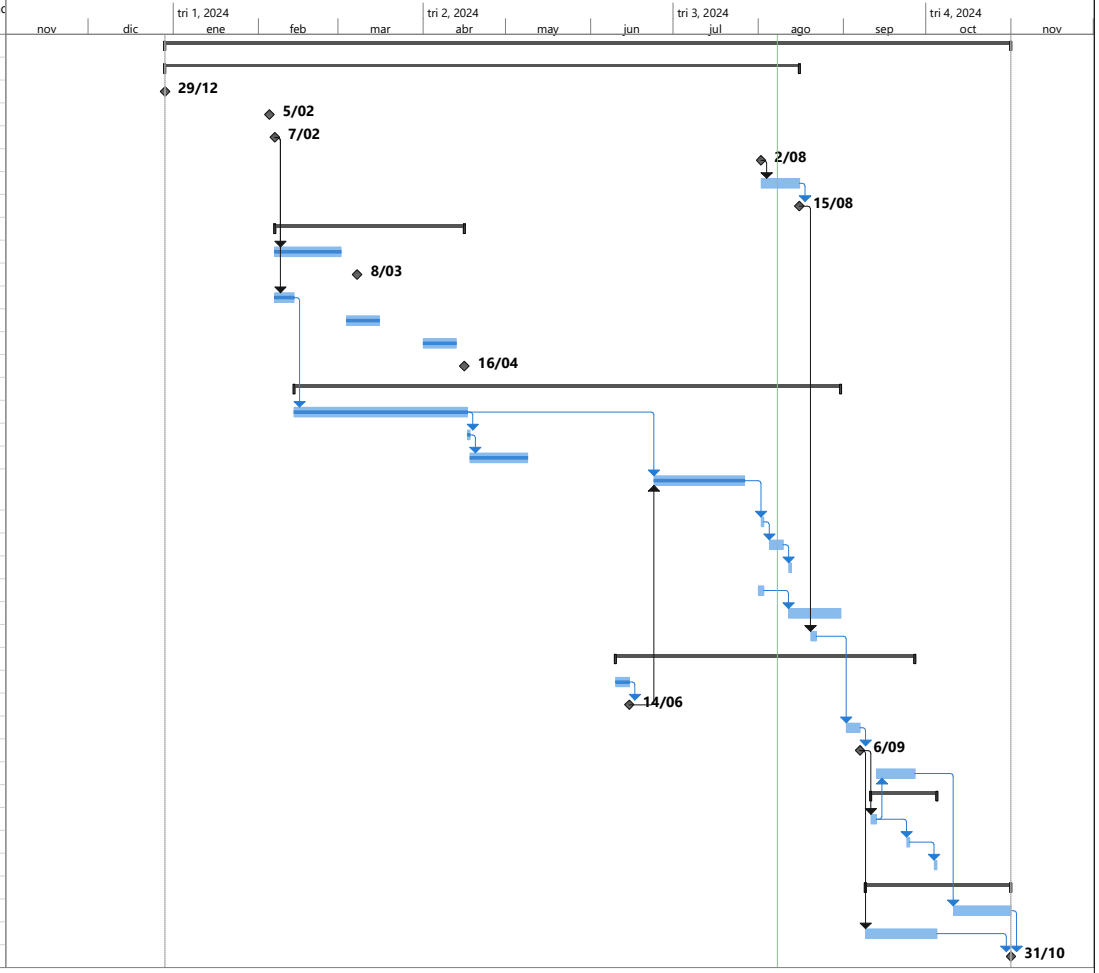

Project: AMHS v1
Date: jue 8/08/24

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline	
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress	
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress	
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone		
