
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**OBRA BARRANQUILLA MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - CONSORCIO TECALINAS**	**49,1 días**	**mié 20/12/23**	**jue 29/02/24**	
2		INICIO DE OBRA	0 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	
3		**EQUIPOS**	**49,1 días**	**mié 20/12/23**	**jue 29/02/24**	**2**
4		Andamios	44,6 días	vie 22/12/23	mar 27/02/24	5CC+2 días
5		Herramienta menor	49,1 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	2
6		Pulidora piso + operario	6,4 días	sáb 23/12/23	mié 3/01/24	5CC+2 días
7		ROTOMARTILLO	3,2 días	vie 5/01/24	mié 10/01/24	5CC+10 días
8		FIN DE OBRA	0 días	jue 29/02/24	jue 29/02/24	2;3;4;5;6;7

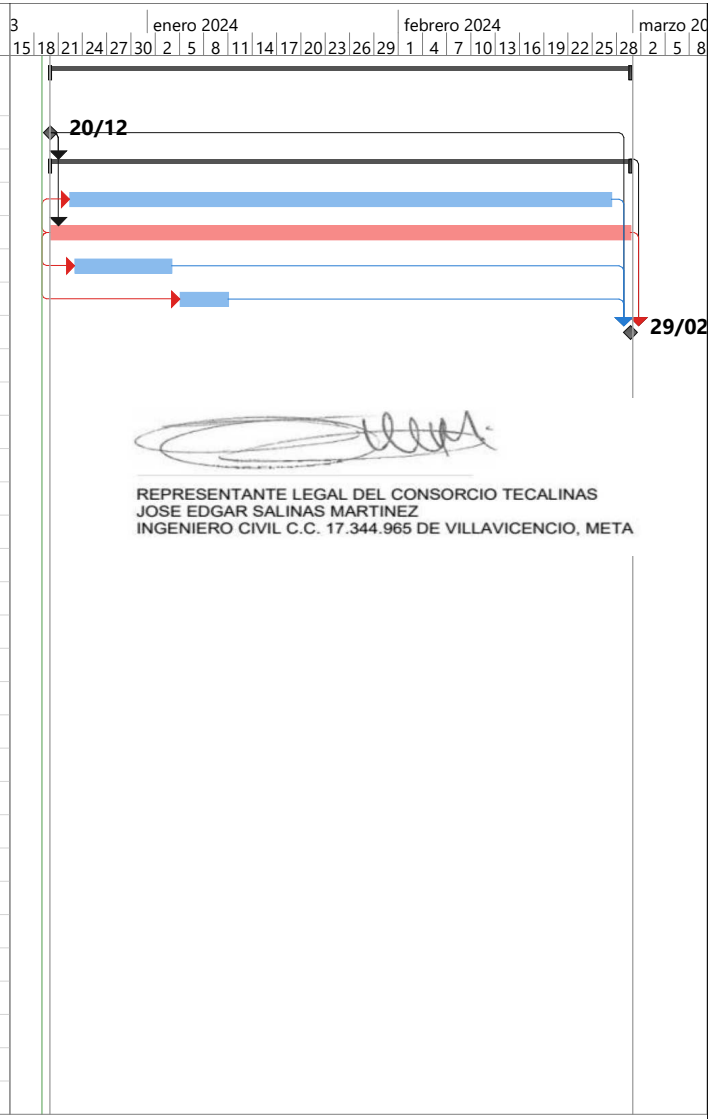

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO TECALINAS
JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ
INGENIERO CIVIL C.C. 17.344.965 DE VILLAVICENCIO, META

Proyecto: PROGRAMACION BA
Fecha: mar 19/12/23

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica		
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso		
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual		
Resumen	solo duración	Hito externo			
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite			
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas			
