

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**OBRA BARRANQUILLA MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - CONSORCIO TECALINAS**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
2		**EQUIPOS**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
3		**Andamios**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
4		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	
5		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	4
6		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	5
7		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6
8		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	7
9		**Herramienta menor**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
10		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
11		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
12		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
13		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
14		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
15		**Pulidora piso + operario**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
16		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
17		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
18		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
19		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
20		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
21		**ROTOMARTILLO**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
22		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
23		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
24		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
25		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
26		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
27		**MATERIALES**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
28		**Abrazadera para tubo 1/2**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
29		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
30		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
31		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
32		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
33		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
34		**Abrazadera para tubo 2"**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
35		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
36		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
37		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
38		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
39		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
40		**ACCESORIOS PVC 1/2"**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
41		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
42		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
43		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
44		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
45		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
46		**Accesorios pvc, pegante**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
47		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
48		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
49		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
50		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
51		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
52		**Acido nitrico**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
53		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
54		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
55		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
56		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
57		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
58		**Adaptador macho 1/2 "**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
59		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
60		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
61		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
62		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
63		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
64		**Agua**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
65		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
66		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
67		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
68		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
69		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
70		**Alero 1,50 x 1,25**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
71		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
72		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
73		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
74		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
75		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
76		**Amarre acero carbono 2 un**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
77		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
78		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
79		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
80		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
81		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
82		**Amarres teja**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
83		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
84		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
85		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
86		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
87		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
88		**anclajes**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
89		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
90		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
91		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
92		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
93		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
94		**Angulo cal. 26 lamina galv. 2,44 m. 30X20X0,38**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
95		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
96		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
97		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
98		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
99		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
100		**Anticorrosivo**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
101		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
102		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
103		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
104		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
105		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
106		**Bisagra pivote 150**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
107		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
108		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
109		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
110		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
111		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
112		**Bloque N° 5**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
113		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
114		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
115		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
116		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
117		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
118		**Boquilla latex plus blanca**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
119		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
120		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
121		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
122		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
123		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
124		**BROCHA**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
125		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
126		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
127		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
128		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
129		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
130		**Cable acero plastificado 1/8**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
131		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
132		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
133		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
134		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
135		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
136		**Cable de Cu 12 AWG LSZH**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
137		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
138		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
139		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
140		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
141		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
142		**Cable de Cu encauchetado 3x16 AWG**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
143		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
144		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
145		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
146		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
147		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
148		**Caja Metálica 5800 galvanizada**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
149		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
150		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
151		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
152		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
153		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
154		**Caja Metálica octogonal galvanizada**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
155		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
156		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
157		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
158		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
159		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
160		**Canal 8 9x2,44 cal 26**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
161		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
162		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
163		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
164		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
165		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
166		**carga fulminante**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
167		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
168		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
169		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
170		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
171		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
172		**Cemento Blanco**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
173		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
174		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
175		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
176		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
177		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
178		**cera piso**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
179		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
180		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
181		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
182		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
183		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
184		**Cerradura de seguridad**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
185		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
186		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
187		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
188		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
189		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
190		**Cerradura tipo manija**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
191		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
192		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
193		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
194		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
195		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
196		**Chazo expansivo 1/4 x 3/8**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
197		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
198		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
199		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
200		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
201		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
202		**Chazo plastico 1/4"**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
203		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
204		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
205		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
206		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
207		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
208		**Cierra puerta piso 150 kg**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
209		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
210		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
211		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
212		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
213		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
214		**Cinta aislante**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
215		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
216		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
217		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
218		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
219		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
220		**Cinta anti dust 25 mm**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
221		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
222		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
223		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
224		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
225		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
226		**Cinta de papel**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
227		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
228		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
229		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
230		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
231		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
232		**Cinta teflon**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
233		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
234		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
235		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
236		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
237		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
238		**Clavija 15A 125V aérea NEMA 6-15PV**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
239		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
240		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
241		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
242		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
243		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
244		**Codo 2"**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
245		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
246		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
247		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
248		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
249		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
250		**Codo 90° presion**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
251		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
252		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
253		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
254		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
255		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
256		**Concertina 30 cm diametro 10 M.**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
257		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
258		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
259		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
260		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
261		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
262		**CONCRETO 2500 PSI**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
263		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
264		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
265		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
266		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
267		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
268		**CONCRETO 3000 PSI**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
269		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
270		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
271		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
272		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
273		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
274		**Conector rosca amarillo - rojo 3M X 100 Un**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
275		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
276		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
277		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
278		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
279		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
280		**conector tapa y base 5.9 m**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
281		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
282		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
283		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
284		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
285		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
286		**Consumibles y Accesorios**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
287		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
288		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
289		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
290		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
291		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
292		**Curva 90° EMT de 1/2"**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
293		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
294		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
295		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
296		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
297		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
298		**Emulsion asfaltica ed-9**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
299		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
300		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
301		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
302		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
303		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
304		**Estuco plastico**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
305		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
306		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
307		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
308		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
309		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
310		**GARGOLA EN CONCRETO 30x18x7**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
311		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
312		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
313		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
314		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
315		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
316		**Graniplast Cuñete**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
317		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
318		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
319		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
320		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
321		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
322		**Grapa metálica aleta doble 1/2"**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
323		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
324		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
325		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
326		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
327		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
328		**Guardacanto flecha 8 mm.**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
329		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
330		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
331		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
332		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
333		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
334		**Hipermanto 3 mm refuerzo polietileno texsa**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
335		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
336		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
337		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
338		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
339		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
340		**Interruptor sencillo LEGRAND**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
341		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
342		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
343		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
344		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
345		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
346		**Junta plastica**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
347		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
348		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
349		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
350		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
351		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
352		**KORAZA doble vida 10**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
353		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
354		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
355		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
356		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
357		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
358		**Lamina fibrocemento 6 mm**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
359		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
360		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
361		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
362		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
363		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
364		**lamina policarbonato alveolar 8 mm.**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
365		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
366		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
367		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
368		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
369		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
370		**lija**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
371		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
372		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
373		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
374		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
375		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
376		**LIMPIADOR PVC 1/4**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
377		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
378		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
379		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
380		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
381		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
382		**malla electrosoldada 15 X 15 CM. 4 mm.**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
383		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
384		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
385		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
386		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
387		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
388		**Masilla supermastico**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
389		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
390		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
391		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
392		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
393		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
394		**MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
395		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
396		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
397		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
398		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
399		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
400		**mortero 1:3**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
401		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
402		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
403		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
404		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
405		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
406		**Panel Led 60x60, 40W, 4000K, 3200lm, driver 100-277V**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
407		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
408		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
409		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
410		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
411		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
412		**Paral 8 9x2,44 cal. 26**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
413		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
414		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
415		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
416		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
417		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
418		**Pegacor ceramico gris 25 Kg**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
419		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
420		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
421		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
422		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
423		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
424		**Perfil omega metalico 63 mm x 3,05**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
425		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
426		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
427		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
428		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
429		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
430		**Pintura MARINA ANTIINCRUSTANTE**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
431		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
432		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
433		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
434		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
435		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
436		**Pintura superlavable max Corona**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
437		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
438		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
439		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
440		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
441		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
442		**Pintura vinilo aceite - pintulux**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
443		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
444		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
445		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
446		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
447		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
448		**pirlan cobre**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
449		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
450		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
451		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
452		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
453		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
454		**Piso pared cayey blanco 0,205*0,205**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
455		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
456		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
457		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
458		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
459		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
460		**Prensaestopas Nylón 18-25mm**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
461		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
462		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
463		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
464		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC

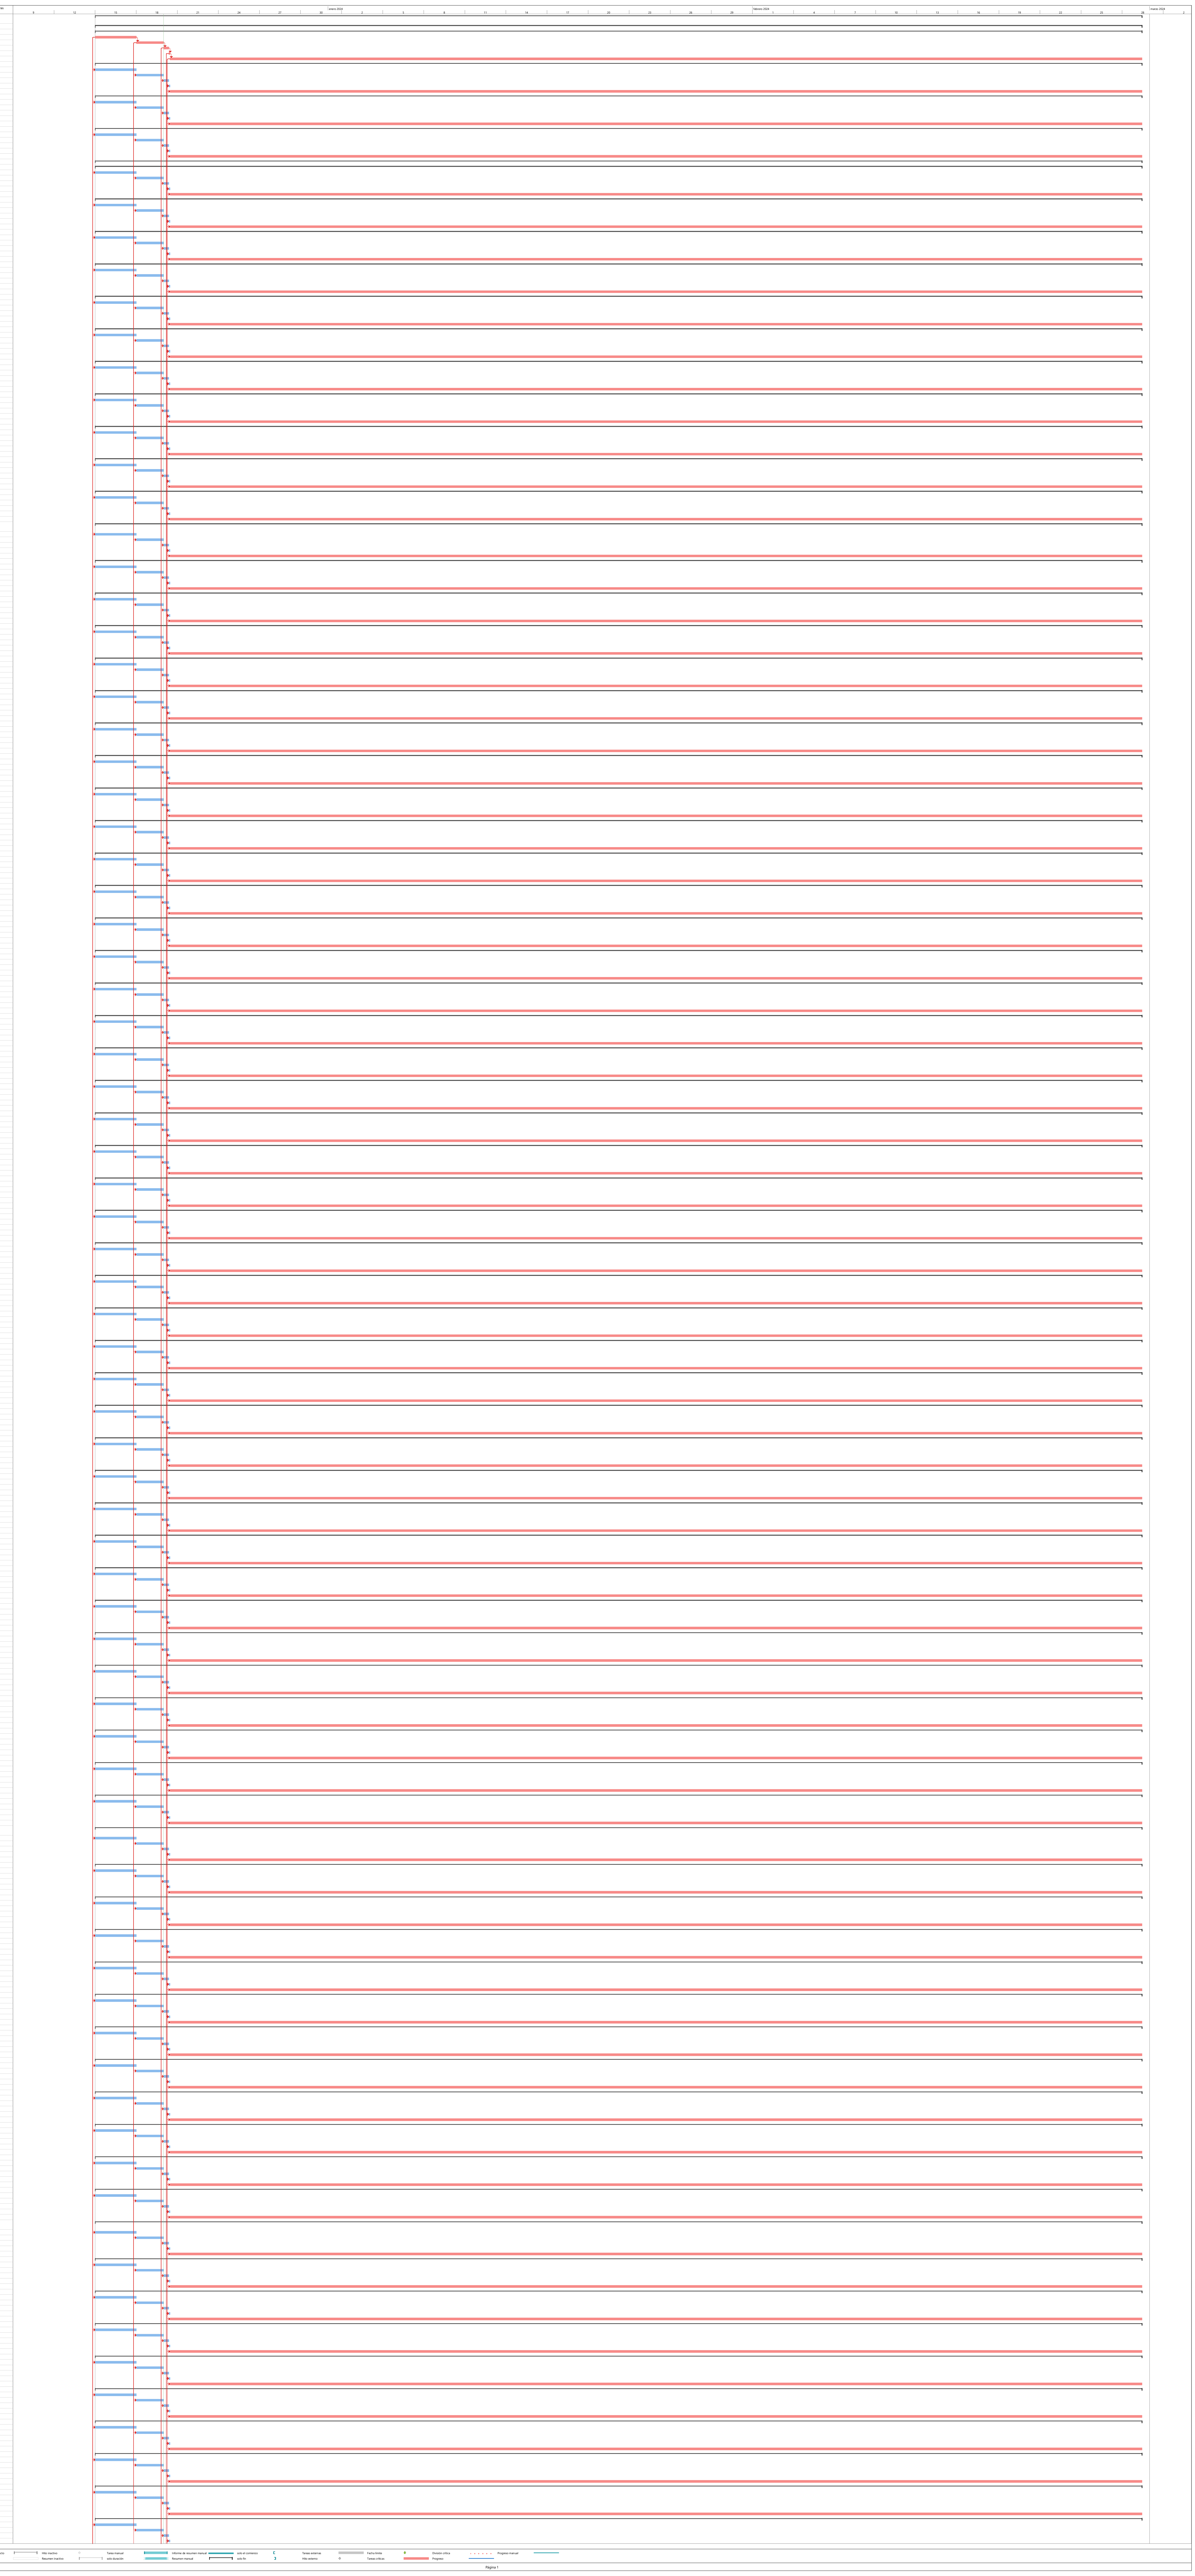

Proyecto: PROGRAMACION BA
Fecha: mié 20/12/23

Tarea | División | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo | Tarea manual | solo duración | Informe de resumen manual | Resumen manual | solo el comienzo | solo fin | Tareas externas | Hito externo | Fecha límite | Tareas críticas | División crítica | Progreso | Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
465		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
466		**protector guardacamilla 1600 depot**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
467		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
468		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
469		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
470		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
471		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
472		**Registro de bola metalico**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
473		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
474		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
475		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
476		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
477		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
478		**remate aluminio U 8 mm.**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
479		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
480		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
481		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
482		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
483		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
484		**Rodillo 9" Felpa acrilica**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
485		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
486		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
487		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
488		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
489		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
490		**Sikadur 32**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
491		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
492		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
493		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
494		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
495		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
496		**Silicona acetica**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
497		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
498		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
499		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
500		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
501		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
502		**SOLDADURA PVC 1/8**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
503		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
504		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
505		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
506		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
507		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
508		**Tabla chapa**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
509		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
510		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
511		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
512		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
513		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
514		**Tablon granito Blanco huila**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
515		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
516		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
517		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
518		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
519		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
520		**Tapa inspeccion 60 x 60 drywall**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
521		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
522		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
523		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
524		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
525		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
526		**Tapon roscado**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
527		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
528		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
529		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
530		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
531		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
532		**teja fibrocemento perfil 7 #6**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
533		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
534		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
535		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
536		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
537		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
538		**Terminal conector EMT de 1/2"**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
539		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
540		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
541		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
542		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
543		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
544		**Terminales**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
545		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
546		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
547		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
548		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
549		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
550		**Tornillo 7 x 7/16**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
551		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
552		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
553		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
554		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
555		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
556		**tornillos**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
557		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
558		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
559		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
560		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
561		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
562		**tornillos avellanado**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
563		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
564		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
565		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
566		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
567		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
568		**Tuberia Conduit EMT de 1/2" x 3m**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
569		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
570		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
571		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
572		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
573		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
574		**Tuberia pvc 2"**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
575		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
576		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
577		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
578		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
579		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
580		**Tubo PVCP RDE 9 DE 1/2"**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
581		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
582		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
583		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
584		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
585		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
586		**tubo rectangular 80x40 mm. espesor**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
587		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
588		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
589		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
590		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
591		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
592		**Union 2"**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
593		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
594		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
595		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
596		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
597		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
598		**Unión metálica EMT de 1/2"**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
599		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
600		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
601		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
602		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
603		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
604		**Vidrio 3+3 templado lamina pvb**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
605		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
606		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
607		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
608		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
609		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
610		**SUBCONTRATOS**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
611		**Subcontrato canales galv.cal. 18,**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
612		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
613		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
614		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
615		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
616		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
617		**Subcontrato Carpinteria**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
618		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
619		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
620		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
621		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
622		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC
623		**Subcontrato carpinteria aluminio**	**76,4 días**	**vie 15/12/23**	**jue 29/02/24**	
624		COTIZACION	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	4CC
625		PRESENTACION DE MUESTRAS	2 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	5CC
626		CONTRATACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	6CC
627		FABRICACION	0,2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	7CC
628		SUMINISTRO	71 días	mié 20/12/23	jue 29/02/24	8CC

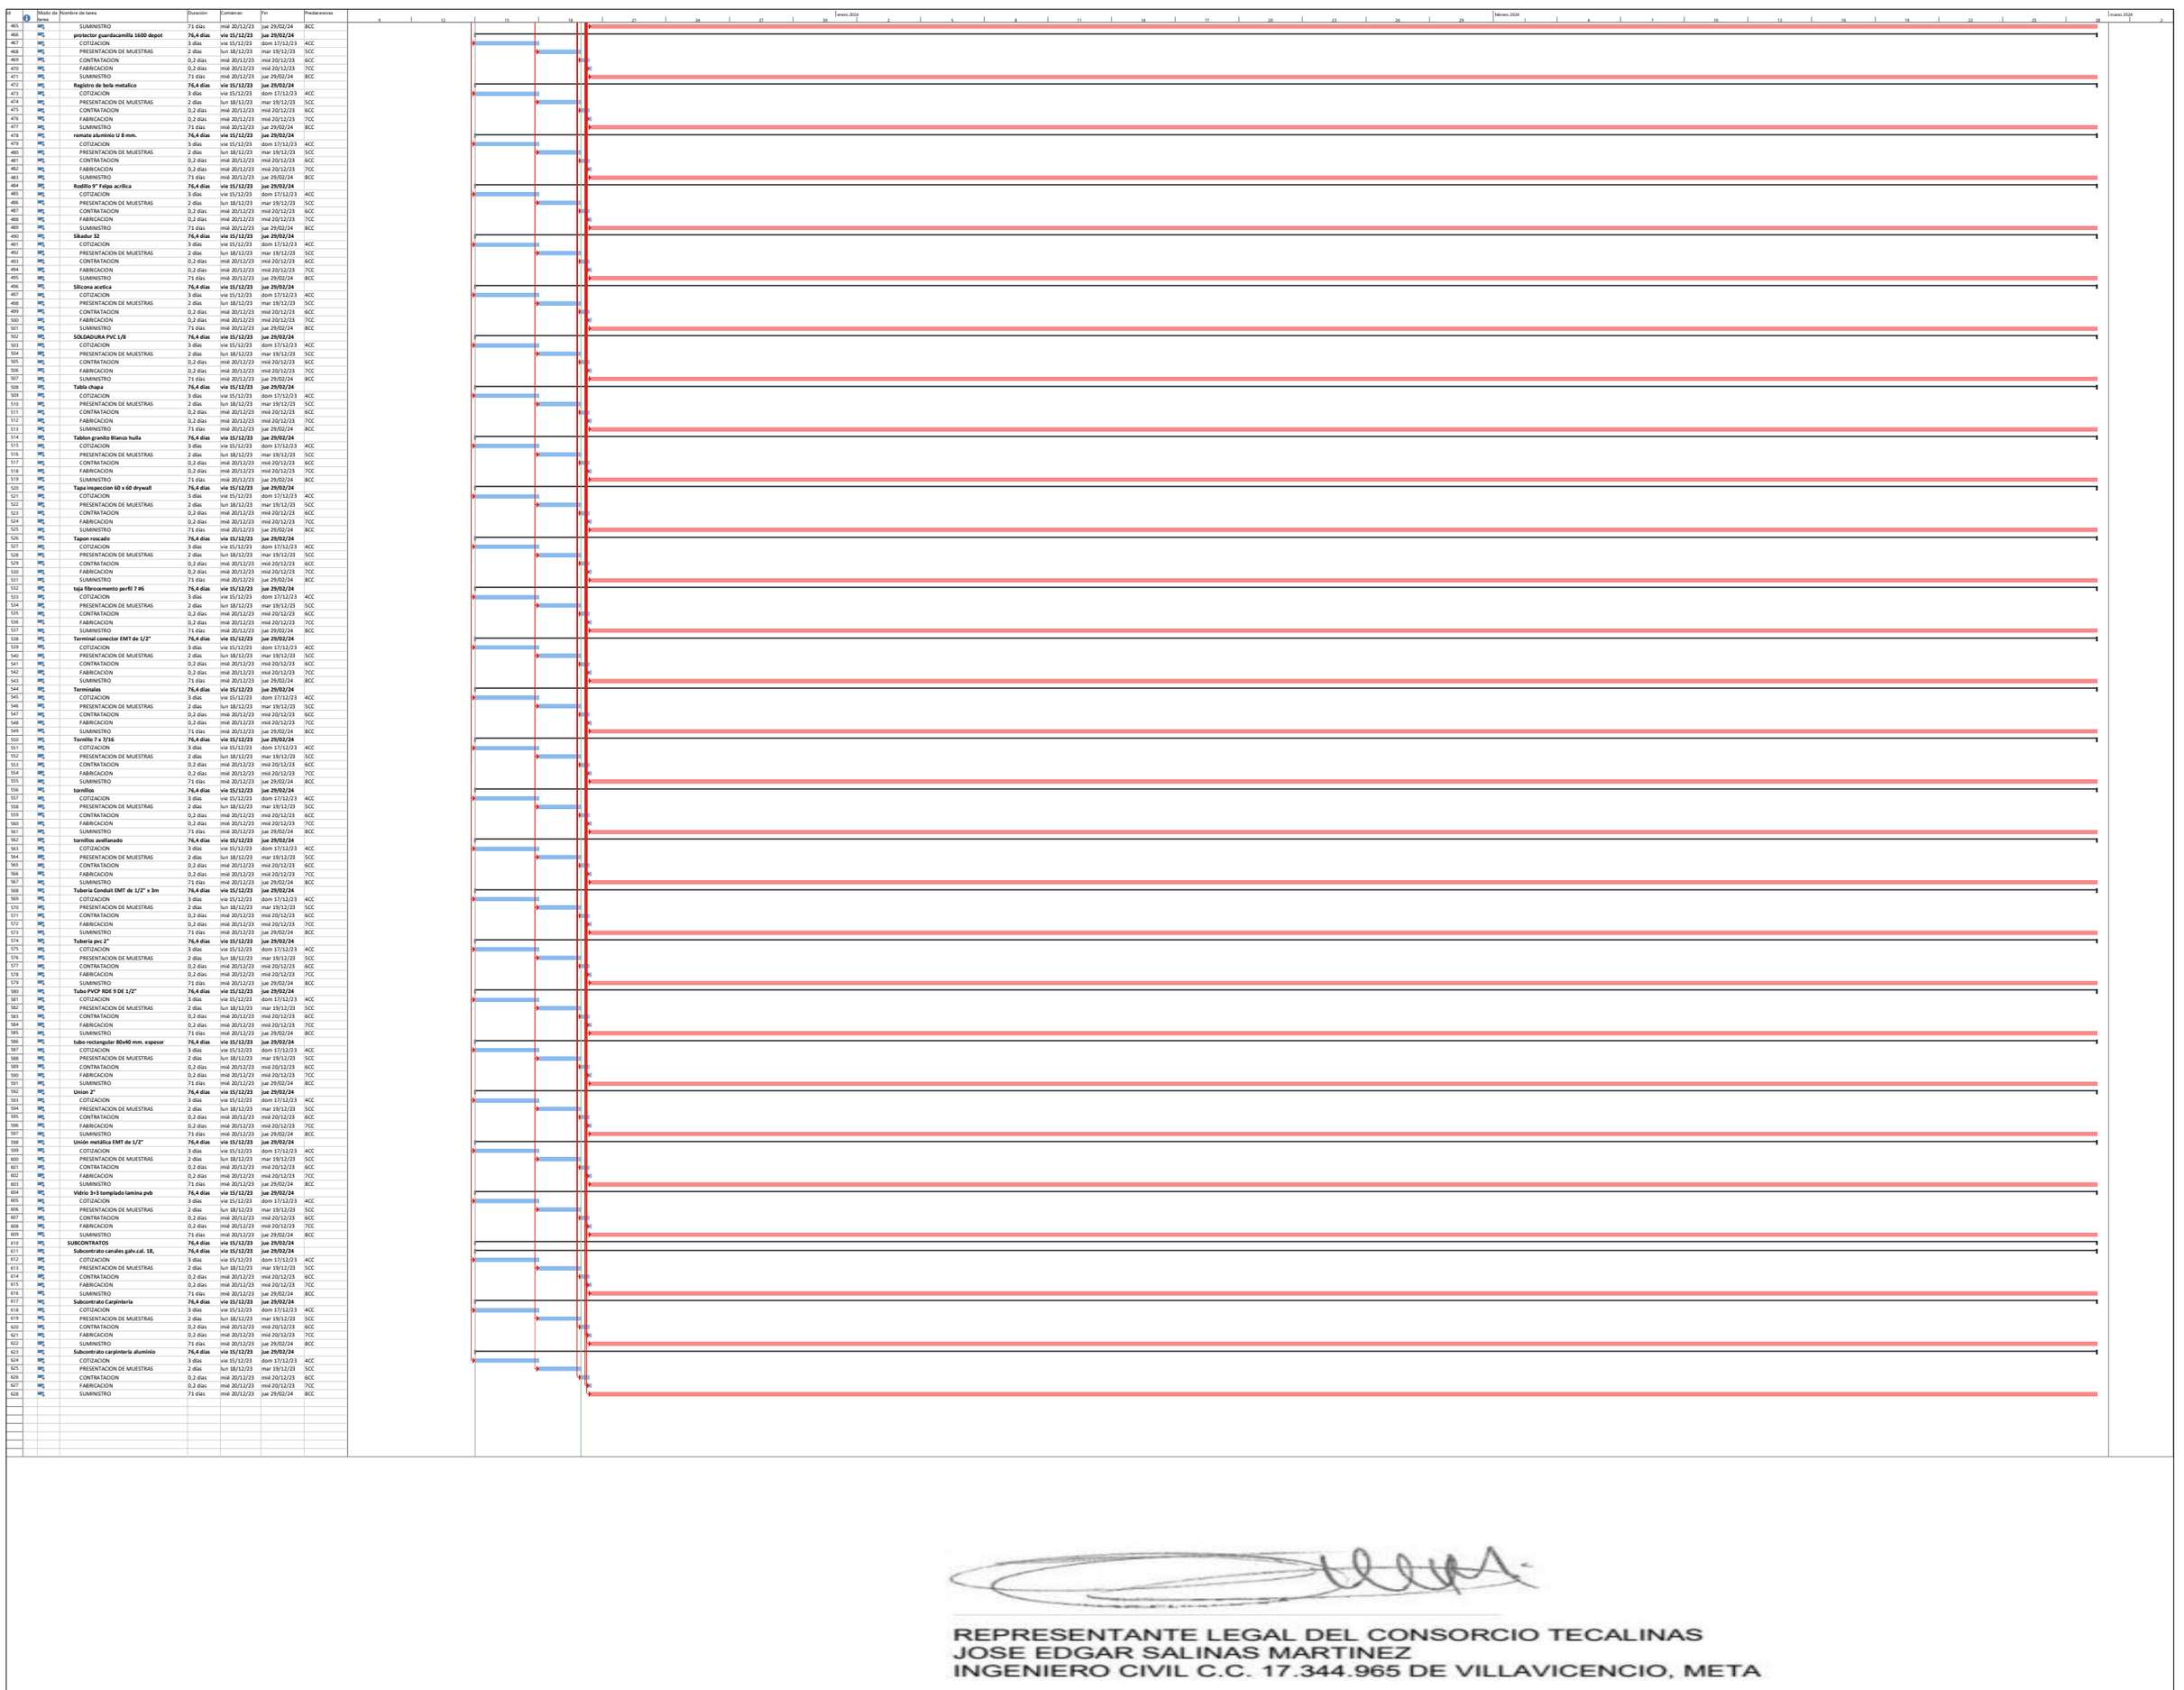

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO TECALINAS
JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ
INGENIERO CIVIL C.C. 17.344.965 DE VILLAVICENCIO, META
