Zipaquirá, 13 de agosto de 2024

Oficio: CZ-83-08-2024

Señores
GKAIROS S.A.S.
Ing. DAVID FELIPE CAYCEDO VILLARRAGA
Interventoría contrato de obra CO1.PCCNTR.5268004

Referencia: Contrato de obra CO1.PCCNTR.5268004.

Asunto: Solicitud de Adición al contrato de obra

Cordial saludo

De acuerdo a la necesidad establecida y solicitada por la alcaldía municipal de Zipaquirá, de ampliar el alcance del contrato de obra No CO1.PCCNTR.5268004, con el fin de beneficiar a la comunidad del municipio, interviniendo tramos viales que se encuentran en un estado de desgaste considerable y que son de vital importancia para la correcta movilidad de los usuarios de las vías que conectan la ciudad, el CONSORCIO ZIPAQUIRÁ GKG, actuando como firma constructora, solicita amablemente sea adicionado el contrato en mención por un total de mil cuatrocientos veintiún millones setecientos mil de pesos m/cte ($1.421.700.000) que equivale al 50% del presupuesto oficial.

Para lograr el cumplimiento en la totalidad de las actividades a desarrollar con los recursos relacionados anteriormente, es indispensable contar con un plazo proyectado de cuatro (4) meses, el cual fue analizado previamente y plasmado en el cronograma y flujo de inversión que se anexan en el presente documento, es por esto, que solicitamos una prórroga al contrato en mención por dicho lapso de tiempo, todo en aras de cumplir a cabalidad con el objeto del contrato y con el mayor alcance que se quiere otorgar al mismo, supliendo las necesidades del municipio y de la comunidad. Sin embargo, el CONSORCIO ZIPAQUIRÁ GKG aclara que, para dichas intervenciones, requiere que se ajusten los siguientes precios establecidos en el contrato:

ITEM REFERENCIA ICCU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO CONTRACTUAL (INC. AIU)	VALOR UNITARIO AJUSTADO A PRECIOS 2024 (INC. AIU)
3,4	Excavación para reparación del pavimento existente (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROSCON CARGUE MENOR A 5 KM)	m3	$216.192,22	$ 244.399.47
3,2	Subbase granular	m3	$ 177570,76	$ 193.933.95
3,1	Fresado concreto asfaltico (E = 5 - 15 cm)	m2	$ 8650,06	$ 9.876.58
3,5	Riego de imprimación	m2	$ 6337,77	$ 7.582.33
3,10	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (incluye cemento asfaltico)	m3	$ 1220991,98	$ 1.415.641.36
3,11	Mezcla densa en caliente para bacheo (incluye cemento asfaltico)	m3	$1335337,38	$ 1.547.961.73

Fundamento mi solicitud bajo los siguientes motivos:

Que el municipio de Zipaquirá inicio el proceso de licitación pública No LP-008-2023, el cual fue terminado 1 de agosto de 2023 y adjudicado al CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG con precios de la cartilla del instituto de infraestructura y concesiones de Cundinamarca ICCU 2023, como se puede evidenciar en el presupuesto inicial.

Teniendo en cuenta los incrementos del IPC del año 2023 al 2024 que han perjudicado al contratista debido a que los plazos contractuales se han incrementado por diferentes motivos y en vista que los materiales, insumos, mano de obra, equipos, transportes han incrementado su costo, solicitamos en que se haga el ajuste a los precios relacionados en la tabla No. 1, acorde a los precios unitarios del ICCU año 2024.

Tales incrementos que se presentan son:

- Incremento en el salario mínimo para el año 2024 (12%) el cual corresponde a trecientos mil pesos ($300.000) y auxilio de transporte de ciento sesenta y dos mil pesos ($162.000). fuente ministerio de trabajo https://www.mintrabajo.gov.co/comunicados/2023/enero/en-el-2024-el-salario-minimo-es-de-un-millon-300-mil-pesos-y-auxilio-de-transporte-de-162-mil-pesos
- Desde la fecha de iniciación del contrato se han presentado incrementos en el IPC los cuales afectan directamente en la ejecución del contrato como se muestra en los anexos presentados por el DANE con corte a agosto 8 de 2024. Los cuales son incrementos importantes afectando los costos totales de ejecución, con un acumulado del 6,03 % a corte julio de 2024. Se anexa fuente del DANE. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica#:~:text=Informaci%C3%B3n%20julio%202024,la%20anual%206%2C86%25

Colombia, variación anual del Indice de Precios al Consumidor

(IPC) por divisiones de bienes y servicios
2024

AÑO 2024, MES 7 — **Base Diciembre de 2018 = 100,00**

	Variaciones anuales 2024											
Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
Total IPC	8,35	7,74	7,36	7,16	7,16	7,18	6,86					
Alimentos Y Bebidas No Alcoholicas	2,96	1,89	1,73	2,98	4,4	5,27	5,26					
Bebidas Alcohólicas y Tabaco	11,55	11,38	10,81	9,72	8,59	8,15	8,01					
Prendas De Vestir Y Calzado	5,13	4,88	4,25	3,75	3,34	3,06	2,50					
Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas Y Otros Combustibles	9,64	9,77	9,58	9,34	9,14	9,25	9,06					
Muebles, Articulos Para El Hogar Y Para La Conservación Ordinaria Del Hogar	7,23	5,49	4,22	3,58	3,26	3,17	2,87					
Salud	8,93	8,21	7,91	7,18	6,67	6,78	6,46					
Transporte	13,22	11,97	11,72	10,42	9,07	8,10	6,88					
Información Y Comunicación	-0,08	0,21	0,16	0,03	-0,19	-0,15	-0,29					
Recreación Y Cultura	5,31	4,00	2,76	2,02	1,98	2,00	1,69					
Educación	11,41	11,66	11,60	11,40	11,42	11,21	11,20					
Restaurantes Y Hoteles	11,70	11,06	10,62	9,80	9,76	9,57	9,07					
Bienes Y Servicios Diversos	9,04	7,25	5,79	5,35	5,4	5,18	5,21					

Fuente: DANE.
Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación y redondeo.
Actualizado el 8 de agosto de 2024

De no realizarse el reajuste a estos precios el contratista entrara en un desequilibrio económico que perjudicara el correcto desarrollo de la obra, por lo cual no sería posible realizar el mayor alcance del contrato por parte de la firma constructora.

A continuación, se anexan los siguientes documentos:

- Precios unitarios de la cartilla del ICCU (2024)
- Cronograma general y especifico de la adición
- Plan de inversión general y especifico de la adición.
- anex-IPC-Variacion-jul2024
- anex-IPC-divisionesAnuales-jul2024


Cordialmente

Ing. Luis Ernesto Otálora URRIAGO
R/L Consorcio Zipaquirá GKG
consorciozipaquiragkg@gmail.com
celular 300 8377920

FLUJO DE CAJA

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG

Costo real	Costo de línea base	Costo restante	Variación de costo
$ 0,00	$ 0,00	$ 1.421.700.000,00	$ 1.421.700.000,00

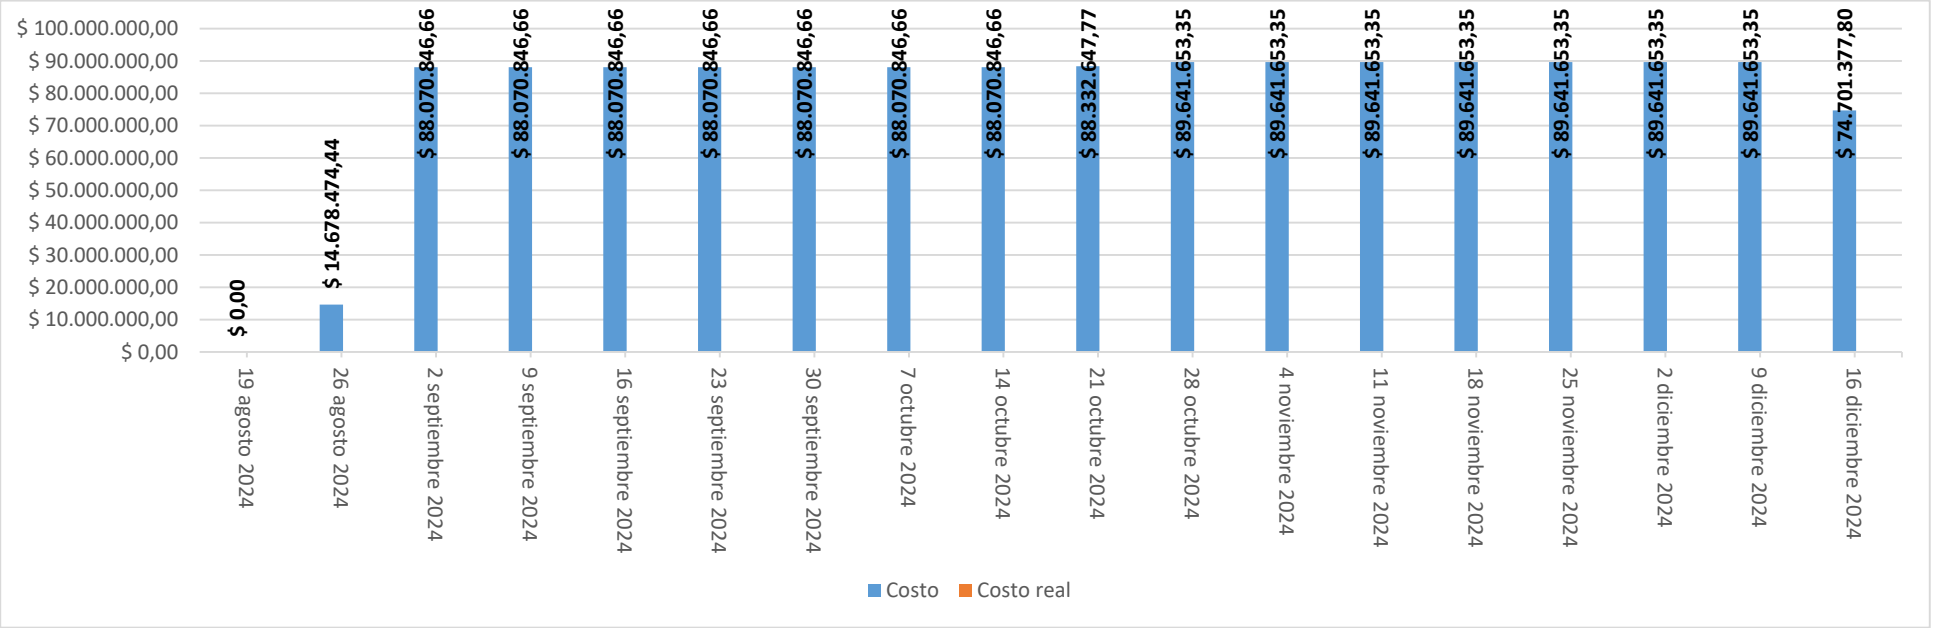


Nombre	Costo restante	Costo	CRTR	Comienzo	Fin
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA	**$ 1.421.700.000,00**	**$ 1.421.700.000,00**	**$ 0,00**	**mar 20/08/24**	**vie 20/12/24**
PERIODO 20 AGOSTO-20 DICIEMBRE 2024	$ 1.421.700.000,00	$ 1.421.700.000,00	$ 0,00	mar 20/08/24	vie 20/12/24
SOCIALIZACION y PMT	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	mar 20/08/24	vie 20/12/24
DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 195.326.803,28	$ 195.326.803,28	$ 0,00	sáb 31/08/24	vie 20/12/24
OBRAS DE ARTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
SARDINEL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
ESTRUCTURA Y PAVIMENTO	$ 1.226.373.196,72	$ 1.226.373.196,72	$ 0,00	sáb 31/08/24	vie 20/12/24
DEMARCACION VIAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
ITEM NO PREVISTOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		

FLUJO DE CAJA

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG

Costo real	Costo de línea base	Costo restante	Variación de costo
$ 0,00	$ 0,00	$ 4.265.100.000,00	$ 4.265.100.000,00

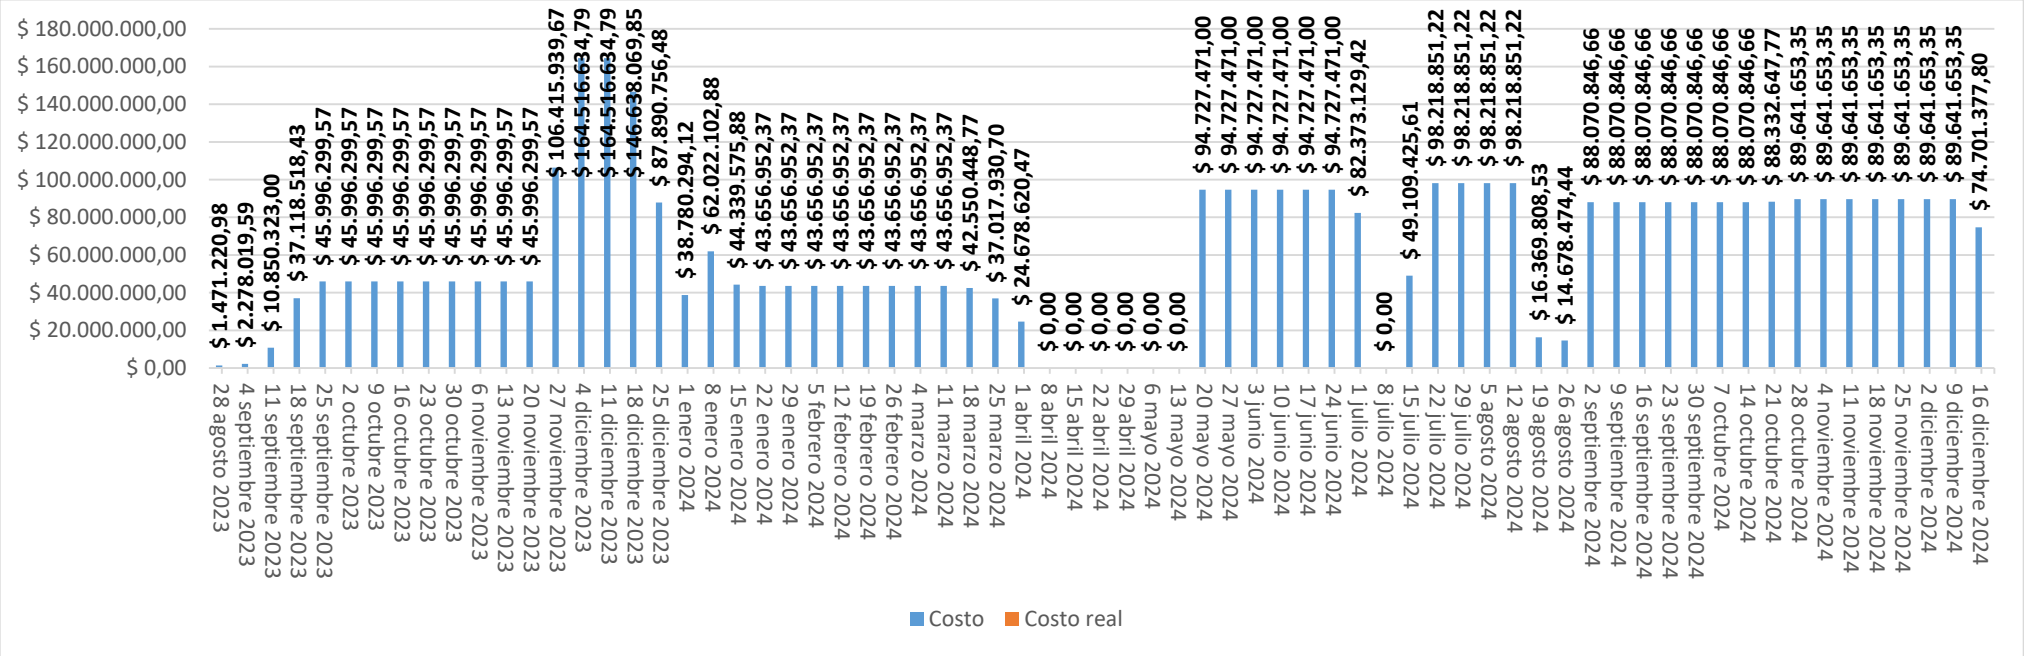


Nombre	Costo restante	Costo	CRTR	Comienzo	Fin
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA	**$ 4.265.100.000,00**	**$ 4.265.100.000,00**	**$ 0,00**	**mié 30/08/23**	**vie 20/12/24**
PERIODO 2023	$ 1.135.662.813,69	$ 1.135.662.813,69	$ 0,00	mié 30/08/23	sáb 30/12/23
SOCIALIZACION y PMT	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	mar 29/08/23	vie 29/12/23
DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 348.692.211,60	$ 348.692.211,60	$ 0,00	vie 15/09/23	sáb 30/12/23
OBRAS DE ARTE	$ 9.663.147,00	$ 9.663.147,00	$ 0,00	vie 15/09/23	mar 28/11/23
SARDINEL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
ESTRUCTURA Y PAVIMENTO	$ 552.263.656,15	$ 552.263.656,15	$ 0,00	jue 21/09/23	vie 29/12/23
DEMARCACION VIAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		

	ITEM NO PREVISTOS	$ 225.043.798,94	$ 225.043.798,94	$ 0,00	mié 30/08/23	sáb 30/12/23
PERIODO 1 ENERO - 4 ABRIL 2024		$ 598.644.591,86	$ 598.644.591,86	$ 0,00	mar 2/01/24	jue 4/04/24
	SOCIALIZACION y PMT	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	mar 2/01/24	jue 4/04/24
	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 78.950.285,42	$ 78.950.285,42	$ 0,00	mar 2/01/24	jue 4/04/24
	OBRAS DE ARTE	$ 682.623,51	$ 682.623,51	$ 0,00	lun 15/01/24	vie 19/01/24
	SARDINEL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	ESTRUCTURA Y PAVIMENTO	$ 498.654.000,89	$ 498.654.000,89	$ 0,00	mar 2/01/24	jue 4/04/24
	DEMARCACION VIAL	$ 18.365.150,51	$ 18.365.150,51	$ 0,00	mar 9/01/24	mar 9/01/24
	ITEM NO PREVISTOS	$ 1.992.531,53	$ 1.992.531,53	$ 0,00	lun 1/01/24	vie 5/01/24
PERIODO 3 MAYO-5 JULIO 2024		$ 650.737.955,47	$ 650.737.955,47	$ 0,00	vie 3/05/24	vie 5/07/24
	SOCIALIZACION y PMT	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	vie 3/05/24	vie 5/07/24
	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 92.564.561,57	$ 92.564.561,57	$ 0,00	lun 20/05/24	vie 5/07/24
	OBRAS DE ARTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	SARDINEL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	ESTRUCTURA Y PAVIMENTO	$ 556.822.334,09	$ 556.822.334,09	$ 0,00	lun 20/05/24	vie 5/07/24
	DEMARCACION VIAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	ITEM NO PREVISTOS	$ 1.351.059,81	$ 1.351.059,81	$ 0,00		
PERIODO 6 JULIO-19 AGOSTO 2024		$ 458.354.638,98	$ 458.354.638,98	$ 0,00	sáb 6/07/24	lun 19/08/24
	SOCIALIZACION y PMT	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	sáb 6/07/24	lun 19/08/24
	DEMOLICIONES	$ 79.118.823,06	$ 79.118.823,06	$ 0,00	jue 18/07/24	lun 19/08/24


	EXCAVACIONES Y RELLENOS					
	OBRAS DE ARTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	SARDINEL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	ESTRUCTURA Y PAVIMENTO	$ 379.235.815,92	$ 379.235.815,92	$ 0,00	jue 18/07/24	lun 19/08/24
	DEMARCACION VIAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	ITEM NO PREVISTOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
PERIODO 20 AGOSTO-20 DICIEMBRE 2024		$ 1.421.700.000,00	$ 1.421.700.000,00	$ 0,00	mar 20/08/24	vie 20/12/24
	SOCIALIZACION y PMT	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	mar 20/08/24	vie 20/12/24
	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 195.326.803,28	$ 195.326.803,28	$ 0,00	sáb 31/08/24	vie 20/12/24
	OBRAS DE ARTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	SARDINEL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	ESTRUCTURA Y PAVIMENTO	$ 1.226.373.196,72	$ 1.226.373.196,72	$ 0,00	sáb 31/08/24	vie 20/12/24
	DEMARCACION VIAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	ITEM NO PREVISTOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1		**MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA**	**106 días?**	**mar 20/08/24**	**vie 20/12/24**	**$ 1.421.700.000,00**
2		**PERIODO 20 AGOSTO-20 DICIEMBRE 2024**	**106 días**	**mar 20/08/24**	**vie 20/12/24**	**$ 1.421.700.000,00**
3		SOCIALIZACION y PMT	106 días	mar 20/08/24	vie 20/12/24	$ 0,00
4		**DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**96 días**	**sáb 31/08/24**	**vie 20/12/24**	**$ 195.326.803,28**
5		DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)				$ 0,00
6		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)				$ 0,00
7		EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)				$ 0,00
8		EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	96 días	sáb 31/08/24	vie 20/12/24	$ 191.853.976,45
9		SUBBASE GRANULAR	96 días	sáb 31/08/24	vie 20/12/24	$ 2.129.611,95
10		BASE GRANULAR				$ 0,00
11		AFIRMADO				$ 0,00
12		RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE				$ 0,00
13		FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-15 cm)	48 días	sáb 26/10/24	vie 20/12/24	$ 1.343.214,88
14		**OBRAS DE ARTE**				**$ 0,00**
15		CONCRETOS f´c =3500 psi (elevaciones)				$ 0,00
16		CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80				$ 0,00
17		NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)				$ 0,00
18		SUMIDERO PREFABRICADO SL-100				$ 0,00
19		**SARDINEL**				**$ 0,00**
20		SARDINEL PREFABRICADO A-10				$ 0,00
21		**ESTRUCTURA Y PAVIMENTO**	**96 días**	**sáb 31/08/24**	**vie 20/12/24**	**$ 1.226.373.196,72**
22		RIEGO DE IMPRIMAC	48 días	sáb 26/10/24	vie 20/12/24	$ 1.031.196,88
23		RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1				$ 0,00
24		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)				$ 0,00
25		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	48 días	sáb 26/10/24	vie 20/12/24	$ 10.192.041,79
26		MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	96 días	sáb 31/08/24	vie 20/12/24	$ 1.215.149.958,05
27		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T-2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)				$ 0,00
28		PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO				$ 0,00
29		ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM				$ 0,00
30		RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"				$ 0,00
31		**DEMARCACION VIAL**				**$ 0,00**
32		LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO				$ 0,00
33		MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO				$ 0,00
34		**ITEM NO PREVISTOS**				**$ 0,00**
35		CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M				$ 0,00
36		BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO PORTLAN TIPO I (5%-7%)				$ 0,00
37		SUMIDERO PREFABRICADO SL-250				$ 0,00
38		TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"				$ 0,00
39		SELLADO DE JUNTAS ENTRE PAVIMENTO Y CONCRETO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLANTE)				$ 0,00
40		ARREGLO ACOMETIDA DOMICILIARIA				$ 0,00

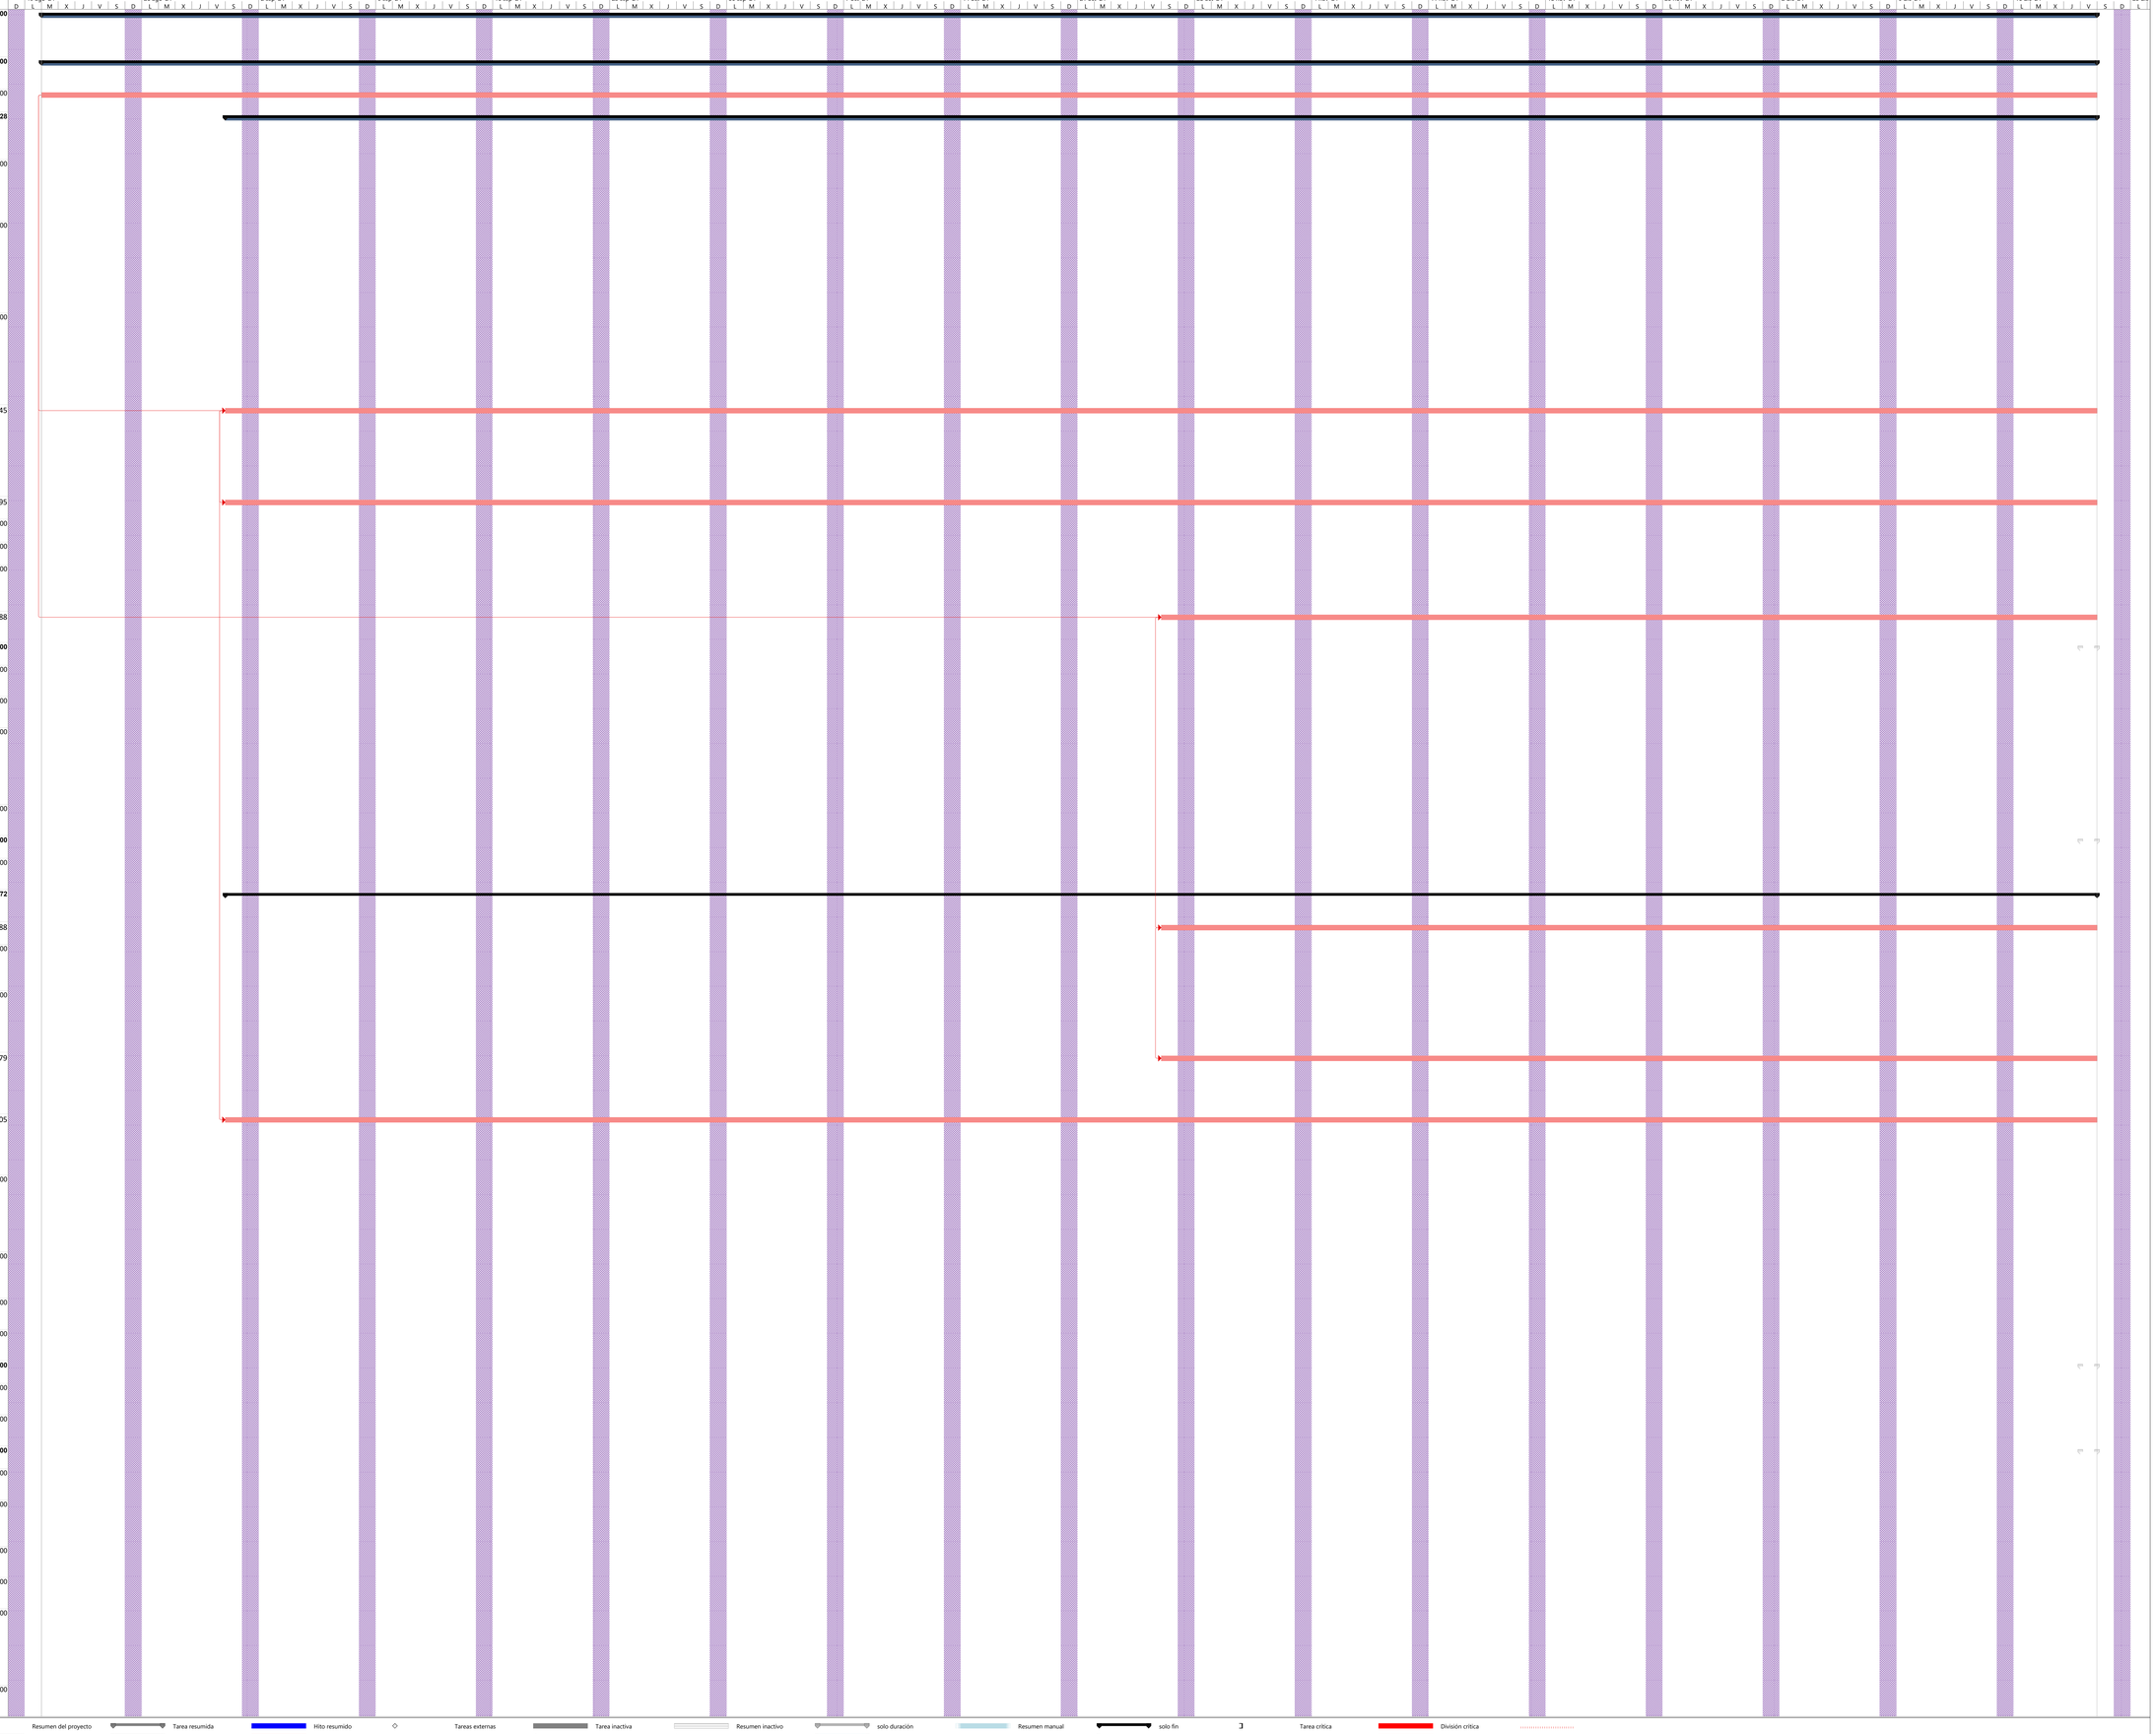

Proyecto: Programacion CZ.GK
Fecha: mié 14/08/24

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Agrupar por síntesis · Tarea resumida · Tarea crítica resumida · Hito resumido · Progreso resumido · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Fecha límite · Tarea crítica · Tareas críticas · División crítica · Progreso

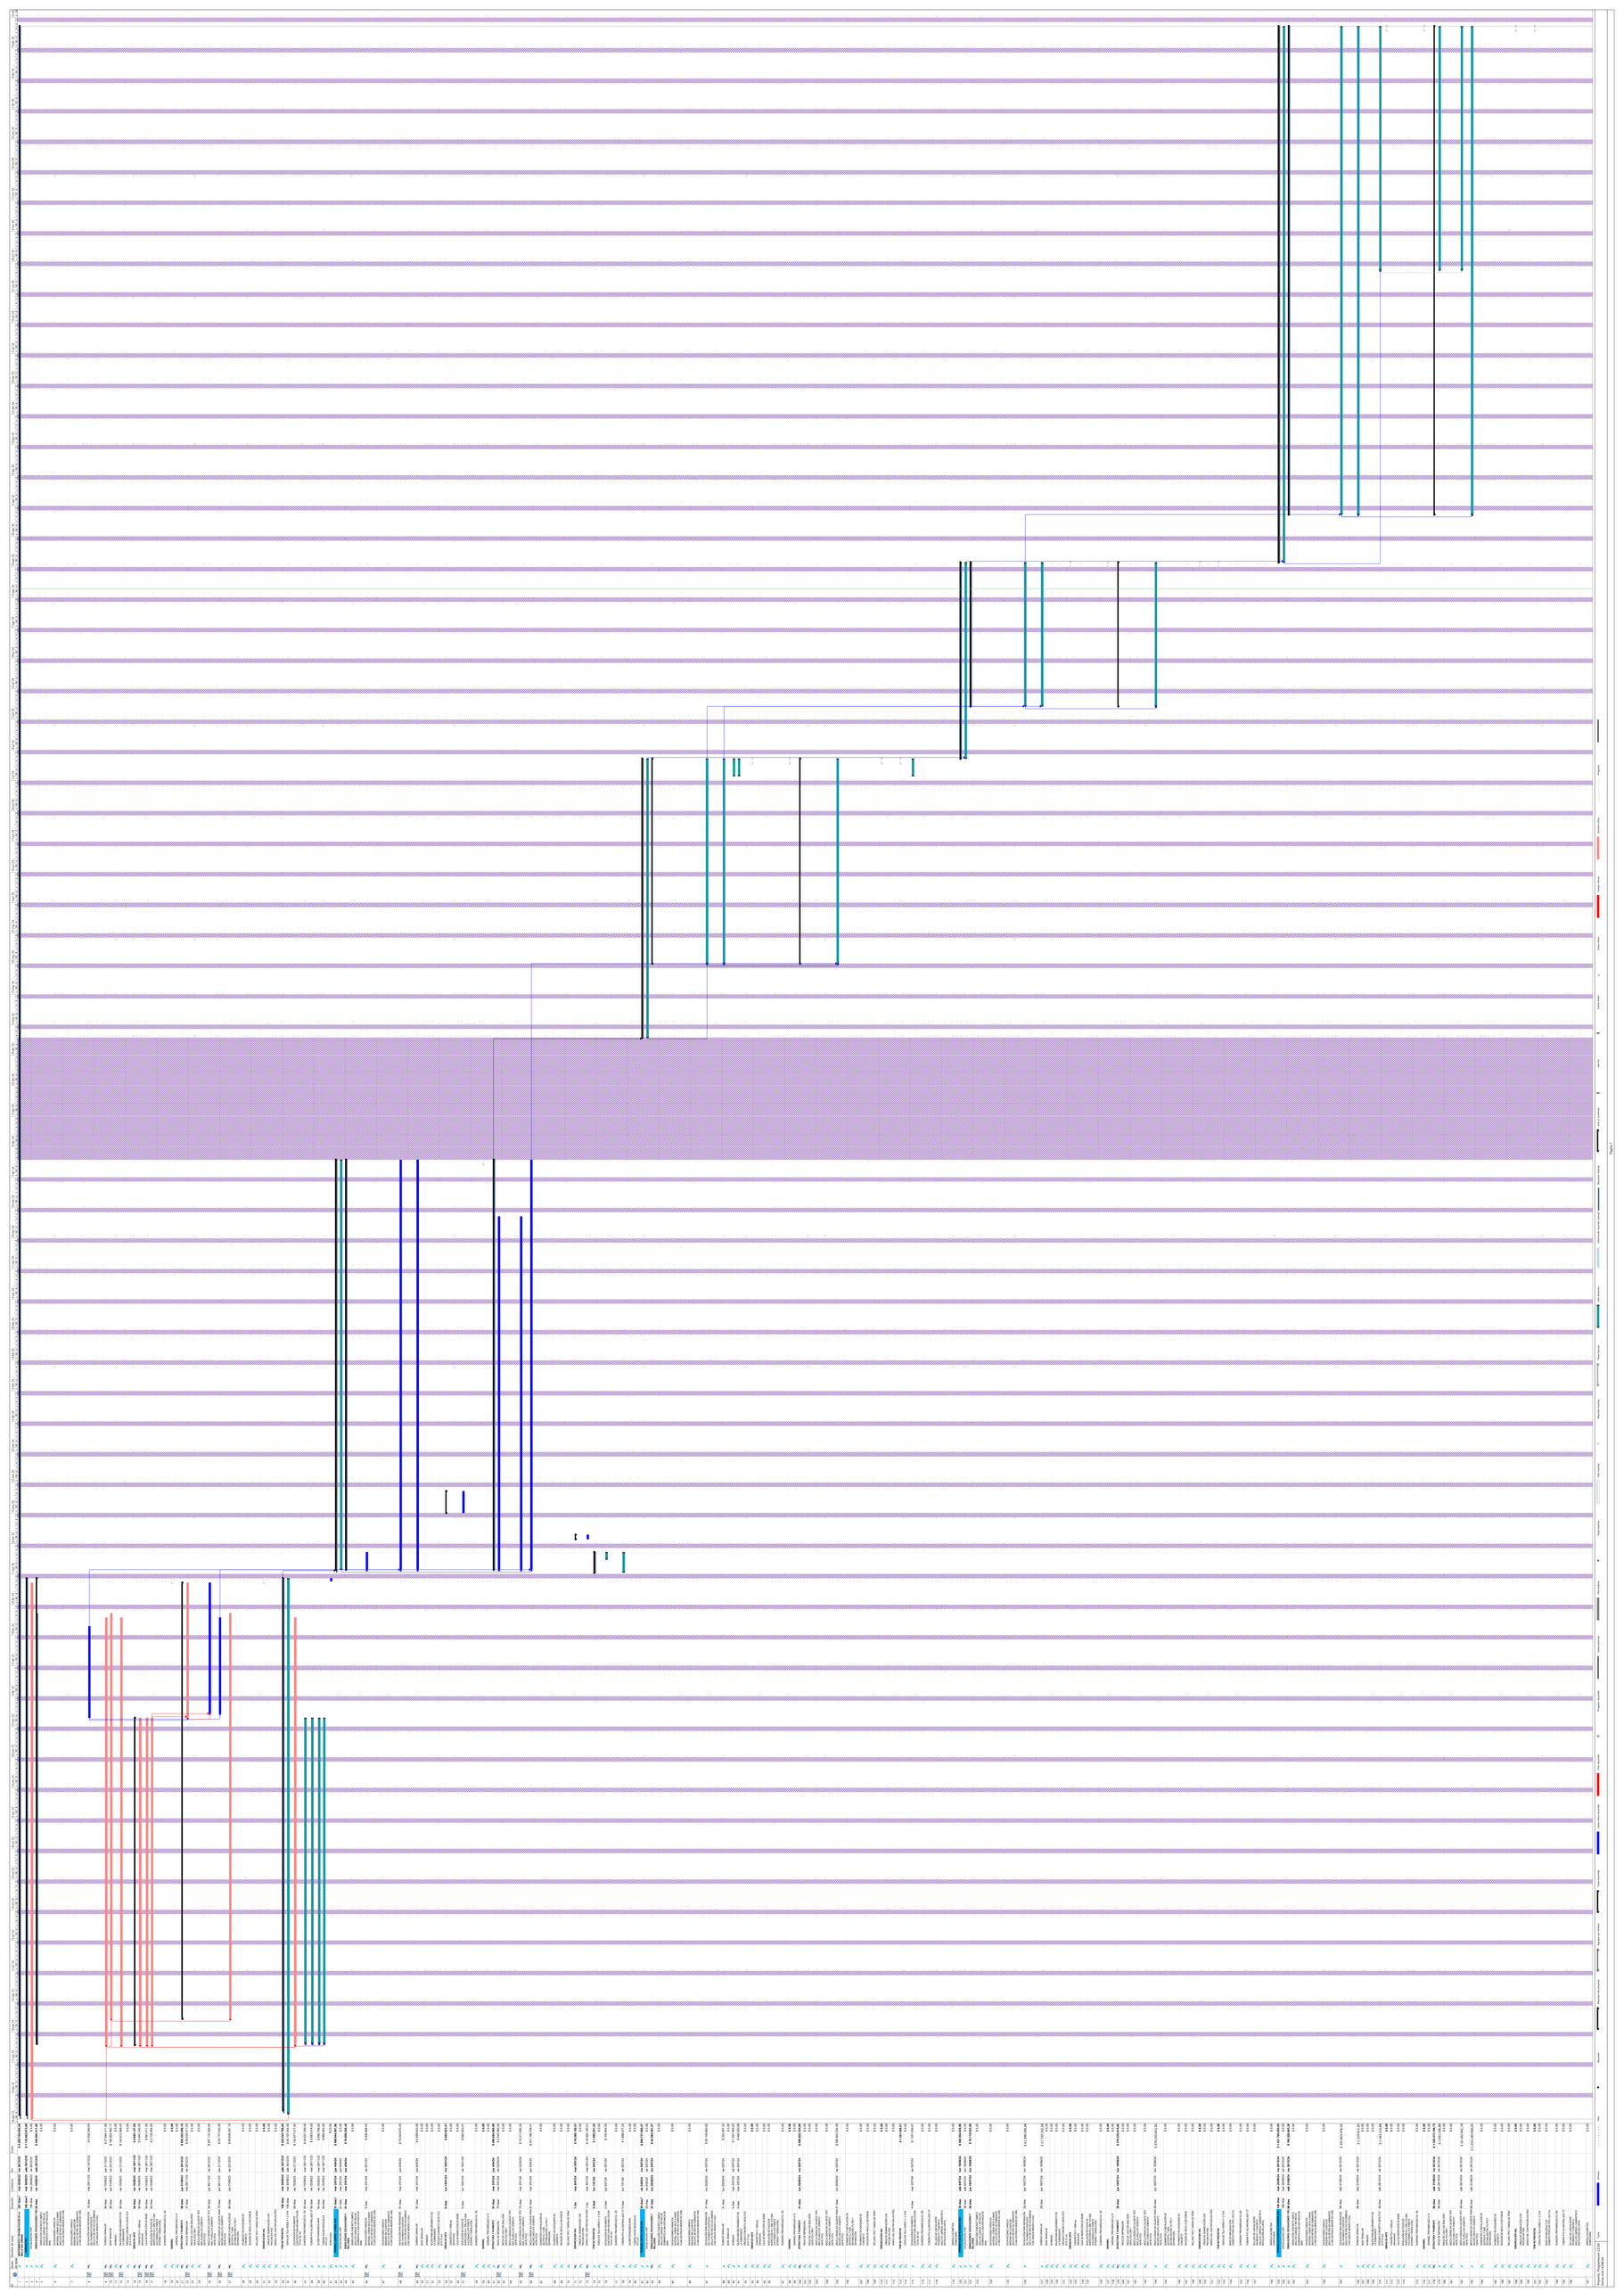

ACTA No.	PROYECCION CON ADICION	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	19/08/2024	CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5268004
TIPO DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	CONSORCIO ZIPAQUIRÁ GKG		
INTERVENTOR:	GKAIROS S.A.S	SUPERVISOR:			
		PERÍODO A PAGAR (1):	DEL 28/07/2024	HASTA	19/08/2024
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA				

ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO CANTIDAD CONTRATO	CONTRATO VALOR UNITARIO	CONTRATO VALOR TOTAL	MODIFICATORIO 01 UNIDAD	MODIFICATORIO 01 CANTIDAD	MODIFICATORIO 01 VUNIT	MODIFICATORIO 01 VTOTAL
	1.2	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	m3	80.00	$ 84.445.85	$ 6.755.668.18	m3	5.00	$ 84.445.85	$ 422.229.25
	2.13	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	80.00	$ 69.330.31	$ 5.546.424.75	m3	140.00	$ 69.330.31	$ 9.706.243.40
	16.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	15.00	$ 25.425.78	$ 381.386.66	m3	528.48	$ 25.425.78	$ 13.437.016.21
	3.4	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	m3	236.00	$ 216.192.22	$ 51.021.364.56	m3	305.60	$ 216.192.22	$ 66.069.262.98
	3.2	SUBBASE GRANULAR	m3	322.00	$ 177.570.76	$ 57.177.783.60	m3	498.77	$ 177.570.76	$ 88.566.298.68
	3.3	BASE GRANULAR	m3	312.00	$ 237.793.42	$ 74.191.546.66	m3	1857.94	$ 237.793.42	$ 441.805.442.07
	3.15	AFIRMADO	m3	429.00	$ 92.663.53	$ 39.752.656.16	m3	32.40	$ 92.663.53	$ 3.002.298.37
	3.22	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	m3	720.00	$ 121.724.81	$ 87.641.861.16	m3	2055.08	$ 121.724.81	$ 250.154.740.47
	3.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	m2	13.127.00	$ 8.650.06	$ 113.549.321.71	m2	0.00	$ 8.650.06	$ -
	4.5	CONCRETOS f'c =3500 psi (elevaciones)	m3	5.00	$ 885.430.96	$ 4.427.154.80	m3	16.96	$ 885.430.96	$ 15.015.846.56
	3.6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	und	3.00	$ 495.705.60	$ 1.487.116.80	und	2.00	$ 495.705.60	$ 991.411.20
	4.13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	und	15.00	$ 227.541.17	$ 3.413.117.56	und	12.00	$ 227.541.17	$ 2.730.494.04
	4.11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	und	5.00	$ 2.839.266.45	$ 14.196.332.27	und	0.00	$ 2.839.266.45	$ -
	5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	110.00	$ 149.167.50	$ 16.408.425.35	ML	120.00	$ 149.167.50	$ 17.900.100.00
	3.5	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	m2	13.127.00	$ 6.737.77	$ 88.446.680.93	m2	7735.75	$ 6.737.77	$ 52.121.710.90
	3.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	m2	13.127.00	$ 3.285.06	$ 43.122.928.06	m2	7735.75	$ 3.285.06	$ 25.412.406.13
	3.9	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	m3	604.00	$ 1.192.345.43	$ 720.176.641.08	m3	19.44	$ 1.192.345.43	$ 23.179.195.16
	3.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	m3	604.00	$ 1.220.991.98	$ 737.479.153.75	m3	775.79	$ 1.220.991.98	$ 947.237.414.90
	3.11	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	m3	472.00	$ 1.335.337.38	$ 630.279.244.95	m3	134.20	$ 1.335.337.38	$ 179.205.291.59
	4.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	m2	1.879.00	$ 14.409.62	$ 27.075.678.60	m2	8051.18	$ 14.409.62	$ 116.014.388.18
	3.8	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	m2	200.00	$ 97.787.77	$ 19.557.553.50	m2	10.00	$ 97.787.77	$ 977.877.70
	5.2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	m2	200.00	$ 133.981.37	$ 26.796.273.63	m2	120.00	$ 133.981.37	$ 16.077.764.40
	6.2	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	m3	24.00	$ 74.037.29	$ 1.776.895.03	m3	6.00	$ 74.037.29	$ 444.223.74
	5.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN	ml	5.379.20	$ 6.054.54	$ 32.568.582.84	ml	3121.96	$ 6.054.54	$ 18.902.029.23
	5.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	m2	600.00	$ 66.950.35	$ 40.170.207.43	m2	58.30	$ 66.950.35	$ 3.903.205.78
	1.8.	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	m		$ 35.468.44		m	2302.94	$ 35.468.44	$ 81.681.621.18
		EXCAVACION DE PAVIMENTO EXISTENTE PARA REHABILITACION TOTAL DE VIA	m3		$ 58.538.12		m3	4625.19	$ 58.538.12	$ 270.749.962.05
		SUMIDERO PREFABRICADO SL-120	un		$ 4.945.908.42	$ -	un	10.00	$ 4.945.908.42	$ 49.459.084.20
	3.27.	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	m		$ 164.050.22	$ -	m	35.90	$ 164.050.22	$ 5.889.402.90
	3.21	SELLADO DE JUNTAS ENTRE PAVIMENTO Y CONCRETO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLANTE)	m		$ 12.521.71	$ -	m	400.00	$ 12.521.71	$ 5.008.682.11
	9.6	ACOMETIDA DOMICILIARIA	un		$ 77.307.58	$ -	un	9.00	$ 77.307.58	$ 695.768.22
	11.34.	TUBERIA AGUAS RESIDUALES PVC-S 6"	ml		$ 148.177.24	$ -	ml	6.00	$ 148.177.24	$ 889.063.44
	16.9.	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3		$ 122.881.36		M3	96.00	$ 122.881.36	$ 11.796.610.56
	4.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2		$ 14.215.04		M2	960.00	$ 14.215.04	$ 13.646.438.40
	4.53.	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 137.216.10		ML	400.00	$ 137.216.10	$ 54.886.440.00
	5.8.	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML		$ 138.550.09		ML	400.00	$ 138.550.09	$ 55.420.036.00
	ADICION 1 AL CONTRATO (REAJUSTE)									
	3.4	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	785.00	$ 244.399.97	$ 191.853.976.45				
	3.2	SUBBASE GRANULAR	M3	10.98	$ 193.933.95	$ 2.129.611.95				
	3.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-15 cm)	M2	136.00	$ 9.876.58	$ 1.343.214.88				
	3.5	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	136.00	$ 7.582.33	$ 1.031.196.88				
	3.10	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	7.20	$ 1.415.561.36	$ 10.192.041.79				
	3.11	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	785.00	$ 1.547.961.73	$ 1.215.149.958.05				
		AJUSTE AL PESO				-				-
		VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				4.265.100.000				4.265.100.000
		ADMINISTRACIÓN	0%			-				-
		IMPREVISTOS	0%			-				-
		UTILIDAD	0%			-				-
		IVA 19% SOBRE UTILIDAD	0%			-				-
		VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				4.265.100.000				4.265.100.000

ITEM DE PAGO	CAM No 2 UNIDAD	CAM No 2 CANTIDAD	CAM No 2 VUNIT	CAM No 2 VTOTAL	CAM No 3 UNIDAD	CAM No 3 CANTIDAD	CAM No 3 VUNIT	CAM No 3 VTOTAL	CAM No 4 UNIDAD	CAM No 4 CANTIDAD	CAM No 4 VUNIT	CAM No 4 VTOTAL
1.2	m3	5.00	$ 84.445.85	$ 422.229.25	m3	0.00	$ 84.445.85	$ -	m3		$ 84.445.85	$ -
2.13	m3	40.00	$ 69.330.31	$ 2.773.212.40	m3	5.87	$ 69.330.31	$ 406.968.92	m3	5.87	$ 69.330.31	$ 406.968.92
16.2	m3	28.00	$ 25.425.78	$ 711.921.84	m3	0.00	$ 25.425.78	$ -	m3		$ 25.425.78	$ -
3.4	m3	863.60	$ 216.192.22	$ 186.703.601.19	m3	1079.00	$ 216.192.22	$ 233.271.405.38	m3	1101.40	$ 216.192.22	$ 238.114.111.11
3.2	m3	248.77	$ 177.570.76	$ 44.174.277.97	m3	248.77	$ 177.570.76	$ 44.174.277.97	m3	184.58	$ 177.570.76	$ 32.776.010.88
3.3	m3	1457.94	$ 237.793.42	$ 346.688.538.75	m3	787.82	$ 237.793.42	$ 187.338.412.14	m3	782.82	$ 237.793.42	$ 186.149.445.04
3.15	m3	0.00	$ 92.663.53	$ -	m3	25.00	$ 92.663.53	$ 2.316.588.25	m3	17.18	$ 92.663.53	$ 1.591.959.45
3.22	m3	1305.08	$ 121.724.81	$ 158.860.615.03	m3	1085.08	$ 121.724.81	$ 132.081.156.83	m3	1029.40	$ 121.724.81	$ 125.303.519.41
3.1	m2	0.00	$ 8.650.06	$ -	m2	0.00	$ 8.650.06	$ -	m2		$ 8.650.06	$ -
4.5	m3	11.71	$ 885.430.96	$ 10.368.396.54	m3	7.71	$ 885.430.96	$ 6.826.672.70	m3	6.71	$ 885.430.96	$ 5.941.241.74
3.6	und	2.00	$ 495.705.60	$ 991.411.20	und	2.00	$ 495.705.60	$ 991.411.20	und	2.00	$ 495.705.60	$ 991.411.20
4.13	und	27.00	$ 227.541.17	$ 6.143.611.59	und	17.00	$ 227.541.17	$ 3.868.199.89	und	15.00	$ 227.541.17	$ 3.413.117.55
4.11	und	0.00	$ 2.839.266.45	$ -	und	0.00	$ 2.839.266.45	$ -	und		$ 2.839.266.45	$ -
5.15	ML	60.00	$ 149.167.50	$ 8.950.050.00	ML	0.00	$ 149.167.50	$ -	ML		$ 149.167.50	$ -
3.5	m2	7735.75	$ 6.737.77	$ 52.121.710.90	m2	6735.75	$ 6.737.77	$ 45.383.934.28	m2	6625.99	$ 6.737.77	$ 44.644.396.64
3.6	m2	0.00	$ 3.285.06	$ -	m2	0.00	$ 3.285.06	$ -	m2		$ 3.285.06	$ -
3.9	m3	0.00	$ 1.192.345.43	$ -	m3	0.00	$ -	$ -	m3		$ -	$ -
3.1	m3	525.79	$ 1.220.991.98	$ 641.985.373.16	m3	394.79	$ 1.220.991.98	$ 482.035.423.78	m3	421.90	$ 1.220.991.98	$ 515.136.516.36
3.11	m3	734.20	$ 1.335.337.38	$ 980.404.704.39	m3	1029.20	$ 1.335.337.38	$ 1.374.329.231.50	m3	1042.89	$ 1.335.337.38	$ 1.392.610.000.23
4.46	m2	5693.13	$ 14.409.62	$ 82.035.839.91	m2	3493.13	$ 14.409.62	$ 50.334.675.91	m2	3458.54	$ 14.409.62	$ 49.836.247.15
3.8	m2	10.00	$ 97.787.77	$ 977.877.70	m2	0.00	$ 97.787.77	$ -	m2		$ 97.787.77	$ -
5.2	m2	120.00	$ 133.981.37	$ 16.077.764.40	m2	0.00	$ 133.981.37	$ -	m2		$ 133.981.37	$ -
6.2	m3	6.00	$ 74.037.29	$ 444.223.74	m3	0.00	$ 74.037.29	$ -	m3		$ 74.037.29	$ -
5.1	ml	3123.02	$ 6.054.54	$ 18.908.497.25	ml	3123.03	$ 6.054.54	$ 18.908.503.88	ml	2.14	$ 6.054.54	$ 12.956.72
5.2	m2	459.03	$ 66.950.35	$ 30.732.219.16	m2	344.24	$ 66.950.35	$ 23.046.939.02	m2	274.31	$ 66.950.35	$ 18.365.150.51
1.8.	m	1302.94	$ 35.468.44	$ 46.213.249.21	m	1302.94	$ 35.468.44	$ 46.213.249.21	m	1133.33	$ 35.468.44	$ 40.197.553.51
(EXCAVACION DE PAVIMENTO EXISTENTE)	m3	2525.00	$ 58.538.12	$ 147.808.753.00	m3	2525.00	$ 58.538.12	$ 147.808.753.00	m3	2462.56	$ 58.538.12	$ 144.153.632.79
(SUMIDERO PREFABRICADO SL-120)	un	10.00	$ 4.945.908.42	$ 49.459.084.20	un	7.00	$ 4.945.908.42	$ 34.621.358.94	un	7.00	$ 4.945.908.42	$ 34.621.358.94
3.27.	m	47.90	$ 164.050.22	$ 7.858.005.54	m	47.90	$ 164.050.22	$ 7.858.005.54	m	46.02	$ 164.050.22	$ 7.549.591.12
3.21	m	0.00	$ 12.521.71	$ -	m	0.00	$ 12.521.71	$ -	m		$ 12.521.71	$ -
9.6	un	9.00	$ 77.307.58	$ 695.768.22	un	9.00	$ 77.307.58	$ 695.768.22	un	9.00	$ 77.307.58	$ 695.768.22
11.34.	ml	6.00	$ 148.177.24	$ 889.063.44	ml	6.00	$ 148.177.24	$ 889.063.44	ml	6.00	$ 148.177.24	$ 889.063.44
16.9.	M3	0.00	$ 122.881.36	$ -	M3	0.00	$ 122.881.36	$ -	M3		$ 122.881.36	$ -
4.42	M2	0.00	$ 14.215.04	$ -	M2	0.00	$ 14.215.04	$ -	M2		$ 14.215.04	$ -
4.53.	ML	0.00	$ 137.216.10	$ -	ML	0.00	$ 137.216.10	$ -	ML		$ 137.216.10	$ -
5.8.	ML	0.00	$ 138.550.09	$ -	ML	0.00	$ 138.550.09	$ -	ML		$ 138.550.09	$ -
(fila)												-21
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				2.843.400.000				2.843.400.000				2.843.400.000
ADMINISTRACIÓN				-				-				-
IMPREVISTOS				-				-				-
UTILIDAD				-				-				-
IVA 19% SOBRE UTILIDAD				-				-				-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				4.265.100.000				4.265.100.000				4.265.100.000

ITEM DE PAGO	ACTA 01 CANTIDAD	ACTA 01 VPARCIAL	ACTA 02 CANTIDAD	ACTA 02 VPARCIAL	ACTA 03 CANTIDAD	ACTA 03 VPARCIAL	ACTA 04 CANTIDAD	ACTA 04 VPARCIAL	ACTA 05 CANTIDAD	ACTA 05 VPARCIAL	ACTA 06 CANTIDAD	ACTA 06 VPARCIAL	ACTA 07 CANTIDAD	ACTA 07 VPARCIAL	ACTA 08 CANTIDAD	ACTA 08 VPARCIAL
1.2	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -								
2.13	0.00	$ -	5.87	$ 406.968.92		$ -		$ -								
16.2	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -								
3.4	41.77	$ 9.030.349.03	347.28	$ 75.079.234.16	26.50	$ 5.729.093.83	203.99	$ 44.101.050.96	108.87	$ 23.536.846.99	139.78	$ 30.219.348.51	49.98	$ 10.805.287.16	176.83	$ 38.229.270.26
3.2	157.37	$ 27.944.310.50	25.34	$ 4.499.643.06		$ -	1.87	$ 332.057.32								
3.3	787.63	$ 187.293.231.39	-4.81	-$ 1.143.786.35		$ -		$ -								
3.15	0.00	$ -		$ -		$ -	17.18	$ 1.591.959.45								
3.22	1033.84	$ 125.843.977.57	-8.47	-$ 1.031.009.14		$ -	4.03	$ 490.550.98								
3.1	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -								
4.5	6.71	$ 5.941.241.74		$ -		$ -		$ -								
3.6	2.00	$ 991.411.20		$ -		$ -		$ -								
4.13	12.00	$ 2.730.494.04	3.00	$ 682.623.51		$ -		$ -								
4.11	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -								
5.15	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -								
3.5	5867.67	$ 39.535.010.90	481.37	$ 3.243.360.34		$ -		$ -							276.95	$ 1.866.025.40
3.6		$ -		$ -		$ -		$ -								
3.9	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -								
3.1	333.43	$ 407.115.355.89	60.78	$ 74.211.892.54		$ -		$ -							27.69	$ 33.809.267.93
3.11	41.77	$ 55.777.042.36	315.42	$ 421.198.748.01	26.50	$ 35.386.440.57	203.99	$ 272.395.472.15	108.87	$ 145.378.180.56	139.78	$ 186.647.233.63	49.98	$ 66.740.162.25	149.14	$ 199.152.216.85
4.46	3477.80	$ 50.113.776.44	-19.26	-$ 277.529.28		$ -		$ -								
3.8	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -								
5.2	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -								
6.2	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -								
5.1	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -								
5.2	0.00	$ -	274.31	$ 18.365.150.51		$ -		$ -								
1.8.	1133.33	$ 40.197.553.51		$ -		$ -		$ -								
(EXCAVACION DE PAVIMENTO EXISTENTE)	2442.46	$ 142.977.016.58	-2.98	-$ 174.443.60		$ -	23.08	$ 1.351.059.81								
(SUMIDERO PREFABRICADO SL-120)	7.00	$ 34.621.358.94		$ -		$ -		$ -								
3.27.	34.52	$ 5.663.013.59	11.50	$ 1.886.577.53		$ -		$ -								
3.21	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -								
9.6	9.00	$ 695.768.22		$ -		$ -		$ -								
11.34.	6.00	$ 889.063.44		$ -		$ -		$ -								
16.9.	0.00			$ -		$ -		$ -								
4.42	0.00			$ -		$ -		$ -								
4.53.	0.00			$ -		$ -		$ -								
5.8.	0.00			$ -		$ -		$ -								
(fila)		$ 25.00				$ -		$ -								
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		1.137.360.000		$ 596.947.430		$ 41.115.534.40		$ 320.262.150.66		$ 168.915.027.55		$ 216.866.582.15		$ 77.545.449.41		$ 273.056.780.44
ADMINISTRACIÓN		-		-		-		-		-		-		-		-
IMPREVISTOS		-		-		-		-		-		-		-		-
UTILIDAD		-		-		-		-		-		-		-		-
IVA 19% SOBRE UTILIDAD		-		-		-		-		-		-		-		-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		1.137.360.000		$ 596.947.430		$ 41.115.534.40		$ 320.262.150.66		$ 168.915.027.55		$ 216.866.582.15		$ 77.545.449.41		$ 273.056.780.44

ITEM DE PAGO	CANTIDADES ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDADES PRESENTE ACTA	CANTIDADES ACUMULADO TOTAL	VALORES ACUMULADO ANTERIOR	VALORES PRESENTE ACTA	VALORES ACUMULADO TOTAL	SALDOS CANTIDAD	SALDOS VALOR
1.2	0.00		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
2.13	5.87		5.87	$ 406.968.92	$ -	$ 406.968.92	0.00	$ -
16.2	0.00		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
3.4	918.17	176.83	1095.00	$ 198.501.210.64	$ 38.229.270.26	$ 236.730.480.90	6.40	$ 1.383.630.21
3.2	184.58		184.58	$ 32.776.010.88	$ -	$ 32.776.010.88	0.00	$ -
3.3	782.82		782.82	$ 186.149.445.04	$ -	$ 186.149.445.04	0.00	$ -
3.15	17.18		17.18	$ 1.591.959.45	$ -	$ 1.591.959.45	0.00	$ -
3.22	1029.40		1029.40	$ 125.303.519.41	$ -	$ 125.303.519.41	0.00	$ -
3.1	0.00		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
4.5	6.71		6.71	$ 5.941.241.74	$ -	$ 5.941.241.74	0.00	$ -
3.6	2.00		2.00	$ 991.411.20	$ -	$ 991.411.20	0.00	$ -
4.13	15.00		15.00	$ 3.413.117.55	$ -	$ 3.413.117.55	0.00	$ -
4.11	0.00		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
5.15	0.00		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
3.5	6349.04	276.95	6625.99	$ 42.778.371.24	$ 1.866.025.40	$ 44.644.396.64	0.00	$ -
3.6	0.00		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
3.9	0.00		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
3.1	394.21	27.69	421.90	$ 481.327.248.44	$ 33.809.267.93	$ 515.136.516.37	0.00	$ -
3.11	886.31	149.14	1035.45	$ 1.183.523.279.53	$ 199.152.216.85	$ 1.382.675.496.38	7.44	$ 9.934.910.11
4.46	3458.54		3458.54	$ 49.836.247.15	$ -	$ 49.836.247.15	0.00	$ -
3.8	0.00		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
5.2	0.00		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
6.2	0.00		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
5.1	0.00		0.00	$ -	$ -	$ -	2.14	$ 12.956.72
5.2	274.31		274.31	$ 18.365.150.51	$ -	$ 18.365.150.51	0.00	$ -
1.8.	1133.33		1133.33	$ 40.197.553.51	$ -	$ 40.197.553.51	0.00	$ -
(EXCAVACION DE PAVIMENTO EXISTENTE)	2462.56		2462.56	$ 144.153.632.79	$ -	$ 144.153.632.79	0.00	$ -
(SUMIDERO PREFABRICADO SL-120)	7.00		7.00	$ 34.621.358.94	$ -	$ 34.621.358.94	0.00	$ -
3.27.	46.02		46.02	$ 7.549.591.12	$ -	$ 7.549.591.12	0.00	$ -
3.21	0.00		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
9.6	9.00		9.00	$ 695.768.22	$ -	$ 695.768.22	0.00	$ -
11.34.	6.00		6.00	$ 889.063.44	$ -	$ 889.063.44	0.00	$ -
16.9.	0.00		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
4.42	0.00		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
4.53.	0.00		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
5.8.	0.00		0.00	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -
ADICION 1 – 3.4	785.00						785.00	$ 191.853.976.45
ADICION 1 – 3.2	10.98						10.98	$ 2.129.611.95
ADICION 1 – 3.1	136.00						136.00	$ 1.343.214.88
ADICION 1 – 3.5	136.00						136.00	$ 1.031.196.88
ADICION 1 – 3.10	7.20						7.20	$ 10.192.041.79
ADICION 1 – 3.11	785.00						785.00	$ 1.215.149.958.05
(fila)	0.00					$ -		
(fila)	0.00		0.00		$ -		0.00	$ -
AJUSTE AL PESO				$ 24.67		$ 24.67		-451.87
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS			-	$ 2.559.012.174.40	$ 273.056.780.44	$ 2.832.068.954.83		$ 1.433.031.045.17
ADMINISTRACIÓN				-	-	-		-
IMPREVISTOS				-	-	-		-
UTILIDAD				-	-	-		-
IVA 19% SOBRE UTILIDAD				-	-	-		-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				$ 2.559.012.174.40	$ 273.056.780.44	$ 2.832.068.954.83		$ 1.433.031.045.17

BALANCE PRESUPUESTAL

% EJECUCION	*66.40%*
% POR EJECUTAR	*33.60%*
% TOTAL	*100.00%*

VIr INICIAL CONTRATO:	4.265.100.000
VIr ADICIONES:	
VIr ACTUAL CONTRATO:	4.265.100.000

No. ACTA	FECHA PAGO	DESCRIPCIÓN	No. COMPROBANTE	VALOR FACTURADO	% PAGADO
ACTA 1	19/01/2024	ACTA PARCIAL DE OBRA 1		$ 1.137.360.000.00	26.67%
ACTA 2		ACTA PARCIAL DE OBRA 2		$ 596.947.430.22	14.00%
ACTA 3		ACTA PARCIAL DE OBRA 3		$ 41.115.534.40	0.96%
ACTA 4		ACTA PARCIAL DE OBRA 4		$ 320.262.150.66	7.51%
ACTA 5		ACTA PARCIAL DE OBRA 5		$ 168.915.027.55	3.96%
ACTA 6		ACTA PARCIAL DE OBRA 6		$ 216.866.582.15	5.08%
ACTA 7		ACTA PARCIAL DE OBRA 7		$ 77.545.449.41	1.82%
ACTA 8		ACTA PARCIAL DE OBRA 8		$ 273.056.780.44	6.40%
		TOTAL		$ 2.832.068.954.83	66.40%

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Nota 1:
a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas a dos decimales
c) Todos los valores estarán expresados en pesos con maximo dos decimales
d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría.
e) Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.
f) Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad del Contratista quién elaboró y revisó y del Interventor quién verificó y aprobó cuando el contrato tiene interventoria
g) La interventoria certifica que verificó y validó los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales del periodo representado de la presente acta, tanto del personal operativo como del personal ofertado dentro de la propuesta (Anexar Soportes).
h) La interventoria certifica que el contratista ha cumplido con la disponibilidad del personal propuesto en la oferta con los tiempos establecidos para cada perfil.
i) La interventoria certifica que el contratista ha cumplido con el pago de salarios, prestaciones y demás componentes de los trabajadores tanto operativos como los ofertados en la propuesta y que a la fecha de la presente acta NO se presentan reclamaciones hacia el contratista por falta de pago a los acreedores y personal operativo y profesional.
j) La interventoria certifica que el contratista ha cumplido con el pago de prestaciones sociales segun la legislación vigente y que se encuentran relacionado en los análisis de precios unitarios APU presentados por el contratista en la propuesta y los demas APUS aprobados por la Interventoria (Anexar Soportes).
k) A la presente acta se debe anexar los formatos que apliquen de acuerdo al proyecto y que se encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad, cuando este aplique o sea exigido por la SUPERVISIÓN.

Nota 2: Instrucciones para la firma:
Elaboró - Representante legal o Director de Obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT.
Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

	Elaboró RESIDENTE DE OBRA	Aprobó DIRECTOR DE OBRA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	Verificó RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Firma:			
Nombre:	VIRGILIO HORACIO ORTIZ RIVERA	LUIS ERNESTO OTALORA URRIAGO	JHOANNA GOMEZ VANEGAS
