AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 23001315 H3-2023
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS
ACTA COMITÉ OPERATIVO N. 0007

Siendo las 09:00 A.M. del 13 de agosto de 2024 se inicia el Comité Técnico Operativo N. 0007 del convenio interadministrativo N. 23001315 H3-2023, con una breve exposición y descripción de los aspectos esenciales del convenio, sus características, su plazo de ejecución, costos por anualidad y total, forma de pago y, demás consideraciones para ejecutar las intervenciones en los seis (6) aeródromos así: Cumaribo, La Primavera, Bajo Baudó, Bahía Solano, Barrancominas y Magüí Payán. Igualmente se enuncian los batallones dispuestos por el COING para ejecutar las intervenciones y demás actividades propuestas. Con base en la cláusula sexta del citado convenio se plantea el orden del día para el presente comité operativo N. 0007 así:

ORDEN DEL DÍA.

1. Bienvenida y verificación quórum.
2. Revisión de estado de compromisos realizados por las partes en comité operativo N. 0006
3. Intervención COING.
4. Preguntas, observaciones, compromisos generados y otros.
5. Cierre del comité operativo N. 0007

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA.

1. Bienvenida y verificación quorum.

Se verifica el quórum por el Coordinador del Grupo Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales, anotando que hay presencialidad de invitados como el Mayor Diego Bonilla y el Mayor Jesús Roncancio por el COING y virtualmente se presentan las unidades en sitio del Ejército Nacional. Se verifica el quórum de los integrantes e inicia el comité operativo N. 0007.

Miembros del Comité Operativo.

Nombre	Cargo	Asistencia
Ing. Andrés Arboleda Salazar	Secretario de Servicios Aeroportuarios	Delegada a supervisor de convenio Ing. Omar Javier Suspes Fonseca.
Ing. Nubia Quintero Hernández	Directora de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias	Presencial
Dr. Abel Torres Muñetones	Coordinador Grupo ASAES.	Presencial
My. Alvaro Patiño. La Primavera. My. Edwin Albornoz. Cumaribo. TC. Quesada My. Diego Cepeda Sánchez. Bahía Solano My. Felipe Prieto. Bajo Baudó. Cap. Johan Bautista. Magüí Payán. Cap. Andrés Urrea. Barrancominas.	Supervisores o quienes hagan sus veces	Presencial/ Virtual
My. Jesús Roncancio	Oficial de la Sección de Proyectos de Consolidación del COING.	Presencial

En calidad de invitado, asiste personal de la Gerencia Integral. ENTERRITORIO. El listado del total de asistentes presencial se evidencia en la planilla anexa a la presente.

2. Revisión de estado de compromisos realizados por las partes en comité operativo No. 0006.

Se exponen los compromisos del comité operativo 0006 suscritos el 18 de julio de 2024:

Compromiso	Entidad	Fecha límite para cumplimiento	Estado

1	Copia del oficio a CODECHOCÓ solicitando certificar que no hay necesidad de permisos ambientales en Bahía Solano.	ENTERRITORIO	18-07-2024	Pendiente
2	Solicitud concepto de Armada Nacional frente a transporte fluvial a Barrancominas.	COING	18-07-2024	Pendiente
3	Documentación de la vía a Cumaribo como soporte de dificultad en transporte.	COING	22-07-2024	Cumplido
4	Documento referente a predios en Cumaribo y Gobernación.	ENTERRITORIO	22-07-2024	Pendiente
5	Definición contratación ornamentador en La Primavera. (Pendiente honorarios).	COING - ENTERRITORIO	18-07-2024	Pendiente
6	Estado gestiones ambientales.	ENTERRITORIO	22-07-2024	Cumplido
7	Concepto contratación derivada Grupo 2-3.	ENTERRITORIO	23-07-2024	Pendiente
8	Mesa de trabajo estudios y diseños Bahía Solano.	ENTERITORIO	19-07-2024	Parcial
9	Remisión informe financiero y ambiental Gerencia Integral.	ENTERRITORIO	24-07-2024	Pendiente

10	Solicitud convenio Alcaldía Magüí Payán de estado de convenio para intervención de vías a su cargo.	ENTERRITORIO	24-07-2024	Pendiente
11	Mesa de trabajo Bajo Baudó.	ENTERRITORIO	24-07-2024	Cumplido
12	Reporte fotográfico, climático y avances en sitio conforme a instrucción del BG. Roque Salcedo.	COING	PERMANENTE	Pendiente

Respecto a los compromisos relacionados, en los cuales están algunos de la Gerencia Integral, se listan así:

- Primer compromiso: La Gerencia Integral remitirá el 13 de agosto de 2024, documento a CODECHOCÓ en el cual se manifieste que no existe necesidad de permisos ambientales para gestionar en el aeródromo de Bahía Solano.

- Segundo compromiso: El COING remitirá documento de gestión ante Armada Nacional referente al transporte fluvial para el aeródromo de Barrancominas [Guainía] el 13 de agosto de 2024.

- Cuarto compromiso: La Gerencia Integral remitirá documento referente a predios en Cumaribo [Vichada] el 13 de agosto de 2024.

- Séptimo compromiso: La Gerencia Integral remitirá cronograma y documento de contratación derivada actualizado el 13 de agosto de 2024 para los Grupos 2-3.

- Octavo compromiso: Enterritorio como la entidad que contrató la consultoría para Bahía Solano, programará reunión de estudios y diseños en atención a observaciones del aeródromo de Bahía Solano [Chocó] el 20 de agosto de 2024.

- Noveno compromiso: La Gerencia Integral, remitirá informe financiero y ambiental del Grupo 1 el 13 de agosto de 2024.

• Décimo compromiso: La Gerencia Integral, solicitará a la Alcaldía Municipal de Magüí Payán [Nariño] estado del convenio a su cargo [del Municipio] en relación con vías de acceso que le corresponde atender a dicho ente Municipal.

• Duodécimo compromiso: El COING por medio de sus brigadas en sitio, remitirán diariamente reporte de actividades por medio de WhatsApp y tener así conocimiento del estado del proyecto en sitio.

3. Intervención del COING.

Aeródromo La Primavera.


Hace intervención en sitio, personal del BIAHE28 el cual relaciona actividades desde el 17 de julio de 2024 a la fecha, informando entre otros el estado de vias de acceso, afectadas por precipitaciones en la zona, en las cuales se aprecian inundaciones en el Municipio.

PATRIA HONOR LEALTAD

EJERCITO NACIONAL

AERÓDROMO "LA PRIMAVERA" – BIAHE28


CONSIDERACIONES		
FECHA	**PARTICIPANTES**	**JUSTIFICACIÓN**
17 DE JULIO DE 2024	COING Aerocivil Enterritorio BIAHE 28	Se realiza acto simbólico para el proyecto del mejoramiento de la aeropista de La Primavera-Vichada.
17 DE JULIO DE 2024	COING Aerocivil BIAHE 28	Se realiza "Notam" para el aeródromo de La Primavera, dejando una franja de operaciones que abarca desde el día domingo hasta el día lunes 05:00am.
09 DE AGOSTO DE 2024	BIAHE 28 Enterritorio	Se inicia con las actas de "vecindad y entorno" del proyecto de La Primavera, queda pendiente la reunión con el personal de grupos étnicos del sector.
09 DE AGOSTO DE 2024	BIAHE 28 Interventoría	Se inicia con el reconocimiento de topografía, ubicando los puntos geodésicos del aeródromo.

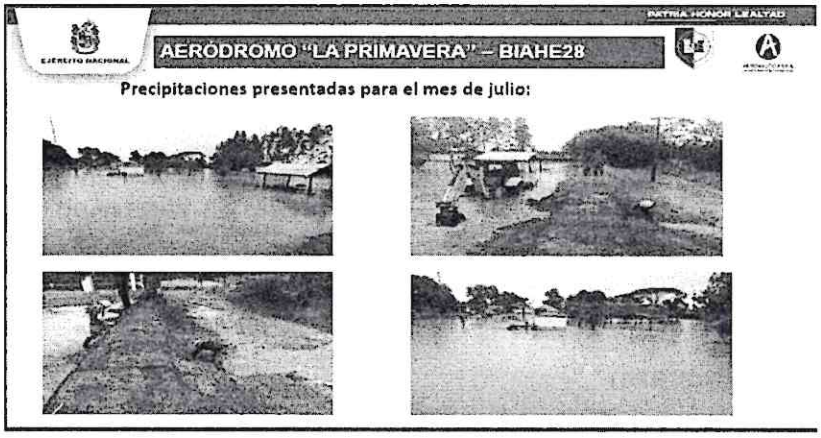

Se señala para el caso del ornamentador recomendado en sitio, que, si cumple con el perfil, será incorporado para ejecutar las actividades. Así, el día de hoy será entrevistado y con ello se evaluará para el visto bueno en sitio de COING y su posterior contratación.

Aeródromo Cumaribo.

Se hace recuento por el BIRAN 18 de sus actividades, con el inicio de movimiento y traslado de maquinaria desde el punto de origen de unidad militar al sitio de obras. El cual tiene trayecto Villavicencio [Meta], Puerto Gaitán [Meta] y hoy en día se encuentra en un punto denominado Carimagua, llegando a Cumaribo, con afectaciones en vía a causa de precipitaciones y pésimo estado del transitable.

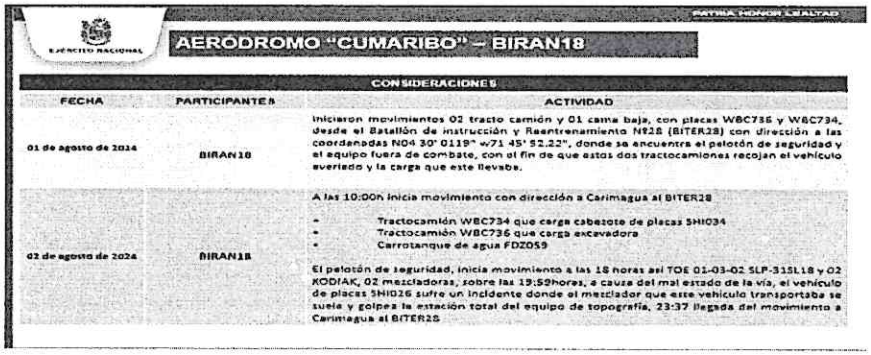


CONSIDERACIONES		
FECHA	PARTICIPANTES	ACTIVIDAD
01 de agosto de 2024	BIRAN18	Iniciaron movimientos 02 tracto camión y 01 cama baja, con placas W8C735 y W8C734, desde el Batallón de instrucción y Reentrenamiento N°28 (BITER28) con dirección a las coordenadas N04 30' 0119" w71 45' 52.22", donde se encuentra el pelotón de seguridad y el equipo fuera de combate, con el fin de que estos dos tractocamiones recojan el vehículo averiado y la carga que este llevaba.
02 de agosto de 2024	BIRAN18	A las 10:00h inicia movimiento con dirección a Carimagua al BITER28 • Tractocamión W8C734 que carga cabezote de placas SHI034 • Tractocamión W8C736 que carga excavadora • Carrotanque de agua FDZ059 El pelotón de seguridad, inicia movimiento a las 18 horas así TOE 01-03-02 SLP-315L18 y 02 KODIAK, 02 mezcladoras, sobre las 19:59horas, a causa del mal estado de la vía, el vehículo de placas SHI026 sufre un incidente donde el mezclador que este vehículo transportaba se suelta y golpea la estación total del equipo de topografía, 23:37 llegada del movimiento a Carimagua al BITER28



Aeródromo Bajo Baudó.


El personal del BIJUL15 interviene, expresando las actividades desde el 18 de julio de 2024 a la fecha, consultando a la AEROCIVIL, del estado de demanda del Consejo Comunitario. Se responde que, se concertó con el Consejo Comunitario y se acordó una socialización del proyecto a gran escala, donde está involucrada la Gobernación del Chocó, el COING, ENTERRITORIO, las autoridades municipales, el Consejo Comunitario, la comunidad conforme al acuerdo logrado que se allegó al Despacho de la Juez Primero Civil del Circuito de Restitución de Tierras de Quibdó y se está a la espera de su pronunciamiento.

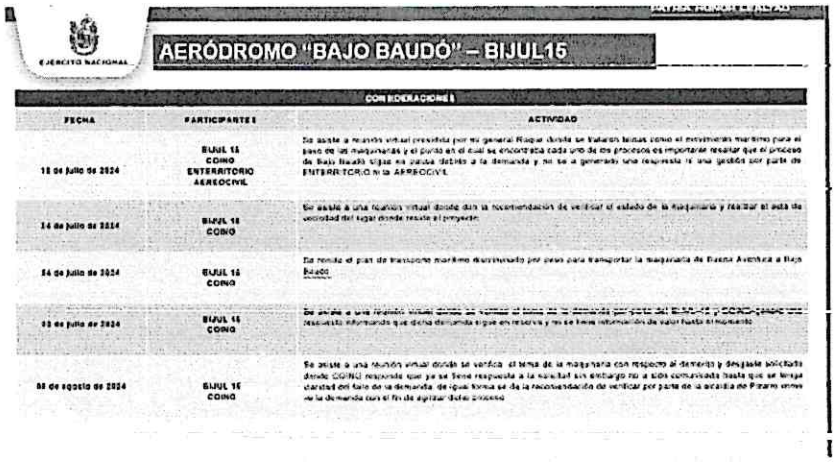

FECHA	PARTICIPANTES	ACTIVIDAD
18 de julio de 2024	BIJUL 15 COING ENTERRITORIO AEROCIVIL	Se asiste a reunión virtual presidida por el general Riaño donde se trataron temas como el movimiento marítimo para el paso de las maquinarias y el punto en el cual se encontraba cada uno de los procesos es importante resaltar que el proceso de Bajo Baudó sigue en pausa debido a la demanda y no se ha generado una respuesta ni una gestión por parte de ENTERRITORIO ni la AEROCIVIL
24 de julio de 2024	BIJUL 15 COING	Se asiste a una reunión virtual donde dan la recomendación de verificar el estado de la maquinaria y realizar el acta de veracidad del lugar donde reside el proyecto.
24 de julio de 2024	BIJUL 15 COING	Se revisa el plan de transporte marítimo suministrado por paso para transportar la maquinaria de Buena Aventura a Bajo Baudó
25 de julio de 2024	BIJUL 15 COING	Se asiste a una reunión virtual donde se verifica el tema de la demanda por parte del BIJUL15 y COING donde nos [illegible] informando que dicha demanda sigue en reserva y no se tiene información de valor hasta el momento
30 de agosto de 2024	BIJUL 15 COING	Se asiste a una reunión virtual donde se verifica el tema de la maquinaria con respecto al demerito y desgaste solicitado donde COING responde que ya se tiene respuesta a la solicitud sin embargo no a sido comunicada hasta que se tenga claridad del fallo de la demanda de igual forma se da la recomendación de verificar por parte de la alcaldía de Pizarro antes de la demanda con el fin de agilizar dicho proceso

Aeródromo de Bahía Solano.


Interviene el BICON 52 exponiendo los avances así: Expresan la necesidad de contar con los despieces de acero para obras hidráulicas; informan que en las instalaciones de la Armada Nacional no se tiene espacio para depósito, si en alojamiento y la importancia de tener el documento de CODECHOCÓ para absolver las dudas ambientales, como la necesidad de construir un pozo séptico, contar con permiso de concesión de aguas superficiales, la búsqueda de solución de suministro de agua mediante el camión de bomberos del Municipio, aclarando que el poder ante CODECHOCO debe salir a nombre del propietario, es decir del Municipio.

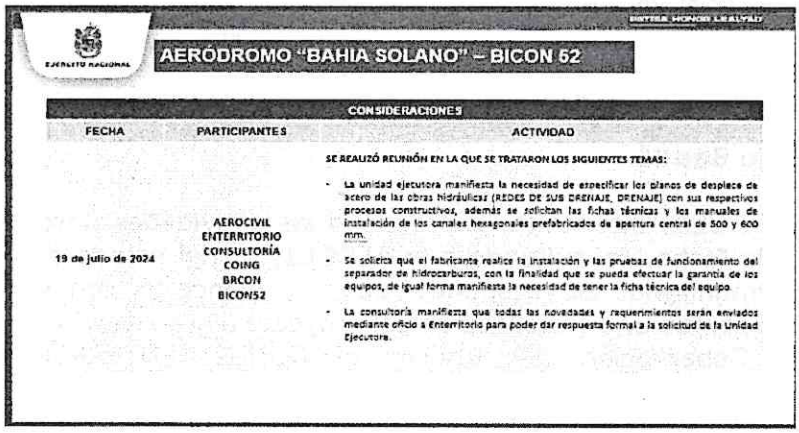

AERÓDROMO "BAHIA SOLANO" – BICON 52

CONSIDERACIONES

FECHA	PARTICIPANTES	ACTIVIDAD
19 de julio de 2024	AEROCIVIL ENTERRITORIO CONSULTORÍA COING BRCON BICON52	SE REALIZÓ REUNIÓN EN LA QUE SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS: - La unidad ejecutora manifiesta la necesidad de especificar los planos de despiece de acero de las obras hidráulicas (REDES DE SUS DRENAJE, DRENAJE) con sus respectivos procesos constructivos, además se solicitan las fichas técnicas y los manuales de instalación de los canales hexagonales prefabricados de apertura central de 500 y 600 mm. - Se solicita que el fabricante realice la instalación y las pruebas de funcionamiento del separador de hidrocarburos, con la finalidad que se pueda efectuar la garantía de los equipos, de igual forma manifiesta la necesidad de tener la ficha técnica del equipo. - La consultoría manifiesta que todas las novedades y requerimientos serán enviados mediante oficio a Enterritorio para poder dar respuesta formal a la solicitud de la Unidad Ejecutora.

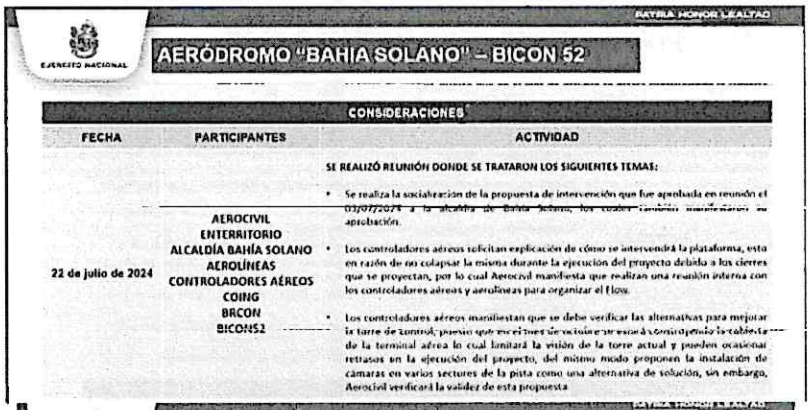


EJERCITO NACIONAL

RAYBA HONOR LEALTAD

AERÓDROMO "BAHIA SOLANO" – BICON 52

CONSIDERACIONES

FECHA	PARTICIPANTES	ACTIVIDAD
22 de Julio de 2024	AEROCIVIL ENTERRITORIO ALCALDÍA BAHÍA SOLANO AEROLÍNEAS CONTROLADORES AÉREOS COING BRCON BICON52	SE REALIZÓ REUNIÓN DONDE SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS: • Se realiza la socialización de la propuesta de intervención que fue aprobada en reunión el 03/07/2024 a la alcaldía de Bahía Solano, los cuales [illegible] su aprobación. • Los controladores aéreos solicitan explicación de cómo se intervendrá la plataforma, esto en razón de no colapsar la misma durante la ejecución del proyecto debido a los cierres que se proyectan, por lo cual Aerocivil manifiesta que realizan una reunión interna con los controladores aéreos y aerolíneas para organizar el Flow. • Los controladores aéreos manifiestan que se debe verificar las alternativas para mejorar la torre de control, puesto que en [illegible] de la terminal aérea lo cual limitará la visión de la torre actual y pueden ocasionar retrasos en la ejecución del proyecto, del mismo modo proponen la instalación de cámaras en varios sectores de la pista como una alternativa de solución, sin embargo, Aerocivil verificará la validez de esta propuesta

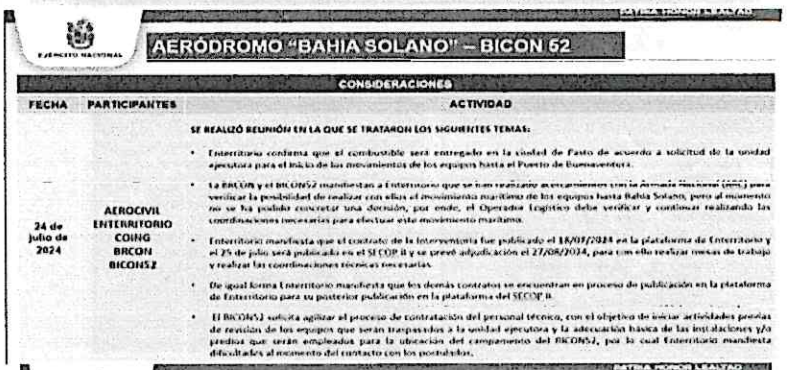


EJERCITO NACIONAL

AERÓDROMO "BAHIA SOLANO" – BICON 52

CONSIDERACIONES

FECHA	PARTICIPANTES	ACTIVIDAD
24 de Julio de 2024	AEROCIVIL ENTERRITORIO COING BRCON BICON52	SE REALIZÓ REUNIÓN EN LA QUE SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS: • Enterritorio confirma que el combustible será entregado en la ciudad de Pasto de acuerdo a solicitud de la unidad ejecutora para el inicio de los movimientos de los equipos hasta el Puerto de Buenaventura. • La BRCON y el BICON52 manifiestan a Enterritorio que se han realizado acercamientos con la Armada Nacional (DIMAR) para verificar la posibilidad de realizar con ellos el movimiento marítimo de los equipos hasta Bahía Solano, pero al momento no se ha podido concretar una decisión, por ende, el Operador Logístico debe verificar y continuar realizando las coordinaciones necesarias para efectuar este movimiento marítimo. • Enterritorio manifiesta que el contrato de la Interventoría fue publicado el 18/07/2024 en la plataforma de Enterritorio y el 25 de julio será publicado en el SECOP II y se prevé adjudicación el 27/08/2024, para con ello realizar mesas de trabajo y realizar las coordinaciones técnicas necesarias. • De igual forma Enterritorio manifiesta que los demás contratos se encuentran en proceso de publicación en la plataforma de Enterritorio para su posterior publicación en la plataforma del SECOP II. • El BICON52 solicita agilizar el proceso de contratación del personal técnico, con el objetivo de iniciar actividades previas de revisión de los equipos que serán transportados a la unidad ejecutora y la adecuación básica de las instalaciones y/o predios que serán empleados para la ubicación del campamento del BICON52, por lo cual Enterritorio manifiesta dificultades al momento de contacto con los propietarios.

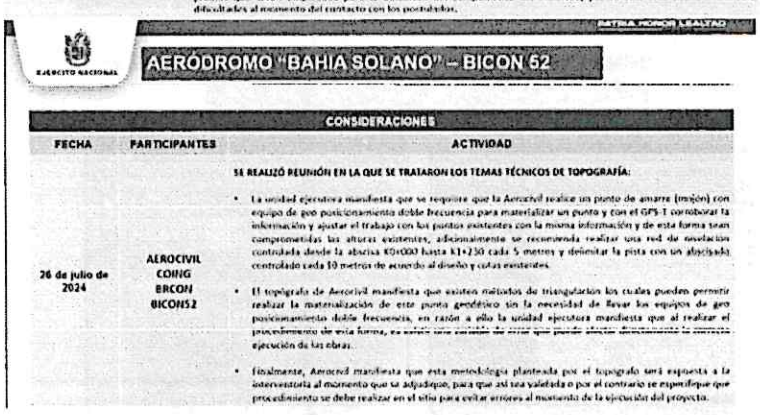

EJERCITO NACIONAL

RAYBA HONOR LEALTAD

AERÓDROMO "BAHIA SOLANO" – BICON 52

CONSIDERACIONES

FECHA	PARTICIPANTES	ACTIVIDAD
26 de Julio de 2024	AEROCIVIL COING BRCON BICON52	SE REALIZÓ REUNIÓN EN LA QUE SE TRATARON LOS TEMAS TÉCNICOS DE TOPOGRAFÍA: • La unidad ejecutora manifiesta que se requiere que la Aerocivil realice un punto de amarre (mojón) con equipo de geo posicionamiento doble frecuencia para materializar un punto y con el GPS-T corroborar la información y ajustar el trabajo con los puntos existentes con la misma información y de esta forma sean comprometidas las alturas existentes, adicionalmente se recomienda realizar una red de nivelación controlada desde la abscisa K0+000 hasta K1+230 cada 5 metros y delimitar la pista con un alineado controlado cada 10 metros de acuerdo al diseño y cotas existentes. • El topógrafo de Aerocivil manifiesta que existen métodos de triangulación los cuales pueden permitir realizar la materialización de este punto geodésico sin la necesidad de llevar los equipos de geo posicionamiento doble frecuencia, en razón a ello la unidad ejecutora manifiesta que al realizar el procedimiento de esta forma, se estaría [illegible] ejecución de las obras. • Finalmente, Aerocivil manifiesta que esta metodología planteada por el topógrafo será expuesta a la interventoría al momento que se adjudique, para que así sea validada o por el contrario se especifique que procedimiento se debe realizar en el sitio para evitar errores al momento de la ejecución del proyecto.

PATRIA HONOR LEALTAD

EJÉRCITO NACIONAL

AERÓDROMO "BAHIA SOLANO" – BICON 52

CONSIDERACIONES

FECHA	PARTICIPANTES	ACTIVIDAD
08 y 09 de agosto de 2024	ENTERRITORIO COING BICON52	**SE REALIZO VISITA EN CAMPO LOS DÍAS 08 Y 09 DE AGOSTO CON ENTERRITORIO, COING Y BICON52 PARA TRATAR LOS SIGUIENTES TEMAS:** • Reunión con la Alcaldía Municipal, Aerocivil, Ejército Nacional (EJC) y ENTERRITORIO S.A. para socializar la agenda de la comisión. • Chequeo instalación de acometidas de acueducto provisional y puntos provisionales de energía eléctrica aeródromo José Celestino Mutis del municipio de Bahía Solano. • Visita de inspección pozo septico y áreas de baños del Batallón Armada Nacional (ARC) de Bahía Solano. • Visita de inspección temas logísticos para socialización con entidades públicas y privadas del área de influencia, frente a la tercera propuesta de intervención. • Mesa de trabajo con Entes territoriales, Ejército Nacional (EJC) y Aeronáutica, previa antes de iniciar espacio de socialización. • Socialización del proyecto y propuesta de intervención dirigida a entidades públicas y privadas del área influencia directa del aeródromo José Celestino Mutis del municipio de Bahía Solano. • Recolección información primaria concerniente a transporte marítimo y logística de materiales.

PATRIA HONOR LEALTAD

EJÉRCITO NACIONAL

AERÓDROMO "BAHIA SOLANO" – BICON 52







PATRIA HONOR LEALTAD

EJÉRCITO NACIONAL

AERÓDROMO "BAHIA SOLANO" – BICON 52








Aeródromo de Magüí Payán.

Intervención del BIANG 23: Enfatizan el estado de vías de acceso al Municipio de Magüí Payán y describen actividades gestionadas ante el Municipio de Barbacoas para el paso de maquinaria y, la Fuerza Naval de Pacifico en el tránsito sobre el río Telembí.

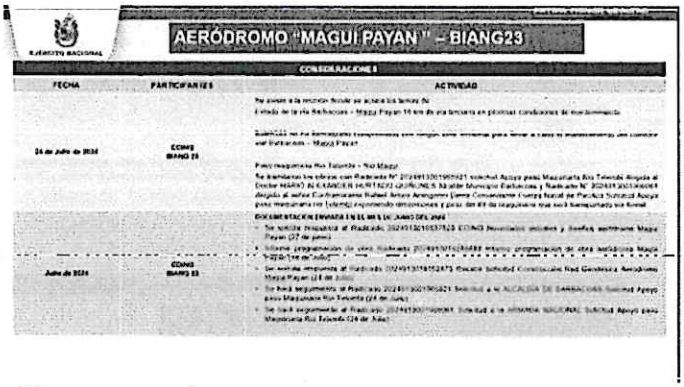

Aeródromo de Barrancominas.

Brevemente expone el BIALB 07 las actividades del mes, destacando las gestiones ante la Armada Nacional para el movimiento fluvial de equipos y, expresan la necesidad del acompañamiento de la Gerencia Integral para tratar temas ambientales.

PATRIA HONOR LEALTAD

EJERCITO NACIONAL

AERÓDROMO "BARRANCOMINAS"- BIALB07

CONSIDERACIONES

FECHA	PARTICIPANTES	ACTIVIDAD
22-JULIO-2024	COING AERONAUTICA CIVIL BIALB ENTERRITORIO	• Se remite la solicitud a la Séptima Brigada del Ejército Nacional el requerimiento para el trámite ante la Armada Nacional para el movimiento fluvial del equipo mediante oficio No. 2024976001921411, se sigue el conducto regular como Unidad Táctica para realizar la solicitud a otra Fuerza.
24-JULIO-2024		• Mediante documento No. 20249760190576G3 se solicita al Coing la intervención para elevar el trámite con quien corresponda referente al movimiento del equipo por parte de la Armada Nacional.
01-AGOSTO-2024		• Se realiza visita técnica por parte del personal de Enterritorio con el fin de verificar los procesos en los permisos ambientales que se requieran.

PATRIA HONOR LEALTAD

EJERCITO NACIONAL

AERÓDROMO "BARRANCOMINAS"- BIALB07

CONSIDERACIONES ESPECIALES

FECHA	PARTICIPANTES	ACTIVIDAD
09 AGOSTO 2024	COING AERONAUTICA CIVIL BIALB ENTERRITORIO	• En múltiples reuniones y comités se ha informado que la Armada Nacional no cuenta con la capacidad para realizar el movimiento de la maquinaria para la ejecución del proyecto, sin embargo se están realizando las gestiones correspondientes para obtener la respuesta formal por parte de Armada.
		• Se solicita realizar la liberación del presupuesto que se tiene contemplado a la fecha como combustible y se realice el proceso de contratación del transporte fluvial de los equipos.
		• Se informa que el transporte fluvial cuenta con un valor aproximado de 550.000 por tonelada, sin embargo este es el precio comercial, es necesario contemplar los incrementos en los precios dentro de un proceso de contratación.

PATRIA HONOR LEALTAD

EJERCITO NACIONAL

CONSIDERACIONES ESPECIALES

1. Transporte marítimo – fluvial, Bahía Solano, Bajo Baudó, Barrancominas y Magul Payán.
2. Se requiere la logística del ingreso de los materiales de construcción por parte del contratista de acuerdo a la capacidad de entrega y/o limitaciones en la región.
3. Balance financiero con los precios reales de adjudicación.
4. Se requiere información de las gestiones ambientales ante las distintas corporaciones ambientales.
5. Se solicita se informe el estado actual y el cronograma de la contratación derivada para grupo 2 y 3.
6. Se solicita información del estado de la demanda de Bajo Baudó.

Frente a consideraciones especiales adicionales, AEROCIVIL informa que ha respondido la solicitud de transporte marítimo y/o fluvial por el COING. Queda pendiente la remisión de los cronogramas actualizados de las contrataciones para los Grupos 2 y 3 por ENTERRITORIO. De las otras observaciones toma nota ENTERRITORIO y lo tiene en cuenta en la ejecución de su contrato.

Se reitera la intervención del BG. Roque Salcedo el 18 de julio de 2024, quien solicitó a los Batallones el registro fotográfico diario y climático, soportado con bitácora y con ello los soportes de lo allegado por ENTERRITORIO en cuanto a calidad, cantidad y precio, para control del material entregado, con una comunicación permanente y fluida con esa Gerencia integral de ENTERRITORIO.

4. Preguntas, observaciones, compromisos generados y otros.

Compromiso	Entidad	Fecha límite para cumplimiento
Cronograma contratación derivada grupos 2-3	ENTERRITORIO	13 de agosto de 2024
Atención a observaciones de estudios y diseños realizados por ENTERRITORIO y su consultor.	ENTERRITORIO	20 de agosto de 2024
Reiteración a Municipio de Magüí Payán en atención a estado de convenio para atención de vías a su cargo, incluyendo el acta de reunión realizada entre Gerencia Integral y ente Municipal.	ENTERRITORIO	16 de agosto de 2024
Información sobre gestiones ambientales para el aeropuerto de Bahía Solano.	ENTERRITORIO	13 de agosto de 2024
Balance financiero y gestiones ambientales Grupo 1.	ENTERITORIO	20 de agosto de 2024
Apoyo de ENTERRITORIO a Municipio de Bahía Solano en referencia a poder para adelantar gestiones ambientales.	ENTERRITORIO	20 de agosto de 2024
Remisión de observaciones a estudios y diseños de todos los aeródromos.	COING	23 de agosto de 2024
Mesa de trabajo virtual para el aeródromo de La Primavera, temas análisis costo beneficio para incorporar topógrafo con equipos vs compra de equipos de topografía por separado; análisis de perfiles de cubiertas para campamento.	ENTERRITORIO	14 de agosto de 2024

5. Cierre del comité operativo No. 0007

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Siendo las 12:06 P.M. del 13 de agosto de 2024 se finaliza el presente Comité Operativo del convenio 23001315 H4-2023.

Nombre	Cargo	Firma
Andrés Arboleda Salazar	Secretaría de Servicios Aeroportuarios Presidente Comité Operativo	Andrés Arboleda

Revisó: Ing. Nubia Quintero Hernández. Directora de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias
Revisó: Administrador Abel Torres Muñetones. Coordinador Grupo ASAES.
Revisó: Abg. Alford Pedraza Vega. Contratista Grupo ASAES.
Proyectó: Ing. Omar Javier Suspes Fonseca. Profesional Aeronáutico

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

LISTADO DE PARTICIPANTES Y/O ASISTENTES - EXTERNOS

Clave: ESTR-3.0-12-004	Versión: 06	Fecha de aprobación: 01/04/2022

ÁREA / PROCESO QUE REALIZA LA REUNIÓN: S.S.A

TEMA DE LA REUNIÓN: Comite Operativo Ejercito 0007

FECHA: Agosto 13 de 2024 | **HORA INICIO:** 9:00 | **HORA FINAL:** 12:06 p.m.

LUGAR: Sala de cristal - NEAA

Ley 1581 del 2012: los datos personales recolectados, serán tratados para gestionar el tema de la reunión, alcanzar los objetivos del proceso que la realiza y cumplir los deberes de la Aerocivil. Puede conocer nuestra Política de Protección de Datos Personales en www.aerocivil.gov.co y ejercer sus derechos a conocer, rectificar, actualizar, u oponerse tambien atravès de nuestra pagina, opción Atención al ciudadano, opción PQRSD.

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	EMPRESA	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
1	Omar Javier Suspes F.	80035262	Aeronautica C.		omar.suspes@	
2	Ricardo Sanchez R.	19446681	AEROCIVIL	3114995630	ricardo.sanchez@aerocivil.gov.co	
3	Juan Castellanos	1014312788	Aerocivil	304-3447778	Juan.Castellanos	
4	Abel Torres M.	79.307.225	Aerocivil.	3173319096	abel.torres@aerocivil.gov.co	
5	Mg Diego Bonilla Campo	12206354	COTECMAR	3204952837	diego.bonilla@cotecmar.com	
6	Ghisney Vella	1032499462	COTECMAR	3503479347	ghisney.vella@gmail.com	
7	Javier Zorro Castro	79841647	AEROCIVIL	3143306871	javier.zorro@aerocivil.	
8	Carlos Andres Cormane P.	79902392	Aerocivil	3016962966	carlos.cormane@aerocivil	
9	Dirlady Perez B.	40343115	Aerocivil	3142266502	dirlady.perez@	
10	Arturo Rebolledo Vera	11.339.487	Aerocivil	—	arturo.rebolledo@	
11	Faban Camilo Morales A.	80.849.594	Aerocivil	3052933941	faban.morales@aerocivil.gov.co	
12	Angel F. Castro D.	1026305508	Aerocivil	3208697278	angel.castro@aerocivil.gov.co	
13	Nubia Quintero M.	40'033.850	AEROCIVIL	3163805306	nubia.quintero@aerocivil.gov.co	
14	Jesvert Quintero J.	84009230	Enterritorio	3007586121	jquintero@enterritorio	
15	Salim Nader	1026296648	Aerocivil	3012977239	Salim.nader...	
16	Diego Fernando Alza	1101752146	Enterritorio	3187683682	dalza@enterritorio	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO **LISTADO DE PARTICIPANTES Y/O ASISTENTES - EXTERNOS**		
	Clave: ESTR-3.0-12-004	**Versión:** 06	**Fecha de aprobación:** 01/04/2022

ÁREA / PROCESO QUE REALIZA LA REUNIÓN:	S. S. A				
TEMA DE LA REUNIÓN:	Comité Operativo 0007 Ejército				
FECHA:	Agosto 13 de 2024	**HORA INICIO:**	09:00 a.m	**HORA FINAL:**	12:06 p.m
LUGAR:	Una de cristal - NEAA				

Ley 1581 del 2012: los datos personales recolectados, serán tratados para gestionar el tema de la reunión, alcanzar los objetivos del proceso que la realiza y cumplir los deberes de la Aerocivil. Puede conocer nuestra Política de Protección de Datos Personales en www.aerocivil.gov.co y ejercer sus derechos a conocer, rectificar, actualizar, u oponerse tambien através de nuestra pagina, opción Atención al ciudadano, opción PQRSD.

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	EMPRESA	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
17	Jesús Alberto Rencenco	7706653	EJC	3165334508	Jesús.Rencenco@ejercito.mil.co	
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
