Bogotá D.C, 06 de junio 2024
C. INTERVIAS RURALES – 093– TEC

Secretaria de infraestructura
ING. OLGA LILIANA OSPINA JIMÉNEZ
Departamento de Risaralda

Referencia: Contrato de interventoría No. 1655 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

Asunto: Remisión de documentos.

Respetada Ingeniera,

Adjunto al presente, se realiza la entrega del informe mensual de interventoría No. 10 con sus respectivos anexos, correspondiente al periodo del 10 de abril al 09 de mayo de 2024, en cumpliendo de las obligaciones contractuales de la interventoría

Cordialmente,

Álvaro Hernando Vera Ayala
Director de Interventoría
Consorcio Intervias Rurales

6/6/24, 14:41 SGDA

GOBERNACION DE RISARALDA
Rad: 20240606-18507-E
Fecha: 2024-06-06 14:41:41
Asunto: CONTRATO DE INTERVENTORIA -
Recibido Por: Jheferson Giovany Gil Holguin
Folios: 1
El radicado no implica su aceptación

Powered by CamScanner

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO INTERVIAS RURALES
NIT 901.713.373-0
Cl 123 N 7 a 17 Ofc 304
Tel: (601) 3117528883
Bogotá - Colombia
almaintercon@gmail.com
www.almaintercon.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 13

Señores	Departamento de Risaralda		
NIT	899.999.230-7	**Teléfono**	(603) 3239030 - Ext. 000
Dirección	Cl 19 13 17	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/06/2024, 12:32
Expedición	07/06/2024, 12:32
Vencimiento	07/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Cto 1655 Objeto : Interventoría para el seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Ambiental, Contable y Jurídico para las Obras de Mejoramiento de Vías terciarias en diferentes municipios del Departamento del Risaralda. Periodo 6 : Comprendido 10 de marzo al 9 de mayo del 2024	1.00	171,802,873.85

Total items: 1

Total Bruto	144,372,162.90
IVA 19%	27,430,710.95
Total a Pagar	171,802,873.85

Valor en Letras:
Ciento setenta y un millones ochocientos dos mil ochocientos setenta y tres pesos m/cte con ochenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 171,802,873.85

Observaciones:
Favor Consignar en la Cuenta Corriente Banco de Bogotá 637499625

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764057961777 aprobado en 20231012 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 837c54551e019f49c050e8f87b53b709ae09ce30a53320b2d13e2e128908f0b1e6d793e85a41ec2c334a1cba1b06fce6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ACTA No. 06 Contrato No interno 1655 de fecha 19/05/2023 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4964560 de fecha 25/01/2023

ACTA PARCIAL	X
ACTA FINAL	

En el municipio de RISARALDA se reunieron ALVARO HERNANDO VERA AYALA, en calidad de Interventor y OLGA LILIANA OSPINA JIMENEZ en calidad de Supervisora, con el objeto de realizar la presente acta parcial del (Contrato de Interventoría No interno: 1655 SECOP II No CO1.PCCNTR.4964560 de fecha 25/01/2023, conforme a lo siguiente:

OBJETO	INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVIAS RURALES integrado por (ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S NIT. 901.573.477-6 y ARA INGENIERÍA S.A.S NIT 830.068.724-8)
NIT O CEDULA	901.713.373-0
REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO HERNANDO VERA AYALA
CEDULA	1.022.329.221 de Bogotá
IMPUTACIONES	Rubro No 2.3.24.02.0600.09 fuente 96 Disponibilidad No 624.959.555 (2023-06-13) Registro No 14123 (2023-06-13)
PLAZO INICIAL	Diez (10) meses y quince (15) días. (Aclaratorio)
FECHA DE INICIACION	10 de julio de 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	25 de mayo de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 627.959.555
PRORROGA No.01	Dos (2,0) meses y diez (10) días
FECHA DE TERMINACION No.01	04 de agosto de 2024
VALOR ADICION No.01	$144'203.323,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$772.162.878,00
FORMA DE PAGO	El departamento de Risaralda, cancelara el valor del contrato que se suscriba con ocasión de este

ACTA No. 06 Contrato No interno 1655 de fecha 19/05/2023 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4964560 de fecha 25/01/2023

	concurso de méritos abierto de la siguiente forma: Mediante presentación de actas parciales de avance de interventoría y un acta final con la liquidación del contrato. La última acta no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato.
FECHA DE ELABORACIÓN:	04/06/2024

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		$0
Valor amortizado actas anteriores	$0	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	$0	
Saldo por amortizar	$0	
SUMAS IGUALES	$0	$0

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$627.959.555,00
Valor Adición		$144'203.323,00
Valor total de actas pagadas	$493'838.667,20	
Valor presente acta	$171'802.873,85	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$106'521.336,95	
SUMAS IGUALES	$772.162.878,00	$772.162.878,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): $ **171'802.873,85**

PERIODO DE PAGADO (fechas): DESDE **10/03/2024** HASTA **09/05/2024**

OBSERVACIONES:

MARZO	• Se realiza acompañamiento por parte de equipo de interventoría, director de obra, residente y auxiliar a socialización de la obra con la comunidad en el tramo 80 (Vereda planadas – Municipio de Quinchía). • Se realiza control y verificación por parte de la topografía a las actividades de localización y construcción de la estructura de pavimento según lo consolidado en el anexo 17 *"Informe de especialista en vías y transportes y/o pavimentos e informe de*

ACTA No. 06 Contrato No interno 1655 de fecha 19/05/2023 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4964560 de fecha 25/01/2023

	topografía" del informe mensual No.09 • Se realizan recorridos de obra por parte del especialista en vías y pavimentos para verificación de método constructivo en tramos activos y seguimiento al estado final de las placa huellas según el anexo 17 *"Informe de especialista en vías y transportes y/o pavimentos e informe de topografía"* del informe mensual No.09 • Se realizan recorridos de obra por parte de profesional ambiental y SST para verificar actividades y su implantación de acuerdo a los requerimientos ambientales y de seguridad en el trabajo establecidos, se recompila esta información y se genera informe según el numeral 4.5 *"Gestión ambiental"* y numeral 4.7 *"Gestión de seguridad y salud en el trabajo"* del informe mensual No.09 • Se realizan recorridos y acompañamientos a obra a las actividades de obra. En donde se verifica la construcción y cumplimiento de los procesos constructivos del contrato, se verifica cuantías, dimensiones y se lleva control de las cantidades de obra.
ABRIL	• Se realiza acompañamiento por parte de equipo de interventoría, director de obra, residente y auxiliar a socialización de la obra con la comunidad en el tramo 71 (Vereda Alto Jardín – Municipio de Apia). • Se realiza control y verificación por parte de la topografía a las actividades de localización, construcción de la estructura de pavimento y cuantificación de áreas de empradización realizadas según lo consolidado en el anexo 17 *"Informe de especialista en vías y transportes y/o pavimentos e informe de topografía"* del informe mensual No.10 • Se realizan recorridos de obra por parte del especialista en vías y pavimentos para verificación de método constructivo en tramos activos, seguimiento al estado final de las placa huellas y a la ejecución del capítulo de obras complementarias verificando su estado final según el anexo 17 *"Informe de especialista en vías y transportes y/o pavimentos e informe de topografía"* del informe mensual No.10 • Se realizan recorridos de obra por parte de profesional ambiental y SST para verificar actividades y su implantación de acuerdo a los requerimientos ambientales y de seguridad en el trabajo establecidos, se recompila esta información y se genera informe según el numeral 4.5 *"Gestión ambiental"* y numeral 4.7 *"Gestión de seguridad y salud en el trabajo"* del informe mensual No.10 • Se realizan recorridos y acompañamientos a obra a las actividades de obra. En donde se verifica la construcción y cumplimiento de los procesos constructivos del contrato, se verifica cuantías, dimensiones y se lleva control de las cantidades de obra.

ACTA No. 06 Contrato No interno 1655 de fecha 19/05/2023 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4964560 de fecha 25/01/2023

El valor del personal y de costos directos por los dos meses de acta corresponde a $ 131'400.923,95 y por el valor de ensayos de laboratorio corresponde a $ 40'401.949.9. Cobrándose en este periodo los ensayos de:

Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos, límite líquido de suelos, índice de plasticidad de suelos, material orgánico, densidad en campo, determinación en laboratorio del contenido de agua, relación de soporte del suelo en laboratorio cbr, proctor modificado, resistencia a la compresión de cilindros, equivalente de arena, determinación del valor del 10% de finos, determinación de terrones de arcilla y partículas deleznables en los agregados, solidez de los agregados frente a la acción de soluciones de sulfato de sodio o de magnesio, resistencia a la degradación de los agregados de tamaños por medio de la máquina de los ángeles, índices de aplanamiento y de alargamiento de los agregados para carreteras

NOTA:

- El suscrito supervisor hace constar que el contratista CONSORCIO INTERVIAS RURALES cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

- El contratista ALVARO HERNANDO VERA AYALA declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). (Se deben anexar las constancias de pago o certificados). Planillas de pago Nº 75887184, 76058732, 76241825, 76572076, 76572092, 76819535, 76893322 del personal de INTERVENTORIA.

Firma
ALVARO HERNANDO VERA AYALA
Contratista

firma
OLGA LILIANA OSPINA JIMENEZ
Supervisor del Departamento

Nombre de quien elaboró: Gina Paola Solano Reyes

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro. CO1.PCONTR.4964560 de fecha 25/01/223

OBJETO:
INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA
CONTRATISTA : CONSORCIO INTERVIAS RURALES
INTERVENTOR: N/A
IMPUTACIONES (No /fecha)
RUBRO: No 00RG-2402-0600-2019-00366-0023
CDP: No 624.959.555 (2023-06-13)
REGISTRO: No 14123 (2023-08-13)

VALOR CONTRATO: $ 627.959.555,00
VALOR ADICION(E: $ 144.203.323,00
VALOR TOTAL: $ 772.162.878,00
VALOR ANTICIPO: $ 0
FECHA DE INICIACIÓN: 10 de julio de 2023
FECHA DE TERMINACION: 25 de mayo de 2023
SUSPENSION:
REINICIACION:
PLAZO: 10.5 Meses
PRORROGA: DOS (02) MESES Y DIEZ (10
FECHA TERM. FIN: 4 de agosto de 2024

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
Acta parcial No. 08

ACTA PARCIAL
ACTA FINAL

VALOR DEL ACTA: **171.802.873,85**

3 de junio de 2024

CONDICIONES ORIGINALES																			MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA			ACUMULADO ACTAS ANTERIORES									ACUMULADO	
																			Cantida	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	TOTAL ACTAS ANTERIORES	Cantida	Valor
1. PERSONAL PROFESIONAL																							Mes 9	Mes 10											
Profesional	Actividad	Salario Mes	EDICACIO	PARTICIPACIÓN (H-MES) 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL	VrTotal																						
Ingeniero Civil	Ingeniero Civil (Director de Obra)	$ 5.500.000	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	5,0	27.500.000,00	1,25	$ 6.875.000,00	6,25	$ 34.375.000,00	0,50	0,50	5.500.000,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	4,00	5,00	27.500.000,00
Ingeniero Civil con especializacion	Especialista en Vias y transporte v/o	$ 4.500.000	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33		2,97	13.365.000,00	#####	$ 3.712.500,00	3,80	$ 17.077.500,00	0,33	0,33	2.970.000,00	0,00	0,00	0,99	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	2,64	3,30	14.850.000,00
Ingeniero Civil	Residente de Interventoria	$ 4.500.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,0	45.000.000,00	2,50	$ 11.250.000,00	12,50	$ 56.250.000,00	1,00	1,00	9.000.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	10,00	45.000.000,00
Ingeniero Ambie	Profesional en area ambiental	$ 3.300.000	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-	4,5	14.850.000,00	1,25	$ 4.125.000,00	5,75	$ 18.975.000,00	0,50	0,50	3.300.000,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	4,00	5,00	18.500.000,00
Ingeniero Industrial	Profesional en area SISO	$ 3.000.000	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-	4,5	13.500.000,00	1,25	$ 3.750.000,00	5,75	$ 17.250.000,00	0,50	0,50	3.000.000,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	4,00	5,00	15.000.000,00
Ingeniero Civil	Inspector de	$ 2.000.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	9,0	18.000.000,00	2,50	$ 5.000.000,00	11,50	$ 23.000.000,00	1,00	1,00	4.000.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	7,50	9,50	19.000.000,00
Topografo	Topógrafo	$ 3.000.000	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-	4,5	13.500.000,00	1,25	$ 3.750.000,00	5,75	$ 17.250.000,00	0,50	0,50	3.000.000,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	4,00	5,00	15.000.000,00
Cadenero	Cadenero	$ 1.500.000	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-	4,5	6.750.000,00	1,25	$ 1.875.000,00	5,75	$ 8.625.000,00	0,50	0,50	1.500.000,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	4,00	5,00	7.500.000,00
Secretaria	Secretaria	$ 1.160.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	9,0	10.440.000,00	2,50	$ 2.900.000,00	11,50	$ 13.340.000,00	1,00	1,00	2.320.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	7,50	9,50	11.000.000,00
Contador Publico	Contador	$ 2.466.660	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30		2,7	6.659.982,00	0,75	$ 1.849.995,00	3,45	$ 8.509.977,00	0,30	0,30	1.479.995,00	0,00	0,30	0,60	0,60	0,30	0,30	0,30	0,30	2,70	3,30	8.139.978,00
	Total Costo de Personal														169.584.962,00		**$ 45.087.495,00**		**$ 214.652.477,00**			36.069.996,00												179.509.978,00
	Factor Multiplicador													**188%**																					
	TOTAL PERSONAL														**318.782.166,00**		**$ 84.764.491,00**		**$ 403.546.657,00**			**67.811.592,00**												**337.478.759,00**
COSTOS DIRECTOS																																			
	Cant	Unidad	Tarifa																																
Alquiler de oficina v/o	1	Mes	$ 700.000		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		9,00	6.300.000,00	2,50	$ 1.750.000,00	11,50	$ 8.050.000,00	1,00	1,00	$1.400.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	10,00	7.000.000,00
Alquiler de comp	6	Und	$ 155.000		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		54,00	8.370.000,00	2,50	$ 775.000,00	56,50	$ 9.145.000,00	1,00	1,00	$1.240.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	10,00	8.680.000,00
Elementos de consumo y	1	Und	$ 200.000		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		9,00	1.800.000,00	2,50	$ 500.000,00	11,50	$ 2.300.000,00	1,00	1,00	$400.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	10,00	2.000.000,00
Equipo de topogr	3	Mes	$ 950.000		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		27,00	25.650.000,00	2,50	$ 2.375.000,00	29,50	$ 28.025.000,00	1,00	1,00	$3.800.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	10,00	26.600.000,00
Transporte (Camioneta - Fotocopias y reproducciones	2	Mes	$ 3.500.000		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		18,00	63.000.000,00	2,50	$ 17.500.000,00	20,50	$ 80.500.000,00	1,00	1,00	$14.000.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	10,00	70.000.000,00
	1	Mes	$ 150.000		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		9,00	1.350.000,00	2,50	$ 375.000,00	11,50	$ 1.725.000,00	1,00	1,00	$300.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	10,00	1.500.000,00
Fotografias	1	Mes	$ 150.000		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		9,00	1.350.000,00	2,50	$ 375.000,00	11,50	$ 1.725.000,00	1,00	1,00	$300.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	10,00	1.500.000,00
Telecomunicacio nes	1	Und	$ 300.000		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		9,00	2.700.000,00	2,50	$ 750.000,00	11,50	$ 3.450.000,00	1,00	1,00	$600.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	10,00	3.000.000,00
Edicion de informes	1	Und	$ 200.000		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		9,00	1.800.000,00	2,50	$ 500.000,00	11,50	$ 2.300.000,00	1,00	1,00	$400.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	10,00	2.000.000,00

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro. CO1.PCONTR 4964560 de fecha 25/01/223

OBJETO:
INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA
CONTRATISTA : CONSORCIO INTERVIAS RURALES
INTERVENTOR: N/A
IMPUTACIONES (No./fecha)
RUBRO: No 00RG-2402-0600-2019-00366-0023
CDP: No 624.959 555 (2023-06-13)
REGISTRO: No 14123 (2023-06-13)

VALOR CONTRATC $ 627.959.555,00
VALOR ADICION(E $ 144.203.323,00
VALOR TOTAL: $ 772.162.878,00
VALOR ANTICIPO $ 0
FECHA DE INICIACIÓN: 10 de julio de 2023
FECHA DE TERMINACION: 25 de mayo de 2023
SUSPENSION:
REINICIACION:
PLAZO: 10,5 Meses
PRORROGA: DOS (02) MESES Y DIEZ (10
FECHA TERM. FINA 4 de agosto de 2024

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
Acta parcial No. 06

ACTA PARCIAL
ACTA FINAL

VALOR DEL ACTA: **171.802.873,85**

3 de junio de 2024

	CONDICIONES ORIGINALES														MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES								ACUMULADO	
															Cantida	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	TOTAL ACTAS ANTERIORES	antidad	Valor
Determinación de los tamaños de las particulas de los suelos	4	Quince Dia	$ 200.209		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00				28,00	5.605.852,00		$ -	28,00	$ 5.605.852,00	4,00	3,00	$5.605.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	5.605.852,00
Límite líquido de suelos (Sub	4	Quince Dia	$ 56.629		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00				28,00	1.585.612,00		$ -	28,00	$ 1.585.612,00	2,00	2,00	$906.064,00	0,00	0,00	1,50	1,25	0,25	0,00	0,00	0,00	3,00	7,00	1.585.612,00
Indice de plasticidad de	4	Quince Dia	$ 56.630		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00				28,00	1.585.640,00		$ -	28,00	$ 1.585.640,00	2,00	2,00	$906.080,00	0,00	0,00	1,50	1,25	0,25	0,00	0,00	0,00	3,00	7,00	1.585.640,00
Material orgánico (Sub	4	Quince Dia	$ 92.326		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00				28,00	2.585.128,00		$ -	28,00	$ 2.585.128,00	4,00	3,00	$2.585.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	2.585.128,00
Densidad en campo (Sub	12	Semanla	$ 50.500		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00				84,00	4.242.000,00		$ -	84,00	$ 4.242.000,00	4,00	3,00	$4.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	4.242.000,00
Determinación en laboratorio del contenido de agua	4	Quince Dia	$ 14.098		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00				28,00	394.744,00		$ -	28,00	$ 394.744,00	2,00	2,00	$225.568,00	0,00	0,00	1,50	1,25	0,25	0,00	0,00	0,00	3,00	7,00	394.744,00
Relación de soporte del suelo en	2	Mensual	$ 333.357		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00				14,00	4.666.998,00		$ -	14,00	$ 4.666.998,00	1,00	1,00	$1.333.428,00	0,00	0,00	2,00	2,50	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	7,00	4.666.998,00
Proctor modificado (Sub	6	Quince Dia	$ 153.273		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00				42,00	6.437.466,00		$ -	42,00	$ 6.437.466,00	4,00	2,83	$6.261.127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	7,00	6.437.465,54
Resistencia a la compresión de	6	Quince Dia	$ 20.902		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00				42,00	877.884,00		$ -	42,00	$ 877.884,00	3,00	1,67	$585.674,04	0,00	0,00	1,33	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	7,00	877.884,00
Equivalente de	2	Mensual	$ 93.498		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00				14,00	1.308.972,00		$ -	14,00	$ 1.308.972,00	4,00	3,00	$1.308.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1.308.972,00
Determinación del valor del 10% de finos	2	Mensual	$ 246.884		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00				14,00	3.456.376,00		$ -	14,00	$ 3.456.376,00	4,00	3,00	$3.456.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	3.456.376,00
Determinación de terrones de arcilla y	3	Quince Dia	$ 127.220		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				21,00	2.671.620,00		$ -	21,00	$ 2.671.620,00	4,00	2,67	$2.545.872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	7,00	2.671.620,00
Solidez de los agregados frente a la	3	Quince Dia	$ 342.412		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				21,00	7.190.652,00		$ -	21,00	$ 7.190.652,00	4,00	2,67	$6.851.664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	7,00	7.190.652,00
resistencia a la degradación de los agregados de tamaños por	2	Mensual	$ 153.967		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00				14,00	2.155.538,00		$ -	14,00	$ 2.155.538,00	4,00	2,50	$2.001.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	7,00	2.155.538,00
Indices de aplanamiento y	2	Mensual	$ 120.521		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00				14,00	1.687.294,00		$ -	14,00	$ 1.687.294,00	4,00	2,50	$1.566.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	7,00	1.687.294,00
	Subtotal															158.771.776,00		24.900.000,00		183.671.776,00			$62.841.949,90											$168.731.775,54
	Factor Multiplicador Costos Directos (Rango Mínimo 1,0-Maximo 1,25)																															
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON F.M															318.782.166,00		84.764.491,00		403.546.657,00			$67.811.592,00											$337.478.796,00
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON F.M. Y COSTOS DIRECTOS															477.553.942,00		109.664.491,00		587.218.433,00			$130.653.541,90											$506.210.531,54
																																$0,00
Polizas		1,0%	SOBRE SUB-TOTAL CON IMPUESTOS													$4.775.539,00		$1.096.645,00		$5.872.184,00			$1.306.535,00											$5.062.105,00
Estampilla Pro-		3,0%														$14.326.618,00		$3.289.935,00		$17.616.553,00			$3.919.606,00											$15.186.316,00
Estampilla		1,0%														$4.775.539,00		$1.096.645,00		$5.872.184,00			$1.306.535,00											$5.062.105,00
Estampilla Pro-		3,0%														$14.326.618,00		$3.289.935,00		$17.616.553,00			$3.919.606,00											$15.186.316,00
Estampilla Pro-		2,5%														$11.938.849,00		$2.741.612,00		$14.680.461,00			$3.266.399,00											$12.655.264,00
																$50.143.163,00		$11.514.772,00		$61.657.935,00			$13.726.621,00											$53.192.108,00
SUB-TOTAL CON IMPUESTOS																$ 527.697.105,00		$ 121.179.263,00		$ 648.875.368,00			$144.372.162,90											$559.362.639,54
IVA		19,0%														$100.262.450,00		$23.024.060,00		$123.286.510,00			$27.430.710,95											$106.278.901,51
TOTAL																**$627.959.555,00**		**$144.203.323,00**		**$772.162.878,00**			**$ 171.802.873,85**											**665.641.541,05**
																		AMORTIZACION ANTICIP		**AMORTIZACION ANTICIPO:**			0,00											0,00
																		TOTAL A PAGAR:		**TOTAL A PAGAR:**			**$ 171.802.873,85**										**TOTAL ACUMULADO:**	**665.641.541,05**

Alvaro Hernando Vera Ayala
Contratista

Olga Liliana Ospina Jimenez
Supervisor

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro. CO1.PCCNTR.4964560 de fecha 25/01/223

OBJETO:

INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

CONTRATISTA : CONSORCIO INTERVIAS RURALES

INTERVENTOR: N/A

IMPUTACIONES (No./fecha)

RUBRO: No 00RG-2402-0600-2019-00366-0023

CDP: No 624.959.555 (2023-06-13)

REGISTRO: No 14123 (2023-06-13)

VALOR CONTRATO:	$	627.959.555,00
VALOR ADICION(ES) :	$	144.203.323,00
VALOR TOTAL:	$	772.162.878,00
VALOR ANTICIPO:	$	0

FECHA DE INICIACIÓN: 10 de julio de 2023

FECHA DE TERMINACION: 10 de mayo de 2023

SUSPENSION:

REINICIACION:

PLAZO: 10,5 Meses

PRORROGA DOS (02) MESES Y DIEZ (10 DÍAS

FECHA DE TERM. FINAL : 4 de agosto de 2024

BALANCE DEL CONTRATO

Y ANTICIPO

No. 6

ACTA PARCIAL

ACTA FINAL

VALOR DEL ACTA: **171.802.873,85**

FECHA: 3 de junio de 2024

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO :		$	627.959.555,00
VALOR ADICIÓN		$	144.203.323,00
VALOR ACTAS ANTERIORES :	$	493.838.667,20	
VALOR PRESENTE ACTA :	$	171.802.873,85	
SUMA :	$	665.641.541,05	$
SALDO DEL CONTRATO :	$	106.521.336,95	
SUMAS IGUALES :	$	772.162.878,00	772.162.878,00

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO :		$	0,00
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES :	$	0	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA :	$	0	
SUMA :	$	0,00	$
SALDO POR AMORTIZAR :	$	0	0
SUMAS IGUALES :	$	0	0

ALVARO HERNANDO VERA AYALA
Contratista

OLGA LILIANA OSPINA JIMENEZ
Supervisora

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Hacienda** **GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS** **GESTIÓN CONTABLE** **FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO**
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

No. DE CONTRATO CO1.PCCNTR.4964560 de fecha 25/01/223

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [ ] DE TERCEROS [X]

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD Apia

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
TRAMO 71 Cercano a ramal de la via Departamental 606 - Via Valladolid - El Carmelo - El Jardin Mpio. De Apia * 5,9 Km								
Valor total acta								$ 24.654.043,76
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación								$ 24.654.043,76
Firma de Responsable encargado								

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Codigo de la via y/o matricula inmobiliaria								
Nombre de la vía o bien inmueble								
Valor total acta								
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación								
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**								
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabiitación de las vías o bien inmueble								
Valor								
Nombre de la entidad								
Nit de la entidad								
Contacto								
Firma de Responsable encargado								

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Glosario

El mejoramiento y rehabilitacion son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida util del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o reducir signifivamente los costos.

Mantenimiento y la conservacion de los bienes de uso publico se reconoceran como gastos en el resultado del periodo.
El mantenimiento y conservacion son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo

Depreciacion. La depreciacion de un bien de uso publico inicara cuando este disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administracion de la entidad

Vida util: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo.

La estimacion de la vida util de un activo se efectuara con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares.

Para determinar la vida util se debe tener en cuenta los siguientes factores:

a) utilizacion prevista del activo

b) Desgaste fisico esperado , que depende de factores operativos, tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservacion que se le da al activo mientras no se esta utilizando.

La vida util y el metodo de depreciacion seran revisados como minimo, al termino de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustaran para reflejar el nuevo patron de consumo del potencial de servicio.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Hacienda** **GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS** **GESTIÓN CONTABLE** **FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN** **CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO**
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

No. DE CONTRATO CO1.PCCNTR.4964560 de fecha 25/01/223

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO X DE TERCEROS X

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD BALBOA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4		ACTA 5		ACTA 6		TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
				MES1	MES 2	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10		
TRAMO 4 Vereda Tambores						$ 14.910.926,50	$ 17.893.111,80		$ 9.798.608,84		
Valor total acta						$ 14.910.926,50	$ 17.893.111,80		$ 9.798.608,84	$ 42.602.647,14	$ 42.602.647,14 $ -
Valor total acta											
Distribución:											
Valor mantenimiento											
Valor, construcción, mejora o rehabilitación										$ 42.602.647,14	$ 42.602.647,14
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**											
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabiitación de las vías o bien inmueble											
Valor											
Nombre de la entidad											
Nit de la entidad											
Contacto											
Firma de Responsable encargado											

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**
SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1		ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4		ACTA 5		ACTA 6		TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
	MES 1	MES 2			MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10		
478 Via Granatal Mpio. De Balboa * 3,2 Km						$ 7.207.144,64	$ 3.267.029,65		$ 940.114,99			
Valor total acta						$ 7.207.144,64	$ 3.267.029,65		$ 940.114,99		$ 11.414.289,27	$ 11.414.289,27
Distribución:												
Valor mantenimiento												
Valor, construcción, mejora o rehabilitación											$ 11.414.289,27	$ 11.414.289,27
Vida util en años que aumenta por la construcción,												
Si existen aportes realizados por otra entidad para la												
Valor							$ 11.414.289					
Nombre de la entidad							GOBERNACION DE RISARALDA					
Nit de la entidad							891.480.085-7					
Contacto												
Firma de Responsable encargado												

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Glosario
El mejoramiento y rehabilitacion son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida util del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o reducir signifivamente los costos.

Mantenimiento y la conservacion de los bienes de uso publico se reconoceran como gastos en el resultado del periodo. El mantenimiento y conservacion son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo

Depreciacion. La depreciacion de un bien de uso publico inicara cuando este disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administracion de la entidad

Vida util: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo. La estimacion de la vida util de un activo se efectuara con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. Para determinar la vida util se debe tener en cuenta los siguientes factores: a) utilizacion prevista del activo b) Desgaste fisico esperado , que depende de factores operativos, tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservacion que se le da al activo mientras no se esta utilizando.
La vida util y el metodo de depreciacion seran revisados como minimo, al termino de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustaran para reflejar el nuevo patron de consumo del potencial de servicio.

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaria de Hacienda

GESTIÓN CONTABLE

GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO

Versión: 02 | Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

No. DE CONTRATO 021.PCCNTR.4964560 de fecha 25/01/223

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO X DE TERCEROS X

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD PEREIRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1		ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4		ACTA 5		ACTA 6		TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
	MES 1	MES 2			MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10		
026 - Via Sucre - Tres Esquinas - Cruce Arabia Mpio. De Pereira * 2,78 Km			$ 29.443.499,52	$ 5.748.435,47	$ 1.955.107,50				$ 1.955.107,50			
Valor total acta			$ 29.443.499,52	$ 5.748.435,47	$ 1.955.107,50				$ 1.955.107,50		$ 39.102.149,99	$ 39.102.149,99
060 - Via Cruce Alto Erazo - Llano Grande - Pital de Colombia Mpio. De Pereira * 9,3 Km						$ 33.703.219,27	$ 1.453.476,41		$ 1.180.214,62			
Valor total acta						$ 33.703.219,27	$ 1.453.476,41		$ 1.180.214,62		$ 36.336.910,30	$ 36.336.910,30
Cercano a ramal de la via Municipal 020 - Via Calle Larga - El Jazmin - Cruce Altagracia Mpio. De Pereira * 0,7 Km				$ 10.240.414,69						$ 890.470,85		
Valor total acta				$ 10.240.414,69						$ 890.470,85	$ 11.130.885,54	$ 11.130.885,54
Carcano a ramal de la via Departamental 003 - Via Arabia - Yarumal - Cruce Armenia Mpio. De Pereira * 13,3 Km												
Valor total acta												$ 14.766.371,29
045 - Via Guacarí - Catamonos Mpio. De Pereira * 1,8 Km	$ 24.391.512,00								$ 2.121.001,19			
Valor total acta	$ 24.391.512,00								$ 2.121.001,19		$ 26.512.513,19	$ 26.512.513,19
038 - Via la Cecilia - La Esmeralda Mpio. de Pereira * 0,95 Km						$ 21.591.683,11	$ 1.925.798,63		$ 555.001,16			
Valor total acta						$ 21.591.683,11	$ 1.925.798,63		$ 555.001,16		$ 24.072.482,90	$ 24.072.482,90
043 - Via Venecia - Cruce Mundo Nuevo Mpio. De Pereira * 2,55 Km			$ 5.476.033,07	$ 21.686.123,09				$ 2.361.926,63				
Valor total acta			$ 5.476.033,07	$ 21.686.123,09				$ 2.361.926,63			$ 29.524.082,79	$ 29.524.082,79
029 - Via La Horqueta (Cruce Tribunas) - El Guayabo - 2500 Lotes Mpio. De Pereira * 10,28 Km	$ 25.171.099,15								$ 2.188.791,23			
Valor total acta	$ 25.171.099,15								$ 2.188.791,23		$ 27.359.890,38	$ 27.359.890,38
050 - Via El Rincon - La bella Mpio. De Pereira * 2, Km	$ 5.931.960,58	$ 11.360.137,89								$ 1.503.660,74		
Valor total acta	$ 5.931.960,58	$ 11.360.137,89								$ 1.503.660,74	$ 18.795.759,21	$ 18.795.759,21
004 - Via casa Loma - La Colonia - Corozal Mpio. De Pereira * 6,3 Km			$ 18.109.133,20							$ 1.574.707,24		
Valor total acta			$ 18.109.133,20							$ 1.574.707,24	$ 19.683.840,44	$ 19.683.840,44
060 - Via Cruce Alto Erazo - Llano Grande - Pital de Colombia Mpio. De Pereira * 9,3 Km							$ 3.591.150,09	$ 23.204.354,42	$ 828.726,94			
Valor total acta							$ 3.591.150,09	$ 23.204.354,42	$ 828.726,94		$ 27.624.231,45	$ 27.624.231,45
Distribución:											$ -	
Valor mantenimiento											$ -	
Valor, construcción, mejora o rehabilitación											$ 260.142.746,17	$ 274.909.117,46

Firma de Responsable encargado

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1		ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4		ACTA 5		ACTA 6		TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
					MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10		
003	MES 1	MES 2										
Via Arabia - Yarumal - Cruce Armenia Mpio. de Pereira * 13,3 Km												
Valor total acta						$ 10.663.851,66					$ 10.663.851,66	$ 10.663.851,66
006 Via La Estrella Morron - El Chocho - Canceles Mpio. De Pereira * 5 Km			$ 20.802.210,81				$ 1.808.887,90					
Valor total acta			$ 20.802.210,81				$ 1.808.887,90				$ 22.611.098,71	$ 22.611.098,71
006 Via La Estrella Morron - El Chocho - Canceles Mpio. De Pereira * 5 Km		$ 27.854.654,45	$ 17.422.299,13						$ 3.937.126,39			
Valor total acta		$ 27.854.654,45	$ 17.422.299,13						$ 3.937.126,39		$ 49.214.079,97	$ 49.214.079,97
Distribución:												
Valor mantenimiento												
Valor, construcción, mejora o rehabilitación											$ 82.489.030,34	$ 82.489.030,34
Vida util en años que aumenta por la construcción												
Si existen aportes realizados por otra entidad para la Valor		$ 342.631.777										
Nombre de la entidad		GOBERNACION DE RISARALDA										
Nit de la entidad		891.480.085-7										
Contacto												

Firma de Responsable encargado

Nota: Si el contrato de obra, interventoria, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el oresente anexo oara cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor oue del contrato total le asienaron a la obra. se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Glosario

El mejoramiento y rehabilitacion son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida util del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o reducir signifivamente los costos.

Mantenimiento y la conservacion de los bienes de uso publico se reconoceran como gastos en el resultado del periodo. El mantenimiento y conservacion son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo

Depreciacion. La depreciacion de un bien de uso publico inicara cuando este disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administracion de la entidad

Vida util: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo. La estimacion de la vida util de un activo se efectuara con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares.

Para determinar la vida util se debe tener en cuenta los siguientes factores: a) utilizacion prevista del activo

b) Desgaste fisico esperado , que depende de factores operativos, tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservacion que se le da al activo mientras no se esta utilizando.
La vida util y el metodo de depreciacion seran revisados como minimo, al termino de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustaran para reflejar el nuevo patron de consumo del potencial de servicio.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE — FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO	
Versión: 02	Vigencia 02-2019	

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

No. DE CONTRATO CO1.PCCNTR.4964560 de fecha 25/01/223

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [ ] DE TERCEROS [X]

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD BELEN DE UMBRIA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5		ACTA 6		TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
					MES 7	MES 8	MES 9	MES 10		
Carcano a ramal de la via Departamental 704 - Via Taparcal - Belen de Umbria Mpio. De Belen de Umbria * 9,38 Km					$ 4.984.995,77	$ 18.278.317,83	$ 474.761,50			
Valor total acta					$ 4.984.995,77	$ 18.278.317,83	$ 474.761,50		$ 23.738.075,10	$ 23.738.075,10
Distribución:										
Valor mantenimiento										
Valor, construcción, mejora o rehabilitación									$ 23.738.075,10	$ 23.738.075,10
Firma de Responsable encargado										

$ -

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5		ACTA 6		TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Codigo de la via y/o matricula inmobiliaria										
Nombre de la vía o bien inmueble										
Valor total acta										
Distribución:										
Valor mantenimiento										
Valor, construcción, mejora o rehabilitación										
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**										
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabiitación de las vías o bien inmueble										
Valor										
Nombre de la entidad										
Nit de la entidad										
Contacto										
Firma de Responsable encargado										

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Glosario

El mejoramiento y rehabilitacion son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida util del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o reducir signifivamente los costos.

Mantenimiento y la conservacion de los bienes de uso publico se reconoceran como gastos en el resultado del periodo. El mantenimiento y conservacion son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo

Depreciacion. La depreciacion de un bien de uso publico inicara cuando este disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administracion de la entidad

Vida util: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo. La estimacion de la vida util de un activo se efectuara con

fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. Para determinar la vida util se debe tener en cuenta los siguientes factores:

a) utilizacion prevista del activo b) Desgaste fisico esperado , que depende de factores

operativos, tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservacion que se le da al activo mientras no se esta utilizando.
La vida util y el metodo de depreciacion seran revisados como minimo, al termino de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustaran para reflejar el nuevo patron de consumo del potencial de servicio.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Hacienda** **GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS** **GESTIÓN CONTABLE** **FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO**
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

No. DE CONTRATO CO1.PCCNTR.4964560 de fecha 25/01/223

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [ ] DE TERCEROS [X]

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD DOSQUEBRADAS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4		ACTA 5	ACTA 6		TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
				MES 5	MES 6		MES 9	MES 10		
Cercano a ramal de la via Departamental 175 - Via Playa Rica - La Cima Mpio. De Dosquebradas * 3,4 Km				$ 3.071.509,46	$ 26.107.830,43		$ 1.535.754,73			
Valor total acta				$ 3.071.509,46	$ 26.107.830,43		$ 1.535.754,73		$ 30.715.094,62	$ 30.715.094,62
Via Boqueron			$ 28.343.371,94	$ 14.010.687,10	$ 1.556.743,01		$ 2.311.094,85			
Valor total acta			$ 28.343.371,94	$ 14.010.687,10	$ 1.556.743,01		$ 2.311.094,85		$ 46.221.896,90	$ 46.221.896,90
Distribución:										
Valor mantenimiento										
Valor, construcción, mejora o rehabilitación									$ 76.936.991,52	$ 76.936.991,52
Firma de Responsable encargado										

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3		ACTA 4	ACTA 5	ACTA 6		TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Codigo de la via y/o matricula inmobiliaria										
Nombre de la via o bien inmueble										
Valor total acta										
Distribución:										
Valor mantenimiento										
Valor, construcción, mejora o rehabilitación										
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**										
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabitación de las vías o bien inmueble										
Valor										
Nombre de la entidad										
Nit de la entidad										
Contacto										
Firma de Responsable encargado										

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Glosario

El mejoramiento y rehabilitacion son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida util del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o reducir signifivamente los costos.

Mantenimiento y la conservacion de los bienes de uso publico se reconoceran como gastos en el resultado del periodo. El mantenimiento y conservacion son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo

Depreciacion. La depreciacion de un bien de uso publico inicara cuando este disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administracion de la entidad

Vida util: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo. La estimacion de la vida util de un activo se efectuara con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. Para determinar la vida util se debe tener en cuenta los siguientes factores:

a) utilizacion prevista del activo b) Desgaste fisico esperado , que depende de factores operativos, tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservacion que se le da al activo mientras no se esta utilizando.

La vida util y el metodo de depreciacion seran revisados como minimo, al termino de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustaran para reflejar el nuevo patron de consumo del potencial de servicio.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Hacienda** **GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS** **GESTIÓN CONTABLE** **FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO**	
Versión: 02	Vigencia 02-2019	

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

No. DE CONTRATO CO1.PCCNTR.4964560 de fecha 25/01/223

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [ ] DE TERCEROS [X]

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD GUATICA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5		ACTA 6		TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
					MES 7	MES 8	MES 9	MES 10		
34_1 - 34_2 - 34_3 .Cercano a ramal de la vía Departamental 881 - Via Tarqui - Buenos Aires Mpio. de Guatica * 4,3 Km.						$ 5.930.565,00	$ 20.226.348,01	$ 5.056.587,00		
Valor total acta						$ 5.930.565,00	$ 20.226.348,01	$ 5.056.587,00	$ 31.213.500,02	$ 31.213.500,02
Distribución:										
Valor mantenimiento										
Valor, construcción, mejora o rehabilitación									$ 31.213.500,02	$ 31.213.500,02
Firma de Responsable encargado										

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5		ACTA 6		TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Codigo de la via y/o matricula inmobiliaria										
Nombre de la via o bien inmueble										
Valor total acta										
Distribución:										
Valor mantenimiento										
Valor, construcción, mejora o rehabilitación										
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**										
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabiitación de las vías o bien inmueble										
Valor										
Nombre de la entidad										
Nit de la entidad										
Contacto										
Firma de Responsable encargado										

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Glosario

El mejoramiento y rehabilitacion son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida util del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o reducir signifivamente los costos.

Mantenimiento y la conservacion de los bienes de uso publico se reconoceran como gastos en el resultado del periodo. El mantenimiento y conservacion son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo

Depreciacion. La depreciacion de un bien de uso publico inicara cuando este disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administracion de la entidad

Vida util: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo. La estimacion de la vida util de un activo se efectuara con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. Para determinar la vida util se debe tener en cuenta los siguientes factores:

a) utilizacion prevista del activo b) Desgaste fisico esperado , que depende de factores operativos, tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservacion que se le da al activo mientras no se esta utilizando.

La vida util y el metodo de depreciacion seran revisados como minimo, al termino de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustaran para reflejar el nuevo patron de consumo del potencial de servicio.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Hacienda** **GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS** **GESTIÓN CONTABLE** **FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN** **CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO**	
Versión: 02	Vigencia 02-2019	

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

No. DE CONTRATO CO1.PCCNTR.4964560 de fecha 25/01/223

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [ ] DE TERCEROS [X]

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD MARSELLA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5		ACTA 6		TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
					MES 7	MES 8	MES 9	MES 10		
Cercano a ramal de la via Departamental 330 - Via El Motor - Marsella Mpio. De Marsella * 3.6 Km						$ 22.379.465,27	$ 14.650.630,83	$ 6.760.486,85		
Valor total acta						$ 22.379.465,27	$ 14.650.630,83	$ 6.760.486,85	$ 43.790.582,95	$ 43.790.582,95
Distribución:										
Valor mantenimiento										
Valor, construcción, mejora o rehabilitación									$ 43.790.582,95	$ 43.790.582,95
Firma de Responsable encargado										

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5		ACTA 6		TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
					MES 7	MES 8				
Codigo de la via y/o matricula inmobiliaria										
Nombre de la vía o bien inmueble										
Valor total acta										
Distribución:										
Valor mantenimiento										
Valor, construcción, mejora o rehabilitación										
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**										
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabiitación de las vías o bien inmueble										
Valor										
Nombre de la entidad										
Nit de la entidad										
Contacto										
Firma de Responsable encargado										

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Glosario

El mejoramiento y rehabilitacion son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida util del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o reducir signifivamente los costos.

Mantenimiento y la conservacion de los bienes de uso publico se reconoceran como gastos en el resultado del periodo. El mantenimiento y conservacion son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo

Depreciacion. La depreciacion de un bien de uso publico inicara cuando este disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administracion de la entidad

Vida util: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo. La estimacion de la vida util de un activo se efectuara

con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. Para determinar la vida util se debe tener en cuenta los siguientes factores:

a) utilizacion prevista del activo b) Desgaste fisico esperado , que depende de

factores operativos, tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservacion que se le da al activo mientras no se esta utilizando.
La vida util y el metodo de depreciacion seran revisados como minimo, al termino de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustaran para reflejar el nuevo patron de consumo del potencial de servicio.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Hacienda** **GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS** **GESTIÓN CONTABLE** **FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO**
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

No. DE CONTRATO CO1.PCCNTR.4964560 de fecha 25/01/223

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [ ] DE TERCEROS [X]

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUINCHIA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA 6		TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
						MES 9	MES 10		
913 - Via El Cairo - Planadas Mpio. de Quinchia * 1.1 Km						$ 13.779.585,82	$ 2.431.691,62		
Valor total acta						$ 13.779.585,82	$ 2.431.691,62	$ 16.211.277,44	$ 16.211.277,44
Distribución:									
Valor mantenimiento									
Valor, construcción, mejora o rehabilitación								$ 16.211.277,44	$ 16.211.277,44
Firma de Responsable encargado									

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA 6		TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Codigo de la via y/o matricula inmobiliaria									
Nombre de la vía o bien inmueble									
Valor total acta									
Distribución:									
Valor mantenimiento									
Valor, construcción, mejora o rehabilitación									
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**									
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabiitación de las vías o bien inmueble									
Valor									
Nombre de la entidad									
Nit de la entidad									
Contacto									
Firma de Responsable encargado									

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Glosario

El mejoramiento y rehabilitacion son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida util del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o reducir signifivamente los costos.

Mantenimiento y la conservacion de los bienes de uso publico se reconoceran como gastos en el resultado del periodo. El mantenimiento y conservacion son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo

Depreciacion. La depreciacion de un bien de uso publico inicara cuando este disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administracion de la entidad

Vida util: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo. La estimacion de la vida util de un activo se efectuara con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. Para determinar la vida util se debe tener en cuenta los siguientes factores: a) utilizacion prevista del activo

b) Desgaste fisico esperado , que depende de factores operativos, tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservacion que se le da al activo mientras no se esta utilizando.

La vida util y el metodo de depreciacion seran revisados como minimo, al termino de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustaran para reflejar el nuevo patron de consumo del potencial de servicio.

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

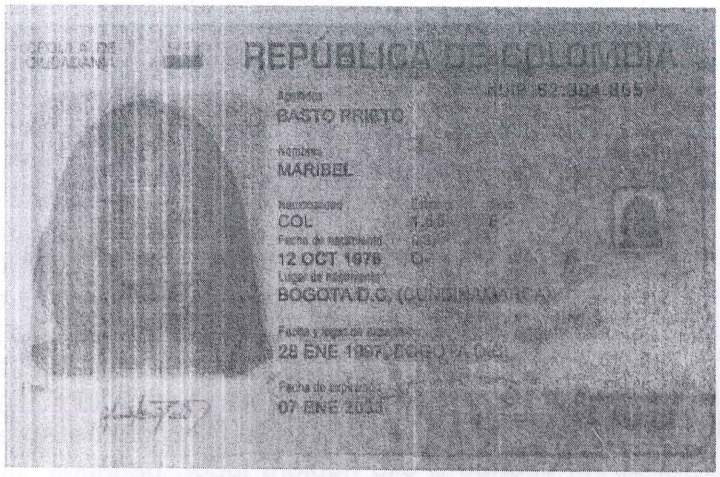
Nosotros **ALVARO HERNANDO VERA AYALA**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.022.329.221 de Bogotá D.C., en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO INTERVIAS RURALES** identificado con Nit: 901.713.373-0 y **MARIBEL BASTO PRIETO** identificada con cedula de ciudadanía N° 52.384.865 de Bogotá en condición de Contador Público con tarjeta profesional expedida por la Junta central de Contadores N 266372-T certificamos el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Caja de Compensación Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016) cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante el mes de Marzo y abril de 2024.

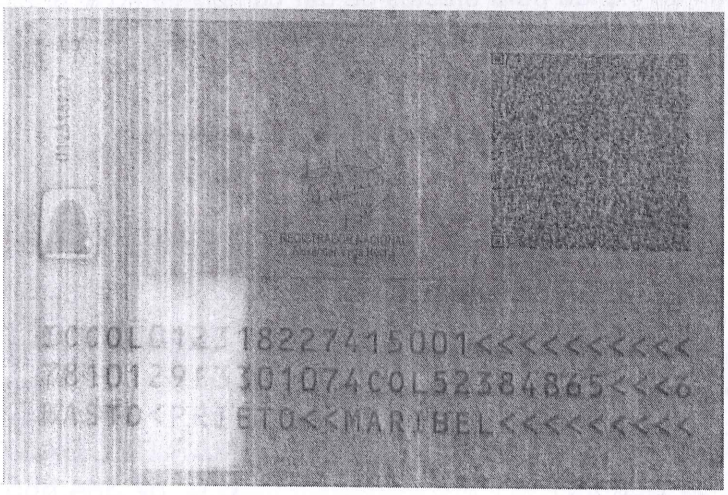
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas concordantes en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Dada en Bogotá D.C., a los (Cuatro) 04 días del mes de Junio 2024.

ALVARO HERNANDO VERA AYALA
C.C. 1.022.329.221 de Bogotá
Representante Legal

MARIBEL BASTO PRIETO
C.C. 52.384.865 de Bogotá
Contador Público
TP 266372-T


REPÚBLICA DE COLOMBIA
Apellidos
BASTO PRIETO
Nombres
MARIBEL
Nacionalidad
COL
Fecha de nacimiento
12 OCT 1979
Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C.
Fecha de expedición
07 ENE 2033


IDCOL
8101291
BASTO<PRIETO<<MARIBEL<<<<<<<<<



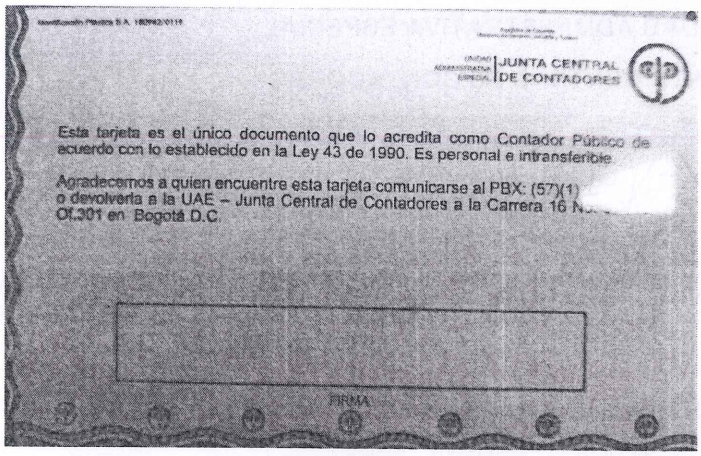
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

266372-T

MARIBEL
BASTO PRIETO
C.C. 52384865
RES. INSCRIPCION 2033 DEL 09/12/2019
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

280027 297618



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) [redacted] o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 N[redacted] Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 1 D 1 8 F 4 A E 2 E 5 7 C 7 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIBEL BASTO PRIETO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52384865 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 266372-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901713373-0	CONSORCIO INTERVIAS RURALES	CALLE 123 N 7 A 17	3033518	administrativo@almaintercon.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CALDAS	RISARALDA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
76058732	22/04/2024				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	N	25/04/2024	76572076	$62.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	8.000	0		0		0	9	100	0	8.100	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	32.000	0	0	0	0	9	300	0	32.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	13.900				13.900	9	200	14.100			139	14.100	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	8.000	9	100	8.100	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	8.000	8.100
Pensión	1	32.000	32.300
Riesgos Laborales	1	13.900	14.100
CCF	1	8.000	8.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	61.900	62.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901713373-0	CONSORCIO INTERVIAS RURALES	CALLE 123 N 7 A 17	3033518	administrativo@almaintercon.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CALDAS	RISARALDA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
76058732	22/04/2024				EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-04	2024-03	N	25/04/2024	76572076	$62.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Dependiente	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79287652	LOZANO GABRIEL ALFONSO	1	0			6																	230301	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF11	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901713373-0	CONSORCIO INTERVIAS RURALES		CALLE 123 N 7 A 17	3033518	administrativo@almaintercon.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CALDAS	RISARALDA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	22/04/2024	76058732	$1.960.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	172.000	0		0		0	6	900	0	172.900	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	80.000	0		0		0	6	500	0	80.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	688.000	0	0	0	0	6	3.600	0	691.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	6	1.700	0	321.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	438.500				438.500	6	2.300	440.800			4.385	440.800	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	252.000	6	1.300	253.300	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	252.000	253.400
Pensión	2	1.008.000	1.013.300
Riesgos Laborales	1	438.500	440.800
CCF	1	252.000	253.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.950.500	1.960.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901713373-0	CONSORCIO INTERVIAS RURALES	CALLE 123 N 7 A 17	3033518	administrativo@almaintercon.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	CALDAS	RISARALDA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 2 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-04	2024-03	E	22/04/2024	76058732	$1.960.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1004680090	AVENDAÑO CORTES JUAN MANUEL	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF11	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	79287652	LOZANO GABRIEL ALFONSO	1	0			S																	230301	4.300.000	688.000	0	0	0	0	EPS005	4.300.000	172.000	14-11	4.300.000	5	299.300	CCF11	4.300.000	172.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS		CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3033518	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	VALLEDUPAR	02	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	22/04/2024	75887184	$632.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	84.000	0		0		0	5	400	0	84.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	336.000	0	0	0	0	5	1.500	0	337.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	146.200				146.200	5	700	146.900			1.462	146.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF15	Comfacesar	892399989-8	63.000	5	300	63.300	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	84.000	84.400
Pensión	1	336.000	337.500
Riesgos Laborales	1	146.200	146.900
CCF	1	63.000	63.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	629.200	632.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS	CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3033518	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	VALLEDUPAR / 02	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-04	2024-03	E	22/04/2024	75887184	$632.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	85203617	LEYVA DELGADO JUAN BAUTISTA	1	0			S																	230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS037	2.100.000	84.000	14-11	2.100.000	5	146.200	CCF15	2.100.000	63.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS	CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3033518	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	OFICINA	PRINCIPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	11/04/2024	76241825	$13.207.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	871.600	0		0		0	0	0	0	871.600	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	655.200	0		0		0	0	0	0	655.200	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	72.900	0		0		0	0	0	0	72.900	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	238.700	0		0		0	0	0	0	238.700	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.572.600	0	0	0	0	0	0		1.572.600	3
230301	Porvenir	800224808-8	4.641.600	0	0	59.600	59.600	0	0		4.760.800	9
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.138.800	0	0	0	0	0	0		1.138.800	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.517.300				2.517.300	0	0	2.517.300			25.173	2.517.300	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.379.100	0	0	1.379.100	16

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.838.400	1.838.400
Pensión	3	7.472.200	7.472.200
Riesgos Laborales	1	2.517.300	2.517.300
CCF	1	1.379.100	1.379.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	13.207.000	13.207.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS		CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3033518	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	OFICINA	PRINCIPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	11/04/2024	76241825	$13.207.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN.
1	CC	1000954208	RAMIREZ PALACIOS JUAN ANDRES	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	39.000	0	0	0	0	0
2	CC	1013587538	SOLANO REYES GINA PAOLA	1	0			S																	230301	1.821.000	291.400	0	0	0	0	EPS010	1.821.000	72.900	14-11	1.821.000	1	9.600	CCF22	1.821.000	54.700	0	0	0	0	0
3	CC	1013570218	OLARTE TRIANA KAREN YULIANA	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF22	3.000.000	90.000	0	0	0	0	0
4	CC	1015436316	RODRIGUEZ BELTRAN CHRISTIAN FELIPE	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	5	278.400	CCF22	4.000.000	120.000	0	0	0	0	0
5	CC	1016026253	SANCHEZ SOLANO ANDERSON ESMID	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	39.000	0	0	0	0	0
6	CC	1019062027	MORA MUÑOZ NORMA ROCIO	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF22	1.500.000	45.000	0	0	0	0	0
7	CC	1022329221	VERA AYALA ALVARO HERNANDO	1	0			S																	230201	4.300.000	688.000	0	0	0	0	EPS037	4.300.000	172.000	14-11	4.300.000	5	299.300	CCF22	4.300.000	129.000	0	0	0	0	0
8	CC	1022359309	SILVA MURCIA CINTHIA NICOLE	1	0			S	X																230201	1.666.667	266.700	0	0	0	0	EPS037	1.666.667	66.700	14-11	1.666.667	1	8.700	CCF22	1.666.667	50.100	0	0	0	0	0
9	CC	1053870860	ZULUAGA CIRO SANTIAGO	1	0			S																	25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF22	1.800.000	54.000	0	0	0	0	0
10	CC	1075310515	OSORIO GIRALDO SHARIN ZULAY	1	0			S																	25-14	2.717.392	434.800	0	0	0	0	EPS008	2.717.392	108.700	14-11	2.717.392	5	189.200	CCF22	2.717.392	81.600	0	0	0	0	0
11	CC	1087415902	RUANO CASTILLO RICHAR ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	39.000	0	0	0	0	0
12	CC	1094920106	CUELLAR LEGUIZAMON CRISTIAN MAURICIO	1	0			S																	230301	5.604.000	896.700	0	0	28.100	28.100	EPS005	5.604.000	224.200	14-11	5.604.000	5	390.100	CCF22	5.604.000	168.200	0	0	0	0	0
13	CC	13512588	VILARETE SANCHEZ EDUARDO ANDRES	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF22	2.500.000	75.000	0	0	0	0	0
14	CC	41956924	ENCISO SANCHEZ FLOR LUCIA	1	0			S																	230201	3.861.690	617.900	0	0	0	0	EPS006	3.861.690	154.500	14-11	3.861.690	5	268.800	CCF22	3.861.690	115.900	0	0	0	0	0
15	CC	52384885	BASTO PRIETO MARIBEL	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	90.000	0	0	0	0	0
16	CC	72276971	ESMERAL VARGAS JOSE ALEXANDER	1	0			S																	230301	6.284.000	1.005.500	0	0	31.500	31.500	EPS005	6.284.000	251.400	14-11	6.284.000	5	437.400	CCF22	6.284.000	188.600	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	Departamento de Risaralda Secretaría de Infraestructura GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA CONTRATACION MATRIZ PERSONAL	VERSIÓN: 00 Vigencia: 00/00

CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVIAS RURALES
MODALIDAD Y No. DE CONTRATO	INTERVENTORIA / CO1.PCCNTR.4964560 de fecha 25/01/223
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
PERIODO REPORTADO	Del 10 de abril al 09 de mayo de 2024

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO	SALARIO BASE SEGÚ PROPUESTA ECONÓMICA	% Dedicación	INGRESO BASICO SEGÚN DEDICACIÓN	INGRESO BASICO REPORTADO EN PLANILLA DE PAGO S.S	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	No DE PLANILLA PAGADA
ADMINISTRATIVOS / PROFESIONALES / ASESORES										
1	ALVARO HERNANDO VERA AYALA	1.022.329.221	Ingeniero Civil (Diretor de obra)	$ 5.500.000,00	50%	$ 2.750.000,00	$ 4.300.000,00	10 de julio de 2023	N.A	76819535
2	ALVARO HERNANDO VERA AYALA	1.022.329.221	Especialista en Vías y transporte y/o pavimentos	$ 4.500.000,00	33%	$ 1.485.000,00	$ 4.300.000,00	10 de julio de 2023	N.A	76819535
3	GABRIEL ALFONSO LOZANO	79.287.652	Ingeniero civil (Residente de interventiría)	$ 4.500.000,00	100%	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	17 de noviembre de 2023	N.A	76572092
4	CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN	1.015.436.316	Profesional en area ambiental	$ 3.300.000,00	50%	$ 1.650.000,00	$ 4.000.000,00	10 de julio de 2023	N.A	76819535
5	JOSE ALEXANDER ESMERAL VARGAS	79.789.267	Profesional en area SISO	$ 3.000.000,00	50%	$ 1.500.000,00	$ 6.284.000,00	10 de julio de 2023	N.A	76819535
6	JUAN MANUEL AVENDAÑO CORTES	1.004.680.090	Inspector de obras civiles de interventoría	$ 2.000.000,00	100%	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	10 de julio de 2023	N.A	76572092
7	JUAN BAUTISTA LEYVA DELGADO	85.203.617	Topógrafo	$ 3.000.000,00	50%	$ 1.500.000,00	$ 2.100.000,00	10 de julio de 2023	N.A	76893322
8	JUAN ANDRES RAMIREZ PALACIOS	1.000.954.208	Cadenero	$ 1.500.000,00	50%	$ 750.000,00	$ 1.300.000,00	10 de julio de 2023	N.A	76819535
9	GINA PAOLA SOLANO REYES	1.013.587.538	Secretaria	$ 1.160.000,00	100%	$ 1.160.000,00	$ 1.821.000,00	10 de julio de 2023	N.A	76819535
10	MARIBEL BASTO PRIETO	52.384.865	Contador	$ 2.466.660,00	30%	$ 739.998,00	$ 3.000.000,00	10 de julio de 2023	N.A	76819535

Alvaro Hernando Vera Ayala
Representante Legal Consorcio Intervias Rurales

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS		CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3033518	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	03/05/2024	76819535	$14.309.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	871.600	0		0		0	0	0	0	871.600	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	674.000	0		0		0	0	0	0	674.000	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	272.000	0		0		0	0	0	0	272.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.705.900	0	0	0	0	0	0		1.705.900	3
230301	Porvenir	800224808-8	5.225.400	0	0	59.600	59.600	0	0		5.344.600	10
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.138.800	0	0	0	0	0	0		1.138.800	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.589.200				2.589.200	0	0	2.589.200			25.892	2.589.200	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.513.400	0	0	1.513.400	17

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS	CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3033518	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	03/05/2024	76819535	$14.309.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.017.600	2.017.600
Pensión	3	8.189.300	8.189.300
Riesgos Laborales	1	2.589.200	2.589.200
CCF	1	1.513.400	1.513.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	14.309.500	14.309.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS	CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3033518	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	03/05/2024	76819535	$14.309.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000954208	RAMIREZ PALACIOS JUAN ANDRES	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	39.000	0	0	0	0	0
2	CC	1013670218	OLARTE TRIANA KAREN YULIANA	1	0			S																	230301	3.470.000	555.200	0	0	0	0	EPS008	3.470.000	138.800	14-11	3.470.000	5	241.500	CCF22	3.470.000	104.100	0	0	0	0	0
3	CC	1015436316	RODRIGUEZ BELTRAN CHRISTIAN FELIPE	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	5	278.400	CCF22	4.000.000	120.000	0	0	0	0	0
4	CC	1016026253	SANCHEZ SOLANO ANDERSON ESMID	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	39.000	0	0	0	0	0
5	CC	1019062027	MORA MUÑOZ NORMA ROCIO	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF22	1.500.000	45.000	0	0	0	0	0
6	CC	1022329221	VERA AYALA ALVARO HERNANDO	1	0			S																	230201	4.300.000	688.000	0	0	0	0	EPS037	4.300.000	172.000	14-11	4.300.000	5	299.300	CCF22	4.300.000	129.000	0	0	0	0	0
7	CC	1075310515	OSORIO GIRALDO SHARIN ZULAY	1	0			S																	25-14	2.717.392	434.800	0	0	0	0	EPS006	2.717.392	108.700	14-11	2.717.392	1	14.200	CCF22	2.717.392	81.600	0	0	0	0	0
8	CC	1094920106	CUELLAR LEGUIZAMON CRISTIAN MAURICIO	1	0			S																	230301	5.604.000	896.700	0	0	28.100	28.100	EPS005	5.604.000	224.200	14-11	5.604.000	5	390.100	CCF22	5.604.000	168.200	0	0	0	0	0
9	CC	41956924	ENCISO SANCHEZ FLOR LUCIA	1	0			S	X																230201	3.861.690	617.900	0	0	0	0	EPS006	3.861.690	154.500	14-11	3.861.690	5	268.800	CCF22	3.861.690	115.900	0	0	0	0	0
10	CC	52384865	BASTO PRIETO MARIBEL	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	90.000	0	0	0	0	0
11	CC	72276971	ESMERAL VARGAS JOSE ALEXANDER	1	0			S	X																230301	6.284.000	1.005.500	0	0	31.500	31.500	EPS005	6.284.000	251.400	14-11	6.284.000	5	437.400	CCF22	6.284.000	188.600	0	0	0	0	0
12	CC	1013587538	SOLANO REYES GINA PAOLA	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	60.000	0	0	0	0	0
13	CC	1087415902	RUANO CASTILLO RICHAR ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	39.000	0	0	0	0	0
14	CC	13512566	VILARETE SANCHEZ EDUARDO ANDRES	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF22	2.500.000	75.000	0	0	0	0	0
15	CC	30404253	CHAVARRIAGA TELLEZ ADRIANA MARIA	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS002	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF22	3.000.000	90.000	0	0	0	0	0
16	CC	1022359309	SILVA MURCIA CINTHIA NICOLE	1	0			S																	230201	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	13.100	CCF22	2.500.000	75.000	0	0	0	0	0
17	CC	1053870860	ZULUAGA CIRO SANTIAGO	1	0			S																	25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF22	1.800.000	54.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901713373-0	CONSORCIO INTERVIAS RURALES	CALLE 123 N 7 A 17	3033518	administrativo@almaintercon.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CALDAS	RISARALDA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	29/05/2024	76572092	$2.027.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	180.000	0		0		0	9	1.400	0	181.400	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	80.000	0		0		0	9	600	0	80.600	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	720.000	0	0	0	0	9	5.300	0	725.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	9	2.400	0	322.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	452.400				452.400	9	3.300	455.700			4.524	455.700	2

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	260.000	9	1.900	261.900	2

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	260.000	262.000
Pensión	2	1.040.000	1.047.700
Riesgos Laborales	1	452.400	455.700
CCF	1	260.000	261.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	2.012.400	2.027.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901713373-0	CONSORCIO INTERVIAS RURALES	CALLE 123 N 7 A 17	3033518	administrativo@almaintercon.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CALDAS	RISARALDA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	29/05/2024	76572092	$2.027.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1004680090	AVENDAÑO CORTES JUAN MANUEL	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF11	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	79287652	LOZANO GABRIEL ALFONSO	1	0			S																	230301	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF11	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS	CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3033518	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	VALLEDUPAR	02	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	06/05/2024	76893322	$629.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	84.000	.0		0		0	0	0	0	84.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	336.000	0	0	0	0	0	0		336.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	146.200				146.200	0	0	146.200			1.462	146.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF15	Comfacesar	892399989-8	63.000	0	0	63.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	84.000	84.000
Pensión	1	336.000	336.000
Riesgos Laborales	1	146.200	146.200
CCF	1	63.000	63.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	629.200	629.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS	CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3033518	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	VALLEDUPAR	02	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	06/05/2024	76893322	$629.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Ecuatoriano	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	85203617	LEYVA DELGADO JUAN BAUTISTA	1	0			S																	230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS037	2.100.000	84.000	14-11	2.100.000	5	146.200	CCF15	2.100.000	63.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
