CESPETROL
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

FACTURA

6019474
cespetrolltda@hotmail.com
administrativo@cespetrol.com
www.cespetrol.com
CALLE 61 #21-15 BARRIO EL PARNASO
BARRANCABERMEJA - SANTANDER

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
NORSOK S-WA-006:2018
BUREAU VERITAS
Certification

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVCE1356

CESPETROL LTDA EN REORGANIZACION

NIT 900152349-1
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 4112
Municipio: Barrancabermeja (Santander)
Dirección: CALLE 61 # 21-15 BRR PARNASO
Correo: contabilidad@cespetrol.com
Teléfono: 3118992198

CUFE: 050b6738130e909620f13a1e6d4e8740f036d0f5f178d8df6e2b8c29dfb9eb9196a6ef66c0a5ad2c0aaaa58e0a5ee176

Fecha de emisión
2024-08-15

Fecha y hora de autorización
2024-08-15 08:24:38

Prefijo
FVCE

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2024-09-12

Medio de pago
Transferencia Débito Interbancario

Forma de Pago
Crédito

Plazo
28 Días

Orden de referencia
-

Adquiriente

Nombres y apellidos: MUNICIPIO DE SIMACOTA

Número de documento
NIT - 890208807-0

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
Impuesto sobre las ventas – IVA

Tipo de responsabilidad
R-99-PN (No aplica – Otros)

Departamento
Santander

Municipio
Simacota

Dirección
CR 6 3-33

Teléfono
3502956397

Correo
tesoreria@simacota-santander.gov.co

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV002	COSTO DIRECTO	1,00	UNIDAD	$219.271.608,00	0%	0%		$219.271.608,00
2	SV002	ADMINISTRACION	1,00	UNIDAD	$63.588.766,32	0%	0%		$63.588.766,32
3	SV002	IMPREVISTOS	1,00	UNIDAD	$2.192.716,08	0%	0%		$2.192.716,08
4	SV005	UTILIDAD	1,00	UNIDAD	$10.963.580,40	0%	19%		$10.963.580,40

Total Items: 4

Observaciones
REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE LAS CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO 037 DEL 2024 POR EL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE URGENCIA MANIFIESTA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$296.016.670,80**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$296.016.670,80**
Impuesto IVA (19%)	+	$2.083.080,28
Subtotal más impuestos	=	**$298.099.751,08**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$298.099.751,08**

Número de autorización: 18764072172597
Rango Autorizado:desde FVCE 1308 hasta FVCE 2000
Expedida: 2024-06-04 **Vigencia:** 12 meses **Vencimiento:** 2025-06-04

Firma Digital:
tkq1AfKigBlh/2dMj5HDLibM89ndAc+LSHqnSSPQCKc0ntPoy1DwjWicdZ+78VsCTcUtW0k+nyC+1RMH8Pi0F3JYq4OweGspl1aMO1Bcs8iPZX9+kT8J80AMRGalumrpO7KUArfQ3zpdCYiFZzTmj1vzicCDzoDhRSlIK/Iv3V7j1SFdSClIKEqVBxf1IV933m1Q/TPaRSOaT/4cXFiZMlbv7WXzyge+RXQmSYWODBfVfbOXi6CmehMu+dFtEL9XsopIMgIh7nuJxRcfmm+ZWCypfn4i72iAPaMHprnjMm8v3fF4qwz4h0zGL3mAGAZCWevF/bMpxnEHCPLe2cUNYQ==

CESPETROL
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

ACTA PARCIAL (FIRMADAS POR CONTRATISTA DE OBRA Y SUPERVISIÓN)

6019474
cespetrolltda@hotmail.com
administrativo@cespetrol.com
www.cespetrol.com

CALLE 61 #21-15 BARRIO EL PARNASO
BARRANCABERMEJA - SANTANDER

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
NORSOK S-WA-006:2018
BUREAU VERITAS
Certification

ACTA PARCIAL 01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CUM-099-2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER Y CESPETROL LTDA

CONTRATISTA: CESPETROL LTDA		
IDENTIFICACIÓN O NIT: NIT No. 900.152.349 – 1		
REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR FREDDY MANTILLA PORRAS		
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: C.C. No. 91.109.786 DE SOCORRO, SANTANDER.		
INTERVENTOR: CONSORCIO PROMAING NIT No. 901.845.459-1 **R/L: JORGE IVAN REYES MANTILLA,** Cedula de ciudadanía No. 1.102.374.179 expedida en Piedecuesta.		
SUPERVISOR: ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		
NUMERO DE CONTRATO: CUM-099-2024	**FECHA:** 19 DE JUNIO DEL 2024	
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		
OBJETO: "REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO 037 DEL 2024 POR EL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE URGENCIA MANIFIESTA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	24-00426	**FECHA:** 12 DE JUNIO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	24-00845	**FECHA:** 19 DE JUNIO DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	**2.3.40.03.20.2.02.02.005.4003017** Acueductos optimizados **2.3.40.03.20.2.02.02.005.4003020** Alcantarillados optimizados	
PÓLIZA (CUANDO SE REQUIERE DE LO CONTRARIO NO APLICA):	**NUMERO POLIZA CUMPLIMIENTO**	NB-100329387 ANEXO 2
	NUMERO POLIZA RCE	NB-100082862 ANEXO 2
	COMPAÑÍA	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Powered by CamScanner

PÓLIZA (CUANDO SE REQUIERE DE LO CONTRARIO NO APLICA):	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	12 DE AGOSTO DE 2024	
	FECHA DE APROBACIÓN	12 DE AGOSTO DE 2024	
	DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS		
	CLASE DE AMPARO	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**	
		VIGENCIA	
		DESDE	**HASTA**
		02-07-2024	01-09-2029
		VALOR ASEGURADO	
		$96.925.380,57	
	CLASE DE AMPARO	**ESTABILIDAD DE LA OBRA**	
		VIGENCIA	
		DESDE	**HASTA**
		01-09-2024	01-09-2029
		VALOR ASEGURADO	
		$96.925.380,57	
	CLASE DE AMPARO	**PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES**	
		VIGENCIA	
		DESDE	**HASTA**
		02-07-2024	01-09-2027
		VALOR ASEGURADO	
		$24.231.345,14	
	CLASE DE AMPARO	**RESPONSABILIDAD CIVIL**	
		VIGENCIA	
		DESDE	**HASTA**
		02-07-2024	01-09-2024
		VALOR ASEGURADO	
		$ 260.000.000,00	

Powered by CamScanner

FORMA DE PAGO:	La Alcaldía Municipal de Simacota cancelará al contratista EL 90% del valor del contrato en actas parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría y debidamente suscritas por el CONTRATISTA y SUPERVISOR, estos pagos se girarán al contratista cumplidos los requisitos de ejecución y suscripción de Actas de Obra. El restante (10%) del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato de obra pública previa presentación de los documentos que acrediten la ejecución de las obras, suscritas por el Municipio de Simacota, el Contratista e interventor. así como certificaciones de cumplimiento y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, etc.), cuando corresponda. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por quien sea designado por el municipio, una vez medido, cuantificado y aprobado por el supervisor el valor del acta acompañada del informe técnico se deberá presentar al municipio para hacer efectivo dicho pago una vez se hayan agotado los trámites administrativos necesarios. El valor contempla todos los
TERMINO DE DURACIÓN:	El término para la ejecución de este contrato es de **DOS (02) MESES** contados a partir de la fecha de suscripción del acta de
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	DOS (02) DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($484.626.902,85), INCLUIDO LOS IMPUESTOS LEGALES Y DEPARTAMENTALES.

En el municipio de Simacota, Santander, a los trece (13) días del mes de agosto del 2024, se reunieron, por una parte, el Ingeniero **ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ**, secretario de Planeación e Infraestructura, en su calidad de supervisor del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CUM-099-2024**, y por la otra, el Ingeniero **OSCAR FREDDY MANTILLA PORRAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 91.109.786 de Socorro, Santander, Representante Legal de la sociedad **CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN**, identificada con el NIT No. 900.152.349-1, en calidad de contratista de obra y el ingeniero **JORGE IVAN REYES MANTILLA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.102.374.174 de Piedecuesta, Santander, representante legal del consorcio **PROMAING**, identificada con el NIT No. 901.845.459-1, con el fin de suscribir la presente Acta Parcial 01, previas las siguientes consideraciones:

Powered by CamScanner

CONSIDERANDO

1. Que mediante designación de supervisión el día **DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE 2024,** se delegó y notificó la actividad de supervisión al Ingeniero **ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ**, en calidad de secretario de Planeación e Infraestructura. Que el Municipio de Simacota, Santander, procedió mediante Decreto 037 del 07 de junio de 2024 a declarar la urgencia manifiesta para conjurar la situación de riesgo y salubridad presentada en la carrera 7 entre calles 3 y 4 del municipio de Simacota. Que en virtud de lo anterior y con el propósito de efectuar los trabajos a fin de contrarrestar la situación presentada, el municipio bajo la modalidad de contratación directa, teniendo como causal la urgencia manifiesta suscribió el **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CUM-099-2024** a la propuesta presentada por la sociedad **CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN,** identificada con el NIT No. 900.152.349-1, representada legalmente por el Ingeniero **OSCAR FREDDY MANTILLA PORRAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 91.109.786 de Socorro, Santander, para ejecutar la **"REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO 037 DEL 2024 POR EL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE URGENCIA MANIFIESTA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".**
2. Que mediante designación de supervisión el día DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE 2024, se delegó y notificó la actividad de supervisión al Ingeniero ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ, en calidad de secretario de Planeación e Infraestructura.
3. Las actividades ejecutadas son las que se discriminan en el anexo No. 01 que hace parte integral de la presente acta.
4. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO		**$ 484.626.902,85**
VALOR ACTA PARCIAL 01	$ 296.016.670,80	
VALOR POR EJECUTAR	$ 188.610.232,05	
SUMAS IGUALES	**$ 484.626.902,85**	**$ 484.626.902,85**

5. Que el supervisor ha elaborado el respectivo informe de supervisión correspondiente al periodo que se pretende pagar, donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contratadas.
6. Que el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber del pago de seguridad social con base en los documentos presentados por el contratista.
7. Que el municipio recibe parcialmente las actividades del objeto contractual, sin que ello exima al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato.

POR LO ANTERIOR, LAS PARTES ACUERDAN:

PRIMERO: Suscribir la presente Acta Parcial 01 del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CUM-099-2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER Y CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN,** cuyo objeto es **"REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO 037 DEL 2024 POR EL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE URGENCIA MANIFIESTA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".**, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente documento.

SEGUNDO: Que el Municipio de Simacota, ha verificado el estado y las especificaciones técnicas solicitadas en el **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CUM-099-2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN, cuyo objeto es "REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO 037 DEL 2024 POR EL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE URGENCIA MANIFIESTA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".** Observando que cumple con lo estipulado en el contrato, y es viable realizar el pago, según **ACTA PARCIAL No. 01** por la suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE. ($ 296.016.670,80)**, avalada por parte de la interventoría.

En constancia de lo anterior se firma a los trece (13) días del mes de agosto de 2024.

POR EL MUNICIPIO DE SIMACOTA,

ING. ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR DEL CONTRATO
NIT No. 900.152.34

POR EL CONTRATISTA

ING. OSCAR FREDDY MANTILLA PORRAS
C.C. No. 91.109.786 expedida en Socorro
R.L. CESPETROL LTDA EN REORGANIZACION

POR LA INTERVENTORIA

ING. JORGE IVAN REYES MANTILLA
C.C No. 1.102.374.174 expedida en Piedecuesta
R.L CONSORCIO PROMAING
NIT No. 901.845.459

PROYECTÓ:	KAREN GUISELLA DUARTE	CARGO: Apoyo profesional Secretaría Planeación	FIRMA:
APROBO:	DIANA PATRICIA JIMENEZ	CARGO: Apoyo Contratación -Secretaría de Planeación e Infraestructura	FIRMA:

Powered by CamScanner

CESPETROL
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

SABANA DE ACTA PARCIAL (FIRMADAS POR CONTRATISTA E INTERVENTORIA)

6019474
cespetrolltda@hotmail.com
administrativo@cespetrol.com
www.cespetrol.com
CALLE 61 #21-15 BARRIO EL PARNASO
BARRANCABERMEJA - SANTANDER

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
NORSOK S-WA-006:2018
BUREAU VERITAS
Certification

REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO DE LA VÍA URBANA LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER

CESPETROL

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 1

CONDICIONES ORIGINALES						CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No. 1 18 de Julio 2024			ACTA PARCIAL No. 1 08 de Agosto 2024	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO									
1.1	Localización y replanteo de vias	m2	549,99	$ 4.900,00	$ 2.694.951,00	+	841,10	$ 4.121.390,00	841,10	$ 4.121.390,00
1.2	Retiro de piedra labor	m2	549,99	$ 40.200,00	$ 22.109.598,00	+	566,00	$ 22.753.200,00	566,00	$ 22.753.200,00
1.3	Excavación mecánica en material común (incluye retiro de material 5km)	m3	577,49	$ 36.550,00	$ 21.107.241,00	-	385,25	$ 14.080.888,00	126,00	$ 4.605.300,00
1.4	Mejoramiento de la subrasante con rajón	m3	165,00	$ 160.150,00	$ 26.424.750,00	+	165,11	$ 26.442.367,00	54,00	$ 8.648.100,00
1.5	Subbase granular suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador.	m3	137,50	$ 200.000,00	$ 27.500.000,00	+	137,59	$ 27.518.000,00		$ -
1.6	Suministro e instalación de material seleccionado (incluye compactación mecánica)	m3	220,00	$ 144.650,00	$ 31.823.000,00	+	285,77	$ 41.336.631,00	285,77	$ 41.336.631,00
1.7	Suministro e instalación de geotextil tejido 2400	m2	549,99	$ 20.300,00	$ 11.164.797,00	+	400,32	$ 8.126.496,00	180,00	$ 3.654.000,00
1.8	Concreto hidráulico 3000 psi (incluye fundida, formaleteado, vibrado, texturizado y curado)	m3	55,00	$ 703.700,00	$ 38.703.500,00	+	40,03	$ 28.169.111,00		$ -
1.9	Colocación piedra labor existente (inc. El relabrado)	m2	412,49	$ 109.900,00	$ 45.332.651,00	+	382,97	$ 42.088.403,00		$ -
1.10	Entibado	glb	1,00	$ 6.023.250,00	$ 6.023.250,00	=	1,00	$ 6.023.250,00	1,00	$ 6.023.250,00
1.11	Suministro e instalación de piedra Barichara e = 18 cm	m2	137,50	$ 184.350,00	$ 25.348.125,00	-	0,00	$ -		$ -
	SUBTOTAL				**$ 258.231.863,00**		**SUBTOTAL**	**$ 220.659.736,00**	**SUBTOTAL**	**$ 91.141.871,00**
2	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO									
2.1	Localización y replanteo de redes	m2	438,00	$ 6.200,00	$ 2.715.600,00	-	367,37	$ 2.277.694,00	367,37	$ 2.277.694,00
2.2	Excavación mecánica en material común (incluye retiro de material 5km)	m3	390,72	$ 28.350,00	$ 11.076.912,00	+	397,73	$ 11.275.646,00	397,73	$ 11.275.646,00
2.3	Excavación manual en material común (incluye retiro de escombros 5km)	m3	67,20	$ 71.250,00	$ 4.788.000,00	+	174,87	$ 12.459.488,00	174,87	$ 12.459.488,00
2.4	Suministro e instalación de material de atraque para tubería (arena y/o gravilla)	m3	21,98	$ 158.300,00	$ 3.479.434,00	+	124,65	$ 19.732.095,00	124,65	$ 19.732.095,00
2.5	Suministro e instalación de silla yee 8x6"	und	5,00	$ 192.850,00	$ 964.250,00	=	5,00	$ 964.250,00	5,00	$ 964.250,00
2.6	Suministro e instalación de tubería Novafort d = 6" domiciliarias	ml	84,00	$ 89.000,00	$ 7.476.000,00	-	80,00	$ 7.120.000,00	80,00	$ 7.120.000,00
2.7	Suministro e instalación de tubería Novafort d = 12" sanitaria	ml	90,00	$ 186.550,00	$ 16.789.500,00	-	86,17	$ 16.075.014,00	86,17	$ 16.075.014,00
2.8	Suministro e instalación de silla yee 12x6"	und	14,00	$ 327.250,00	$ 4.581.500,00	-	13,00	$ 4.254.250,00	13,00	$ 4.254.250,00
2.9	Caja de inspección 0.60x0.6x0.6m tolete común	und	9,00	$ 253.650,00	$ 2.282.850,00	+	18,00	$ 4.565.700,00	18,00	$ 4.565.700,00

REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO DE LA VÍA URBANA LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER

CESPETROL

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 1

CONDICIONES ORIGINALES						CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No. 1 18 de Julio 2024			ACTA PARCIAL No. 1 08 de Agosto 2024	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2.10	Suministro e instalación para la reposición de tubería presión PVC rde-21 d=3" (incluye accesorios)	ml	90,00	$ 65.850,00	$ 5.926.500,00	-	88,00	$ 5.794.800,00		$ -
2.11	Suministro e instalación para la reposición de tubería presión PVC rde-9 d=1/2" (incluye accesorios)	ml	240,00	$ 12.950,00	$ 3.108.000,00	-	34,00	$ 440.300,00		$ -
2.12	Suministro e instalación para la reposición de tubería presión PVC rde-11 d=3/4" (incluye accesorios)	ml	12,00	$ 13.150,00	$ 157.800,00	-	6,00	$ 78.900,00		$ -
2.13	Construcción de pozo inspección h = 2.20 m - h=2.80 m (inc. Tapa hf)	und	2,00	$ 5.055.900,00	$ 10.111.800,00	=	2,00	$ 10.111.800,00	2,00	$ 10.111.800,00
2.14	Suministro e instalación de tubería Novafort d = 12" - para conducción de alcantarillado pluvial (incluye accesorios)	ml	90,00	$ 185.000,00	$ 16.650.000,00	-	86,00	$ 15.910.000,00	86,00	$ 15.910.000,00
2.15	Concreto resistencia 14 Mpa (atraque de tubería)	m3	3,96	$ 511.700,00	$ 2.026.332,00	-	1,40	$ 716.380,00	1,40	$ 716.380,00
2.16	Suministro e instalación de cruceta 3"x3"x3"x2" (incluye accesorios)	und	1,00	$ 635.500,00	$ 635.500,00	=	1,00	$ 635.500,00		$ -
2.17	Suministro e instalación para reposición de acometidas para acueducto	und	19,00	$ 49.950,00	$ 949.050,00	-	18,00	$ 899.100,00		$ -
2.18	Suministro e instalación de válvula de 3"	und	1,00	$ 286.000,00	$ 286.000,00	=	1,00	$ 286.000,00		$ -
2.19	Suministro e instalación de tubería presión PVC rde-21 d = 2" (incluye accesorios)	ml	42,00	$ 31.500,00	$ 1.323.000,00	+	48,00	$ 1.512.000,00		$ -
2.20	Suministro e instalación de cruceta 2"x2"x2"x3" (incluye accesorios)	und	1,00	$ 546.800,00	$ 546.800,00	=	1,00	$ 546.800,00		$ -
2.21	Suministro e instalación de tubería Novafort d=8" sanitaria	ml	42,00	$ 116.100,00	$ 4.876.200,00	-	52,00	$ 6.037.200,00	52,00	$ 6.037.200,00
	SUBTOTAL				**$ 100.751.028,00**		**SUBTOTAL**	**$ 121.692.917,00**	**SUBTOTAL**	**$ 111.499.517,00**
	ITEMS NO PREVISTO									
3										
3.1	Relleno compactado producto de la excavación	m3	0,00	$ 45.802,00	$ -	+	304,14	$ 13.930.220,00	304,14	$ 13.930.220,00
3.2	Construcción de pozo inspección h = 0.00 m - h=1.5 m (inc. Tapa hf)	und	0,00	$ 2.700.000,00	$ -	+	1,00	$ 2.700.000,00	1,00	$ 2.700.000,00
	SUBTOTAL				$ -		**SUBTOTAL**	**$ 16.630.220,00**	**SUBTOTAL**	**$ 16.630.220,00**

VALOR DE AJUSTE AL PESO		$ -
TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 358.982.891,00**
ADMINISTRACIÓN	**29,00%**	$ 104.105.038,39
IMPREVISTOS	**1,00%**	$ 3.589.828,91
UTILIDAD	**5,00%**	$ 17.949.144,55
TOTAL AIU	**35,00%**	**$ 125.644.011,85**
TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 484.626.902,85**

AJUSTE	**$ 18,00**	**AJUSTE**	
SUBTOTAL	**$ 358.982.891,00**	**SUBTOTAL**	**$ 219.271.608,00**
ADM	$ 104.105.038,39	**ADM**	$ 63.588.766,32
IMP	$ 3.589.828,91	**IMP**	$ 2.192.716,08
UTI	$ 17.949.144,55	**UTI**	$ 10.963.580,40
TOTAL AIU	**$ 125.644.011,85**	**TOTAL AIU**	**$ 76.745.062,80**
SUBTOTAL	**$ 484.626.902,85**	**SUBTOTAL**	**$ 296.016.670,80**

FABIAN PEREZ REY
DIRECTOR DE OBRA

Angie Oviedo
ANGIE STEFANY OVIEDO
DIRECTOR INTERVENTORIA

ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ
SUPERVISOR

CESPETROL
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, QUE CONTENGA GRAFICAS CON LA UBICACIÓN Y MEDIDA DE LOS ELEMENTOS INSTALADOS O CONSTRUIDOS (FIRMADAS POR EL CONTRATISTA E INTERVENTORIA)

6019474
cespetrolltda@hotmail.com
administrativo@cespetrol.com
www.cespetrol.com
CALLE 61 #21-15 BARRIO EL PARNASO
BARRANCABERMEJA - SANTANDER

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
NORSOK S-WA-006:2018
BUREAU VERITAS
Certification
BUREAU VERITAS 1828

MEMORIAS DE CALCULO


ALCALDÍA MUNICIPAL SIMACOTA, SANTANDER

CESPETROL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

HOJA	1	DE	1

FECHA	jueves, 8 de agosto de 2024	ACTA No	PARCIAL No. 1		CONTRATO No	CUM-099-2024
OBJETO DEL CONTRATO	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO DE LA VÍA URBANA LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER					
INTERVENTORIA	CONSORCIO PROMAING	NIT	901.845.459-1	CONTRATANTE	ALCALDIA DE SIMACOTA - SANTANDER	
CONTRATISTA DE OBRA	CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN	NIT	900.152.349-1			
SECCIÓN 1	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO					
ITEM	Localización y replanteo de vias				UNIDAD	m2

DIAGRAMA/ FOTOGRAFIA/ PLANO/ ILUSTRACION

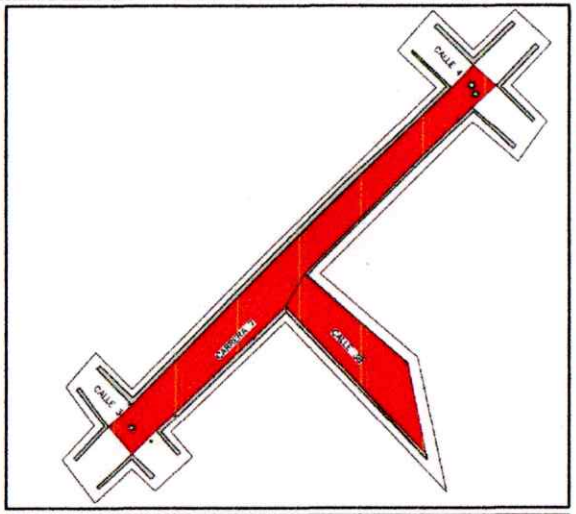









OPERACIONES MATEMATICAS

DESCRIPCIÓN	Dimensiones		No. Elementos	Area Total
Carrera 7 entre Calles 3 y 4			1,00	566,00
Calle 3B con Carrera 7			1,00	275,10

MEMORIAS DE CALCULO


ALCALDÍA MUNICIPAL SIMACOTA, SANTANDER

CESPETROL
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

HOJA	1	DE	1

FECHA	jueves, 8 de agosto de 2024	ACTA No	PARCIAL No. 1	CONTRATO No	CUM-099-2024
OBJETO DEL CONTRATO	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO DE LA VÍA URBANA LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER				
INTERVENTORIA	CONSORCIO PROMAING	NIT	901.845.459-1	CONTRATANTE	ALCALDIA DE SIMACOTA - SANTANDER
CONTRATISTA DE OBRA	CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN	NIT	900.152.349-1		
SECCIÓN 1	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
ITEM	Retiro de piedra labor			UNIDAD	m2

DIAGRAMA/ FOTOGRAFIA/ PLANO/ ILUSTRACION

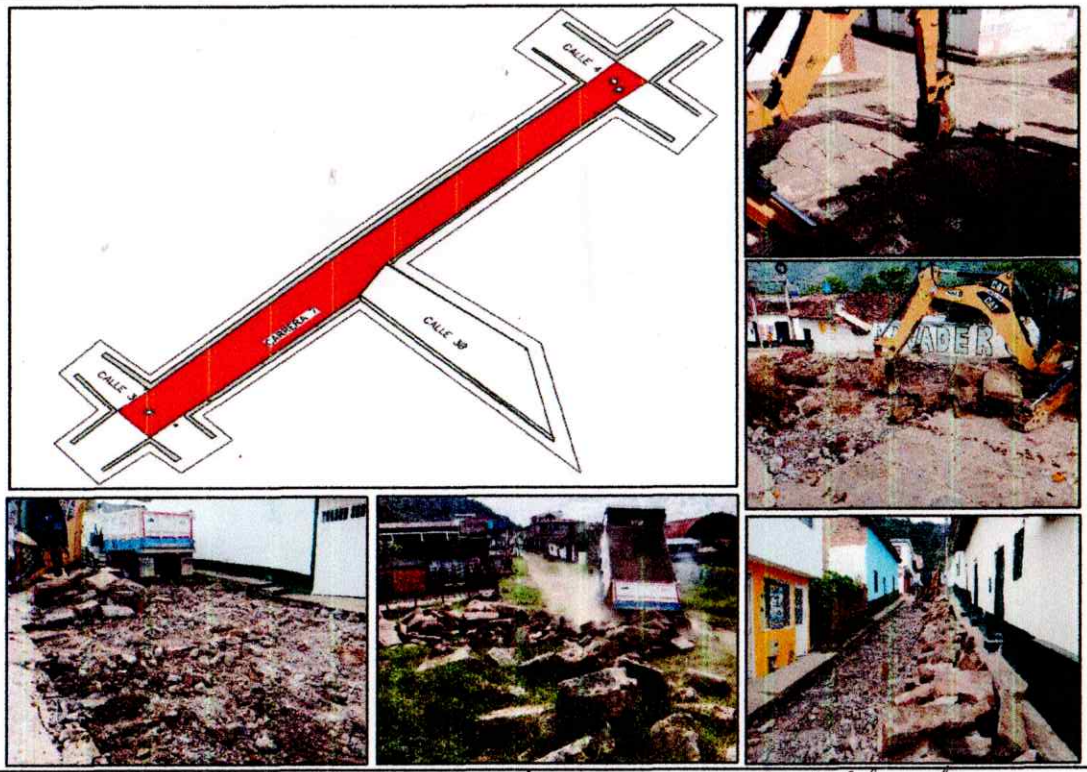

OPERACIONES MATEMATICAS

DESCRIPCIÓN	Dimensiones		No. Elementos	Area Total
	Longitud (m)	Ancho (m)		
Carrera 7 entre Calles 3 y 4			1,00	566,00

MEMORIAS DE CALCULO

ALCALDIA MUNICIPAL SIMACOTA, SANTANDER

CESPETROL INGENIERIA Y CONSTRUCCION

HOJA	1	DE	1

FECHA	jueves, 8 de agosto de 2024	ACTA No	PARCIAL No. 1	CONTRATO No	CUM-099-2024
OBJETO DEL CONTRATO	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO DE LA VÍA URBANA LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER				
INTERVENTORIA	CONSORCIO PROMAING	NIT	901.845.459-1	CONTRATANTE	ALCALDIA DE SIMACOTA - SANTANDER
CONTRATISTA DE OBRA	CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN	NIT	900.152.349-1		
SECCIÓN 1	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
ITEM	Excavación mecánica en material común (incluye retiro de material 5km)			UNIDAD	m3

DIAGRAMA/ FOTOGRAFIA/ PLANO/ ILUSTRACION

OPERACIONES MATEMATICAS

DESCRIPCIÓN	Dimensiones		No. Elementos	Volumen Total
	Area (m)	Espesor (m)		
Carrera 7 entre Calles 3 y 4	180,00	0,70	1,00	126,00

MEMORIAS DE CALCULO

ALCALDÍA MUNICIPAL SIMACOTA, SANTANDER

CESPETROL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

HOJA	1	DE	1

FECHA	jueves, 8 de agosto de 2024	ACTA No	PARCIAL No. 1	CONTRATO No	CUM-099-2024
OBJETO DEL CONTRATO	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO DE LA VÍA URBANA LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER				
INTERVENTORIA	CONSORCIO PROMAING	NIT	901.845.459-1	CONTRATANTE	ALCALDIA DE SIMACOTA - SANTANDER
CONTRATISTA DE OBRA	CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN	NIT	900.152.349-1		
SECCIÓN 1	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
ITEM	Mejoramiento de la subrasante con rajón			UNIDAD	m3

DIAGRAMA/ FOTOGRAFIA/ PLANO/ ILUSTRACION

OPERACIONES MATEMATICAS

DESCRIPCIÓN	Dimensiones		No. Elementos	Volumen Total
	Area (m)	Espesor (m)		
Carrera 7 entre Calles 3 y 4	180,00	0,30	1,00	54,00

MEMORIAS DE CALCULO


ALCALDÍA MUNICIPAL SIMACOTA, SANTANDER

CESPETROL

HOJA	1	DE	1

FECHA	jueves, 8 de agosto de 2024	ACTA No	PARCIAL No. 1	CONTRATO No	CUM-099-2024
OBJETO DEL CONTRATO	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO DE LA VÍA URBANA LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER				
INTERVENTORIA	CONSORCIO PROMAING	NIT	901.845.459-1	CONTRATANTE	ALCALDIA DE SIMACOTA - SANTANDER
CONTRATISTA DE OBRA	CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN	NIT	900.152.349-1		
SECCIÓN 1	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
ITEM	Suministro e instalación de material seleccionado (incluye compactación mecánica)			UNIDAD	m3

DIAGRAMA/ FOTOGRAFIA/ PLANO/ ILUSTRACION

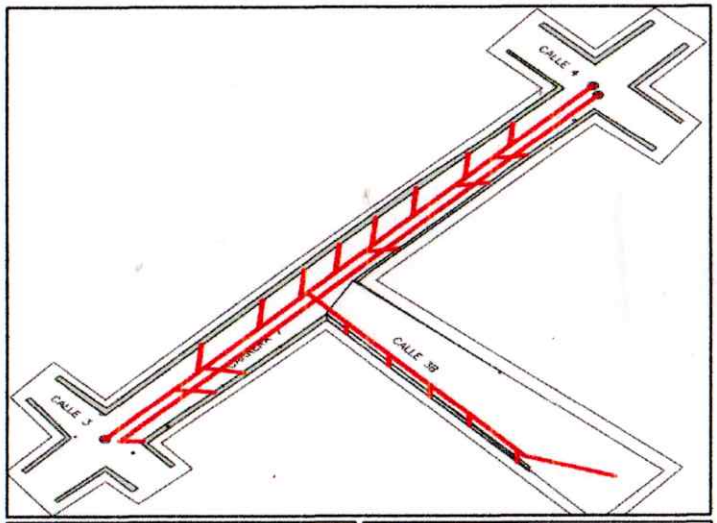











OPERACIONES MATEMATICAS

DESCRIPCIÓN	Dimensiones			No. Elementos	Volumen Total
	Longitud (m)	Altura (m)	Ancho (m)		
Carrera 7 entre Calles 3 y 4					
Alcantarillado	86,17	1,00	1,00	1,00	86,17
Pluvial	86,00	1,00	1,00	1,00	86,00
Domiciliarias	5,00	1,00	0,80	13,00	52,00
Calle 3B con Carrera 7					
Alcantarillado	40,00	1,00	1,00	1,00	40,00
Domiciliarias	3,00	1,00	0,80	5,00	12,00
Alcaldia - Red principal	12,00	1,00	0,80	1,00	9,60
SUBTOTAL					285,77
Vienen					0,00
TOTAL					285,77

HARVEY CABALLERO MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

DANIELA MORA MONTENEGRO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO

ALCALDÍA MUNICIPAL SIMACOTA, SANTANDER

CESPETROL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

HOJA	1	DE	1

FECHA	jueves, 8 de agosto de 2024	ACTA No	PARCIAL No. 1	CONTRATO No	CUM-099-2024
OBJETO DEL CONTRATO	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO DE LA VÍA URBANA LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER				
INTERVENTORIA	CONSORCIO PROMAING	NIT	901.845.459-1	CONTRATANTE	ALCALDIA DE SIMACOTA - SANTANDER
CONTRATISTA DE OBRA	CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN	NIT	900.152.349-1		
SECCIÓN 1	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
ITEM	Suministro e instalación de geotextil tejido 2400			UNIDAD	m2

DIAGRAMA/ FOTOGRAFIA/ PLANO/ ILUSTRACION

OPERACIONES MATEMATICAS

DESCRIPCIÓN	Dimensiones		No. Elementos	Area Total
Carrera 7 entre Calles 3 y 4			1,00	180,00

MEMORIAS DE CALCULO


ALCALDIA MUNICIPAL SIMACOTA, SANTANDER

CESPETROL INGENIERIA Y CONSTRUCCION

HOJA	1	DE	1

FECHA	jueves, 8 de agosto de 2024	ACTA No	PARCIAL No. 1	CONTRATO No	CUM-099-2024
OBJETO DEL CONTRATO	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO DE LA VÍA URBANA LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER				
INTERVENTORIA	CONSORCIO PROMAING	NIT	901.845.459-1	CONTRATANTE	ALCALDIA DE SIMACOTA - SANTANDER
CONTRATISTA DE OBRA	CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN	NIT	900.152.349-1		
SECCIÓN 1	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
ITEM	Entibado			UNIDAD	glb

DIAGRAMA/ FOTOGRAFIA/ PLANO/ ILUSTRACION

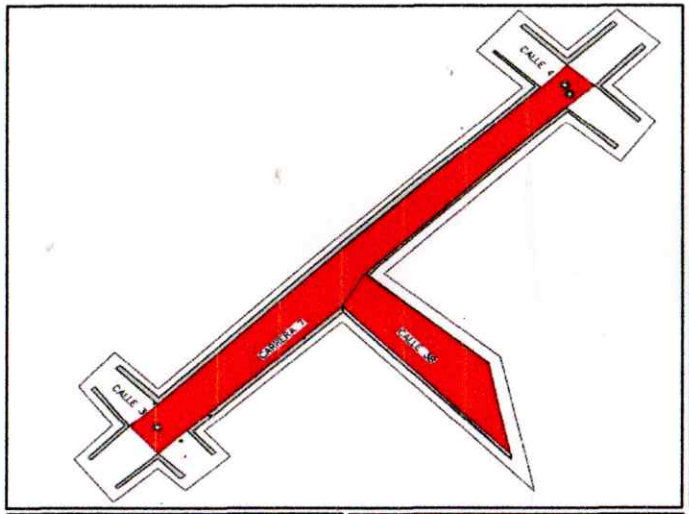











OPERACIONES MATEMATICAS

DESCRIPCIÓN	Dimensiones		No. Elementos	Total
Carrera 7 entre Calles 3 y 4			1,00	1,00
Calle 3B con Carrera 7				
SUBTOTAL				1,00
Vienen				0,00
TOTAL				1,00

HARVEY CABALLERO MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

DANIELA MORA MONTENEGRO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO


ALCALDÍA MUNICIPAL SIMACOTA, SANTANDER

CESPETROL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

HOJA	1	DE	1

FECHA	jueves, 8 de agosto de 2024	ACTA No	PARCIAL No. 1	CONTRATO No	CUM-099-2024
OBJETO DEL CONTRATO	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO DE LA VÍA URBANA LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER				
INTERVENTORIA	CONSORCIO PROMAING	NIT	901.845.459-1	CONTRATANTE	ALCALDIA DE SIMACOTA - SANTANDER
CONTRATISTA DE OBRA	CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN	NIT	900.152.349-1		
SECCIÓN 2	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
ITEM	Localización y replanteo de redes			UNIDAD	m2

DIAGRAMA/ FOTOGRAFIA/ PLANO/ ILUSTRACION

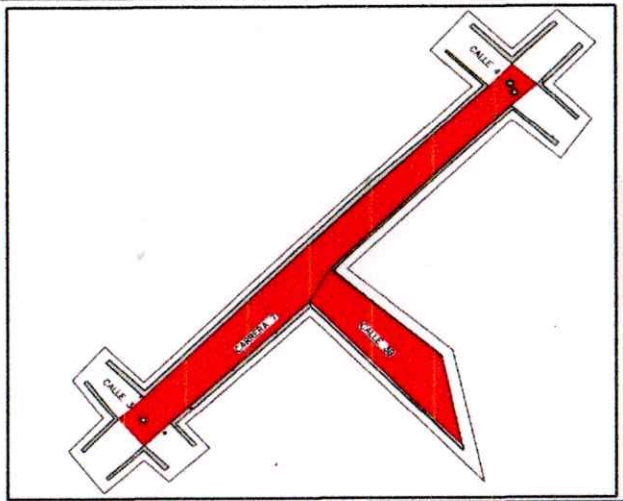











OPERACIONES MATEMATICAS

DESCRIPCIÓN	Dimensiones		No. Elementos	Area Total
	Longitud (m)	Ancho (m)		
Carrera 7 entre Calles 3 y 4				
Alcantarillado	86,17	1,00	1,00	86,17
Pluvial	86,00	1,00	1,00	86,00
Domiciliarias	5,00	0,80	13,00	52,00
Acueducto	88,00	0,60	1,00	52,80
Calle 3B con Carrera 7				
Alcantarillado	40,00	1,00	1,00	40,00
Domiciliarias	3,00	0,80	5,00	12,00
Alcaldia - Red principal	12,00	0,80	1,00	9,60
Acueducto	48,00	0,60	1,00	28,80
			SUBTOTAL	367,37
			Vienen	0,00
			TOTAL	367,37

HARVEY CABALLERO MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

DANIELA MORA MONTENEGRO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO


ALCALDIA MUNICIPAL SIMACOTA, SANTANDER

CESPETROL

HOJA	1	DE	1

FECHA	jueves, 8 de agosto de 2024	ACTA No	PARCIAL No. 1	CONTRATO No	CUM-099-2024
OBJETO DEL CONTRATO	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO DE LA VÍA URBANA LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER				
INTERVENTORIA	CONSORCIO PROMAING	NIT	901.845.459-1	CONTRATANTE	ALCALDIA DE SIMACOTA - SANTANDER
CONTRATISTA DE OBRA	CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN	NIT	900.152.349-1		
SECCIÓN 2	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
ITEM	Excavación mecánica en material común (incluye retiro de material 5km)			UNIDAD	m3

DIAGRAMA/ FOTOGRAFIA/ PLANO/ ILUSTRACION

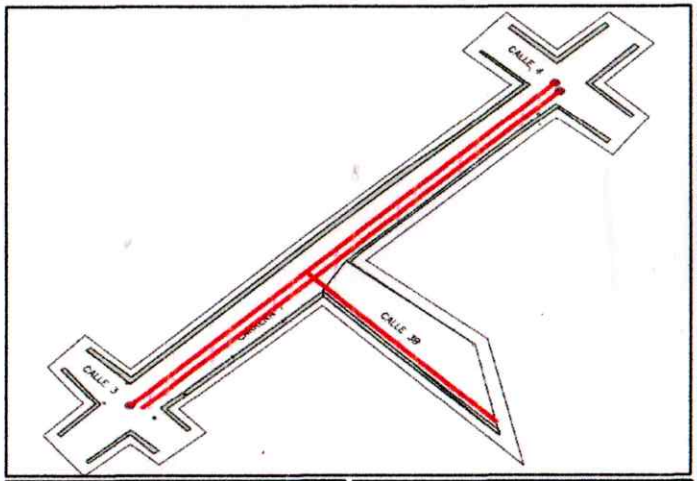











OPERACIONES MATEMATICAS

DESCRIPCIÓN	Dimensiones			No. Elementos	Volumen Total
	Longitud (m)	Altura (m)	Ancho (m)		
Carrera 7 entre Calles 3 y 4					
Alcantarillado	86,17	1,95	1,00	1,00	168,03
Pluvial	86,00	1,95	1,00	1,00	167,70
Calle 3B con Carrera 7					
Alcantarillado	40,00	1,55	1,00	1,00	62,00
SUBTOTAL					397,73
Vienen					0,00
TOTAL					397,73

HARVEY CABALLERO MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

DANIELA MORA MONTENEGRO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO


ALCALDIA MUNICIPAL SIMACOTA, SANTANDER

CESPETROL INGENIERIA Y CONSTRUCCION

HOJA	1	DE	1

FECHA	jueves, 8 de agosto de 2024	ACTA No	PARCIAL No. 1	CONTRATO No	CUM-099-2024
OBJETO DEL CONTRATO	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO DE LA VÍA URBANA LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER				
INTERVENTORIA	CONSORCIO PROMAING	NIT	901.845.459-1	CONTRATANTE	ALCALDIA DE SIMACOTA - SANTANDER
CONTRATISTA DE OBRA	CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN	NIT	900.152.349-1		
SECCIÓN 2	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
ITEM	Excavación manual en material común (incluye retiro de escombros 5km)			UNIDAD	m3

DIAGRAMA/ FOTOGRAFIA/ PLANO/ ILUSTRACION

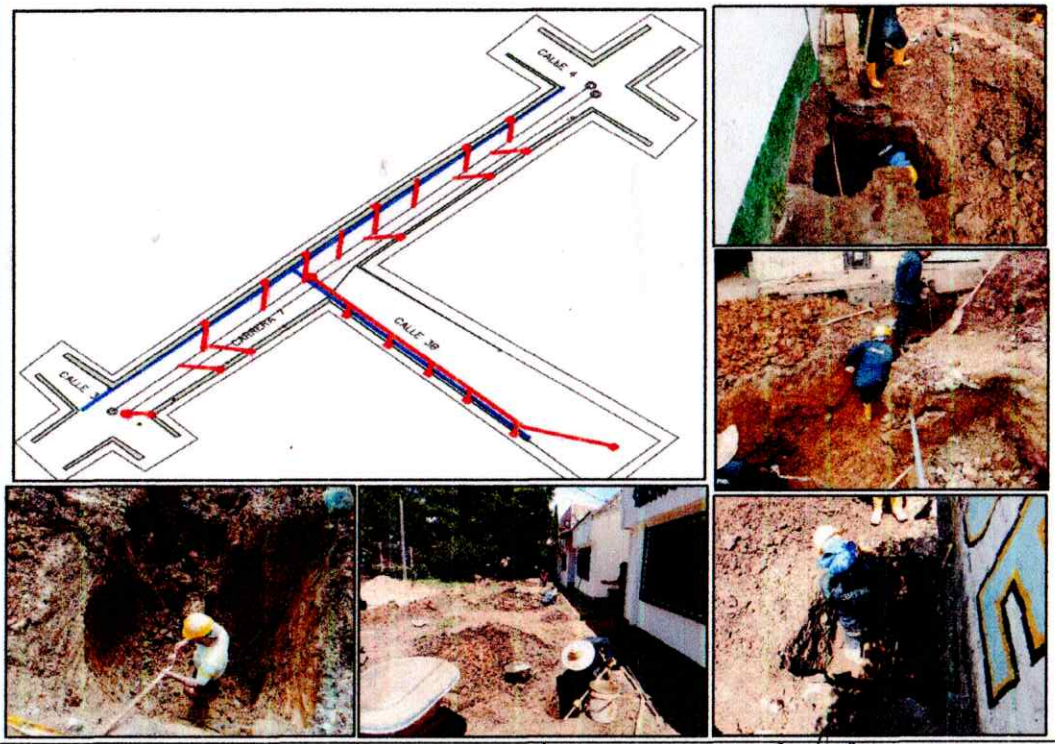

OPERACIONES MATEMATICAS

DESCRIPCIÓN	Dimensiones			No. Elementos	Volumen Total
	Longitud (m)	Altura (m)	Ancho (m)		
Carrera 7 entre Calles 3 y 4					
Acueducto	88,00	0,20	0,60	1,00	10,56
Domiciliarias	5,00	1,50	0,80	13,00	78,00
Cajas inspección	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00
Calle 3B con Carrera 7					
Acueducto	48,00	0,80	0,60	1,00	23,04
Domiciliarias	3,00	1,50	0,80	5,00	18,00
Alcaldia - Red principal	12,00	1,25	0,80	1,00	12,00
Cajas inspección	1,00	1,00	1,00	6,00	6,00
Pozo inspección		1,20	1,80	1,00	3,05
POZOS DE INSPECCIÓN					
Pozo inspección		2,40	1,80	2,00	12,21
				SUBTOTAL	174,87
				Vienen	0,00
				TOTAL	174,87

HARVEY CABALLERO MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

DANIELA MORA MONTENEGRO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO


ALCALDIA MUNICIPAL SIMACOTA, SANTANDER

CESPETROL INGENIERIA Y CONSTRUCCION

HOJA	1	DE	1

FECHA	jueves, 8 de agosto de 2024	ACTA No	PARCIAL No. 1	CONTRATO No	CUM-099-2024
OBJETO DEL CONTRATO	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO DE LA VÍA URBANA LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER				
INTERVENTORIA	CONSORCIO PROMAING	NIT	901.845.459-1	CONTRATANTE	ALCALDIA DE SIMACOTA - SANTANDER
CONTRATISTA DE OBRA	CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN	NIT	900.152.349-1		
SECCIÓN 2	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
ITEM	Suministro e instalación de material de atraque para tubería (arena y/o gravilla)			UNIDAD	m3

DIAGRAMA/ FOTOGRAFIA/ PLANO/ ILUSTRACION

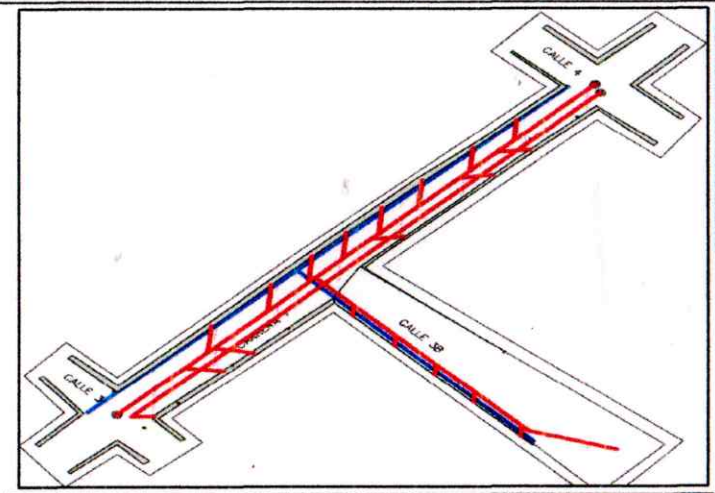











OPERACIONES MATEMATICAS

DESCRIPCIÓN	Dimensiones			No. Elementos	Volumen Total
	Longitud (m)	Altura (m)	Ancho (m)		
Carrera 7 entre Calles 3 y 4					
Alcantarillado	86,17	0,50	1,00	1,00	36,80
Pluvial	86,00	0,50	1,00	1,00	36,72
Domiciliarias	5,00	0,35	0,80	13,00	17,01
Acueducto	88,00	0,10	0,60	1,00	4,88
Calle 3B con Carrera 7					
Alcantarillado	40,00	0,40	1,00	1,00	14,70
Domiciliarias	5,00	0,35	1,00	5,00	8,29
Alcaldia - Red principal	12,00	0,40	0,80	1,00	3,45
Acueducto	48,00	0,10	0,60	1,00	2,78

MEMORIAS DE CALCULO


ALCALDÍA MUNICIPAL SIMACOTA, SANTANDER

CESPETROL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

HOJA	1	DE	1

FECHA	jueves, 8 de agosto de 2024	ACTA No	PARCIAL No. 1	CONTRATO No	CUM-099-2024
OBJETO DEL CONTRATO	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO DE LA VÍA URBANA LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER				
INTERVENTORIA	CONSORCIO PROMAING	NIT	901.845.459-1	CONTRATANTE	ALCALDIA DE SIMACOTA - SANTANDER
CONTRATISTA DE OBRA	CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN	NIT	900.152.349-1		
SECCIÓN 2	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
ITEM	Suministro e instalación de silla yee 8x6"			UNIDAD	und

DIAGRAMA/ FOTOGRAFIA/ PLANO/ ILUSTRACION

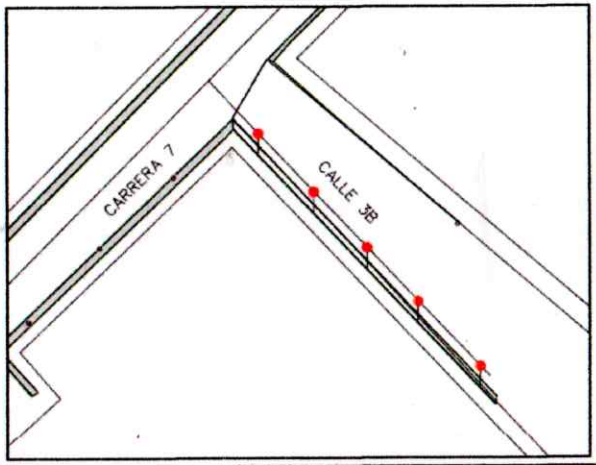









OPERACIONES MATEMATICAS

DESCRIPCIÓN	Dimensiones		No. Elementos	Total
Calle 3B con Carrera 7			5,00	5,00

MEMORIAS DE CALCULO


ALCALDÍA MUNICIPAL SIMACOTA, SANTANDER

CESPETROL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

HOJA	1	DE	1

FECHA	jueves, 8 de agosto de 2024	ACTA No	PARCIAL No. 1	CONTRATO No	CUM-099-2024
OBJETO DEL CONTRATO	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO DE LA VÍA URBANA LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER				
INTERVENTORIA	CONSORCIO PROMAING	NIT	901.845.459-1	CONTRATANTE	ALCALDIA DE SIMACOTA - SANTANDER
CONTRATISTA DE OBRA	CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN	NIT	900.152.349-1		
SECCIÓN 2	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
ITEM	Suministro e instalación de tubería Novafort d = 12" sanitaria			UNIDAD	ml

DIAGRAMA/ FOTOGRAFIA/ PLANO/ ILUSTRACION

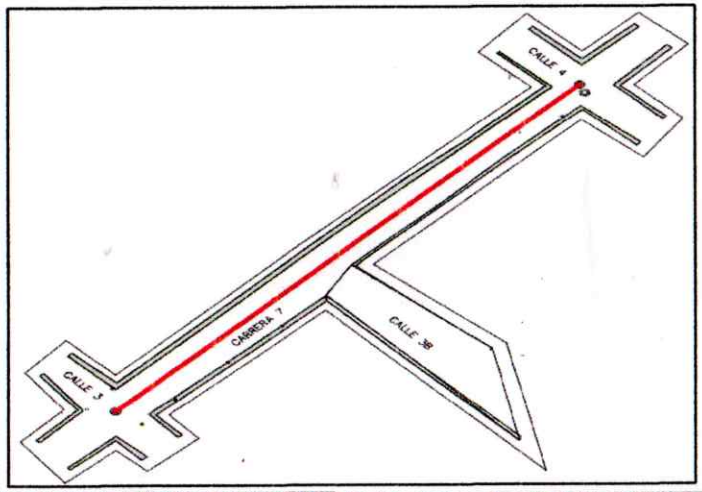











OPERACIONES MATEMATICAS

DESCRIPCIÓN	Dimensiones Longitud (m)		No. Elementos	Longitud Total
Carrera 7 entre Calles 3 y 4				
Alcantarillado	86,17		1,00	86,17

MEMORIAS DE CALCULO


ALCALDÍA MUNICIPAL SIMACOTA, SANTANDER

CESPETROL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

HOJA	1	DE	1

FECHA	jueves, 8 de agosto de 2024	ACTA No	PARCIAL No. 1	CONTRATO No	CUM-099-2024
OBJETO DEL CONTRATO	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO DE LA VÍA URBANA LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER				
INTERVENTORIA	CONSORCIO PROMAING	NIT	901.845.459-1	CONTRATANTE	ALCALDIA DE SIMACOTA - SANTANDER
CONTRATISTA DE OBRA	CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN	NIT	900.152.349-1		
SECCIÓN 2	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
ITEM	Suministro e instalación de tubería Novafort d = 6" domiciliarias			UNIDAD	ml

DIAGRAMA/ FOTOGRAFIA/ PLANO/ ILUSTRACION

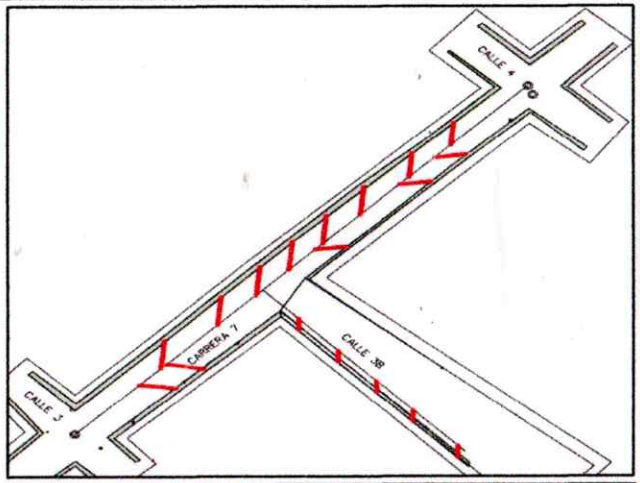









OPERACIONES MATEMATICAS

DESCRIPCIÓN	Dimensiones		No. Elementos	Longitud Total
	Longitud (m)			
Carrera 7 entre Calles 3 y 4	5,00		13,00	65,00
Calle 3B con Carrera 7	3,00		5,00	15,00

MEMORIAS DE CALCULO


ALCALDÍA MUNICIPAL SIMACOTA, SANTANDER

CESPETROL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

HOJA	1	DE	1

FECHA	jueves, 8 de agosto de 2024	ACTA No	PARCIAL No. 1	CONTRATO No	CUM-099-2024
OBJETO DEL CONTRATO	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO DE LA VÍA URBANA LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER				
INTERVENTORIA	CONSORCIO PROMAING	NIT	901.845.459-1	CONTRATANTE	ALCALDIA DE SIMACOTA - SANTANDER
CONTRATISTA DE OBRA	CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN	NIT	900.152.349-1		
SECCIÓN 2	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
ITEM	Suministro e instalación de silla yee 12x6"			UNIDAD	und

DIAGRAMA/ FOTOGRAFIA/ PLANO/ ILUSTRACION

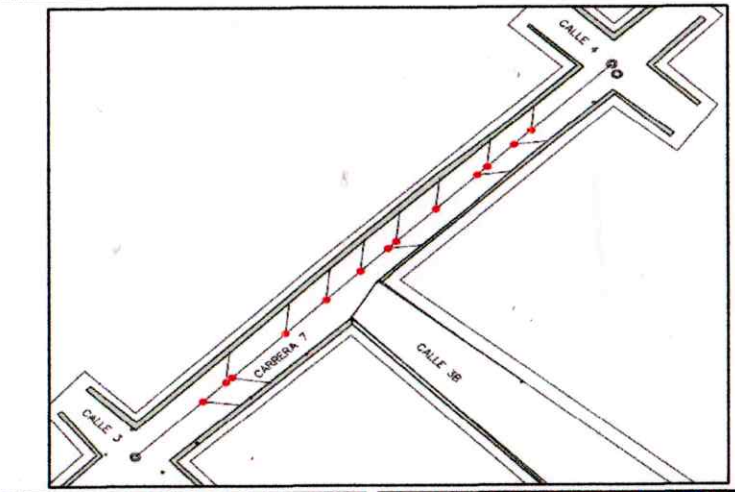











OPERACIONES MATEMATICAS

DESCRIPCIÓN	Dimensiones		No. Elementos	Total
Carrera 7 entre Calles 3 y 4			13,00	13,00

MEMORIAS DE CALCULO


ALCALDÍA MUNICIPAL SIMACOTA, SANTANDER


CESPETROL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

HOJA	1	DE	1

FECHA	jueves, 8 de agosto de 2024	ACTA No	PARCIAL No. 1	CONTRATO No	CUM-099-2024
OBJETO DEL CONTRATO	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO DE LA VÍA URBANA LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER				
INTERVENTORIA	CONSORCIO PROMAING	NIT	901.845.459-1	CONTRATANTE	ALCALDIA DE SIMACOTA - SANTANDER
CONTRATISTA DE OBRA	CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN	NIT	900.152.349-1		
SECCIÓN 2	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
ITEM	Caja de inspección 0.60x0.6x0.6m tolete común			UNIDAD	und

DIAGRAMA/ FOTOGRAFIA/ PLANO/ ILUSTRACION

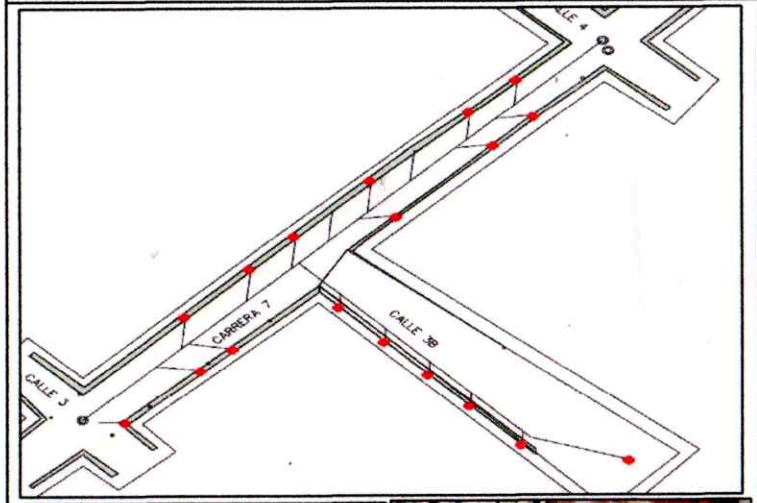

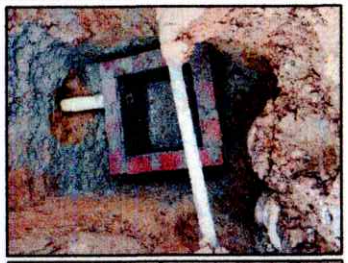









OPERACIONES MATEMATICAS

DESCRIPCIÓN	Dimensiones		No. Elementos	Total
Carrera 7 entre Calles 3 y 4			12,00	12,00
Calle 3B con Carrera 7			6,00	6,00

MEMORIAS DE CALCULO


ALCALDÍA MUNICIPAL SIMACOTA, SANTANDER

CESPETROL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

HOJA	1	DE	1

FECHA	jueves, 8 de agosto de 2024	ACTA No	PARCIAL No. 1	CONTRATO No	CUM-099-2024
OBJETO DEL CONTRATO	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO DE LA VÍA URBANA LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER				
INTERVENTORIA	CONSORCIO PROMAING	NIT	901.845.459-1	CONTRATANTE	ALCALDIA DE SIMACOTA - SANTANDER
CONTRATISTA DE OBRA	CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN	NIT	900.152.349-1		
SECCIÓN 2	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
ITEM	Construcción de pozo inspección h = 2.20 m - h=2.80 m (inc. Tapa hf)			UNIDAD	und


DIAGRAMA/ FOTOGRAFIA/ PLANO/ ILUSTRACION

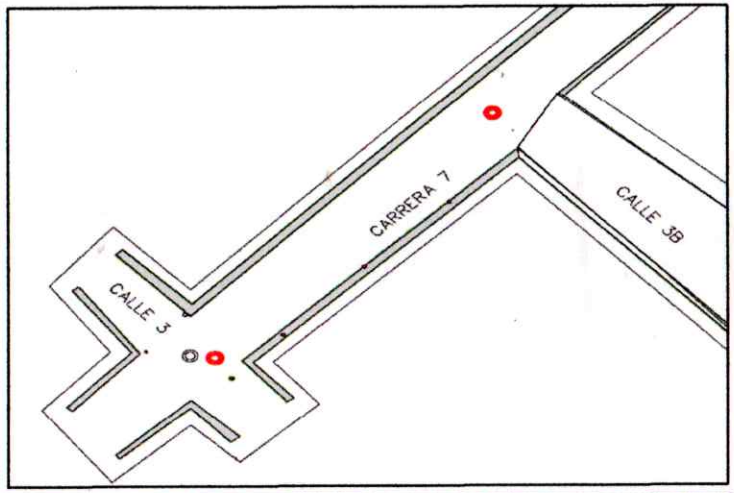








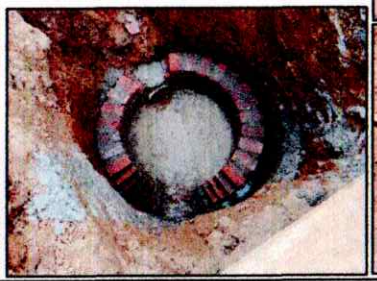

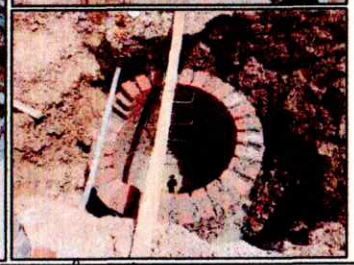

OPERACIONES MATEMATICAS

DESCRIPCIÓN	Dimensiones		No. Elementos	Total
	Longitud (m)	Ancho (m)		
Carrera 7 entre Calles 3 y 4				
Alcantarillado			1,00	1,00
Pluvial			1,00	1,00
SUBTOTAL				2,00
Vienen				0,00
TOTAL				2,00

HARVEY CABALLERO MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

DANIELA MORA MONTENEGRO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO


ALCALDÍA MUNICIPAL SIMACOTA, SANTANDER

CESPETROL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

HOJA	1	DE	1

FECHA	jueves, 8 de agosto de 2024	ACTA No	PARCIAL No. 1	CONTRATO No	CUM-099-2024
OBJETO DEL CONTRATO	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO DE LA VÍA URBANA LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER				
INTERVENTORIA	CONSORCIO PROMAING	NIT	901.845.459-1	CONTRATANTE	ALCALDIA DE SIMACOTA - SANTANDER
CONTRATISTA DE OBRA	CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN	NIT	900.152.349-1		
SECCIÓN 2	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
ITEM	Suministro e instalación de tubería Novafort d = 12" - para conducción de alcantarillado pluvial (incluye accesorios)			UNIDAD	ml

DIAGRAMA/ FOTOGRAFIA/ PLANO/ ILUSTRACION

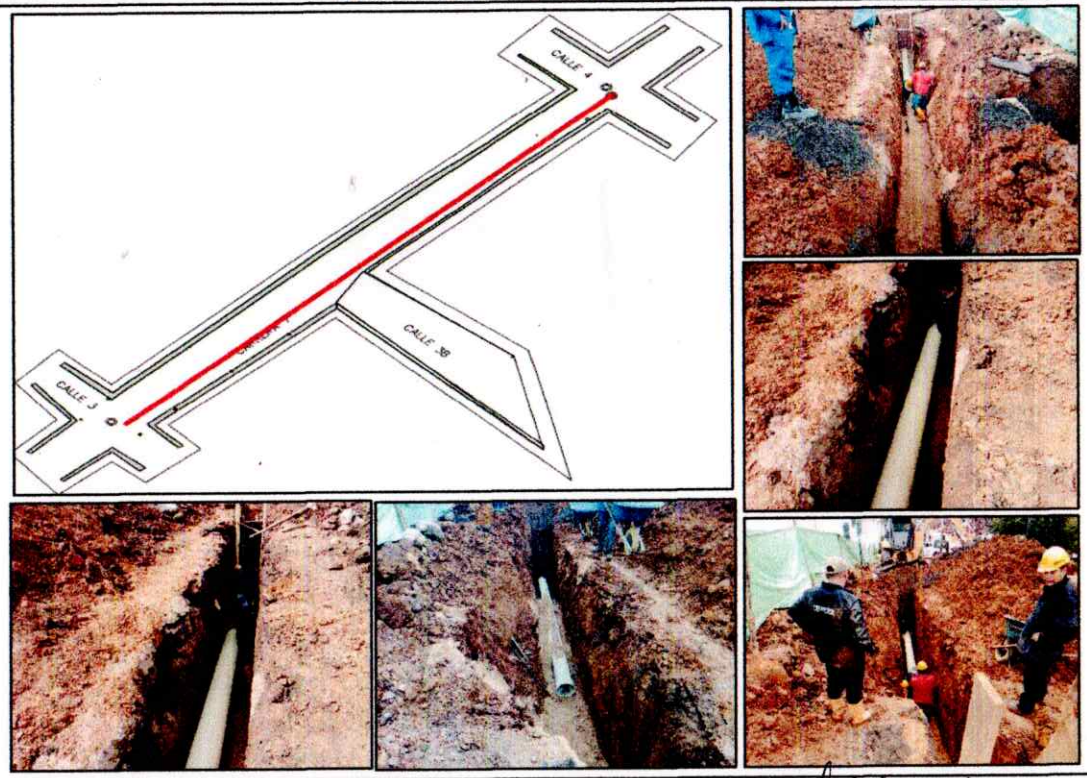

OPERACIONES MATEMATICAS

DESCRIPCIÓN	Dimensiones Longitud (m)		No. Elementos	Longitud Total
Carrera 7 entre Calles 3 y 4				
Pluvial	86,00		1,00	86,00

MEMORIAS DE CALCULO


ALCALDIA MUNICIPAL SIMACOTA, SANTANDER

CESPETROL INGENIERIA Y CONSTRUCCION


HOJA	1	DE	1

FECHA	jueves, 8 de agosto de 2024	ACTA No	PARCIAL No. 1	CONTRATO No	CUM-099-2024
OBJETO DEL CONTRATO	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO DE LA VÍA URBANA LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER				
INTERVENTORIA	CONSORCIO PROMAING	NIT	901.845.459-1	CONTRATANTE	ALCALDIA DE SIMACOTA - SANTANDER
CONTRATISTA DE OBRA	CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN	NIT	900.152.349-1		
SECCIÓN 2	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
ITEM	Concreto resistencia 14 Mpa (atraque de tubería)			UNIDAD	m3

DIAGRAMA/ FOTOGRAFIA/ PLANO/ ILUSTRACION

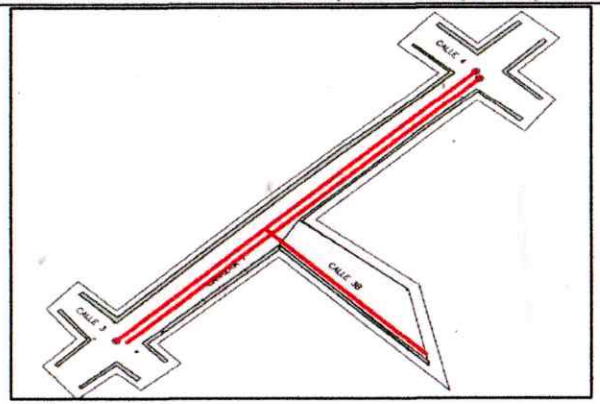



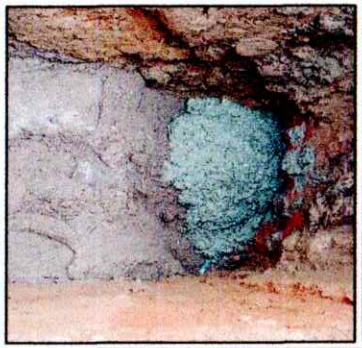





OPERACIONES MATEMATICAS

DESCRIPCIÓN	Dimensiones			No. Elementos	Volumen Total
	Longitud (m)	Altura (m)	Ancho (m)		
Carrera 7 entre Calles 3 y 4					
Alcantarillado	0,35	0,55	0,45	10,00	0,61
Pluvial	0,35	0,55	0,45	10,00	0,61
Calle 3B con Carrera 7					
Alcantarillado	0,35	0,45	0,35	5,00	0,15
Accesorios					
Cruceta 3x3x3x2	0,30	0,05	0,20	2,00	0,01
Cruceta 2x2x2x2	0,30	0,05	0,20	2,00	0,01
Valvula 3"	0,35	0,10	0,20	1,00	0,01
Tee 3x2	0,35	0,10	0,20	1,00	0,01
SUBTOTAL					1,40
Vienen					0,00
TOTAL					1,40

HARVEY CABALLERO MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

DANIELA MORA MONTENEGRO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO


ALCALDÍA MUNICIPAL SIMACOTA, SANTANDER

CESPETROL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

HOJA	1	DE	1

FECHA	jueves, 8 de agosto de 2024	ACTA No	PARCIAL No. 1	CONTRATO No	CUM-099-2024
OBJETO DEL CONTRATO	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO DE LA VÍA URBANA LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER				
INTERVENTORIA	CONSORCIO PROMAING	NIT	901.845.459-1	CONTRATANTE	ALCALDIA DE SIMACOTA - SANTANDER
CONTRATISTA DE OBRA	CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN	NIT	900.152.349-1		
SECCIÓN 2	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
ITEM	Suministro e instalación de tubería Novafort d=8" sanitaria			UNIDAD	ml

DIAGRAMA/ FOTOGRAFIA/ PLANO/ ILUSTRACION

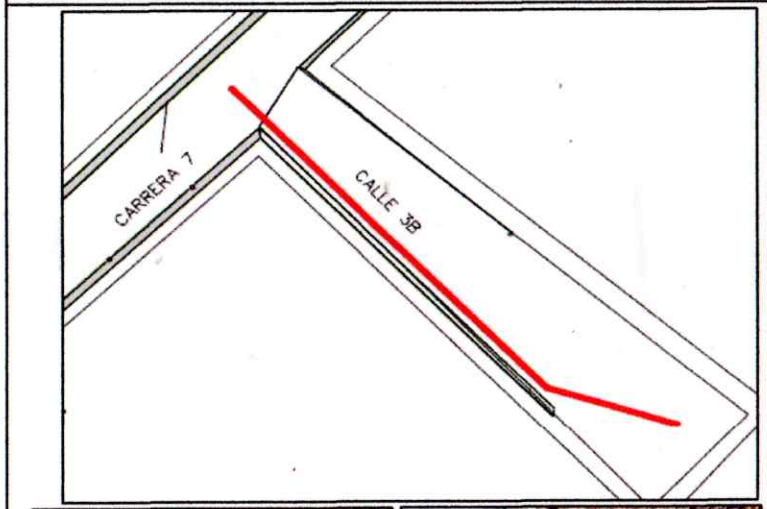











OPERACIONES MATEMATICAS

DESCRIPCIÓN	Dimensiones		No. Elementos	Longitud Total
	Longitud (m)	Ancho (m)		
Carrera 7 entre Calles 3 y 4				
Alcantarillado	40,00		1,00	40,00
Alcaldia - Red principal	12,00		1,00	12,00
SUBTOTAL				52,00
Vienen				0,00
TOTAL				52,00

HARVEY CABALLERO MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

DANIELA MORA MONTENEGRO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO


ALCALDIA MUNICIPAL SIMACOTA, SANTANDER

CESPETROL INGENIERIA Y CONSTRUCCION

HOJA	1	DE	1

FECHA	jueves, 8 de agosto de 2024	ACTA No	PARCIAL No. 1	CONTRATO No	CUM-099-2024
OBJETO DEL CONTRATO	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO DE LA VÍA URBANA LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER				
INTERVENTORIA	CONSORCIO PROMAING	NIT	901.845.459-1	CONTRATANTE	ALCALDIA DE SIMACOTA - SANTANDER
CONTRATISTA DE OBRA	CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN	NIT	900.152.349-1		
SECCIÓN 3	ITEMS NO PREVISTO				
ITEM	Relleno compactado producto de la excavación			UNIDAD	m3

DIAGRAMA/ FOTOGRAFIA/ PLANO/ ILUSTRACION

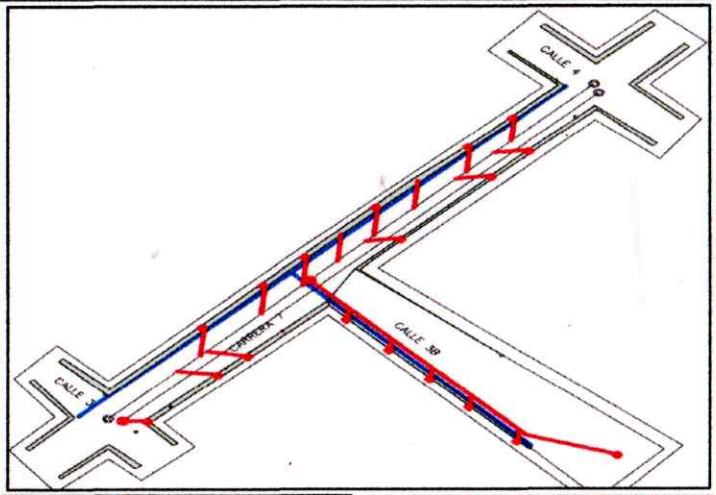











OPERACIONES MATEMATICAS

DESCRIPCIÓN	Dimensiones			No. Elementos	Volumen Total
	Longitud (m)	Altura (m)	Ancho (m)		
Carrera 7 entre Calles 3 y 4					
Alcantarillado	86,17	0,95	1,00	1,00	81,87
Pluvial	85,00	0,95	1,00	1,00	80,75
Domiciliarias	5,00	0,95	0,80	13,00	49,40
Acueducto	88,00	0,20	0,60	1,00	10,56
Calle 3B con Carrera 7					
Alcantarillado	40,00	0,95	1,00	1,00	38,00
Domiciliarias	3,00	0,95	0,80	5,00	11,40
Alcaldia - Red principal	12,00	0,95	0,80	1,00	9,12
Acueducto	48,00	0,80	0,60	1,00	23,04

MEMORIAS DE CALCULO

ALCALDÍA MUNICIPAL SIMACOTA, SANTANDER

CESPETROL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

HOJA	1	DE	1

FECHA	jueves, 8 de agosto de 2024	ACTA No	PARCIAL No. 1	CONTRATO No	CUM-099-2024
OBJETO DEL CONTRATO	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO DE LA VÍA URBANA LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER				
INTERVENTORIA	CONSORCIO PROMAING	NIT	901.845.459-1	CONTRATANTE	ALCALDIA DE SIMACOTA - SANTANDER
CONTRATISTA DE OBRA	CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN	NIT	900.152.349-1		
SECCIÓN 2	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
ITEM	Construcción de pozo inspección h = 0.00 m - h=1.5 m (inc. Tapa hf)			UNIDAD	und

DIAGRAMA/ FOTOGRAFIA/ PLANO/ ILUSTRACION

OPERACIONES MATEMATICAS

DESCRIPCIÓN	Dimensiones		No. Elementos	Area Total
	Longitud (m)	Ancho (m)		
Calle 3B con Carrera 7				
Alcantarillado			1,00	1,00

CESPETROL
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

INFORME CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN DEL PERIODO POR COBRAR, CON FOTOS A COLOR Y FIRMA DEL RESIDENTE Y DIRECTOR DE INTERVENTORIA

6019474
cespetrolltda@hotmail.com
administrativo@cespetrol.com
www.cespetrol.com

CALLE 61 #21-15 BARRIO EL PARNASO
BARRANCABERMEJA - SANTANDER

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
NORSOK S-WA-006:2018
BUREAU VERITAS
Certification

INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA PARCIAL 01
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 090-2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER Y COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA. "COOTRASARAVITA LTDA"

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER		
NIT: 890.208.807-0		
CONTRATISTA: CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN		
IDENTIFICACIÓN O NIT: NIT No. 900.152.349 – 1		
REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR FREDY MANTILLA PORRAS		
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: C.C. No. 91.109.786 DE SOCORRO, SANTANDER.		
SUPERVISOR O INTERVENTOR: ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		
NUMERO DE CONTRATO: CUM – 099 – 2024	**FECHA:** 19 DE JUNIO DE 2024	
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO OBRA PUBLICA		
OBJETO: "REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO DE LA VÍA URBANA LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER**".**		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	24-00426	**FECHA:** 12 DE JUNIO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	24-00845	**FECHA:** 19 DE JUNIO DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	**2.3.40.03.20.2.02.02.005.4003017** Acueductos optimizados **2.3.40.03.20.2.02.02.005.4003020** Alcantarillados optimizados	
PÓLIZA (CUANDO SE REQUIERE DE LO CONTRARIO NO APLICA):	**NUMERO POLIZA**	NB-100329387 ANEXO 2
	NUMERO POLIZA	NB-100082862 ANEXO 2
	COMPAÑÍA	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
	NIT DE LA COMPAÑÍA:	890.903.407-9
	FECHA DE EXPEDICIÓN	12 DE AGOSTO DE 2024
	FECHA DE APROBACIÓN	12 DE AGOSTO DE 2024
	CARACTERISTICAS POLIZAS	
	TOMADOR:	CESPETROL LTDA NIT 900.152.349 – 1

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO	MUNICIPIO DE SIMACOTA	
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS		
CLASE DE AMPARO	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**	
	VIGENCIA	
	DESDE	**HASTA**
	02-07-2024	01-09-2024
	VALOR ASEGURADO	
	$96.925.380,57	
CLASE DE AMPARO	**ESTABILIDAD DE LA OBRA**	
	VIGENCIA	
	DESDE	**HASTA**
	01-09-2024	01-09-2029
	VALOR ASEGURADO	
	$96.925.380,57	
CLASE DE AMPARO	**PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES**	
	VIGENCIA	
	DESDE	**HASTA**
	02-07-2024	01-09-2027
	VALOR ASEGURADO	
	$24.231.345,14	
CLASE DE AMPARO	**RESPONSABILIDAD CIVIL**	
	VIGENCIA	
	DESDE	**HASTA**
	02-07-2024	01-09-2024
	VALOR ASEGURADO	
	$260.000.000,00	

□□rr□r□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ono□M□□i□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

FORMA DE PAGO:	La Alcaldía Municipal de Simacota cancelará al contratista EL 90% del valor del contrato en actas parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría y debidamente suscritas por el CONTRATISTA y SUPERVISOR, estos pagos se girarán al contratista cumplidos los requisitos de ejecución y suscripción de Actas de Obra. El restante (10%) del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato de obra pública previa presentación de los documentos que acrediten la ejecución de las obras, suscritas por el Municipio de Simacota, el Contratista e interventor. así como certificaciones de cumplimiento y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, etc.), cuando corresponda. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por quien sea designado por el municipio, una vez medido, cuantificado y aprobado por el supervisor el valor del acta acompañada del informe técnico se deberá presentar al municipio para hacer efectivo dicho pago una vez se hayan agotado los trámites administrativos necesarios. El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo tanto, el Contratista no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales. La no presentación de estos documentos o hacerlos en forma extemporánea, exonera al Municipio del pago de intereses moratorios. Para proceder al pago el contratista deberá llegar: • Acta de Recibo parcial • Informe de avance de obras • Certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el interventor y el supervisor del contrato. • Factura de venta o cuenta de cobro según corresponda. • Aportes al sistema de seguridad social y parafiscal, según corresponda, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES ORIGINALES CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No. 1 18 de Julio 2024 CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL No. 1 08 de Agosto 2024 CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO									
1.1	Localización y replanteo de vias	m2	549,99	$ 4.900,00	$ 2.694.951,00	+	841,10	$ 4.121.390,00	841,10	$ 4.121.390,00
1.2	Retiro de piedra labor	m2	549,99	$ 40.200,00	$ 22.109.598,00	+	566,00	$ 22.753.200,00	566,00	$ 22.753.200,00
1.3	Excavación mecánica en material común (incluye retiro de material 5km)	m3	577,49	$ 36.550,00	$ 21.107.241,00	-	385,25	$ 14.080.888,00	126,00	$ 4.605.300,00
1.4	Mejoramiento de la subrasante con rajón	m3	165,00	$ 160.150,00	$ 26.424.750,00	+	165,11	$ 26.442.367,00	54,00	$ 8.648.100,00
1.5	Subbase granular suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador.	m3	137,50	$ 200.000,00	$ 27.500.000,00	+	137,59	$ 27.518.000,00		$ -
1.6	Suministro e instalación de material seleccionado (incluye compactación mecánica)	m3	220,00	$ 144.650,00	$ 31.823.000,00	+	285,77	$ 41.336.631,00	285,77	$ 41.336.631,00
1.7	Suministro e instalación de geotextil tejido 2400	m2	549,99	$ 20.300,00	$ 11.164.797,00	+	400,32	$ 8.126.496,00	180,00	$ 3.654.000,00
1.8	Concreto hidráulico 3000 psi (incluye fundida, formaleteado, vibrado, texturizado y curado)	m3	55,00	$ 703.700,00	$ 38.703.500,00	+	40,03	$ 28.169.111,00		$ -
1.9	Colocación piedra labor existente (inc. El relabrado)	m2	412,49	$ 109.900,00	$ 45.332.651,00	+	382,97	$ 42.088.403,00		$ -
1.10	Entibado	glb	1,00	$ 6.023.250,00	$ 6.023.250,00	=	1,00	$ 6.023.250,00	1,00	$ 6.023.250,00
1.11	Suministro e instalación de piedra Barichara e = 18 cm	m2	137,50	$ 184.350,00	$ 25.348.125,00	-	0,00	$ -		$ -
	SUBTOTAL				$ 258.231.863,00		SUBTOTAL	$ 220.659.736,00	SUBTOTAL	$ 91.141.871,00
2	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO									
2.1	Localización y replanteo de redes	□2	438,00	$ 6.200,00	$ 2.715.600,00	-	367,37	$ 2.277.694,00	367,37	$ 2.277.694,00
2.2	Excavación mecánica en material común (incluye retiro de material 5km)	□□	390,72	$ 28.350,00	$ 11.076.912,00	+	397,73	$ 11.275.646,00	397,73	$ 11.275.646,00
2.3	Excavación manual en material común (incluye retiro de escombros 5km)	□□	67,20	$ 71.250,00	$ 4.788.000,00	+	174,87	$ 12.459.488,00	174,87	$ 12.459.488,00
2.4	Suministro e instalación de material de atraque para tubería (arena y/o gravilla)	□□	21,98	$ 158.300,00	$ 3.479.434,00	+	124,65	$ 19.732.095,00	124,65	$ 19.732.095,00
2.5	Suministro e instalación de silla yee 8x6"	und	5,00	$ 192.850,00	$ 964.250,00	=	5,00	$ 964.250,00	5,00	$ 964.250,00
2.6	Suministro e instalación de tubería Novafort d = 6" domiciliarias	□□	84,00	$ 89.000,00	$ 7.476.000,00	-	80,00	$ 7.120.000,00	80,00	$ 7.120.000,00
2.7	Suministro e instalación de tubería Novafort d = 12" sanitaria	□□	90,00	$ 186.550,00	$ 16.789.500,00	-	86,17	$ 16.075.014,00	86,17	$ 16.075.014,00
2.8	Suministro e instalación de silla yee 12x6"	und	14,00	$ 327.250,00	$ 4.581.500,00	-	13,00	$ 4.254.250,00	13,00	$ 4.254.250,00
2.9	Caja de inspección 0.60x0.6x0.6m tolete común	und	9,00	$ 253.650,00	$ 2.282.850,00	+	18,00	$ 4.565.700,00	18,00	$ 4.565.700,00
2.10	Suministro e instalación para la reposición de tubería presión PVC rde-21 d=3" (incluye accesorios)	□□	90,00	$ 65.850,00	$ 5.926.500,00	-	88,00	$ 5.794.800,00		$ -
2.11	Suministro e instalación para la reposición de tubería presión PVC rde-9 d=1/2" (incluye accesorios)	□□	240,00	$ 12.950,00	$ 3.108.000,00	-	34,00	$ 440.300,00		$ -
2.12	Suministro e instalación para la reposición de tubería presión PVC rde-11 d=3/4" (incluye accesorios)	□□	12,00	$ 13.150,00	$ 157.800,00	-	6,00	$ 78.900,00		$ -
2.13	Construcción de pozo inspección h = 2.20 m - h=2.80 m (inc. Tapa hf)	und	2,00	$ 5.055.900,00	$ 10.111.800,00	=	2,00	$ 10.111.800,00	2,00	$ 10.111.800,00
2.14	Suministro e instalación de tubería Novafort d = 12" - para conducción de alcantarillado pluvial (incluye accesorios)	□□	90,00	$ 185.000,00	$ 16.650.000,00	-	86,00	$ 15.910.000,00	86,00	$ 15.910.000,00
2.15	Concreto resistencia 14 Mpa (atraque de tubería)	□□	3,96	$ 511.700,00	$ 2.026.332,00	-	1,40	$ 716.380,00	1,40	$ 716.380,00
2.16	Suministro e instalación de cruceta 3"x3"x3"x2" (incluye accesorios)	und	1,00	$ 635.500,00	$ 635.500,00	=	1,00	$ 635.500,00		$ -
2.17	Suministro e instalación para reposición de acometidas para acueducto	und	19,00	$ 49.950,00	$ 949.050,00	-	18,00	$ 899.100,00		$ -
2.18	Suministro e instalación de válvula de 3"	und	1,00	$ 286.000,00	$ 286.000,00	=	1,00	$ 286.000,00		$ -
2.19	Suministro e instalación de tubería presión PVC rde-21 d = 2" (incluye accesorios)	□□	42,00	$ 31.500,00	$ 1.323.000,00	+	48,00	$ 1.512.000,00		$ -
2.20	Suministro e instalación de cruceta 2"x2"x2"x3" (incluye accesorios)	und	1,00	$ 546.800,00	$ 546.800,00	=	1,00	$ 546.800,00		$ -
2.21	Suministro e instalación de tubería Novafort d=8" sanitaria	□□	42,00	$ 116.100,00	$ 4.876.200,00	-	52,00	$ 6.037.200,00	52,00	$ 6.037.200,00
	SUBTOTAL				$ 100.751.028,00		SUBTOTAL	$ 121.692.917,00	SUBTOTAL	$ 111.499.517,00
3	ITEMS NO PREVISTO									
3.1	Relleno compactado producto de la excavación	□□	0,00	$ 45.802,00	$ -	+	304,14	$ 13.930.220,00	304,14	$ 13.930.220,00
3.2	Construcción de pozo inspección h = 0.00 m - h=1.5 m (inc. Tapa hf)	und	0,00	$ 2.700.000,00	$ -	+	1,00	$ 2.700.000,00	1,00	$ 2.700.000,00
	SUBTOTAL				$ -		SUBTOTAL	$ 16.630.220,00	SUBTOTAL	$ 16.630.220,00

□□rr□r□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ono□M□□i□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

TERMINO DE DURACIÓN:	El término para la ejecución de este contrato es hasta el 01 de septiembre del 2024 y/o hasta agotar disponibilidad presupuestal contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	DOS (02) DE JUNIO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DE 2024	
VALOR DEL CONTRATO:	**CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($484.626.902,85)** IVA incluido.	
ADICIÓN	**SI**	**NO**
		X
PRÓRROGA	**SI**	**NO**
		X
MODIFICACIÓN DE LOS AMPAROS EN CASO DE ADICIÓN O PRÓRROGA	**NA**	
CESIÓN	**SI**	**NO**
		X
SEGURIDAD SOCIAL	**CUMPLIÓ**	**NO CUMPLIÓ**
	SI	
DOCUMENTOS SOPORTE:	El contratista adjuntó para el pago los siguientes soportes: □Factura electrónica. □Informe De Actividades y Soportes de Cumplimiento. □Planilla de pago de seguridad Social empresa CESPETROL LTDA en reorganización.	

SOPORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**NUMERO DE PLANILLA**	9471030599
	FECHA DE PAGO:	05/08/2024
	PERIODO DE COTIZACION:	Junio de 2024
	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN:	N. A
	APORTES A SALUD:	$218.000
	APORTES A PENSIÓN:	$870.800
	APORTES A.RL.:	$378.900
	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	$218.000
CONCLUSIONES:	Conforme a lo anterior y de acuerdo al informe del contratista de suministro el cual presenta una ejecución del 61,08% y el ACTA PARCIAL No. 01 asciende a la suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE. ($ 296.016.670,80)**	

BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO		$ 484.626.902,85
VALOR ACTA PARCIAL 01	$ 296.016.670,80	
VALOR POR EJECUTAR	$ 188.610.207,75	
SUMAS IGUALES	$ 484.626.902,85	$ 484.626.902,85

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

MATERIAL FOTOGRÁFICO	**SI**
INFORME DEL CONTRATISTA	Presenta informe detallado integrado de: - Factura electrónica. - Información general contractual. - Informe técnico. - Informe Administrativo.
ES VIABLE EFECTUARSE EL PAGO POR VALOR DE:	**DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE. ($296.016.670,80)**

En constancia de lo anterior se firma en Simacota - Santander a los ocho (08) días del mes de julio de 2024

POR EL MUNICIPIO DE SIMACOTA,

ING. ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura

MUNICIPIO DE SIMACOTA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INFORME TÉCNICO ACTA DE OBRA No. 1

Contrato de Obra Pública No. CUM-099-2024

PERIODO DE EJECUCIÓN:
DEL 02 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2024

CONTRATISTA:
CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN

INTERVENTORIA:
CONSORCIO PROMAING

ENTIDAD CONTRATANTE:
ALCALDIA DE SIMACOTA

CUADRO DE APROBACIÓN DEL INFORME

Responsable de la Elaboración	Responsable de la Revisión	Responsable de la Aprobación por parte de la Interventoría
HARVEY CABALLERO Residente de obra	FABIAN PEREZ REY Director de obra	ANGIE OVIEDO Director de interventoría
M.P 151037-0509911	M.P 68202-119463	M.P 091037-0538955
		
Fecha: 05/08/2024	**Fecha: 06/08/2024**	**Fecha: 08/08/2024**
Versión Aprobada No.		**0.0**

Nota: Con la suscripción del presente cuadro de aprobación del informe, los aquí firmantes certificamos que la información presentada es veraz y que previo a su entrega esta ha sido revisada y aprobada al verificar que se encuentra acorde con los requisitos técnicos vigentes establecidos según requerimientos del ente interventor.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2.1. LOCALIZACIÓN 5
2.2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO 6
2.2.1. Ficha técnica del contrato 6
2.2.2. Fichas de pólizas generadas 7
2.2.3. Relación de personal del contratista 7
2.2.4. Relación de maquinaria y equipos del contratista 8
2.3. ALCANCE 8
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 9
3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 9
5.2.1. Actividades técnicas 9
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 19

1. INTRODUCCIÓN

El CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, mediante acta No. 07 del 6 de junio de 2024 en la cual se dio el concepto favorable para que el Municipio procediera a declarar la Urgencia Manifiesta a fin de conjurar los hechos presentados en la carrera 7 entre calles 3 y 4 del Municipio, dado el informe presentado por la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA – SANTANDER "SIMSACOOP A.P.C." en los cuales señala: "Se recibe información por parte de los habitantes del sector indicando la presencia de contaminación y malos olores, hundimientos, daños y perjuicios en las viviendas a los adultos mayores, por el colapso de una tubería ubicada en los patios o predios de los afectados. Realizada visita de inspección por parte de SIMSACOOP A.P.C., se detecta que:

1. En la carrera 7 entre las calles 4 y 3 la tubería para las aguas servidas es en material de cemento y en diámetro de 8".
2. Algunas de las viviendas no presentan acometidas a la red pública sobre la carrera 7 entre las calles 4 y 3 y están conectadas al tubo de cemento de 12" que pasa por los solares.
3. Realizadas las inspecciones por parte del personal operativo se descarta la presencia de taponamientos en la red pública.
4. Se presume una falta de capacidad de la tubería primaria sobre la Carrera 7 entre 4 y 3, toda vez que aguas arriba esta red, es de mayor diámetro, generándose cuello de botella.
5. Se emiten comunicados a los usuarios del sector para que realicen las conexiones domiciliarias sobre la carrera 7 entre las calles 4 y 3 y se suspenda el servicio sobre la tubería que atraviesa los solares.

Dada esta situación el Municipio de Simacota procedió mediante Decreto 037 del 7 de junio de 2024 a declarar la urgencia manifiesta para conjurar la situación de riesgo y salubridad presentada en el carrara 7 entre calle 3 y 4 del municipio de Simacota y con ello se puedan adquirir el suministro de bienes y servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, necesarios para conjurar la situación presentada. En este sentido, se debe realizar de manera prioritaria la intervención justificando de manera directa la necesidad de controlar la problemática de salubridad presentada con el alcantarillado del sector de la carrera séptima entre calle 3 y 4 del Municipio de Simacota –Santander.

El presente informe tiene como objetivo relacionar las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el área técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y seguridad industrial que se ha llevado a cabo por CESPETROL LTDA EN RENOVACIÓN durante el periodo comprendido entre el dos (02) de julio de 2024 y el ocho (08) de agosto de 2024, evidenciando el avance físico, económico y técnico del proyecto.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto denominado “REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO DE LA VÍA URBANA LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER”, se encuentra ubicado en el municipio de Simacota, departamento de Santander.

Simacota es un municipio colombiano, el tercero en extensión del departamento de Santander, y forma parte de la Provincia Comunera. Cuenta aproximadamente con 8.324 habitantes, su economía tiene vocación agropecuaria debido a la calidad de los suelos y la topografía del terreno, cultivándose principalmente café y yuca, seguido de la caña de azúcar, plátano, maíz, frutales, tomate, cítricos y millo. También explota la ganadería bovina y finalmente una pequeña proporción de producción piscícola en el territorio. La cabecera municipal se encuentra al 134 Kms de la capital Santandereana, Bucaramanga, de los cuales 120 Kms hacen parte de la red vial principal del departamento y 14 Kms de vía pavimentada que lo comunican con el Socorro. El casco urbano se encuentra a 3 horas de Bucaramanga y a 5 horas de Barrancabermeja.

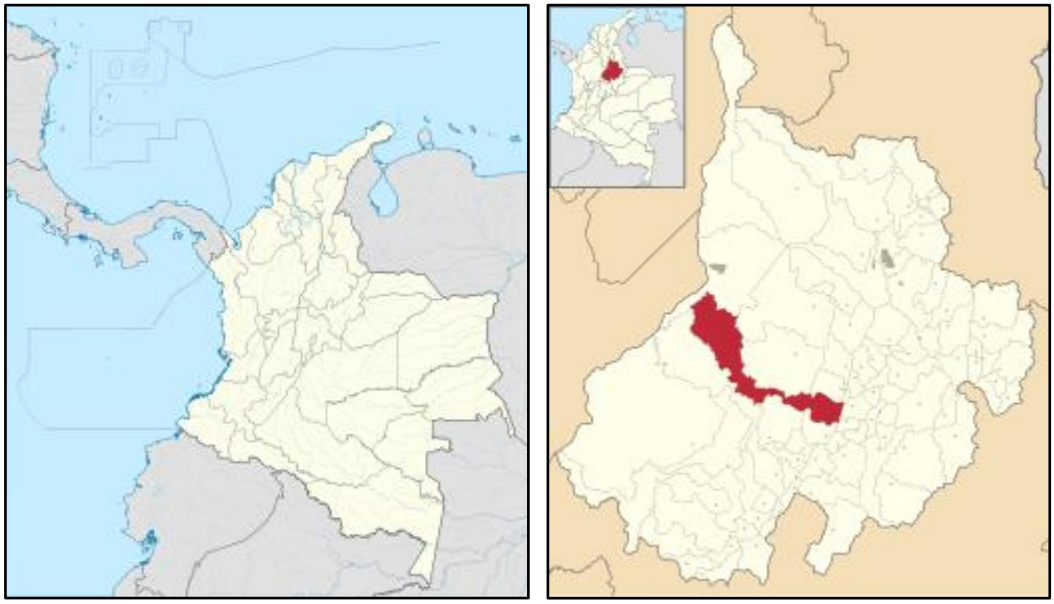


Figura 1. Mapa de Santander y ubicación del proyecto en Simacota

2.2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO

La alcaldía Municipal de Simacota, suscribió el contrato de obra pública CUM-099-2024, con CESPETROL LTDA en renovación, para la ejecución del "REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y RED DE ACUEDUCTO DE LA VÍA URBANA LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DECLARADA MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER", con lo cual se mitiga la problemática de la vía en épocas de invierno y poder brindar una vía en óptimas condiciones para brindar un servicio prioritario y atender las necesidades de estas comunidades, que generalmente se motiva en la búsqueda de una mejor condición de vida, igualmente se establece las condiciones a futuro para la prestación de los servicios básicos en el sector rural de Municipio.

El tiempo de ejecución del Contrato de Obra Pública CUM-099-2024 está estimado en dos (02) meses a partir de la firma del acta de inicio.

2.2.1. Ficha técnica del contrato

ENTIDAD CONTRATANTE	Municipio de Simacota
CONTRATO DE OBRA NO.	Contrato de obra pública CUM-099-2024
OBJETO	Mejoramiento de vía terciaria mediante la construcción de pavimento con placa huella en la vía que conduce del centro poblado de Puerto Pinzón al sector veredal de la arenosa, en el municipio de Puerto Boyacá departamento de Boyacá en el marco del programa de Colombia rural convenio interadministrativo no. 2042 de 2021
CONTRATISTA	CESPETROL LTDA en Reorganización
NIT	900.152.349 - 1
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Cuatrocientos ochenta y cuatro millones seiscientos veintiséis mil novecientos dos pesos con ochenta y cinco centavos M/CTE ($484.626.902,85)
VALOR ADICIÓN NO.	N/A
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	Seiscientos sesenta y tres millones doscientos treinta y dos mil novecientos noventa y dos pesos ochenta y siete mil cuatrocientos setenta y tres pesos M/CTE ($663.232.992)
VALOR DEL ANTICIPO (0%)	N/A
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	24-00845

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	24-00426
PLAZO INICIAL	Dos (02) meses
FECHA DE INICIO:	02 de julio de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL	02 de septiembre de 2024
MODIFICACIÓN No. 1	18 de julio de 2024
REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA	Oscar Fredy Mantilla 3113296388 Cespetrolltda@hotmail.com
DIRECTOR DE OBRA	Fabian Pérez Rey 3115993934 Cespetrolltda@hotmail.com

2.2.2. Fichas de pólizas generadas

ACTA DE INICIO				
ASEGURADORA	Seguros del estado S.A			
TIPO DE AMPARO	**PÓLIZA No.**	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del contrato	NB-100329387 Anexo 2	02/07/2024	01/09/2029	$96.925.380,57
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	NB-100329387 Anexo 2	02/07/2024	01/09/2027	$24.231.345,14
Estabilidad y Calidad de obra	NB-100329387 Anexo 2	01/09/2024	01/09/2029	$96.925.380,57
Responsabilidad civil	NB-100082862 Anexo 2	19/06/2024	19/08/2027	$260.000.000,00

2.2.3. Relación de personal del contratista

NOMBRE COMPLETO	**CEDULA**	**CARGO**
Harvey Julián Caballero Martínez	1.095.833.464	Ingeniero residente
Luis Alfonso Alcántara Luque	5.759.313	Conductor
Eliseo Calderón Mantilla	1.101.688.943	Operador
Norman Páez	12.457.313	Maestro
Nilson García Quiroga	91.107.023	Auxiliar obra
Jesús Vesga Monsalve	5.758.377	Auxiliar obra
Robert Felipe León Vesga	1.101.320.712	Auxiliar obra

Ricardo Calderón Niño	1.101.320.769	Auxiliar obra
Saul Alberto Gómez Luque	1.006.720.567	Auxiliar obra
Jean Piero Camacho Vesga	1.007.592.439	Auxiliar obra
Moisés Arguello Arguello	5.759.072	Auxiliar obra

2.2.4. Relación de maquinaria y equipos del contratista

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
Retroexcavadora	Caterpillar 420E 2006	
Volqueta	Internacional 4300SBA 2014	7 m3

2.3. ALCANCE

El contrato de Obra Pública CUM-099-2024, comprende la construcción de las siguientes obras:

- El mejoramiento del suelo por medio de subrasante con rajón y sub base granular.
- El retiro y colocación de piedra Barichara.
- Reposición de redes de acueducto y alcantarillado.
- Construcción de dos (02) pozo de inspección.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

5.2.1. Actividades técnicas

Durante el periodo comprendido entre el 02 de julio al 08 de agosto de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades de obra:

CAPÍTULO	SECCIÓN 1 – ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ITEM	Localización y replanteo de vías
DESCRIPCIÓN	
El Contratista con uso de instrumentos topográficos de precisión levantará de acuerdo a la disposición del proyecto, todos los elementos que se encuentra.	
Cantidad ejecutada: 841,10 m2	
REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
CAPÍTULO	SECCIÓN 1 – ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ITEM	Retiro de piedra labor
DESCRIPCIÓN	
Se entiende por el retiro mecánico de la piedra labor existente en el sitio a ejecutar; la cual se acopiará para su posible reutilización.	
Cantidad ejecutada: 566,00 m2	
REGISTRO FOTOGRAFICO	
	

CAPÍTULO	SECCIÓN 1 – ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ITEM	Excavación mecánica en material común (incluye retiro de material 5km)
DESCRIPCIÓN	
Se realizará excavación mecánica del área a intervenir, para el ‘’cajoneo’’ el cual contendrá el mejoramiento de suelo existente. El material de dicha excavación se dispondrá en el botadero autorizado.	
Cantidad ejecutada: 126,00 m3	
REGISTRO FOTOGRAFICO	
CAPÍTULO	SECCIÓN 1 – ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ITEM	Mejoramiento de la subrasante con rajón
DESCRIPCIÓN	
Después de realizado el cajeo se instalará material con rajón para el mejoramiento de la subrasante, el cual será compactado para asegurar el asentamiento del material.	
Cantidad ejecutada: 54,00 m3	
REGISTRO FOTOGRAFICO	
CAPÍTULO	SECCIÓN 1 – ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ITEM	Suministro e instalación de material seleccionado (incluye compactación mecánica)
DESCRIPCIÓN	
Consiste en el relleno con materiales no clasificados provenientes de las canteras de material pétreo, siempre que hayan sido aprobados por la interventoría.	
Cantidad ejecutada: 285,77 m3	
REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
CAPÍTULO	SECCIÓN 1 – ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ITEM	Suministro e instalación de geotextil tejido 2400
DESCRIPCIÓN	

Este trabajo consiste en el suministro e instalación de geotextil en toda el área a intervenir, ayudando a la filtración del agua lluvia en la vía.	
Cantidad ejecutada: 180,00 m2	
REGISTRO FOTOGRAFICO	
CAPÍTULO	SECCIÓN 1 – ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ITEM	Entibado
DESCRIPCIÓN	
Consiste en la utilizacion de madera de calibre grueso para sostener partes de las excavaciones que no se encuentran muy estables.	
Cantidad ejecutada: 1,00 glb	
REGISTRO FOTOGRAFICO	
 	
CAPÍTULO	SECCIÓN 2 – REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ITEM	Localización y replanteo de redes
DESCRIPCIÓN	
El Contratista con uso de instrumentos topográficos de precisión trazará de acuerdo a la disposición del proyecto, todas las redes que serán intervenidos.	
Cantidad ejecutada: 367,37 m2	
REGISTRO FOTOGRAFICO	
 	

CAPÍTULO	SECCIÓN 2 – REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ITEM	Excavación mecánica en material común (incluye retiro de material 5km)

DESCRIPCIÓN

Esta actividad consistió en la excavación mecánica utilizando retro excavadora, necesarias para las fundiciones de las estructuras, de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos u aprobados por el interventor.

Cantidad ejecutada: 397,73 m3

REGISTRO FOTOGRAFICO





CAPÍTULO	SECCIÓN 2 – REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ITEM	Excavación manual en material común (incluye retiro de escombros 5km)

DESCRIPCIÓN

Se entiende por excavación manual, el remover o quitar volúmenes de tierra u otros materiales empleando personal calificado para este trabajo, con la finalidad de conformar espacios que no requieran el uso de maquinaria especializada y sea de difícil acceso para estas

Cantidad ejecutada: 174,87 m3

REGISTRO FOTOGRAFICO





CAPÍTULO	SECCIÓN 2 – REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ITEM	Suministro e instalación de material de atraque para tubería (arena y/o gravilla)
DESCRIPCIÓN	
Base en arena para encamado de tubería Una vez realizada la excavación, el fondo de la zanja debe nivelarse de tal forma que se garantice la pendiente de diseño, así como para que la tubería quede apoyada y debidamente soportada en toda su longitud.	
Cantidad ejecutada: 124,65 m3	
REGISTRO FOTOGRAFICO	
 	
CAPÍTULO	SECCIÓN 2 – REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ITEM	Suministro e instalación de silla yee 8x6"
DESCRIPCIÓN	
Los accesorios que se utilizan en la conexión de la domiciliaria con la red matriz se usarán eventualmente en algunas viviendas que no tengan definido el servicio de alcantarillado sanitario.	
Cantidad ejecutada: 5,00 und	
REGISTRO FOTOGRAFICO	
 	
CAPÍTULO	SECCIÓN 2 – REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ITEM	Suministro e instalación de tubería Novafort d = 6" domiciliarias

DESCRIPCIÓN	
Este trabajo consiste en el suministro y colocación de tubería de PVC, para las conexiones a cabezales u obras existentes o nuevas, y la remoción y disposición de los materiales sobrantes.	
Cantidad ejecutada: 80,00 ml	
REGISTRO FOTOGRAFICO	
 	
CAPÍTULO	SECCIÓN 2 – REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ITEM	Suministro e instalación de tubería Novafort d = 12" sanitaria
DESCRIPCIÓN	
Este trabajo consiste en el suministro y colocación de tubería de PVC, para reposición de la red principal de aguas sanitarias existentes.	
Cantidad ejecutada: 86,17 ml	
REGISTRO FOTOGRAFICO	
 	
CAPÍTULO	SECCIÓN 2 – REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ITEM	Suministro e instalación de silla yee 12x6"
DESCRIPCIÓN	
Los accesorios que se utilizan en la conexión de la domiciliaria con la red matriz se usarán eventualmente en algunas viviendas que no tengan definido el servicio de alcantarillado sanitario.	

Cantidad ejecutada: 13,00 und	
REGISTRO FOTOGRAFICO	
 	
CAPÍTULO	SECCIÓN 2 – REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ITEM	Caja de inspección 0.60x0.6x0.6m tolete común
DESCRIPCIÓN	
Las cajas de 0,60*0,60 son cajas domiciliaría que se usarán eventualmente en algunas viviendas que no tengan definido el servicio de alcantarillado sanitario Se construirán de acuerdo a los planos, con muros en ladrillo tolete de espesor 0,12m, con revoque interno 1:3 de 2 cm de espesor, base en concreto del espesor y tipo señalado en los planos y tapa en concreto reforzado.	
Cantidad ejecutada: 18,00 und	
REGISTRO FOTOGRAFICO	
 	
CAPÍTULO	SECCIÓN 2 – REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ITEM	Construcción de pozo inspección h = 2.20 m - h=2.80 m (inc. Tapa hf)
DESCRIPCIÓN	
Los pozos de inspección de 120 mm 2.20 - 2.80 m, serán construidos en los ejes de las intersecciones de las calles y puntos que indique en los planos, uniendo las tuberías de la red de alcantarillado.	
Cantidad ejecutada: 2,00 und	

REGISTRO FOTOGRAFICO	
 	
CAPÍTULO	SECCIÓN 2 – REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ITEM	Suministro e instalación de tubería Novafort d = 12” - para conducción de alcantarillado pluvial (incluye accesorios)
DESCRIPCIÓN	
Este trabajo consiste en el suministro y colocación de tubería de PVC, para reposición de la red principal de aguas pluviales existentes.	
Cantidad ejecutada: 86,00 ml	
REGISTRO FOTOGRAFICO	
 	
CAPÍTULO	SECCIÓN 2 – REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ITEM	Concreto resistencia 14 Mpa (atraque de tubería)
DESCRIPCIÓN	
Esta actividad comprende a la fabricación in situ e instalación de concreto de 14 Mpa para las estructuras del atraque de la tubería y las bases de los encoles y descoles en las cuales servirán para desviar el caudal de agua lluvia evitando el deterioro de la vía.	
Cantidad ejecutada: 1,40 m3	
REGISTRO FOTOGRAFICO	






CAPÍTULO	SECCIÓN 2 – REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ITEM	Suministro e instalación de tubería Novafort d=8" sanitaria

DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en el suministro y colocación de tubería de PVC, para reposición de la red principal de aguas sanitarias existentes.

Cantidad ejecutada: 52,00 ml

REGISTRO FOTOGRAFICO

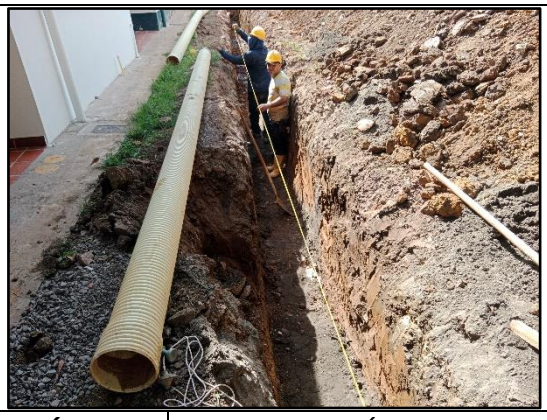



CAPÍTULO	SECCIÓN 2 – REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ITEM	Relleno compactado producto de la excavación

DESCRIPCIÓN

se refiere al relleno con materiales extraídos de las excavaciones, de acuerdo con los alineamientos, las dimensiones, las pendientes y los perfiles indicados en los planos. Los materiales utilizados en la construcción de rellenos deben ser de tal naturaleza que permitan la compactación y la conformación de capas firmes y bien unidas. Deben estar exentos de impurezas, de desperdicios, de raíces y de materiales orgánicos o perecederos.
Cantidad ejecutada: 304,14 m3
REGISTRO FOTOGRAFICO
 

CAPÍTULO	SECCIÓN 2 – REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ITEM	Construcción de pozo inspección h = 0.00 m - h=1.5 m (inc. Tapa hf)

DESCRIPCIÓN
Los pozos de inspección de 120 mm 0.00 - 1.50 m, serán construidos en los ejes de las intersecciones de las calles y puntos que indique en los planos, uniendo las tuberías de la red de alcantarillado.
Cantidad ejecutada: 1,00 und
REGISTRO FOTOGRAFICO

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el presente período el avance ejecutado corresponde a $ 296.016.670,80, con un porcentaje de avance del 61,08%.
- Durante el desarrollo de la obra, se da cumplimiento a las especificaciones técnicas de las actividades ejecutadas, siguiendo los planos de diseño y recomendaciones de la interventoría.

CESPETROL
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

AFILIACION Y PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE PROFESIONALES, TRABAJADORES DE NOMINA Y TRABAJADORES DE SUBCONTRATISTAS CON TABLA DE RESUMEN DE PLANILLAS DE SEGURIDAD IINCLUIDA EN EL INFORME

6019474
cespetrolltda@hotmail.com
administrativo@cespetrol.com
www.cespetrol.com

CALLE 61 #21-15 BARRIO EL PARNASO
BARRANCABERMEJA - SANTANDER

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
NORSOK S-WA-006:2018
BUREAU VERITAS
Certification

CESPETROL
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

JUNIO

6019474
cespetrolltda@hotmail.com
administrativo@cespetrol.com
www.cespetrol.com

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
NORSOK S-WA-006:2018
BUREAU VERITAS
Certification

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900152349	1	CESPETROL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CESPETROL LTDA	CLL 61 N 21-15	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6019474	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	823966275	9471030599	E	2024/07/11	2024/08/05	BANCO DE BOGOTA	25	$1,717,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CESPETROL LTDA (8 Afiliados)																						$5,440,004	$870,800			$5,440,004	$218,000			$5,440,004	$218,000			$5,440,004		$378,900		$0	$0		$1,685,700
Centro de Trabajo: SIMACOTA EMERGENCIA (8 Afiliados)																						$5,440,004	$870,800			$5,440,004	$218,000			$5,440,004	$218,000			$5,440,004		$378,900		$0	$0		$1,685,700
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (8 Afiliados)																						$5,440,004	$870,800			$5,440,004	$218,000			$5,440,004	$218,000			$5,440,004		$378,900		$0	$0		$1,685,700
1	CC	5759313	ALCANTARA LUIS	X																230301	14	$1,213,334	$194,200	EPS042	14	$1,213,334	$48,600	CCF40	14	$1,213,334	$48,600	14-7	14	$1,213,334	6.960%	$84,500	14	$0	$0	Si	$375,900
2	CC	1095833464	CABALLERO HARVEY	X																230301	14	$933,334	$149,400	EPS037	14	$933,334	$37,400	CCF40	14	$933,334	$37,400	14-7	14	$933,334	6.960%	$65,000	14	$0	$0	Si	$289,200
3	CC	1101688943	CALDERON ELISEO	X																230301	14	$1,213,334	$194,200	EPS037	14	$1,213,334	$48,600	CCF40	14	$1,213,334	$48,600	14-7	14	$1,213,334	6.960%	$84,500	14	$0	$0	Si	$375,900
4	CC	1101320769	CALDERON RICARDO	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS042	11	$476,667	$19,100	CCF40	11	$476,667	$19,100	14-7	11	$476,667	6.960%	$33,200	11	$0	$0	Si	$147,700
5	CC	91107023	GARCIA NILSON	X																25-14	11	$476,667	$76,300	EPS042	11	$476,667	$19,100	CCF40	11	$476,667	$19,100	14-7	11	$476,667	6.960%	$33,200	11	$0	$0	Si	$147,700
6	CC	1101320712	LEON ROBERT	X																230201	11	$476,667	$76,300	EPS042	11	$476,667	$19,100	CCF40	11	$476,667	$19,100	14-7	11	$476,667	6.960%	$33,200	11	$0	$0	Si	$147,700
7	CC	12457313	PAEZ NORMAN	X																230301	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF40	4	$173,334	$7,000	14-7	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	Si	$53,900
8	CC	5758377	VESGA JESUS	X																25-14	11	$476,667	$76,300	EPS042	11	$476,667	$19,100	CCF40	11	$476,667	$19,100	14-7	11	$476,667	6.960%	$33,200	11	$0	$0	Si	$147,700
Total			**Afiliados(8)**																			$5,440,004	$870,800			$5,440,004	$218,000			$5,440,004	$218,000			$5,440,004		$378,900		$0	$0		$1,685,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900152349	1	CESPETROL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CESPETROL LTDA	CLL 61 N 21-15	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6019474	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	823966275	9471030599	E	2024/07/11	2024/08/05	BANCO DE BOGOTA	25	$1,717,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$870,800	$16,500	$0	$887,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$152,600	$2,900	$0	$155,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$641,900	$12,100	$0	$654,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$76,300	$1,500	$0	$77,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$378,900	$7,200	$0	$386,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	8	$378,900	$7,200	$0	$386,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$218,000	$4,100	$0	$222,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	8	$218,000	$4,100	$0	$222,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$218,000	$4,200	$0	$222,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	5	$125,000	$2,400	$0	$127,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$93,000	$1,800	$0	$94,800
TOTAL				**8**	**$1,685,700**	**$32,000**	**$0**	**$1,717,700**

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13873157		PEREZ REY FABIAN OSWALDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 46 5 14	BUCARAMANGA-SANTANDER	6596806	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	833854514	9470991860	I	2024/07/15	2024/08/09	BANCOLOMBIA	25	$409,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	13873157	PEREZ REY FABIAN OSWALDO	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No				X	2024/06/30																							
Total		**Afiliados(1)**																																				

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13873157		PEREZ REY FABIAN OSWALDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 46 5 14	BUCARAMANGA-SANTANDER	6596806	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	833854514	9470991860	I	2024/07/15	2024/08/09	BANCOLOMBIA	25	$409,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$3,900	$0	$211,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$3,900	$0	$211,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$600	$0	$32,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$31,700	$600	$0	$32,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$3,100	$0	$165,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$3,100	$0	$165,600
TOTAL				1	$402,200	$7,600	$0	$409,800

CESPETROL
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

JULIO

6019474

cespetrolltda@hotmail.com
administrativo@cespetrol.com

www.cespetrol.com

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
NORSOK S-WA-006:2018
BUREAU VERITAS
Certification

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900152349	1	CESPETROL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CESPETROL LTDA	CLL 61 N 21-15	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6019474	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	849792601	9471378519	E	2024/08/13	2024/08/16	BANCO DE BOGOTA	3	$4,964,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CESPETROL LTDA (11 Afiliados)																						$15,996,668	$2,559,600			$15,996,668	$640,000			$15,996,668	$640,000			$15,996,668		$1,113,700		$0	$0		$4,953,300
Centro de Trabajo: SIMACOTA EMERGENCIA (11 Afiliados)																						$15,996,668	$2,559,600			$15,996,668	$640,000			$15,996,668	$640,000			$15,996,668		$1,113,700		$0	$0		$4,953,300
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (11 Afiliados)																						$15,996,668	$2,559,600			$15,996,668	$640,000			$15,996,668	$640,000			$15,996,668		$1,113,700		$0	$0		$4,953,300
1	CC	5759313	ALCANTARA LUIS																		23030 1	30	$2,600,000	$416,000	ESSC24	30	$2,600,000	$104,000	CCF40	30	$2,600,000	$104,000	14-7	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	Si	$805,000
2	CC	5759072	ARGUELLO MOISES	X																	25-14	9	$390,000	$62,400	ESSC24	9	$390,000	$15,600	CCF40	9	$390,000	$15,600	14-7	9	$390,000	6.960%	$27,200	9	$0	$0	Si	$120,800
3	CC	1095833464	CABALLERO HARVEY																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF40	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
4	CC	1101688943	CALDERON ELISEO																		23030 1	30	$2,600,000	$416,000	EPS037	30	$2,600,000	$104,000	CCF40	30	$2,600,000	$104,000	14-7	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	Si	$805,000
5	CC	1101320769	CALDERON RICARDO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
6	CC	1007592439	CAMACHO JEAN	X																	23030 1	22	$953,334	$152,600	ESSC24	22	$953,334	$38,200	CCF40	22	$953,334	$38,200	14-7	22	$953,334	6.960%	$66,400	22	$0	$0	Si	$295,400
7	CC	91107023	GARCIA NILSON																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
8	CC	1006720567	GOMEZ SAUL	X																	23030 1	22	$953,334	$152,600	EPS042	22	$953,334	$38,200	CCF40	22	$953,334	$38,200	14-7	22	$953,334	6.960%	$66,400	22	$0	$0	Si	$295,400
9	CC	1101320712	LEON ROBERT																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
10	CC	12457313	PAEZ NORMAN																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
11	CC	5758377	VESGA JESUS																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total			**Afiliados(11)**																				$15,996,668	$2,559,600			$15,996,668	$640,000			$15,996,668	$640,000			$15,996,668		$1,113,700		$0	$0		$4,953,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900152349	1	CESPETROL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CESPETROL LTDA	CLL 61 N 21-15	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6019474	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	849792601	9471378519	E	2024/08/13	2024/08/16	BANCO DE BOGOTA	3	$4,964,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$2,559,600	$5,800	$0	$2,565,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$478,400	$1,100	$0	$479,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,873,200	$4,200	$0	$1,877,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$500	$0	$208,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,113,700	$2,500	$0	$1,116,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	11	$1,113,700	$2,500	$0	$1,116,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$640,000	$1,500	$0	$641,500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	11	$640,000	$1,500	$0	$641,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$640,000	$1,600	$0	$641,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$38,200	$100	$0	$38,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	$365,800	$900	$0	$366,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$236,000	$600	$0	$236,600
TOTAL				11	$4,953,300	$11,400	$0	$4,964,700

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13873157		PEREZ REY FABIAN OSWALDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 46 5 14	BUCARAMANGA-SANTANDER	6596806	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	833905187	9470991834	I	2024/08/15	2024/08/09	BANCOLOMBIA	0	$402,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13873157		PEREZ REY FABIAN OSWALDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 46 5 14	BUCARAMANGA-SANTANDER	6596806	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	833905187	9470991834	I	2024/08/15	2024/08/09	BANCOLOMBIA	0	$402,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$402,200	$0	$0	$402,200

CESPETROL
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

CERTIFICACIÓN CUENTA BANCARIA

6019474
cespetrolltda@hotmail.com
administrativo@cespetrol.com
www.cespetrol.com
CALLE 61 #21-15 BARRIO EL PARNASO
BARRANCABERMEJA - SANTANDER

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
NORSOK S-WA-006:2018
BUREAU VERITAS
Certification

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CESPETROL LTDA EN REORGANIZACION identificado(a) con NIT 9001523491 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 168495265 desde el 6 de Enero de 2022, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el □□ de □□o□□ de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



_____
OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota
