Neiva, 02 de agosto de 2024 **Int-Nechí-099**

Radicado
20240104556 97
04/10/2024 12:12

Señores
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCURA FÍSICA
VANESSA BETANCUR MARTINEZ
Supervisora del contrato
Medellín, Antioquia

Referencia: Contrato de obra No. 4600016558 MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO – NECHÍ, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Contrato de Interventoría No. 4600016527 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO – NECHÍ, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Asunto: Radicación informe mensual de interventoría No. 7 – junio 2024.

Cordial saludo,

Por medio del presente y de manera atenta, nos permitimos hacer entrega del informe mensual de interventoría No. 7 correspondiente al mes de junio 2024, para su respectiva revisión y eventual aprobación.

Atentamente,

JAVIER BARRERO MOSSOS.
Representante legal
Sociedad Técnica Sota Ltda.

ARCHIVO SIF
2024 OCT 4 14:54:25

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

SOTA LTDA.
SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 07
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4600016527 de 2023
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO – NECHÍ, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTEMENTO DE ANTIOQUIA"





NECHÍ, ANTIOQUIA

2024

Oficina Principal: Calle 12 No. 5-07 Of. 302 Neiva - Huila Tel: (8) 871 04 81 – Fax: (8) 871 19 10
Email: gobernacionantioquia.sota@gmail.com

CONTROLES DE ELABORACIÓN

Firma			
Nombre	**ELKIN ROJAS ANAYA**	**JUAN CARLOS LEÓN**	**VANESSA BETANCOUR**
Cargo	Residente de Interventoría	Director de Interventoría	Supervisora
	Elaboró	Revisó	Aprobó

El presente informe fue elaborado para cumplir con las disposiciones establecidas en el Proyecto "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25-CAUCASIA) COLORADO-NECHI, ETAPA 1 EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5

2. LOCALIZACIÓN. 7
2.1. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 9
2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO. 11
2.3. NECESIDADES IDENTIFICADAS EN CORREDORES VIALES 17

3. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA 19
3.1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 19
3.2. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20

4. SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 22
4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 22
4.2. DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 22
4.3. DIFICULTADES PREVISTAS EN LA MATRIZ DE RIESGOS 23
4.4. CUADRO RELACIONANDO LAS ACTAS DE PAGO PARCIALES, ACUMULADOS Y SALDOS POR EJECUTAR 23
4.5. CONTROL DEL PRESUPUESTO E INVERSIÓN EN CADA FRENTE DE TRABAJO Y TOTAL 23
4.6. CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y RECURSOS 25
4.7. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 26
4.8. CONTROL DE ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 27
4.9. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 27
4.10. INFORMACIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL 28
4.11. CONTROL DE APORTES LEGALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 28
4.12. RESUMEN DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES 28
4.13. RESULTADO DE ENSAYOS Y PRUEBAS 32
4.14. SEGUIMIENTO GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA 33
4.15. PRE-ACTAS Y ACTAS DE PAGO 36
4.16. CUADRO DE CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA CUMULADAS 36

4.17. ESTADO AMBIENTAL 37
4.18. ESTADO SOCIAL 37
4.19. ESTADO SST 38
4.20. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES POR SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORIA 38
4.21. REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES 39
4.22. INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA 39
4.23. REGISTRO FOTOGRÁFICO 39
4.24. ACTAS DE COMITÉS DE OBRA 39
4.25. INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA 40
4.26. BITÁCORA 40

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 41
5.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL CONTRATO 41
5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 41
5.3. RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 43
5.4. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 43
5.5. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 43
5.6. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 44
5.7. SEGUIMIENTO CORRESPONDENCIA 45

6. CONCLUSIONES GENERALES 46
6.1. ANÁLISIS, COMENTARIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS 46
6.2. RECOMENDACIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y/O FINANCIERAS 46

7. ANEXOS 47

1. INTRODUCCIÓN

La Gobernación de Antioquia, con el fin de mejorar las condiciones de transitabilidad de las vías que hacen parte de la subregión del Bajo Cauca y por intermedio de la secretaria de infraestructura física mediante licitación pública LIC-15027, adjudicó el contrato de obra 4600016558 de 2023, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) – COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA" a CONSORCIO IC-ING 15027 con NIT No. 901.756.732-6, por un valor de TRES MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/L ($3.056.491.448). Y UN A.I.U. DE VEINTISIETE PUNTO OCHENTA Y DOS POR CIENTO (A.I.U.27.82%), con un plazo inicial de ejecución de 2,5 meses sin sobrepasar el 25 de diciembre de 2023.

Mediante concurso de méritos No. CON-15365 la secretaria de infraestructura física de la Gobernación de Antioquia adjudica el contrato de Interventoría No.4600016527 DE 2023 a SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA, cuyo objeto es realizar la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO – NECHÍ, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", por un valor inicial de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/L ($257.054.643), incluido el IVA del 19% y un Factor Multiplicador del 1.97, con un plazo inicial de ejecución de 2 meses y 22 días sin sobrepasar el 25 de diciembre de 2023.

El 18 de octubre de 2023, se designa a la Ing. Vanessa Betancur Martínez de la oficina de Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, como supervisora del contrato de interventoría No. 4600016527 de 2023 para ejercer seguimiento, control y vigilancia.

En desarrollo de las funciones técnicas, administrativas, ambientales y financieras de la interventoría, se elabora el presente informe que contiene información detallada sobre la ejecución del contrato de obra, en el periodo comprendido entre

01 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024; anexando el registro fotográfico del proceso constructivo de los trabajos que se vienen desarrollando, durante la ejecución del contrato de obra.

2. LOCALIZACIÓN.

El proyecto se encuentra localizado en el departamento de Antioquia, en la zona rural del municipio de Nechí. Tramo de vía colorado – Nechí en el Bajo Cauca. La vía comunica el casco urbano del municipio de Nechí con el corregimiento de Colorado. Esta sirve como vía de acceso y comunicación para los productos y la población de este sector.

La vía CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO - NECHÍ, con código 25AN18, vía que comunica los municipios de Caucasia y Nechí, catalogada como vía de segundo orden, tiene una longitud aproximada a los 65,8 km, de los cuales, de acuerdo al informe de transitabilidad de la red vial a cargo del departamento, la vía se encuentra en tramos pavimentados y tramos de afirmado, en algunos tramos deteriorados y desgastados.

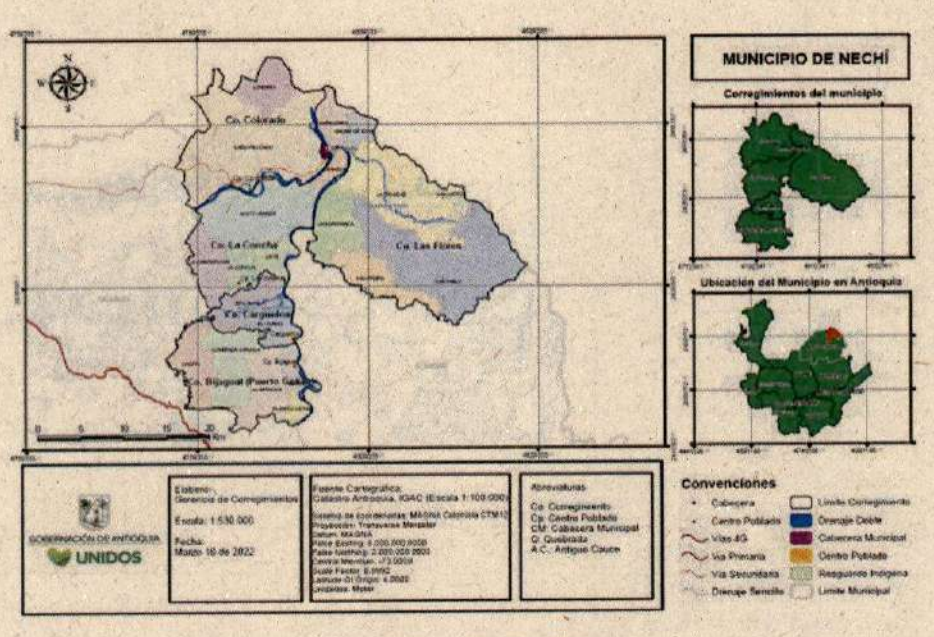


Ilustración 1. Mapa de Nechí
Fuente: Gerencia de Corregimientos – Departamento de Antioquia-Anexo técnico

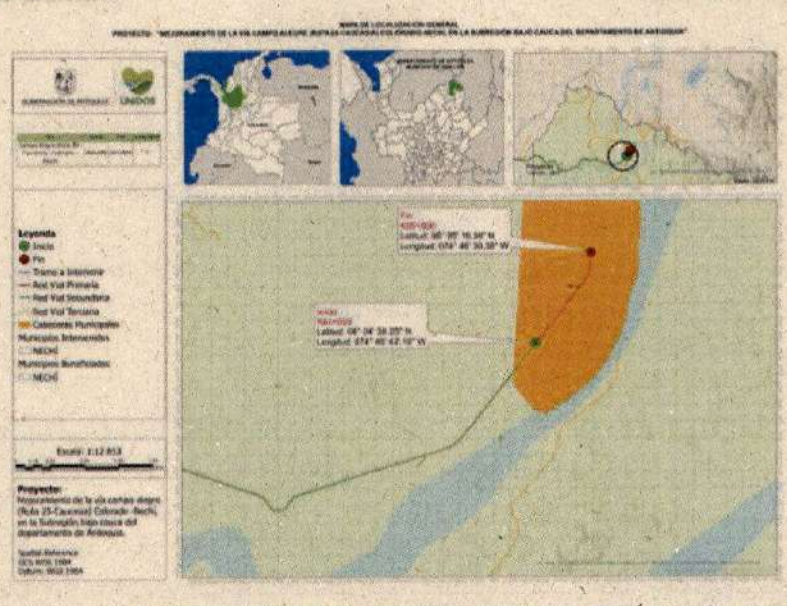


Ilustración 2. Localización de la vía – CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO - NECHÍ, con código 25AN18
Fuente: SIF – Departamento de Antioquia

A continuación, se relaciona la vía priorizada para intervención durante el desarrollo del contrato del Bajo Cauca:

Tabla 1. Vía a Intervenir en Bajo Cauca

Código	Nombre Vía	Longitud Odómetro Municipio km	PR Inicio	PR Fin	Subregión Administrativa	Municipio
25AN18	Campo Alegre (Ruta 25 - Caucasia) - Colorado - Nechí.	5,3	0,0	5,3	Bajo Cauca	CAUCASIA
25AN18	Campo Alegre (Ruta 25 - Caucasia) - Colorado - Nechí.	18,0	5,3	23,3	Dpto. Córdoba	AYAPEL
25AN18	Campo Alegre (Ruta 25 - Caucasia) - Colorado - Nechí.	2,3	23,3	25,6	Bajo Cauca	CAUCASIA
25AN18	Campo Alegre (Ruta 25 - Caucasia) - Colorado - Nechí.	3,8	25,6	29,4	Dpto. Córdoba	AYAPEL
25AN18	Campo Alegre (Ruta 25 - Caucasia) - Colorado - Nechí.	18,0	29,4	47,4	Bajo Cauca	CAUCASIA
25AN18	Campo Alegre (Ruta 25 - Caucasia) - Colorado - Nechí.	18,4	47,4	65,8	Bajo Cauca	NECHI
Total		65,8				

2.1. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

La vía CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO - NECHÍ, con código 25AN18, vía que comunica los municipios de Caucasia y Nechí, catalogada como vía de segundo orden, tiene una longitud aproximada a los 65,8 km, de los cuales, de acuerdo al informe de transitabilidad de la red vial a cargo del departamento, la vía se encuentra en tramos pavimentados y tramos de afirmado, en algunos tramos deteriorados y desgastados.

Los diseños usados para el presente proceso fueron realizados por ESTRUCTURAS, INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S., en desarrollo del contrato 4600007991 de 2018 y contaron con la interventoría de JARQ URBAN ARCHITECTURAL DESIGN S.A.S. conforme al contrato 4600008531 DE 2018, , los cuales hacen parte integral del presente proyecto y se encuentran publicados como anexos del proceso licitatorio, por lo tanto, podrán ser consultados en el portal SECOP II y en la Secretaría de Infraestructura Física – Dirección de Estructuración de Proyectos, ubicada en el Centro Administrativo Departamental "José María Córdova" - La Alpujarra, Calle 42B Número 52- 106, Piso 9, Oficina 910, Medellín – Antioquia.

Como consecuencia de los estudios y diseños mencionados anteriormente, a continuación, se indican los principales aspectos relacionados con las obras actuales y zonas a intervenir:

"El corredor vial entre en corregimiento de Colorado y el municipio de Nechí se desarrolla sobre la llanura inundable, en el que fue necesario, la construcción de grandes terraplenes para levantar la cota de la rasante y así garantizar la funcionalidad de la vía, sin embargo, estos rellenos se encuentran susceptibles a la erosión de la base, debido a la fluctuación de la cota inundable y la falta de estructuras hidráulicas que disminuya la acción de los procesos erosivos sobre la estructura."

"De acuerdo a los análisis de resultados de laboratorio y los apiques y sondeos, se definió que el corredor vial no presenta zonificación y está compuesto principalmente por tres (3) materiales, el superior corresponde al afirmado de la vía, seguido por un limo arcilloso y unas arcillas arenosas de consistencia blanda."

"Dentro de la zona de estudio no se presentan taludes de corte en los costados de la vía, dada la condición topográfica donde se localiza el corredor vial, sin embargo, en la revisión secundaría y durante la visita de campo se identificaron en los rellenos de conformación, sectores críticos que pueden estar afectando la funcionalidad de la vía debido a los procesos erosivos que se presentan en la base de las estructuras de terraplén, ocasionada por la fluctuación de los niveles del rio Cauca."
"El estado general de la mayoría de estructuras no es bueno y/o requiere de mantenimiento, algunas se encuentran colmatadas con material de arrastre o vegetación y otras que estructuralmente se encuentran en malas condiciones..."

"De igual forma, los box Coulvert, identificados en campo, en general no presentan daños estructurales considerables que afecten su funcionamiento, ni tampoco la pérdida de alguno de sus elementos de captación y/o descarga. A pesar de encontrarse vegetación y sedimentos en el fondo de su sección, estas no presentan una cantidad considerable de material por lo que una adecuada limpieza y mantenimiento en general mejoraría su funcionamiento. Basado en lo anterior, este tipo de sección para las condiciones actuales y propuestas para la vía es bastante viable".

El tramo que se pretende mejorar se encuentra en material de afirmado, en regular estado, la vía muestra baches a causa del lavado de la superficie ante la inexistencia de cunetas laterales para la conducción de aguas superficiales dificultando un buen drenaje de la vía, igualmente existen diferentes obras de drenaje las cuales no cumplen con la evacuación de las aguas en razón a que no están funcionando correctamente ya sea por insuficiencia hidráulica, por colmatación o falta de mantenimiento. Igualmente se presenta socavación en algunas partes del terreno. En este tramo de vía no se identifica puntos críticos que dificulten el normal desarrollo de las actividades.

La situación anteriormente mencionada genera aumento en los tiempos de viaje y en los costos de transporte, ocasionando menor oferta y demanda en los productos de la región; así como también, daños frecuentes en los vehículos particulares y de transporte público.



2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.

A continuación, se describen las actividades constructivas a realizar:

Se va a intervenir por medio de un mejoramiento que consta de la excavación, conformación, colocación de una capa de base, con colocación de una geocelda, y una carpeta asfáltica; se construirán estructuras de drenaje longitudinal y transversal como cunetas y box culverts, limpieza y mantenimiento a obras de drenaje seleccionadas, adicionalmente, se realizará la instalación de señalización vial horizontal y vertical, principalmente sobre el corredor vial.

El Constructor es el CONSORCIO IC-ING15027 integrado por ICPB S.A con el 90% Y INGAP S.A.S. con el 10 %, cuyo representante Legal es el Ing. Jorge Iván López.

- **Dimensionamiento y refuerzo del pavimento en asfalto**

Para el proyecto de La vía CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO - NECHÍ, se utilizará el pavimento en asfalto de acuerdo a los diseños.

Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento c.r.l.- 1 o c.r.l. - 0 para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del invias. incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. incluye limpieza de superficie y riego inicial con carrotanque.

Para esta actividad rige lo estipulado en el Artículo 411-22 (Suministro de emulsión asfáltica catiónica) de las Especificaciones Generales de Construcción de Carretera 2013 del INVIAS. Esta especificación no tiene modificaciones

- **Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa mdc 19 que cumpla con el artículo 450-13 de la norma invias 2013. incluye: colocación con terminadora (finisher) y compactación. no incluye imprimación, ni transporte de materiales, que se pagarán en su respectivo ítem. su medida de pago será metro cúbico compacto medido en sitio.**

para esta actividad rige lo estipulado en los artículos 400-13 (disposiciones generales para la ejecución de riegos de imprimación, liga y curado, tratamientos superficiales, sellos de arena asfalto, lechadas asfálticas, mezclas asfálticas en frío y en caliente y reciclado de pavimentos asfalticos) y 450-13 (mezclas asfálticas en caliente de gradación continua (concreto asfáltico)), de las especificaciones generales de construcción de carretera 2013 del invias.

- **Concreto clase f (14 mpa). solados de e=0.05 m**

Para esta actividad rige lo estipulado en el Artículo 630-13 (Concreto estructural), de las Especificaciones Generales de Construcción de Carretera 2013 del INVIAS. El concreto simple para solado tendrá una resistencia mínima a la compresión a los 28 días de 14 MPa. Este solado de limpieza tendrá un espesor de cinco centímetros (5 cm) y se instalará sobre el fondo limpio y nivelado de la excavación, previa verificación y aprobación de la Interventoría, tanto de su cota y dimensiones en planta como de su idoneidad para atender la capacidad portante prevista en los diseños.

- **Concreto clase d (21 mpa). cunetas.**

Para esta actividad rige lo estipulado en el Artículo 630-13 (Concreto estructural) y el Artículo 671-22 (Cunetas revestidas en concreto) de las Especificaciones Generales de Construcción de Carretera 2013 y 2022 del INVIAS. El concreto para cuentas tendrá una resistencia mínima a la compresión a los 28 días de 21 MPa.

- **Concreto clase d (28 mpa). muros, disipadores y aletas**

Para esta actividad rige lo estipulado en el Artículo 630 (Concreto estructural), de las Especificaciones Generales de Construcción de Carretera 2013 del INVIAS. El concreto reforzado para la los muros, disipadores, aletas y estribos tendrá una resistencia mínima a la compresión a los 28 días de 28 MPa.

- **Concreto clase d (28 mpa). box coulvert-losa inferior**

Para esta actividad rige lo estipulado en el Artículo 630 (Concreto estructural), de las Especificaciones Generales de Construcción de Carretera 2013 del INVIAS. El concreto reforzado para la los muros, disipadores, aletas y estribos tendrá una resistencia mínima a la compresión a los 28 días de 28 MPa.

- **Concreto clase d (28 mpa). box coulvert-losa superior y muros laterales**

Para esta actividad rige lo estipulado en el Artículo 630 (Concreto estructural), de las Especificaciones Generales de Construcción de Carretera 2013 del INVIAS. El concreto reforzado para la los muros, disipadores, aletas y estribos tendrá una resistencia mínima a la compresión a los 28 días de 28 MPa.

- **Clases de base granular**

Se definen tres clases de base granular en función de la calidad de los agregados (clases A, B y C), como se indica en la Tabla 330 ł 2. Los documentos del proyecto deben defnir la clase de base granular por utilizar, así mismo, defnir el tipo de granulometría que se debe emplear. Si los documentos del proyecto no indican otra cosa, las clases de base granular se deben usar como se indica en la Tabla 330 — 1, en función del nivel de tránsito del proyecto.

Tabla 330-1

Tabla 330 — 1. Uso típico de las diferentes clases de base granular

Clase de base granular	Nivel de tránsito
Clase A	NT3
Clase B	NT2
Clase C	NT1

- **Requisitos de calidad para los agregados Los agregados**

para la construcción de la base granular deben satisfacer los requisitos de calidad indicados en la Tabla 330 · 2. Además, se deben ajustar a alguna de las franjas granulométricas que se muestran en la Tabla 330 · 3; salvo que los documentos del proyecto indiquen otra cosa, para niveles de tránsito NT3 se deben usar bases granulares de gradación gruesa. Cuando los materiales de base no cumplan los requisitos de la Tabla 330 · 2, estos pueden ser tratados con cemento para mejorar sus propiedades. Las recomendaciones de construcción para tener en cuenta son las establecidas en el artículo 350, Materiales granulares tratados con cemento como capa estructural.

Tabla 330-2

Tabla 330 — 2. Requisitos de los agregados para bases granulares

Característica	Norma de ensayo INV	Base granular		
		Clase A	Clase B	Clase C
Dureza (D)				
Desgaste en la máquina de Los Ángeles (Granulometría A), máximo (%): - 500 revoluciones - 100 revoluciones	E-218	 35 7	 40 8	 40 8
Degradación por abrasión en el equipo Micro-Deval, máximo (%).	E-238	25	30	-
Evaluación de la resistencia mecánica por el método del 10 % de finos: - Valor en seco, mínimo (kN) - Relación húmedo/seco, mínimo (%)	E-224	 90 75	 70 75	 - -
Durabilidad (D)				
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, máximo (%). (Nota 1): - Sulfato de sodio - Sulfato de magnesio	E-220	 12 18	 12 18	 12 18
Limpieza (F)				
Límite líquido, máximo (%).	E-125	-	-	25
Índice de Plasticidad, máximo (%).	E-125 y E-126	0	0	3
Equivalente de arena, mínimo (%).	E-133	30	30	30
Valor de azul de metileno, máximo (Nota 2).	E-235	10	10	10
Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables, máximo (%).	E-211	2	2	2
Geometría de las Partículas (F)				
Índices de alargamiento y aplanamiento, máximo (%).	E-230	35	35	35
Caras fracturadas, mínimo (%). (Nota 3): - Una cara - Dos caras	E-227	 90 85	 70 50	 50 -
Angularidad de la fracción fina, mínimo (%).	E-239	35	35	-
Resistencia de material (F)				
CBR (%): porcentaje asociado al grado de compactación mínimo especificado (numeral 330.5.2.2.2); el CBR se debe medir sobre muestras sometidas previamente a cuatro días (4 d) de inmersión.	E-148	≥ 95	≥ 80	≥ 80

Nota 1: el ensayo de solidez se puede realizar con sulfato de sodio o sulfato de magnesio, de acuerdo con los documentos del proyecto, o con lo solicitado por el interventor.

ESPECIFICACIONES INVÍAS 2022


Tabla 330-3


Tabla 330 – 3. Franjas granulométricas del material de base granular

Tipo de gradación	Tamiz (mm / U.S. *Standard*)							
	37,5	25,0	19,0	9,5	4,75	2,00	0,425	0,075
	1½ Pulgadas	1 Pulgada	3/4 Pulgada	3/8 Pulgada	Nro. 4	Nro. 10	Nro. 40	Nro. 200
	Pasa tamiz (%)							
Bases granulares de gradación gruesa								
BG-40	100	75 – 100	65 – 90	45 – 68	30 – 50	15 – 32	7 – 20	0 – 9
BG-27	-	100	75 – 100	52 – 78	35 – 59	20 – 40	8 – 22	0 – 9
Bases granulares de gradación fina								
BG-38	100	70 – 100	60 – 90	45 – 75	30 – 60	20 – 45	10 – 30	5 – 15
BG-25	-	100	70 – 100	50 – 80	35 – 65	20 – 45	10 – 30	5 – 15
Tolerancias en producción sobre la fórmula de trabajo (±)	0 %	7 %			6 %			3 %

- **Drenajes**

Las obras de drenaje se construirán usando la guía de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, programa de Colombia Rural, donde se especifica la siguiente sección transversal tipo:
Se conformarán mediante la construcción de cunetas con sección en "V" y/o semicirculares en los bordes de la vía.

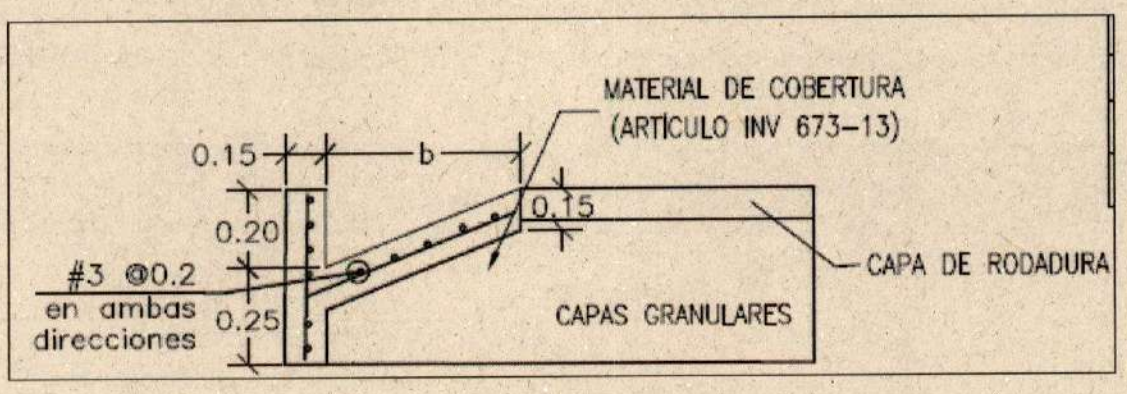

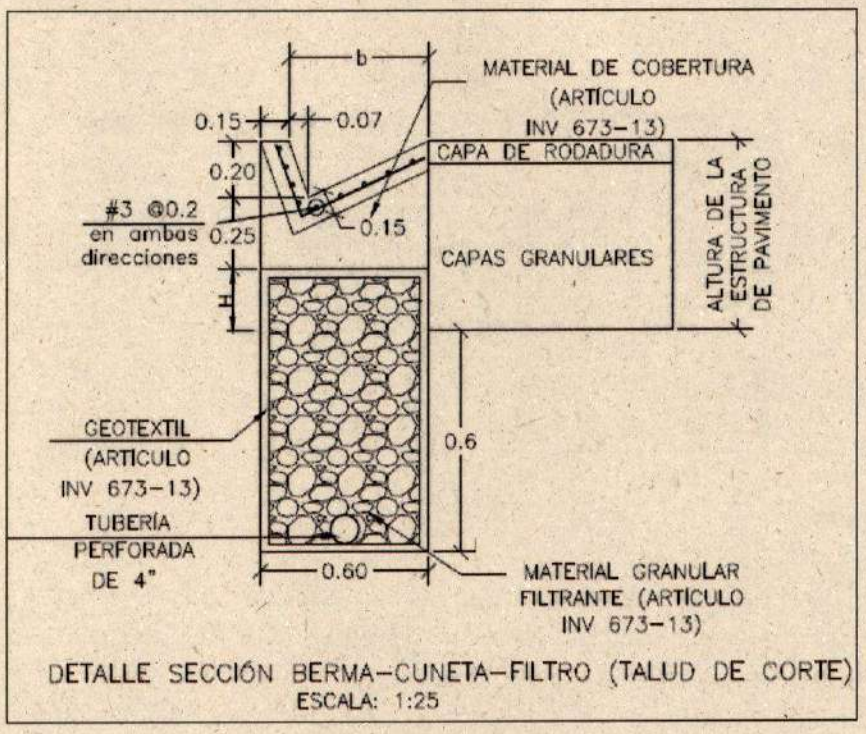

Fuente: cartilla obras menores de drenaje estructuras viales Colombia Rural pag. 16.

A continuación, se resumen las actividades constructivas a realizar inicialmente contratadas por la entidad contratante, entre el K12+225 y el K13+725, con K0+000 en Colorado:

VIA	TIPO DE INTERVENCION	ACTIVIDAD
Campo Alegre (Ruta 25–Caucasia) – Colorado – Nechí(25AN18)	Mantenimiento Mecánico	Adición de material de afirmado
		Conformación de la calzada
	Pavimento en concreto Asfaltico	Conformación de calzada
		Instalación de Base Granular con Geocelda
		Pavimentación e instalación de señalización Vertical y Horizontal
	Construcción de Box Culvert	Limpieza de Obras Trasversales
		Construcción Nuevas Obras

VIA	TIPO DE INTERVENCION	ACTIVIDAD
		K13+217, Box 1,5X1,5 K13+370, Box 1,5X1,0
	construcción de cunetas	Construcción de Muro en concreto PR3+400
		Construcción de Muro en concreto PR3+450

2.3. NECESIDADES IDENTIFICADAS EN CORREDORES VIALES

La movilidad de la población rural de los municipios del Bajo Cauca, es restringida debido a que algunas vías están en regular estado, con restricciones de tránsito y deficiente mantenimiento. Esta situación genera aumento en los tiempos de viaje y aumento en los costos de operación vehicular, lo que incrementa los costos de transporte y de pasajeros. En cuanto al comercio se presenta disminución en la oferta y demanda de los productos de la subregión.

De acuerdo a la Resolución 0001917 RVS, por el cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional correspondiente al Departamento de Antioquia del 15 de junio de 2018, las 101 vías secundarias a cargo del Departamento suman una longitud total de 2.671.10, de la cual 1.508.8 km (56.5%) se encuentra en afirmado.

El mejoramiento de la superficie de rodadura constituye una serie de actividades que se ejecutan a lo largo de las vías y que buscan preservar todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños, conservando y mejorándola con el fin de garantizar transitabilidad fluida y segura para los usuarios. En esta vía las actividades principales a realizar son: Construcción de obras de drenaje, limpieza de obras transversales, limpieza de cunetas, suministro y colocación de material de afirmado, mejoramiento de la rodadura, colocación y recuperación de señales de tránsito, pavimentación, entre otras.

Para lo anterior, la Secretaría de Infraestructura Física con el fin de satisfacer la necesidad planteada adelantó el proceso de selección cuyo objeto es

3. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA No.	Licitación Pública LIC 15027
CONTRATO DE OBRA No.	4600016558 de 2023
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25-CAUCASIA) COLORADO-NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR INICIAL:	$3.056.491.448
VALOR ADICIÓN No	N/A
VALOR TOTAL	$3.056.491.448
ANTICIPO	$458.473.717
FECHA DE INICIO:	08 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL:	47 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25 DE DICIEMBRE DEL 2023
PRÓRROGA No.1	22 DE DICIEMBRE DE 2023 (27 DÍAS)
PRÓRROGA No.2	19 DE ENERO DE 2024 (2 MESES)
PLAZO ACUMULADO	135 DÍAS
SUSPENSION No. 1	12 DE FEBRERO DE 2024
REINICIO No. 1	01 DE ABRIL DE 2024
SUSPENSION No. 2	05 DE ABRIL DE 2024
REINICIO No. 2 (PROYECTADO)	06 DE MAYO DE 2024
PRORROGA No. 3	05 DE JUNIO DE 2024 (2 MESES)
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	08 DE AGOSTO DE 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO IC-ING15027 integrado

	por ICPB S.A con el 90% Y INGAP S.A.S. con el 10 %. NIT: 901.756.732-6
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE IVAN LOPEZ
DIRECCIÓN CONTRATISTA:	MEDELLIN-ANTIOQUIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING VANESSA BETANCUR MARTINEZ
INTERVENTOR CONTRATO:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS
MUNICIPIOS BENEFICIADOS:	NECHI-ANTIOQUIA
UNIDAD EJECUTORA:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA

3.2. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No.	CON-15365
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4600016527 de 2023
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25-CAUCASIA) COLORADO-NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR INICIAL:	$257.054.643
VALOR ADICIÓN No	$278.265.919
VALOR TOTAL	$535.320.562
ANTICIPO	N/A
FECHA DE INICIO:	08 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 25 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE DICIEMBRE DEL 2023

INICIAL	
PRÓRROGA No.1	22 DE DICIEMBRE DE 2023 (36 DÍAS)
PRÓRROGA No.2	19 DE ENERO DE 2024 (2 MESES)
PLAZO ACUMULADO	144 DÍAS
SUSPENSION No. 1	13 DE FEBRERO DE 2024
REINICIO No. 1	01 DE ABRIL DE 2024
SUSPENSION No. 2	05 DE ABRIL DE 2024
REINICIO No. 2 (PROYECTADO)	06 DE MAYO DE 2024
PRORROGA No. 3	05 DE JUNIO (2 MESES)
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	17 DE AGOSTO DE 2024
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING VANESSA BETANCUR MARTINEZ
INTERVENTOR CONTRATO:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS
MUNICIPIOS BENEFICIADOS:	NECHI-ANTIOQUIA
UNIDAD EJECUTORA:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA

4. SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA.

4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO.

Del 01 al 30 de junio de 2024, se adelantaron actividades de construcción de box culvert e instalación de material granular y geocelda para la construcción del pavimento. De igual manera se adelantó la verificación de cantidades ejecutadas, además de los ajustes a los informes de gestión social, ambiental y SST.

4.2. DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Actualmente se tiene que la longitud por intervenir en la vía: 1,05 km Aprox., de la siguiente manera:

- Del K12+975 al K13+725, 750 mts
- Del K12+675 al K12+975, 300 mts

Box culvert a construir en la vía:

- 1,5x1,5 en el K13+217
- 1,5x1,0 en el K13+725

Durante el mes de junio de 2024, se realizaron las actividades que se mencionan a continuación:

- Suministro y acopio de material seleccionado base
- Corte de material existente en la vía
- Instalación de material granular sobre la vía
- Instalación de Geocelda.
- Replanteo de la vía con comisión topografía
- Instalación de material de terraplén desde el K12+975 al K13+520
- Se realizo la construcción de Box en concreto ubicado en el K13+370, de 1,5x1,0

- Se realizo la construcción de Construcción de Box en concreto ubicado en el K13+217, de 1,5x1,5

4.3. DIFICULTADES PREVISTAS EN LA MATRIZ DE RIESGOS

Durante el mes de junio de 2024 no se presentaron dificultades previstas en la matriz de riesgos.

4.4. CUADRO RELACIONANDO LAS ACTAS DE PAGO PARCIALES, ACUMULADOS Y SALDOS POR EJECUTAR

A continuación, se presenta el cuadro relacionando las actas de pago parciales, acumulados y saldos por ejecutar hasta el 30 de junio de 2024.

ACTA No.	PERIODO	VALOR	VALOR A AMORTIZAR	VALOR A PAGAR	SALDO DEL CONTRATO
1	08/11/2023 – 11/02/2024	$274.308.629	$68.577.157	$205.731.472	$2.392.286.259

4.5. CONTROL DEL PRESUPUESTO E INVERSIÓN EN CADA FRENTE DE TRABAJO Y TOTAL

Para el desarrollo del contrato de obra, la inversión ejecutada en el frente de trabajo se detalla a continuación:

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PRODUCTO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO					$1.521.134.299
4.1.1	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	$16.349	$159	$2.599.164
4.3.2	Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$1.531	$0	$0
5.1.4	Suministro, colocación, conformación y compactación de Base, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	$142.068	$702	$99.750.205
5.1.9	Suministro, transporte e instalación de Geocelda para refuerzo de terraplén y capas granulares	m2	$68.152	$3.811	$259.704.100
7.1.1	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L.- 1 o C.R.L. - 0 para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye Limpieza de superficie y Riego inicial con carrotanque	m2	$4.738	$0	$0
7.1.2	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-13 de la norma INVIAS	m3	$1.184.732	$0	$0

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	2013. Incluye: colocación con terminadora (finisher) y compactación. No incluye imprimación, ni transporte de materiales, que se pagarán en su respectivo ítem. Su medida de pago será metro cúbico compacto medido en sitio.				
13.1	Transporte de materiales de afirmado, Subbase, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	$1.629	$53.713	$87.498.637
13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	$1.629	$0	$0
	Suministro, colocación, conformación y compactación de material de relleno para terraplén, no incluye transporte. compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del proctor modificado.	m3	$61.742	$5.750	$355.019.587
	Transporte de materiales de terraplén, para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	$1.629	$439.879	$716.562.606
PRODUCTO 2. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS				$0	**$0**
6.2.5	Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas.	m3	$856.903	$0	$0
10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	$8.488	$0	$0
13.9	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	$1.253	$0	$0
PRODUCTO 3. CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT				$0	**$121.183.376**
4.1.8	Excavaciones para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	$27.398	$137	$3.761.197
2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	$180.051	$0	$0
7.2.9	Suministro e instalación de cinta selladora para muros sika PVC V15	m	$67.324	$54	$3.635.496
8.3	Limpieza de obras transversales, incluye acarreo interno de todos los sedimentos, escombros, material vegetal y demás elementos extraños que se encuentren obstruyendo la obra.	un	$114.305	$0	$0
6.1.18	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m3	$670.061	$3	$2.010.183
6.2.25	Concreto Clase C (28 MPa). Box Coulvert - Losa Inferior	m3	$1.078.554	$14	$14.560.479
6.2.26	Concreto Clase C (28 MPa). Box Coulvert - Losa superior y muros laterales	m3	$1.206.972	$30	$36.420.380
6.2.24	Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas.	m3	$1.174.340	$10	$11.597.860
10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	$8.488	$5.114	$43.407.632
4.2.1	Lleno mecánico compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	$12.172	$0	$0
13.6	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación entre 100 m y 1000 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión) para distancias que superen el acarreo libre (100 m)	m3	$3.026	$0	$0
13.9	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	$1.253	$4.621	$5.790.149
PRODUCTO 4. SEÑALIZACION VIAL				$0	**$0**
12.2	Suministro, transporte y aplicación de pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para resaltos, zonas escolares y otras áreas. Incluye texto, pictograma y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	$77.006	$0	$0
12.1	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	$3.009	$0	$0
12.3	Suministro, transporte y colocación de tachas reflectivas en la superficie del pavimento.	un	$11.690	$0	$0
12.6	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75 cm x 75 cm más lámina inferior, en lámina galvanizada calibre 16,	un	$617.351	$0	$0


ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	reflectivo tipo IX amarillo limón, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8".				
12.9	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	un	$853.479	$0	$0
12.9.2	Suministro, transporte e instalación de señal vertical poste de referencia SI-04 doble en lámina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo XI, estructura metálica tipo pedestal compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8".	un	$843.659	$0	$0
12.26	Suministro, transporte y colocación de paral estructura para señales verticales de tránsito informativas SI-05 Y SI-06, en H, tubería redonda de 2" (interna)espesor 3 mm, rellena en concreto hasta 1 m arriba del nivel de piso acabado. Incluye excavación, concreto y acabado final. Según diseño.	Un	$239.828	$0	$0
PRODUCTO 5. MANTENIMIENTO MECÁNICO				$0	**$42.047.866**
5.1.13	Suministro material de afirmado, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza y transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	$60.428	$226	$13.668.814
4.3.6	Mejoramiento de la subrasante involucrando suelo existente. Incluye la disgregación del material de la subrasante existente, el retiro o adición de materiales, la compactación y perfilado final, de acuerdo a las dimensiones, alineamientos y pendientes de la vía.	m2	$3.477	$0	$0
13.1	Transporte de materiales de afirmado, Subbase, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3-Km	$1.640	$17.304	$28.379.052
VALOR TOTAL OBRAS					**$1.684.365.541**

4.6. CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y RECURSOS

Después del reinicio al contrato de obra No.2 y prorroga No.3, se tiene como nueva fecha de terminación el 8 de agosto del 2024.

Dentro de las funciones de la interventoría está el seguimiento físico financiero del contrato de obra, semanalmente se envía a la entidad contratante la curva S de la obra.

Al cierre de este informe el proyecto presenta un programado de acuerdo a reprogramación de obra por prorroga No.3 de 37,76%, equivalente a $1.088.447.750 y un ejecutado del 47,15%, equivalente a $1.359.149.573, esto representa un avance por encima de la programación del -9,39% equivalente a $270.701.823,65.

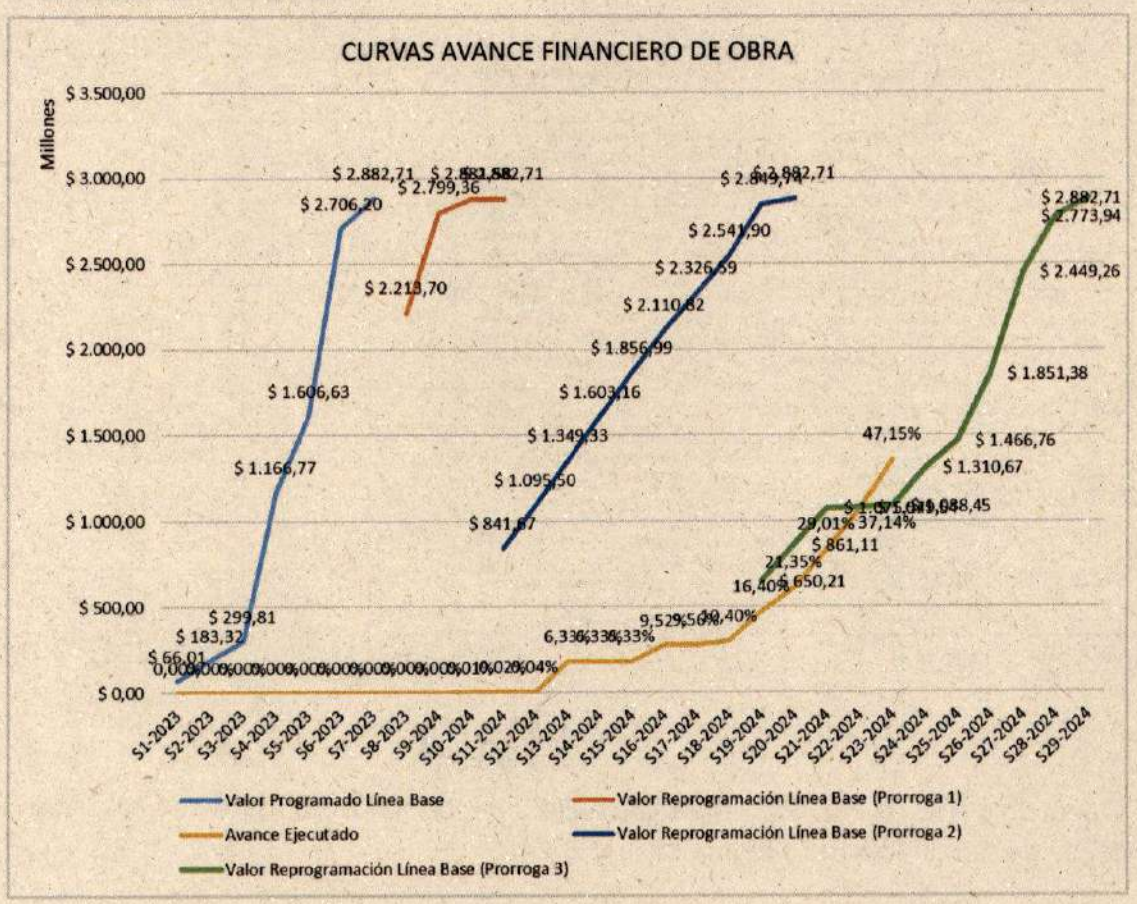

4.7. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

De acuerdo con lo estipulado en la CLAUSULA SEXTA – ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física, entregará un anticipo equivalente al Quince por ciento (15%) del valor total del contrato, el cual será amortizado mediante deducciones del Quince por ciento (25%) del valor de cada acta de pago mensual, hasta completar el 100% del valor del anticipo.

La firma Contratista conforma el FIDEICOMISO con la entidad FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

A La fecha se ha efectuado un desembolso del anticipo de $458.473.717, equivalente a un 100,00%.

Amortización en actas parciales:

DESCRIPCION	CONTRATADO	VR. ACTA	DESCUENTO ANTICIPO
Valor Del Contrato Inicial:	**$ 3.056.491.448**		
Valor Anticipo:	**$ 458.473.717**		
Valor Acta Parcial No.01:		$ 274.308.629	
Amortización Anticipo Acta Parcial No.1:			$68.577.157
Valor Acta Parcial No.02:		$1.410.056.912	
Amortización Anticipo Acta Parcial No.2:			$352.514.228
Saldo por amortizar:			$37.382.332,00

Plan de inversión inicial de anticipo del contrato de obra:

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	nov-23	dic-23	VALOR PROGRAMA APROBADO	%
1	COSTOS DE PERSONAL (NÓMINA Y PAGO SEGURIDAD SOCIAL)	$ 10.000.000	$ 40.000.000	$ 50.000.000	10,91%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 225.000.000	$ 50.000.000	$ 275.000.000	59,98%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	$ 42.500.000	$ 11.500.000	$ 54.000.000	11,78%
4	ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 61.000.000	$ 18.473.717	$ 79.473.717	17,33%
TOTAL		**$ 338.500.000**	**$ 119.973.717**	**$ 458.473.717**	**100,00%**

4.8. CONTROL DE ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

El Registro del Estado General del tiempo se toma en el sector de ejecución del proyecto en el Municipio de Nechí. En el apartado de anexos se adjunta el formato se seguimiento al clima en el mes de junio de 2024.

4.9. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

En el apartado de anexos se adjunta el formato de seguimiento al uso de equipos y maquinaria en el mes de junio de 2024.

4.10. INFORMACIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL

En el apartado de anexos se presenta la información del personal que laboró durante el mes de junio de 2024 para el contratista de obra.

4.11. CONTROL DE APORTES LEGALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

En el apartado de anexos se adjunta la ultima planilla de seguridad social entregada por el contratista de obra.

4.12. RESUMEN DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES

Teniendo en cuenta los requerimientos de la vía a intervenir, se hace necesario tramitar ítems no previstos los cuales se relacionan a continuación:

NP1 - Suministro, colocación, conformación y compactación de material de relleno para terraplén, no incluye transporte. compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del proctor modificado

NP2 - Transporte de materiales de terraplén, para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)..

Por tal motivo se realiza la modificatoria de cantidades de obra No.3 al contrato de obra.

ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 3	
	GENERAL	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL

ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 3	
	GENERAL	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	PRODUCTO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO					$2.086.448.012		$2.283.505.267
4.1.1	INVIAS 210-13	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	300,0	$16.349	$4.904.700	158,98	$2.599.164
4.3.2	INVIAS 310-22	Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	9500,0	$1.531	$14.544.500	0,00	$0,00
5.1.4	INVIAS 330-22	Suministro, colocación, conformación y compactación de Base, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1900,0	$142.068	$269.929.200	924,12	$131.287.880
5.1.9	INVIAS 223-22	Suministro, transporte e instalación de geoceldа para refuerzo de terraplén y capas granulares	m2	7100,0	$68.152	$483.879.200	4.620,60	$314.903.131
7.1.1	INVIAS 411-22	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L.- 1 o C.R.L. - 0 para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye Limpieza de superficie y Riego inicial con carrotanque	m2	7100,0	$4.738	$33.639.800	4.620,60	$21.892.403
7.1.2	INVIAS 450-13	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-13 de la norma INVIAS 2013. Incluye: colocación con terminadora (finisher) y compactación. No incluye imprimación, ni transporte de materiales, que se pagarán en su respectivo ítem. Su medida de pago será metro cúbico compacto medido en sitio.	m3	781,0	$1.184.732	$925.275.692	462,06	$547.417.268
13.1	INVIAS 900-13	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	214480	$1.629,00	$349.387.920	106.043	$172.744.047
13.2	INVIAS 900-13	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	3000,0	$1.629,00	$4.887.000	158,98	$258.978
	NP1	Suministro, colocación, conformación y compactación de material de relleno para terraplén, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la	m3		$61.742,00		5.861,77	$361.917.403

ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 3	
	GENERAL	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		obtenida en el ensayo del proctor modificado						
	NP2	Transporte de materiales de terraplén, para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km		$1.629,00		448.425,41	$730.484.993
PRODUCTO 2. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS						**$385.166.980**		**$37.081.384**
6.2.5	INVIAS 630 -13 INVIAS 671-22	Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas.	m3	300,0	$856.903	$257.070.900	21,00	$17.994.963
10.1	INVIAS 640-13	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	14560,0	$8.488,00	$123.585.280	1.919,00	$16.288.472,00
13.9	INVIAS 900-13	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	3600,0	$1.253,00	$4.510.800,00	2.233,00	$2.797.949,00
PRODUCTO 3. CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT						**$270.586.619**		**$131.872.306**
4.1.8	INVIAS 600-13	Excavaciones para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	280,0	27398,0	$7.671.440,00	141,00	$3.863.118,00
2.8	INVIAS 201-13	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	13,0	180051,0	$2.340.663,00	0,00	$0,00
7.2.9	N.A	Suministro e instalación de cinta selladora para muros sika PVC V15	m	92,0	67324,0	$6.193.808,00	54,00	$3.635.496,00
8.3	N.A	Limpieza de obras transversales, incluye acarreo interno de todos los sedimentos, escombros, material vegetal y demás elementos extraños que se encuentren obstruyendo la obra.	un	2,0	114305,0	$228.610,00	2,00	$228.610,00
6.1.18	INVIAS 630-13	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m3	5,0	670061,0	$3.350.305,00	3,00	$2.010.183,00
6.2.25	INVIAS 630-13	Concreto Clase C (28 MPa). Box Coulvert - Losa Inferior	m3	28,0	1078554,0	$30.199.512,00	14,00	$15.099.756,00
6.2.26	INVIAS 630-13	Concreto Clase C (28 MPa). Box Coulvert - Losa superior y muros laterales	m3	67,0	1206972,0	$80.867.124,00	34,00	$41.037.048,00
6.2.24	INVIAS 630-13	Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas.	m3	34,0	1174340,0	$39.927.560,00	12,00	$14.092.080,00
10.1	INVIAS 630-13	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	10363,0	8488,0	$87.961.144,00	5.114,00	$43.407.632,00
4.2.1	INVIAS 610-13	Lleno mecánico compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	132,0	12172,0	$1.606.704,00	65,00	$791.180,00
13.6	INVIAS 900-13	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación entre 100 m y 1000 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión) para distancias que superen el acarreo libre (100 m)	m3	2745,0	3026,0	$8.306.370,00	0,00	$0,00
13.9	INVIAS 900-13	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000	m3-km	1543,0	1253,0	$1.933.379,00	6.151,00	$7.707.203,00

ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 3	
	GENERAL	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta						
PRODUCTO 4. SEÑALIZACION VIAL						$32.971.730		$30.507.390
12.2	INVIAS 730-13	Suministro, transporte y aplicación de pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para resaltos, zonas escolares y otras áreas. Incluye texto, pictograma y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	28,0	77006,0	$2.156.168	28	$2.156.168
12.1	INVIAS 700-13	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	4000,0	3009,0	$12.036.000	3.080	$9.267.720
12.3	INVIAS 701-13	Suministro, transporte y colocación de tachas reflectivas en la superficie del pavimento.	un	167,0	11690,0	$1.952.230	193	$2.256.170
12.6	INVIAS 710-13	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75 cm x 75 cm más lámina inferior, en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX amarillo limón, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8".	un	2,0	617351,0	$1.234.702	2,00	$1.234.702
12.9	INVIAS 710-13	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	un	17,0	853479,0	$14.509.143	17,00	$14.509.143
12.9.2	INVIAS 710-13	Suministro, transporte e instalación de señal vertical poste de referencia SI-04 doble en lámina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo XI, estructura metálica tipo pedestal compuesta pór un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8".	un	1,0	843659,0	$843.659	1,00	$843.659
12.26	INVIAS 741-22	Suministro, transporte y colocación de paral estructura para señales verticales de tránsito informativas SI-05 Y SI-06, en H, tubería redonda de 2" (interna)espesor 3 mm, rellena en concreto hasta 1 m arriba del nivel de piso acabado. Incluye excavación, concreto y acabado final. Según diseño.	Un	1,0	239828	$239.828	1,00	$239.828
PRODUCTO 5. MANTENIMIENTO MECÁNICO						$107.539.050		$399.744.831
5.1.13	INVIAS 710-13	Suministro material de afirmado, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza y transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	475,0	60428	$28.703.300	2.500	$151.070.000

ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 3	
	GENERAL	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.3.6	INVIAS 741-22	Mejoramiento de la subrasante involucrando suelo existente. Incluye la disgregación del material de la subrasante existente, el retiro o adición de materiales, la compactación y perfilado final, de acuerdo con las dimensiones, alineamientos y pendientes de la vía.	m2	4750,0	3477,0	$16.515.750	1.923,00	$6.686.271
13.1	INVIAS 741-22	Transporte de materiales de afirmado, subbase, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	38000,0	1640,0	$62.320.000	147.554	$241.988.560
		AJUSTE AL PESO						$1.213,00
		SUBTOTAL OBRAS				$2.882.712.391		$2.882.712.391
		PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES						$0,00
		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)			estimado	$39.623.370	estimado	$39.623.370
		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)			estimado	$31.605.932	estimado	$31.605.932
		PRIMA DE LOCALIZACION Y HORAS EXTRA-PERSONAL OPERATIVO (Incluye IVA)			estimado	$12.118.858	estimado	$12.118.858
		PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS			estimado	$18.212.504	estimado	$18.212.504
		AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye IVA)			estimado	$55.921.047	estimado	$55.921.047
		ACTUALIZACION DE PRECIOS OBRA (Incluye IVA)			estimado	$15.099.455	estimado	$15.099.455
		CARACTERIZACIÓN VIAL (Incluye IVA)			estimado	$1.197.891	estimado	$1.197.891
		VALOR TOTAL				$3.056.491.448		$3.056.491.448

4.13. RESULTADO DE ENSAYOS Y PRUEBAS

Para el presente informe se realizan Ensayos de laboratorio según plan de ensayos del contratista, toda vez que las actividades ejecutadas requieren control de calidad.

Se toman muestras de concreto de 28 Mpa de los boxs ubicados en las abscisas K13+217 y K13+370 y se presentan ensayos de este.

La firma contratista presenta ensayos de material de terraplén para este informe, los cuales son materiales para utilizar durante el desarrollo del contrato de obra.

En el apartado de anexos, se adjunta relación de ensayos de laboratorio presentados por la firma contratista.

4.14. SEGUIMIENTO GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

En el apartado de anexos se adjuntan las pólizas entregadas por el contratista de obra a la fecha. Se realiza una observación en cuanto a la póliza de cumplimiento, la cual no presenta el amparo por estudios y diseños.

PÓLIZAS INICIALES

Nombre de la Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Póliza C No. M-100213018 - Anexo 0.
Póliza RC No. M-100048060 - Anexo 0.

ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$611.298.289,60	DESDE 18/10/2023 – HASTA 25/06/2024
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$458.473.717,20	DESDE 18/10/2023 – HASTA 25/06/2024
	PRESTACIONES SOCIALES	$305.649.144,80	DESDE 18/10/2023 – HASTA 25/12/2026
	CALIDAD DEL SERVICIO	$305.649.144,80	DESDE 18/10/2023 – HASTA 25/12/2028
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	$611.298.289,60	DESDE 18/10/2023 – HASTA 25/12/2028
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$464.000.000,00	DESDE 18/10/2023 – HASTA 25/06/2023

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO

Nombre de la Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Póliza C No. M-100213018 - Anexo 2
Póliza RC No. M-100048060 - Anexo 2

ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$611.298.289,60	DESDE 8/11/2023 – HASTA 25/06/2024
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$458.473.717,20	DESDE 8/11/2023 – HASTA 25/06/2024
	PRESTACIONES SOCIALES	$305.649.144,80	DESDE 8/11/2023 – HASTA 25/12/2026
	CALIDAD DEL SERVICIO	$305.649.144,80	DESDE 25/12/2023 – HASTA 25/12/2028
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	$611.298.289,60	DESDE 25/12/2023 – HASTA 25/12/2028
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$464.000.000,00	DESDE 18/10/2023 – HASTA 25/06/2023

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON PRORROGA No.1

Nombre de la Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Póliza C No. M-100213018 - Anexo 3
Póliza RC No. M-100048060 - Anexo 3

ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$611.298.289,60	DESDE 8/11/2023 – HASTA 27/07/2024
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$458.473.717,20	DESDE 8/11/2023 – HASTA 27/07/2024
	PRESTACIONES SOCIALES	$305.649.144,80	DESDE 8/11/2023 – HASTA 21/01/2027
	CALIDAD DEL SERVICIO	$305.649.144,80	DESDE 21/01/2024 – HASTA 21/01/2029
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	$611.298.289,60	DESDE 21/01/2024 – HASTA 21/01/2029
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$464.000.000,00	DESDE 18/10/2023 – HASTA 21/01/2024

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON PRORROGA No.2

Nombre de la Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Póliza C No. M-100213018 - Anexo 4

Póliza RC No. M-100048060 - Anexo 4

ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$611.298.289,60	DESDE 19/01/2024 – HASTA 21/09/2024
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$458.473.717,20	DESDE 19/01/2024 – HASTA 21/09/2024
	PRESTACIONES SOCIALES	$305.649.144,80	DESDE 19/01/2024 – HASTA 21/03/2027
	CALIDAD DEL SERVICIO	$305.649.144,80	DESDE 21/03/2024 – HASTA 21/03/2029
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	$611.298.289,60	DESDE 21/03/2024 – HASTA 21/03/2029
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$464.000.000,00	DESDE 18/10/2023 – HASTA 21/03/2024

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON PRORROGA No.3

Nombre de la Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Póliza C No. M-100213018 - Anexo 6

Póliza RC No. M-100048060 - Anexo 7

ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$611.298.289,60	DESDE 19/01/2024 – HASTA 08/04/2025
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$458.473.717,20	DESDE 19/01/2024 – HASTA 08/04/2025
	PRESTACIONES SOCIALES	$305.649.144,80	DESDE 19/01/2024 – HASTA 08/08/2027
	CALIDAD DEL SERVICIO	$305.649.144,80	DESDE 21/03/2024 – HASTA 08/08/2029
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	$611.298.289,60	DESDE 21/03/2024 – HASTA 08/08/2029
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$464.000.000,00	DESDE 18/10/2023 – HASTA 08/08/2024

En el apartado de anexos se presentan las pólizas del contrato de obra

4.15. PRE-ACTAS Y ACTAS DE PAGO

Durante el mes de junio del 2024 se presenta acta parcial de obra No.2 por parte de la firma contratista

4.16. CUADRO DE CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA CUMULADAS

A continuación, se detalla el avance de actividades ejecutadas a la fecha:

ACTIVIDAD	CANT. EJECUTADA ACUM.	% EJECUTADO ANTERIOR	% EJECUTADO ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
PRODUCTO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO			**46,98%**	**1,17%**	**-45,82%**
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN D	390,94	65,16%	65,16%	50,00%	-15,16%
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	2835,77	30,60%	30,60%	75,00%	44,40%
SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE	558,13	58,62%	53,98%	0,00%	-53,98%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOCELDA	3030,66	62,77%	62,77%	0,00%	-62,77%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSA MDC 19	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTE DE BASE	68979,68	49,26%	52,67%	0,00%	-52,67%
TRANSPORTE DE EXCAVACIÓN	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PRODUCTO 2. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS			**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
CONCRETO CLASE D (21 MPA). CUNETAS.	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PRODUCTO 3. CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT			**100,00%**	**10,46%**	**-89,54%**
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS	175,50	90,93%	90,93%	100,00%	9,07%
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SELLADORA PARA MUROS SIKA PVC V15	54,00	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
CONCRETO CLASE F (14 MPA). SOLADOS DE E=0.05 M	4,70	100,00%	100,00%	0,13%	-99,87%
CONCRETO CLASE C (28 MPA). BOX COULVERT - LOSA INFERIOR	13,50	00,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
CONCRETO CLASE C (28 MPA). BOX COULVERT - LOSA SUPERIOR Y MUROS LATERALES	30,15	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

ACTIVIDAD	CANT. EJECUTADA ACUM.	% EJECUTADO ANTERIOR	% EJECUTADO ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
CONCRETO CLASE C (28 MPA). MUROS, DISIPADORES, ALETAS.	9,88	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO	5114,00	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
LLENO MECÁNICO COMPACTADO	29,70	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
PRODUCTO 4. SEÑALIZACION VIAL			**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN FRIO M2	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN CON PINTURA ACRÍLICA EN FRIO ML	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEÑAL VERTICAL DE 75 CM X 75 CM EN ÁNGULO DE 2"X2"X1/4"	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEÑAL VERTICAL DE 75CMX75CM DOBLE (SP/SR/SI), EN ÁNGULO 2"X2"X1/8"	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEÑAL VERTICAL POSTE DE REFERENCIA SI-04 DOBLE EN ÁNGULO DE 2"X2"X1/8".	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PARAL ESTRUCTURA PARA SEÑALES VERTICALES DE TRANSITO INFORMATIVAS SI-05 Y SI-06, EN H,	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PRODUCTO 5. MANTENIMIENTO MECÁNICO			**4,00%**	**14,69%**	**10,69%**
INSTALACIÓN Y COMPACTACION DE AFIRMADO	226,20	3,19%	3,19%	100,00%	96,81%
TRANSPORTE DE AFIRMADO	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Cuadro de seguimiento semana del 01 de junio al 30 de junio de 2024

4.17. ESTADO AMBIENTAL

El contratista ha implementado el programa del PMA aprobado por la interventoría, dentro el contrato de obra en desarrollo.

El profesional ambiental de la firma interventora entrega su informe mensual correspondiente al mes de junio al supervisor ambiental con el detalle de las actividades realizadas en este componente.

(Se entrega a parte en el informe mensual de este componente)

4.18. ESTADO SOCIAL

La firma contratista ha implementado el plan de Gestión social, realizando las actividades de socialización en el tramo de intervención, así como el resto de las actividades de este componente y cumpliendo con la guía de manejo socio ambiental y SST de la Secretaría de Infraestructura Física.

Se presenta por parte de la firma interventora informe mensual de junio al supervisor correspondiente

(Se entrega a parte en el informe mensual de este componente)

4.19. ESTADO SST

La firma Contratista dentro de su programa de seguridad y Salud en el Trabajo da cumplimiento al control y registro de Afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social, tramite de Incapacidades, Seguridad industrial, Capacitaciones, elementos de seguridad industrial.

La firma contratista efectúa registro de actividades realizadas para cumplimiento de Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se presenta por parte de la firma interventora informe mensual de junio al supervisor correspondiente

(Se entrega a parte en el informe mensual de este componente)

4.20. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES POR SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORIA

Se presentan la siguiente información de avance de obra, de acuerdo con el informe semanal de interventoría No.23, correspondiente al periodo del 24 de junio al 30 de Junio de 2024, de acuerdo con la reprogramación de obra No.3, según la prórroga No.3. así:

Programado: 37,76%, equivale a $1.088.447.750
Ejecutado: 47,15%, equivale a $1.359.149.573
Atraso: 9,39%, $ 270.701.823,65

Se evidencia avance por encima del programado al contrato de obra del 9,39% con respecto a la programación.

La Interventoría continuará con el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato, solicitando al contratista de obra mes a mes:

- Afiliaciones del personal.
- Reprogramación de obra.
- Plan de contingencia.
- Pólizas actualizadas.
- Procesos constructivos de calidad.
- Ensayos de laboratorio.
- Certificado de calibración de los equipos de topografía a utilizar.
- Informe ejecutivo
- Insumos para el seguimiento al Plan de manejo de tránsito. PMT.
- Insumos para el seguimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SST.
- Insumos para el seguimiento al Plan de manejo ambiental PMA
- Insumos para el seguimiento al Plan de gestión social PGS.

4.21. REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES

No se presenta reporte de multas y sanciones durante el mes de junio de 2024.

4.22. INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA

En el apartado de anexos se adjunta el informe ejecutivo de obra elaborado por la dirección de interventoría.

4.23. REGISTRO FOTOGRÁFICO

En el apartado de anexos se adjunta el registro fotográfico para el mes de junio de 2024.

4.24. ACTAS DE COMITÉS DE OBRA

En el apartado de anexos, se adjuntan las actas de comité de obra realizadas durante el mes de junio de 2024.

4.25. INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA, en su calidad de Interventor del Contrato No. 4600016558 de 2023, presentó a consideración de la secretaria de Infraestructura física de la Gobernación de Antioquia, informes semanales durante el periodo comprendido entre el 03 de junio del 2024 al 30 de junio del 2024, tal y como se detalla a continuación:

Informe Semanal No	Periodo Informe	Tiempo transcurrido desde el inicio del contrato
20	Del 03 al 09 de junio del 2024	135 días
21	Del 10 al 16 de junio del 2024	142 días
22	Del 17 al 23 de junio del 2024	149 días
23	Del 24 al 30 de junio del 2024	156 días

4.26. BITÁCORA

En el apartado de anexos de adjunta la bitácora de obra para el periodo del 01 al 30 de junio de 2024.

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Actualmente el contrato se encuentra en etapa de ejecución, realizando las respectivas actividades de supervisión técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal. Interventoría realiza los requerimientos pertinentes al contratista de obra, en términos de gestión administrativa y técnica. A su vez, interventoría avanza en el seguimiento a los componentes de gestión social, ambiental y SST.

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante el mes de junio de 2024 la Interventoría realizó los requerimientos pertinentes al contratista de obra, así como también hizo presencia en el lugar de ejecución y en los comités programados.

En cumplimiento con las obligaciones de la interventoría se contempla en el presente período mensual:

- Supervisión de los trabajos por parte de la dirección de la interventoría mediante el seguimiento de las obligaciones contraídas por el contratista de obra.
- Seguimiento y control en el proceso constructivo de las actividades de obra que desarrolla el contratista.
- Seguimiento del avance físico de las obras en el tiempo, teniendo en cuenta el programa de trabajo presentado por el contratista de obra.
- Participar en reuniones con el contratista de obra, municipio de Nechi, Gobernación de Antioquia.

- Supervisión de las diferentes actividades de resección de documentación para el cumplimiento de diseños, programas de trabajo (general y semanal).
- Inspección de las actividades Ambientales y Sociales que realiza el contratista de obra.
- Elaboración y revisión de comunicaciones y demás documentos enviados al Contratista y a la Gobernación de Antioquia.
- Atención a consultas y requerimientos de todos los interesados en el Proyecto (Contratista de obra, comunidad, autoridades civiles, Alcaldía y oficina central Gobernación de Antioquia, etc.).
- Seguimiento y control financiero del Proyecto, con énfasis en las cantidades del Presupuesto oficial del Contrato.
- Seguimiento y control del avance físico del proyecto
- Elaboración de informe mensual e informes semanales.
- Control de requisitos seguridad industrial personal que labora en obra.
- Verificación diaria del uso de los elementos de seguridad.
- Control de cantidades de obra ejecutadas hasta la fecha.
- Estudio y solicitud de ítems no previstos y presentación ante la entidad contratante
- Presentación de actas de obra ante la entidad contratante
- Verificación de ensayos presentados en obra de materiales a utilizar

- Revisión de diseños presentados por la firma contratista para su ejecución

5.3. RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se muestra el listado de personal de interventoría que laboró durante el mes de junio de 2024.

Nombre	Cargo	C.C
Juan Carlos León Lara	Director de interventoría	3.805.748
Elkin Rojas Anaya	Residente de interventoría	11.039.041
Kiara Beatriz Maza	Profesional social	1.102.581.304
Luis Alfonso Higuita	Profesional ambiental	1.152.186.533
Erica Milena López	Profesional SST	43.204.163

Para el mes de junio de 2024, interventoría contaba con la aprobación de las hojas de vida de todos los profesionales mencionados anteriormente.

5.4. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha, esta interventoría se encuentra al día con el pago de aportes legales y de seguridad social al personal en el mes de junio de 2024.

5.5. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
Recursos iniciales comprometidos	$257.054.643,00	N/A	N/A	$257.054.643,00
Adiciones	$278.256.919,00	N/A	N/A	$278.256.919,00
Total, recursos comprometidos	$535.311.562,00	N/A	N/A	$535.311.562,00

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
Recursos iniciales comprometidos	$257.054.643,00	N/A	N/A	$257.054.643,00

Adiciones	$278.256.919,00	N/A	N/A	$278.256.919,00
Total recursos comprometidos	$535.311.562,00	N/A	N/A	$535.311.562,00
Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A
Recursos pagados/desembolsados	$138.690.165,00	N/A	N/A	$138.690.165,00
Total recursos entregados	$138.690.165,00	N/A	N/A	$138.690.165,00
Recursos ejecutados	$306.705.820,00	N/A	N/A	$306.705.820,00
Recursos no ejecutados	$228.614.742,00	N/A	N/A	$228.614.742,00

5.6. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el apartado de anexos se adjuntan las pólizas del Contrato de interventoría según firma del contrato y acta de inicio.

- **Póliza de cumplimiento No. 61-44-101051578**
  Según firma del contrato (expedida el 26 de octubre de 2023, anexo 0).
  Según acta de inicio (expedida el 16 de noviembre de 2023, anexo 3)
  Según Prorroga No. 1 (expedida el 04 de enero de 2024, anexo 4)
  Según Prorroga No. 2 (expedida el 07 de febrero de 2024, anexo 5)
  Según Suspensión y reinicio No. 1 (expedida el 22 de abril de 2024, anexo 6)
  Según Suspensión No.2 y reinicio No. 2 (expedida el 24 de mayo de 2024, anexo 7).
  Según Prorroga No. 3 (expedida el 18 de junio de 2024, anexo 9)

- **Póliza de Responsabilidad civil extracontractual No. 61-40-101018765**
  Según firma del contrato (expedida el 26 de octubre de 2023, anexo 0)
  Según acta de inicio (expedida el 16 de noviembre de 2023, anexo 3)
  Según Prorroga No. 1 (expedida el 04 de enero de 2024, anexo 4)
  Según Prorroga No. 2 (expedida el 20 de febrero de 2024, anexo 6)
  Según Suspensión y reinicio No. 1 (expedida el 22 de abril de 2024, anexo 7)
  Según Suspensión No.2 y reinicio No. 2 (expedida el 24 de mayo de 2024, anexo 8).
  Según Prorroga No. 3 (expedida el 11 de junio de 2024, anexo 9)

POLIZAS ACTUALIZADAS CON PRORROGA No.3

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Póliza Cumplimiento No. 61-44-101051578.

N.º DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)	
61-44-101051578 - 9	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/11/2023	13/03/2025	$107.064.112,40
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/11/2023	13/09/2027	$160.596.168,60
	CALIDAD DEL SERVICIO	20/01/2024	20/01/2029	$107.064.112,40

Póliza RC No. 61-40-101018765.

N.º DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)	
61-40-101018765	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	08/11/2023	13/09/2024	$260.000.000.00
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	08/11/2023	13/09/2024	$260.000.000.00
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	08/11/2024	13/09/2024	$260.000.000.00

5.7. SEGUIMIENTO CORRESPONDENCIA

En el apartado de anexos se adjunta la relación de la correspondencia durante el mes de junio de 2024.

6. CONCLUSIONES GENERALES

6.1. ANÁLISIS, COMENTARIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS

- Se evidencia un avance por encima de la programación vigente.
- Se aprueba prorroga No.3 al contrato de obra e interventoría por termino de DOS (02) MESES, quedando como nueva fecha de terminación 08 de agosto del 2024
- Se tiene la necesidad de crear ítems no previstos, teniendo en cuenta el diseño inicial de la vía, en el cual se tiene que construir terraplén para poder cumplir con la cota de inundación de la zona, los ítems presentados son:
- NP1 - Suministro, colocación, conformación y compactación de material de relleno para terraplén, no incluye transporte. compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del proctor modificado
- NP2 - Transporte de materiales de terraplén, para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).
- Teniendo en cuenta los ítems no previstos, se realiza modificatoria de cantidades de obra No.3 al contrato.

6.2. RECOMENDACIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y/O FINANCIERAS

- Aumentar tren de volquetas para mejorar el suministro e instalación de material de terraplén y base granular en la vía los días que no llueva, teniendo en cuenta que en la zona se presenta lluvias casi que diariamente.
- En general dar estricto cumplimiento al programa de obra y programa de inversión.

7. ANEXOS

A continuación, se establece el listado de anexos al presente informe:

Anexo 1. Control de equipos y maquinaria
Anexo 2. Estado general del tiempo
Anexo 3. Certificación pago de seguridad social contratista de obra
Anexo 4. Control de personal en obra
Anexo 5. Planilla SS contratista de obra
Anexo 6. Informe ejecutivo
Anexo 7. Pólizas contrato de obra
Anexo 8. Informes semanales de interventoría
Anexo 9. Bitácora de obra
Anexo 10. Actas de comité
Anexo 11. Ensayos de laboratorio
Anexo 12. Acta de obra No. 2
Anexo 13. Pólizas de interventoría
Anexo 14. Topografía interventoría
Anexo 15. Relación de correspondencia
Anexo 16. Registro fotográfico

CONTROL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA
EQUIPO DE OBRA

CÓDIGO	MSE-FR-22-2		
VERSIÓN	2		
PAGINA	1	DE	1
	30	6	2024

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES: JUNIO DE 2024 — CONTRATO No. 4600016558 DE 2023 — SECTOR Vía Campo Alegre (Ruta 25 Caucasia) –Colorado – Nechi(25AN18)

CONTRATISTA: CONSORCIO IC-ING16027

MAQUINA / DÍA	PLACA	CAPACIDAD	DÍA	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Retroexcavadora de llantas				A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Volqueta Doble	WFB 829	15 m3		A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Volqueta Doble	ESP 098	15 m3		A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Volqueta Doble	WFL 297	15 m3		A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Volqueta Doble	WCU 095	15 m3		A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Volqueta Doble	TAY 072	15 m3		A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Volqueta Doble	TAW 517	15 m3		A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Volqueta Sencilla	OCJ 482	7 m3		A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Motoniveladora Caterpillar				A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Vibrocompactador Super Pac		11 ton		A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES
ACTIVO = A
REPARACIÓN = R
INACTIVO = I

FIRMA

NOMBRE ELIECER CORDERO SALGADO
RESIDENTE DE OBRA

FIRMA

NOMBRE ELKIN ROJAS ANAYA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría de Infraestructura Física	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA	30	6	2024
	(Dia / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: 4600016558 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO IC-ING17027

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DEL 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) – COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4600016527 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Total
Seco	24	24	24	20	20	18	18	24	19	24	18	22	24	20	20	24	18	20	18	18	19	20	22	17	17	19	22	19	21	24		617
Lluvias moderadas												2					6	4					2	2			2	1				19
Lluvias intensas				4	4	6	6		5		6			4	4				6	6	5	4		5	7	5		4	3			84
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES:

FIRMA
NOMBRE ELIECER CORDERO
RESIDENTE DE OBRA

FIRMA
NOMBRE ELKIN ROJAS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO IN-ING 15027

Medellín, 12 de julio de 2024

Asunto:

Certificado Pago de Seguridad Social y Aportes Legales

Jorge Iván Lopez Elejalde, identificado con CC 1.036.396.810 en mi condición de Representante legal del Consorcio IC – ING 15027 identificado con NIT 901.756.732-6, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Medellín, a los 12 días del mes de julio de 2024.

Cordialmente,

JORGE IVAN LOPEZ ELEJALDE

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO IC-ING

Medellín, 12 de julio de 2024

Oficio Nº 002-29112023

Asunto:

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

LUCELLY CIRO ALZATE identificado con 43.765.709, y con tarjeta profesional No. 168149-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de **ICPB S.A.** identificada con NIT **811015828-9**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellin, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Medellín, a los 12 días de julio de 2024.



LUCELLY CIRO ALZATE

C.C 43.765.709

T.P No. 168149-T

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

168149-T



LUCELLY
CIRO ALZATE
C.C. 43765709
RES. INSCRIPCION 207 DEL 19/07/2012
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

230158 178249

30 Enero 2020

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F0C2417BEEFCEC50

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUCELLY CIRO ALZATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43765709 de ABEJORRAL (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 168149-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CONSORCIO IC-ING

Medellín, 12 de julio de 2024

Asunto:

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

GLORIA LUCÍA MARÍN CARVAJAL identificado con 21.409.904, y con tarjeta profesional No. 124638-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora de **INGAP S.A.S** identificada con NIT **811047188-0** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Medellín, a los 02 días del mes de julio de 2024.

GLORIA LUCÍA MARÍN CARVAJAL

C.C 21.409.904

T.P No. 124638-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
124638-T



GLORIA LUCIA
MARIN CARVAJAL
C.C. 21409904
RESOLUCION INSCRIPCION 1754 FECHA 2007/03/08
UNIVERSIDAD CORP UNIV REMINGTON

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 133949

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4B1B4B157180C8C8A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA LUCIA MARIN CARVAJAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 21409904 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 124638-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CONTROL DE PERSONAL EN OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

CONTROL DIARIO DE PERSONAL EN OBRA

GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OBRAS)

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO / OFICIO	PERIODO:	DESDE:	2024-06-01	HASTA	2024-06-30
		AÑO: 2024	MES:	JUNIO DEL 2024		

		S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
PERSONAL PROFESIONAL EN CAMPO																																
YAMID TUIRAN GALVÁN	INGENIERO DE APOYO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ELIECER SEGUNDO CORDERO SALGADO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NATALIA HENRÍQUEZ ZABALA	AUXILIAR SOCIAL Y SST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PERSONAL OPERATIVO EN CAMPO																																
SIRLIS PAOLA VALDÉS ZABALA	AUXILIAR DE TRANSITO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SAIDY VILLEGAS BARROSO	AUXILIAR DE TRANSITO								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ANDI ESTIWAR LÓPEZ CERRO	TOPOGRAFO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CARLOS ENRIQUE OSORIO RODRÍGUEZ	MAESTRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FRANK ALBERTO PASTRANA MONTES	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LUIS DAVID MEJIA MERCADO	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LUIS FERNANDO REYES TORRES	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OVER JOSE LAGARES RODRIGUEZ	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JENNER ANTONIO CÁRDENAS CASTILLO	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EDGAR HUMBERTO MONTALVO CABRERA	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LUIS CARLOS GOMEZ GUZMAN	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CARLOS GUTIERREZ	CONDUCTOR DE MOTONIVELADORA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

CONTROL DIARIO DE PERSONAL EN OBRA

GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OBRAS)

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO / OFICIO	PERIODO:	DESDE:	2024-06-01	HASTA	2024-06-30
		AÑO: 2024	MES:	JUNIO DEL 2024		

		S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
EDWIN VARGAS	CONDUCTOR DE CARGADOR DE LLANTAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MANUEL CABIEDEZ	VIBROCOMPACTADOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LUIS CARLOS HERNANDEZ	CONDUCTOR VOLQUETA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VICTOR ALMANZA	CONDUCTOR VOLQUETA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GERALDO ALVAREZ	CONDUCTOR VOLQUETA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GILDARDO GUZMAN	CONDUCTOR VOLQUETA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JHON TORO	CONDUCTOR VOLQUETA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LUIS GUARNIZO	CONDUCTOR VOLQUETA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SEBASTIAN RENDON	CONDUCTOR VOLQUETA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LUISA FERNANDA PANTOJA RAVELO	AUXILIAR DE TRANSITO	X	X	X	X	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
JAMER LUIS HERRERA MÓRELO	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
JOSE CRISPÍN MADERA HERNANDEZ	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
HUGO ENRIQUE URREGO URREGO	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
DANIEL MOLINA	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
ALDEIBER DE JESÚS BORJA MARTÍNEZ	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
DAINER JOSE ROMERO PAREDES	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

CONTROL DIARIO DE PERSONAL EN OBRA

GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OBRAS)

PERIODO: DESDE: 2024-06-01 HASTA 2024-06-30

AÑO: 2024 MES: JUNIO DEL 2024

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO / OFICIO	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
DAVID ESTEBAN BENAVIDES PEREA	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
ENRIQUE GUERRA REGINO	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
JADER ESTRADA CASTRO	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
JAIDER RIVERA	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
KENNYER DAVID PEREZ HERRERA	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
RONALD SMITH	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
SANTIAGO SOLANO	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
SERGIO LUIS YEPES AGUAS	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Interventor: SOCIEDAD TÉCNICA SOTA SAS	**Contratista de obra:** CONSORCIO IC-ING17027
Contrato No: 4600016527 DE 2023	**Contrato No: 4600016558 DE 2023**
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) – COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) – COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

FIRMA
NOMBRE: ELIECER CORDERO
RESIDENTE DE OBRA

FIRMA
NOMBRE: ELKIN ROJAS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANILLA SS CONTRATISTA DE OBRA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-12, 08:22:29 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 70855419

Periodo Cotización: mayo de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADO 12/06/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO IC ING 15027		
Documento	NI901756732	**Dirección**	CL 43B #30 - 23
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3530993
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CARMEN DE VIBORAL	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	LOPEZ ELEJALDE JORGE IVAN	**Identificación**	CC 1036396810
Total Afiliados	28	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineterio	Total
CC 1001549258	LUISA FERNANDA PANTOJA RAVELO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1001548612	JAIDER RIVERA HERRERA	01	00	X																0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION	$ 390.000	$ 62.400	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 390.000	$ 15.600	6,960	$ 390.000	$ 27.200	(CCF04) COMFAMA	$ 390.000	$ 15.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.800
CC 1001550223	SAUL SANTIAGO SOLANO GALE	01	00	X																0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION	$ 720.000	$ 115.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 720.000	$ 28.800	6,960	$ 720.000	$ 50.200	(CCF04) COMFAMA	$ 720.000	$ 28.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.000
CC 1017174160	SIRLIS PAOLA VALDEZ ZABALA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1035857837	LUIS DAVID MEJIA MERCADO	01	00	X																0	9	9	9	9	(231001) COLFONDOS	$ 390.000	$ 62.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 390.000	$ 15.600	6,960	$ 390.000	$ 27.200	(CCF04) COMFAMA	$ 390.000	$ 15.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.800
CC 1038435177	NATALIA HENRIQUEZ ZABALA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.400
CC 1038464780	KENNYER DAVID PEREZ HERRERA	01	00	X																0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 606.667	$ 97.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 606.667	$ 24.300	6,960	$ 606.667	$ 42.300	(CCF04) COMFAMA	$ 606.667	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.000
CC 1038464811	ENRIQUE GUERRA REGINO	01	00											X						0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 130.000	$ 20.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 130.000	$ 5.200	0,000	$ 130.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 86.666	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.000
CC 1038464811	ENRIQUE GUERRA REGINO	01	00	X																0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION	$ 476.667	$ 76.300	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 476.667	$ 19.100	6,960	$ 476.667	$ 33.200	(CCF04) COMFAMA	$ 476.667	$ 19.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.700
CC 1063292650	LUIS FERNANDO DIAZ QUINTERO	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 390.000	$ 62.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 390.000	$ 15.600	6,960	$ 390.000	$ 27.200	(CCF04) COMFAMA	$ 390.000	$ 15.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.800
CC 1070814154	JAMER LUIS HERRERA MORELO	01	00	X																0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 1.120.000	$ 179.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.120.000	$ 44.800	6,960	$ 1.120.000	$ 78.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.120.000	$ 44.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.800
CC 1079606761	LUIS FERNANDO REYES TORRES	01	00	X																0	14	14	14	14	(230201) PROTECCION	$ 606.667	$ 97.100	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 606.667	$ 24.300	6,960	$ 606.667	$ 42.300	(CCF04) COMFAMA	$ 606.667	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.000
CC 1103496861	RONAL ESMITH MERCADO TOVAR	01	00	X																0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION	$ 390.000	$ 62.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 390.000	$ 15.600	6,960	$ 390.000	$ 27.200	(CCF04) COMFAMA	$ 390.000	$ 15.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.800
CC 1124001485	DAVID ESTEBAN BENAVIDES PEREA	01	00	X																0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 606.667	$ 97.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 606.667	$ 24.300	6,960	$ 606.667	$ 42.300	(CCF04) COMFAMA	$ 606.667	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.000
CC 1152710444	ISABEL MEJIA HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1192911355	DANIEL ALBERTO MOLINA MEDRANO	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 720.000	$ 115.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 720.000	$ 28.800	6,960	$ 720.000	$ 50.200	(CCF04) COMFAMA	$ 720.000	$ 28.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.000
CC 52499486	PAOLA ANDREA ALMANZAR HENAO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.800.000	$ 608.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.800.000	$ 152.000	6,960	$ 3.800.000	$ 264.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.800.000	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.176.800
CC 6893188	ELIECER SEGUNDO CORDERO SALGADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.500.000	$ 720.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 4.500.000	$ 180.000	6,960	$ 4.500.000	$ 313.200	(CCF04) COMFAMA	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.393.200
CC 70058829	CARLOS EMILIO ZEA MUÑOZ	01	01																	0	0	30	30	30	(NN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 5.000.000	$ 200.000	6,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF04) COMFAMA	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 748.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 12/06/2024 | Empresa NI901756732 CONSORCIO IC ING 15027 | Planilla Nro: 70855419 | Periodo Cotización: mayo de 2024 | Periodo Servicio: junio de 2024

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	UPC	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 71721266	WILDEMAN FREDY GIRALDO DURANGO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 73170572	SERGIO LUIS YEPES AGUAS	01	00	X																0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 606.667	$ 97.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 606.667	$ 24.300	6,960	$ 606.667	$ 42.300	(CCF04) COMFAMA	$ 606.667	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.000
CC 8051718	CARLOS ENRIQUE OSORIO RODRIGUEZ	01	00	X																0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 1.120.000	$ 179.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.120.000	$ 44.800	6,960	$ 1.120.000	$ 78.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.120.000	$ 44.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.800
CC 8051780	JADER ESTRADA CASTRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 8052741	OVER JOSE LAGARES RODRIGUEZ	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 390.000	$ 62.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 390.000	$ 15.600	6,960	$ 390.000	$ 27.200	(CCF04) COMFAMA	$ 390.000	$ 15.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.800
CC 8371997	JENNER ANTONIO CARDENAS CASTILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 8372364	JOSE CRISPIN MADERA HERNANDEZ	01	00	X																0	14	14	14	14	(230201) PROTECCION	$ 1.120.000	$ 179.200	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	$ 1.120.000	$ 44.800	6,960	$ 1.120.000	$ 78.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.120.000	$ 44.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.800
CC 8373315	FRANC ALBERTO PASTRANA MONTES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 8373751	EDGAR HUMBERTO MONTALVO CABRERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 8374333	LUIS CARLOS GOMEZ GUZMAN	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 390.000	$ 62.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 390.000	$ 15.600	6,960	$ 390.000	$ 27.200	(CCF04) COMFAMA	$ 390.000	$ 15.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 32.873.335	$ 37.873.335	$ 37.873.335	$ 37.830.001	$ 5.259.900	$ 1.515.100	$ 2.628.100	$ 1.509.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.913.000	$ 0	$ 10.913.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-06-12, 08:01:18 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	CONSORCIO IC ING 15027
NIT	NI 901756732
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	70855419
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	698869410
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 10.913.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	13	$ 2.455.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	9	$ 1.749.400	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	$ 785.100	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	$ 270.400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	4	$ 84.300	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	2	$ 31.200	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$ 15.600	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	$ 224.800	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	12	$ 514.100	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	$ 24.300	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	2	$ 96.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	$ 524.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	28	$ 2.628.100	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	28	$ 1.509.900	$ 0

SubTotales:	$ 10.913.000	$ 0
Total a Pagar:		$ 10.913.000

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

67

INFORME EJECUTIVO

INFORME EJECUTIVO DE ACTIVIDADES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

INTERVENTORÍA A EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO – NECHÍ, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

30 DE JUNIO DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 4
3. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 5
4. INFORMACIÓN FINANCIERA: 7
5. GARANTIAS 8
6. CONCLUSIONES 9

SOTA LTDA.
SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

1. INTRODUCCIÓN

Con base en el Contrato de Interventoría, el cual tiene por Objeto "Realizar la INTERVENTORIA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO – NECHÍ, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"; el cual fue adjudicado a SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA., se presenta el siguiente informe ejecutivo.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Interventoría se presenta este Informe ejecutivo, el cual contiene las revisiones al Estado de la ejecución de la obra, realizada por el Contratista, CONSORCIO IC-ING 15027 en el mes de junio de 2024.

SOTA LTDA.
SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO CONVENIO	X	**NÚMERO:**		4600016558	
	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**		20/10/2023	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:				LICITACIÓN PÚBLICA	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				LIC-15027 SECOP II	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				08/11/2023	
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO – NECHÍ, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	
CONTRATISTA / CONVENIANTE		NOMBRE:		CONSORCIO IC-ING 15027 (INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PALACIO BAENA S.A - ICPB SA 90% e INGAP S.A.S SAS (10%)	
		NIT		**901756732-6**	
VALOR [$]:		INICIAL:		TRES MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ML **($3.056.491.448)**, INCLUIDO AIU	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			N/A	N/A	"N/A"
		VALOR TOTAL:		TRES MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ML **($3.056.491.448)**, INCLUIDO AIU	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4500061498	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		11/10/2023	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETESIENTOS DICISIETE PESOS ML ($458.473.717)	
PLAZO:		INICIAL		DOS PUNTO CINCO (2.5) MESES contados a partir de la suscripción de acta de inicio, sin superar el 25 de diciembre de 2023	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				08/11/2023	25/12/2023
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			01	27 días	23/01/2024
			02	Dos Meses	21/03/2024
			03	Dos Meses	08/08/2024

HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
	01	12 de febrero de 2024	30 de marzo de 2024	30 de marzo de 2024
	02	04 de abril de 2024	06 de mayo de 2024	08 de junio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	06/06/2024			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			FALTA POLIZAS ACTUALIZAS CON SUSPENSION Y REINICIO	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	4600016527

% DE EJECUCION FISICA	47.15%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	47.15%

3. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se realiza el seguimiento y control al contrato de obra de acuerdo con la reprogramación de obra N°3, con fecha de finalización 08 de agosto de 2024, de acuerdo con la prórroga No.03 del contrato.

ACTIVIDAD	CANT. EJECUTADA ACUM.	% EJECUTADO ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
PRODUCTO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO		46,98%	1,17%	-45,82%
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN D	390,94	65,16%	50,00%	-15,16%
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	2835,77	30,60%	75,00%	44,40%
SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE	558,13	53,98%	0,00%	-53,98%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOCELDA	3030,66	62,77%	0,00%	-62,77%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSA MDC 19	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTE DE BASE	68979,68	52,67%	0,00%	-52,67%
TRANSPORTE DE EXCAVACIÓN	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
PRODUCTO 2. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS		0,00%	0,00%	0,00%
CONCRETO CLASE D (21 MPA). CUNETAS.	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
PRODUCTO 3. CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT		100,00%	10,46%	-89,54%
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS	175,50	90,93%	100,00%	9,07%
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

ACTIVIDAD	CANT. EJECUTADA ACUM.	% EJECUTADO ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SELLADORA PARA MUROS SIKA PVC V15	54,00	100,00%	0,00%	-100,00%
LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	0,00	0,00%	100,00%	100,00%
CONCRETO CLASE F (14 MPA). SOLADOS DE E=0.05 M	4,70	100,00%	0,13%	-99,87%
CONCRETO CLASE C (28 MPA). BOX COULVERT - LOSA INFERIOR	13,50	100,00%	0,00%	-100,00%
CONCRETO CLASE C (28 MPA). BOX COULVERT - LOSA SUPERIOR Y MUROS LATERALES	30,15	100,00%	0,00%	-100,00%
CONCRETO CLASE C (28 MPA). MUROS, DISIPADORES, ALETAS.	9,88	100,00%	0,00%	-100,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO	5114,00	100,00%	0,00%	-100,00%
LLENO MECÁNICO COMPACTADO	29,70	100,00%	0,00%	-100,00%
PRODUCTO 4. SEÑALIZACION VIAL		0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN FRIO M2	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN CON PINTURA ACRÍLICA EN FRIO ML	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
SEÑAL VERTICAL DE 75 CM X 75 CM EN ÁNGULO DE 2"X2"X1/4"	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
SEÑAL VERTICAL DE 75CMX75CM DOBLE (SP/SR/SI), EN ÁNGULO 2"X2"X1/8"	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
SEÑAL VERTICAL POSTE DE REFERENCIA SI-04 DOBLE EN ÁNGULO DE 2"X2"X1/8".	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
PARAL ESTRUCTURA PARA SEÑALES VERTICALES DE TRANSITO INFORMATIVAS SI-05 Y SI-06, EN H.	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
PRODUCTO 5. MANTENIMIENTO MECÁNICO		4,00%	14,69%	10,69%
INSTALACIÓN Y COMPACTACION DE AFIRMADO	226,20	3,19%	100,00%	96,81%
TRANSPORTE DE AFIRMADO	0,00	0,00%	100,00%	100,00%

Avance en obra:

Programado del 37,76%

Ejecutado: 47.15%


Atraso: 9,39%

Actividades ejecutadas:

- Suministro y acopio de material seleccionado base
- Corte de material existente en la vía
- Instalación de material granular sobre la vía
- Instalación de Geocelda.
- Replanteo de la vía con comisión topografía
- Instalación de material de terraplén del K12+975 al K13+725
- Finaliza la construcción de Bòx en concreto ubicado en el K13+370, de 1,5x1,5

- Finaliza la construcción de Box en concreto ubicado en el K13+217, de 1,5x1,0
- La interventoría continúa realizando actividades topográficas en campo juntamente con el contratista.

Curva **S** programado vs ejecutado

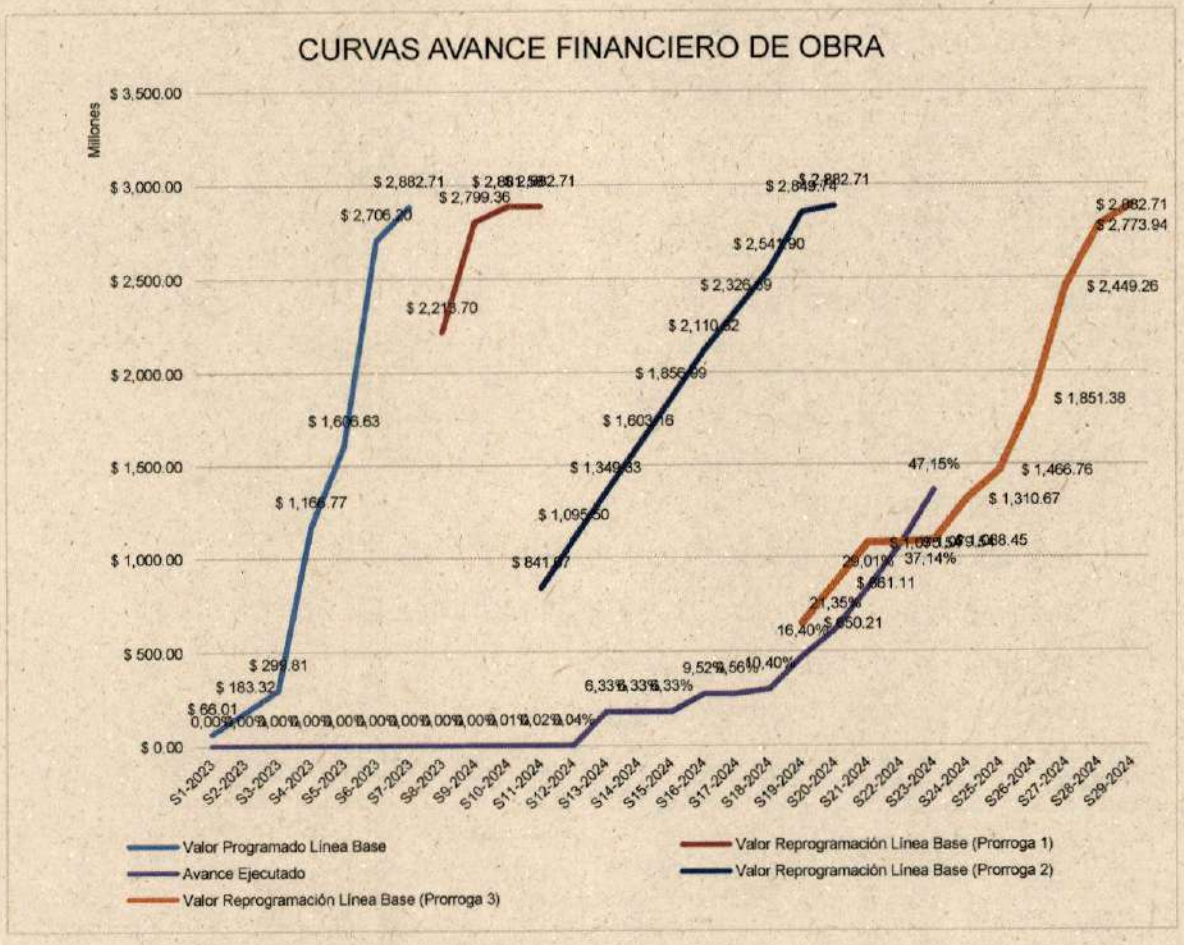

4. INFORMACIÓN FINANCIERA:

CONTRATO DE OBRA:

Se presenta relación de pago de actas parciales a la fecha:

RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 3.056.491.448,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.056.491.448,00
1. Adiciones	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 3.056.491.448,00	$ 0,00	$ 0,00	$3.056.491.448,00

RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
3. Anticipos	$ 458.473.717,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 458.473.717,00
4. Recursos pagados/ desembolsados	$ 274.308.629,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 274.308.629,00
5. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 732.782.346,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 732.782.346,00
6. Recursos ejecutados	$ 1.636.331.214,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 274.308.629,00
7. Recursos no ejecutados	$ 1.420.160.234,00	$ 0,00	$ 0,00	$2.782.182.819,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

DESCRIPCION	CONTRATADO	PAGADO
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 257.054.643,00	
VALOR ADICIONAL:	$ 278.256.919,00	
VALOR ACTUAL CONTRATO	$ 535.311.562,00	
VALOR ANTICIPO	N/A	
ACTA No. 01		$ 31.252.918
ACTA No. 02		$ 48.851.368
VALOR ACUMULADO FACTURADO (IVA INCLUIDO) A ACTA No.2		$ 80.104.286,00
SALDO POR PAGAR A LA FECHA	$ 455.207.276,00	

5. GARANTIAS

CONTRATO DE OBRA

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON PRORROGA No.3

Nombre de la Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Póliza C No. M-100213018 - Anexo 6

Póliza RC No. M-100048060 - Anexo 7

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$611.298.289,60	19	1	2024	8	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$458.473.717,20	19	1	2024	8	4	2025
Prestaciones sociales	10%	$305.649.144,80	19	1	2024	8	8	2027
Calidad del Servicio	10%	$305.649.144,80	21	3	2024	8	8	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$611.298.289,60	21	3	2024	8	8	2029
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	400 SMMLV	$520.000.000,00	18	10	2023	8	8	2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

POLIZAS ACTUALIZADAS CON PRORROGA No.3

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Póliza C No. 61-44-101051578.

Póliza RC No. M-100020791-2.

N.° DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)	
61-44-101051578 - 7	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/11/2023	13/03/2025	$107.064.112,40
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/11/2023	13/09/2027	$160.596.168,60
	CALIDAD DEL SERVICIO	20/01/2024	20/01/2029	$107.064.112,40

6. CONCLUSIONES

- Se aprueban los ítems no previstos presentados por la entidad contratante:

  NP1 - Suministro, colocación, conformación y compactación de material de relleno para terraplén, no incluye transporte. compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del proctor modificado.

  NP2 - Transporte de materiales de relleno para terraplén, para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. material compacto (incluye 30% de expansión).
- Se tiene la necesidad de prorrogar el contrato de obra para poder finalizar el contrato de obra, por un término de dos meses, esto es hasta fecha 08 de agosto del 2024
- Se tiene como nueva meta física, de acuerdo a la modificatoria No.1 al contrato de obra 680 metros de pavimento asfaltico y 300 metros de mantenimiento mecánico, para un total de intervención de 980 mts
- No se presenta atraso al cronograma de obra
- Las constantes lluvias presentadas en la región han hecho que no se tenga un mayor avance de obra esperado

JUAN CARLOS LEON LARA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

POLIZAS CONTRATO DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaria de Infraestructura Física	GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

CONTRATO DE OBRA No. 4600016558 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO IC-ING17027

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) – COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

FECHA DE INICIO: 8/11/2023

PLAZO INICIAL: 2,5 Meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 8/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 3.056.491.448,00

VALOR ACUMULADO: $ 3.056.491.448,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4600016527 DE 2023 **INTERVENTOR:** SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 611.298.289,60	19	1	2024	8	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 458.473.717,20	19	1	2024	8	4	2025
Prestaciones sociales	10%	$ 305.649.144,80	19	1	2024	8	8	2027
Calidad del Servicio	10%	$ 305.649.144,80	21	3	2024	8	8	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 611.298.289,60	21	3	2024	8	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100048060

Certificado de modificación o anexo No.: 6

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	400 SMMLV	**$ 520.000.000,00**	18	10	2023	8	8	2024
Amparo Basico - Predios, Labores y Operaciones		$ 520.000.000,00	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Patronal		$ 520.000.000,00						
Contratistas y Subcontratistas		$ 520.000.000,00						
Vehiculos Propios y No Propios		$ 520.000.000,00						
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. M-100213018 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 7

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DEL SEGURO S.A

OBSERVACIONES:

Los anexo 6 y 7 relacionados corresponden a la poliza actualizada con la Prorroga No.3 al contrato de obra

Firma

Nombre: JUAN CARLOS LEON

Directora de Interventoria

POLIZAS ACTUALIZADAS CON PRORROGA No.3

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.06.13 12:55:37 -05:00

Código de Seguridad: 1CyU1159/e4hccXYjOPBOA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	M-100213018	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	14891082	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	18/10/2023	24:00 Horas Del	08/08/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO IC-ING 15027	No. DOC. IDENTIDAD	901.756.732-6
DIRECCIÓN	CL 43 B 30 23	TELÉFONO	3104576323
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	No. DOC. IDENTIDAD	890.900.286-0
DIRECCIÓN	CALLE 42 B NO. 52 - 106	TELÉFONO	4099000
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	No. DOC. IDENTIDAD	890.900.286-0
DIRECCIÓN	CALLE 42 B NO. 52 - 106	TELÉFONO	4099000

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA N° 3 Y MODIFICACION N° 1 AL CONTRATO N° 4600016558 DE 2023, SE AMPLIA LA VIGENCIA POR 2 MESES, QUEDANDO COMO FECHA DE TERMINACION EL 08/08/2024.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.4600016558 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) - COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 811047188 (PART. 10,0 %) INGAP S.A.S
INTEGRANTE 2 - NIT: 811015828 (PART. 90,0 %) INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO BAENA S.A.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 19/01/2024	24:00 Horas Del 08/04/2025	611.298.289,60	467.266,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 19/01/2024	24:00 Horas Del 08/04/2025	458.473.717,20	350.450,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 19/01/2024	24:00 Horas Del 08/08/2027	305.649.144,80	120.585,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 08/08/2024	24:00 Horas Del 08/08/2029	305.649.144,80	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 08/08/2024	24:00 Horas Del 08/08/2029	611.298.289,60	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 2.292.368.586,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOTO SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	938.301,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	938.301,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	178.277,00
TOTAL A PAGAR	$	1.116.578,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/05/2029

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100213018	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	14891082	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	18/10/2023	24:00 Horas Del	08/08/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO IC-ING 15027)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PIGA - AP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.06.13 10:47:04 -05:00

Código de Seguridad: RFbEL1oPvZm1poJ4RLL7yg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D001

No. PÓLIZA	M-100048860	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	14891083	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	18/10/2023	24:00 Horas Del	08/08/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO IC-ING 15027	No. DOC. IDENTIDAD	901.756.732-6
DIRECCIÓN	CL 43 B 30 23	TELÉFONO	3104576323
ASEGURADO	CONSORCIO IC-ING 15027	No. DOC. IDENTIDAD	901.756.732-6
DIRECCIÓN	CL 43 B 30 23	TELÉFONO	3104576323
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA N°3 Y MODIFICACION N° 1 AL CONTRATO N° 4600016558 DE 2023, SE AMPLIA LA VIGENCIA POR 2 MESES, QUEDANDO COMO FECHA DE TERMINACION EL 08/08/2024
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.4600016558 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) - COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 811047188 (PART. 10,0 %) INGAP S.A.S
INTEGRANTE 2 - NIT: 811015828 (PART. 90,0 %) INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO BAENA S.A.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$20.000.000,00	273.534,00
PATRONAL	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$20.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$20.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$20.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ $20.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOTO SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	273.534,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	273.534,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	51.971,00
TOTAL A PAGAR	$	325.505,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/06/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100048060	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	14891003	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	18/10/2023	24:00 Horas Del	08/08/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO IC-ING 15027) , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO IC-ING 15027, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - AR

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría de Infraestructura Física	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría De Infraestructura Física Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App **INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO DE OBRA**

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S19-2024 Del 27/5/2024 al 2/6/2024

	Información Contractual
	Seguimiento del Avance Físico de Obra
	Actividades Ejecutadas del Proyecto
	Seguimiento del Avance Financiero de Obra
	Seguimiento a Nuevos Ítems (Obra Extra)
	Seguimiento del Avance Financiero de Interventoría
	Seguimiento Empleabilidad del Proyecto
	Varios
	Cuadro de mando

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - INFORMACIÓN CONTRACTUAL

	OBRA	INTERVENTORIA
S18-2024	4600016558 de 2023	4600016527 de 2023
PROCESO	LIC-15027	CON-15365
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) – COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) – COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA	**CONSORCIO IC-ING 15027** ICPB S.A. 90% INGAP S.A.S. 10 % REPRESENTANTE LEGAL - JORGE IVAN LOPEZ ELEJALDE	**SOCIEDAD TÉCNICASOTA LTDA.** REPRESENTANTE LEGAL - JAVIER BARRERO MOSSOS
NIT	901.756.732-6	891.101.100-5
SUBREGIÓN	BAJO CAUCA	
MUNICIPIOS IMPACTADOS	CAUCASIA - NECHI	
SUPERVISOR	VANESSA BETANCUR MARTINEZ	

ESTADO	EJECUCION	EJECUCION
VALOR	$3.056.491.448	$257.054.643
PLAZO	2,5 MESES	2 MESES Y 22 DÍAS
FECHA DE INICIO	8/11/2023	8/11/2023
FECHA DE FIN	8/06/2024	17/08/2024

	FECHA	VALOR	%	FECHA	VALOR	%
VALOR INICIAL	8/11/2023	$ 3.056.491.448	100,00%	5/09/2022	$ 257.054.643	48,02%
ADICIÓN 1				19/01/2024	$ 278.265.919	51,98%
VALOR TOTAL	**$**	**3.056.491.448**	**100,00%**	**$**	**535.320.562**	**100,00%**

	FECHA	DIAS	%	FECHA	DIAS	%
PLAZO INICIAL	8/11/2023	48,00	24,49%	8/11/2023	48	23,41%
AMPLIACIÓN 1	22/12/2023	27,00	13,78%	22/12/2023	36	17,56%
AMPLIACIÓN 2	19/01/2024	60,00	30,61%	19/01/2024	60	29,27%
AMPLIACIÓN 3	8/08/2024	61,00	31,12%	17/08/2024	61	29,76%
PLAZO TOTAL	**196 DIAS**		**100,00%**	**205 DIAS**		**100%**

	FECHA INICIO	FECHA FIN	DÍAS	FECHA INICIO	FECHA FIN	DÍAS
SUSPENSIÓN 1	12/2/2024	30/3/2024	48	13/2/2024	30/3/2024	47
SUSPENSIÓN 2	5/4/2024	5/5/2024	31	5/4/2024	5/5/2024	31
TOTAL	**79**			**78**		

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FISICO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) – COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

S18-2024 | Semana | S19-2024 | Del | 27/5/2024 | al | 2/6/2024

RESUMEN GRAFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

	Semana	Acumulado
Avance Programado	10,68%	98,86%
Avance Ejecutado	3,32%	11,83%
Desviación	7,36%	87,00%

Desviación (días)	0
Fin Proyectado	8/6/2024

CURVAS DE AVANCE GENERAL



AVANCE ACTIVIDADES LICENCIAS Y PERMISOS

ACTIVIDAD	% ANTERIOR			% ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
Aprovechamiento forestal	N/A			N/A	N/A	
Ocupación de cauce	N/A			N/A	N/A	
PMT	0%			0%	95%	95,00%

AVANCE ACTIVIDADES OBRAS

ACTIVIDAD	CANT. EJECUTADA ACUM.	% EJECUTADO ANTERIOR			% EJECUTADO ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
PRODUCTO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO					19,58%	100,00%	80,42%
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN D	390,94	73,21%			73,21%	100,00%	26,79%
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	2835,77	25,78%			25,78%	100,00%	74,22%
SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE	606,13	15,48%			32,18%	100,00%	67,82%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOCELDA	3030,66	34,23%			42,69%	100,00%	57,31%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA	0,00	0,00%			0,00%	100,00%	100,00%
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSA MDC 19	0,00	0,00%			0,00%	100,00%	100,00%
PRODUCTO 2. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS					0,00%	100,00%	100,00%
CONCRETO CLASE D (21 MPA). CUNETAS.	0,00	0,00%			0,00%	100,00%	100,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO	0,00	0,00%			0,00%	100,00%	100,00%
PRODUCTO 3. CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT					18,71%	100,00%	81,29%
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS	91,00	31,25%			32,50%	100,00%	67,50%
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	0,00	0,00%			0,00%	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SELLADORA PARA MUROS SIKA PVC V15	28,00	0,00%			30,43%	100,00%	69,57%
LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	0,00	0,00%			0,00%	100,00%	100,00%
CONCRETO CLASE F (14 MPA). SOLADOS DE E=0.05 M	2,38	28,00%			47,60%	100,00%	52,40%
CONCRETO CLASE C (28 MPA). BOX COULVERT - LOSA INFERIOR	7,00	21,88%			25,00%	100,00%	75,00%
CONCRETO CLASE C (28 MPA). BOX COULVERT - LOSA SUPERIOR Y MUROS LATERALES	12,26	7,84%			18,30%	100,00%	81,70%
CONCRETO CLASE C (28 MPA). MUROS, DISIPADORES, ALETAS.	0,00	0,00%			0,00%	100,00%	100,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO	2627,53	10,41%			25,35%	100,00%	74,65%
LLENO MECÁNICO COMPACTADO	0,00	0,00%			0,00%	100,00%	100,00%

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FISICO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) – COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

S18-2024 Semana S19-2024 Del 27/5/2024 al 2/6/2024

PRODUCTO 4. SEÑALIZACION VIAL					0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN FRIO M2	0,00	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN CON PINTURA ACRÍLICA EN FRIO ML	0,00	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS	0,00	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%
SEÑAL VERTICAL DE 75 CM X 75 CM EN ÁNGULO DE 2"X2"X1/4"	0,00	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%
SEÑAL VERTICAL DE 75CMX75CM DOBLE (SP/SR/SI), EN ÁNGULO 2"X2"X1/8"	0,00	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%
SEÑAL VERTICAL POSTE DE REFERENCIA SI-04 DOBLE EN ÁNGULO DE 2"X2"X1/8".	0,00	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%
PARAL ESTRUCTURA PARA SEÑALES VERTICALES DE TRANSITO INFORMATIVAS SI-05 Y SI-06, EN H,	0,00	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%
PRODUCTO 5. MANTENIMIENTO MECÁNICO					12,71%	100,00%	87,29%
INSTALACIÓN Y COMPACTACION DE AFIRMADO	226,20	40,67%			40,67%	100,00%	59,33%
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	0,00	0,00%			0,00%	100,00%	100,00%

SEGUIMIENTO CURVA S

GENERAL				
Atraso >= 5%	Atraso < 5%	Adelanto < 5%		Adelanto >= 5%
Semana	Avance Programado Linea Base	Avance Programado Reprogramación (Prorroga 1)	Avance Programado Reprogramación (Prorroga 2)	Avance Ejecutado
S1-2023	2,29%			0,00%
S2-2023	6,36%			0,00%
S3-2023	10,40%			0,00%
S4-2023	40,47%			0,00%
S5-2023	55,73%			0,00%
S6-2023	93,88%			0,00%
S7-2023	100,00%	56,96%		0,00%
S8-2023		76,8%		0,00%
S9-2024		97,1%		0,00%
S10-2024		99,90%		0,00%
S11-2024		100,00%	29,20%	0,00%
S12-2024			38,00%	0,00%
S13-2024			46,81%	6,27%
S14-2024			55,61%	6,27%
S15-2024			64,42%	6,27%
S16-2024			73,22%	8,03%
S17-2024			80,71%	8,03%
S18-2024			88,18%	8,51%
S19-2024			98,86%	11,83%
S20-2024			100,00%	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S19-2024 Del 27/5/2024 al 2/6/2024

Observaciones Generales

Descripción de las Actividades Ejecutadas esta Semana

PAVIMENTO: A LA FECHA NO SE HA INICIADO ESTA ACTIVIDAD

RIEGO DE EMULSION: A LA FECHA NO SE HA INICIADO ESTA ACTIVIDAD

CONFORMACION DE TERRENO:
- A LA FECHA SE TIENE UNA INTERVENCION DESDE K13+290 HASTA EL K13+725(FIN VÍA), SIN INTERVENCIÓN ESTA SEMANA

INSTALACION DE AFIRMADO PARA LLENO:
- A LA FECHA SE TIENE UNA INTERVENCION DESDE K13+290 HASTA EL K13+520, SIN INTERVENCIÓN ESTA SEMANA

INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR:
- A LA FECHA SE TIENE UNA INTERVENCION DE BASE GRANULAR DESDE K13+320 HASTA EL K13+725, SIN INTERVENCIÓN ESTA SEMANA
- LLEGA A OBRA MATERIAL DE BASE GRANULAR

CUNETAS : A LA FECHA NO SE HA INICIADO ESTA ACTIVIDAD


EXCAVACIÓN PARA BOX.:
*CONTINUAN ACTIVIDADES EN EL BOX UBICADO EN EL K13+217
*CONTINUAN ACTIVIDADES EN EL BOX UBICADO EN EL K13+370

INSTALACIÓN DE ACERO PARA BOX.:
*CONTINUAN ACTIVIDADES DE INSTALACION DE ACERO EN EL BOX UBICADO EN LA ABSCISA K13+217 EN ZARPA Y ALETAS
*CONTINUAN ACTIVIDADES DE INSTALACION DE ACERO EN EL BOX UBICADO EN LA ABSCISA K13+370 EN LOSA SUPERIOR, ZARPA Y ALETAS

CONCRETO PARA BOX.:
*INSTALACIÓN DE CONCRETO EN LOSA SUPERIOR, ZARPA Y ALETAS DE BOX UBICADO EN LA ABSCISA K13+217
*INSTALACIÓN DE CONCRETO EN LOSA SUPERIOR, ZARPA Y ALETAS DE BOX UBICADO EN LA ABSCISA K13+370
*SE TOMARON MUESTRAS PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA AL CONCRETO

OTROS:
*SE SOLICITÓ A LA FIRMA CONTRATISTA
1.PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON SUSPENSIÓN Y REINICIO DE OBRA Y PRORROGA No.3
2.REITERACIÓN DEL PERSONAL QUE VA A LABORAR EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA, EN CASO DE QUE SE PRODUJERA CAMBIOS DE PERSONAL EN OBRA, SOLICITAMOS ALLEGAR LAS HOJAS DE VIDA PERTINENTE CON SU RESPECTIVO OFICIO PIDIENDO EL CAMBIO DEL RESPECTIVO PROFESIONAL
3.PROGRAMA DE INVERSIONES POR SEMANAS CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACIÓN CON PRORROGA NO.3 EN EXCEL Y PDF FIRMADO
4. SE REALIZA VISITA DE OBRA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO EN REPRESENTACION DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
5. LLEGA A OBRA VIBROCOMPACTADOR

REGISTRO FOTOGRAFICO

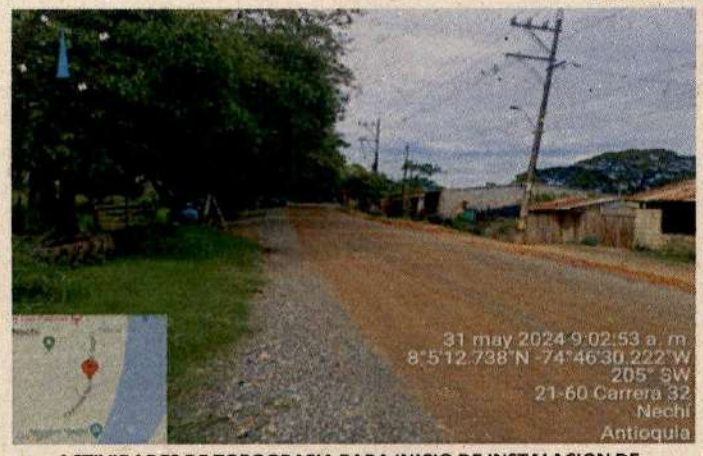

ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA PARA INICIO DE INSTALACION DE BASE GRANULAR



REUNIÓN VISITA DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S19-2024 Del 27/5/2024 al 2/6/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONCRETO 28 MPA - ZARPA - K13+370




CONCRETO 28 MPA - LOSA SUPERIOR K13+217

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONCRETO 28 MPA - LOSA SUPERIOR - K13+217

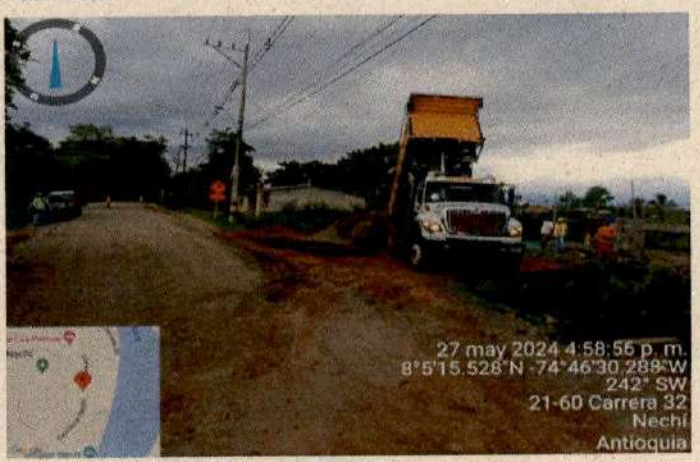

LLEGA MATERIAL DE BASE A OBRA

ACTIVIDADES AREA SST

-SE REALIZA CHARLA SOBRE FACTORES DE RIESGO EN LOS LUGARES DE TRABAJO
-SE REALIZAN SEGUIMIENTOS A INGRESO Y RETIRO DE PERSONAL
-SE HACE RECORRIDO DONDE SE EVIDENCIA EL USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
-SE FIJA NUEVA SEÑALIZACIÓN DE USO DE EPP
-SE LLEVA A CABO REUNIÓN ENTRE SUPERVISIÓN, CONTRATISTA INTERVENTORÍA DE PROYECTO DONDE SE DA A CONOCER AVANCES TÉCNICOS, AMBIENTALES, SOCIALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
-SE REALIZA SEGUIMIENTO A LO DOCUMENTAL REFERENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL SGSST

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S19-2024 Del 27/5/2024 al 2/6/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO






REGISTRO FOTOGRAFICO






ACTIVIDADES AREA AMBIENTAL

-Se realiza recorrido de obra evidenciando condiciones actuales del frente de trabajo
-El contratista continúa haciendo uso del punto ecológico en obra
-Se evidencia acopio temporal para el almacenamiento de elementos para actividades constructivas, tales como cemento y varillas, ambas se encuentran acopiadas sobre estibas
-Se evidencia uso y buen manejo de unidad sanitaria fija, el cual cuenta, con sistema séptico para tratamiento de las aguas residuales
-Se evidencia el buen uso de la concretadora, es de mencionar que cada vez que esta es utilizada para las actividades constructivas, esta es instalada sobre una cubierta plástica, para evitar el contacto directo con el suelo y por ende la contaminación de este

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S19-2024 Del 27/5/2024 al 2/6/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Manejo de residuos solidos



Acopio de cemento



Unidad Sanitaria Fija



Concretadora sobre plástico

ACTIVIDADES AREA FORESTAL

NO APLICA PARA ESTE PROYECTO

ACTIVIDADES AREA SOCIAL

-SE REALIZÓ RECORRIDO POR LA VÍA, SE HABLÓ CON LOS VOLQUETEROS SOBRE LAS SEÑALIZACIONES Y LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL PEATÓN
-SE REALIZÓ CALISTENIA POR LA MAÑANA Y CHARLA CON LOS EMPLEADOS DEL CUIDADO EN LA VÍA SOBRE LA IMPORTANCIA QUE ES TRABAJAR EN EQUIPO
VISITA Y COMITÉ DE OBRA SUPERVISIÓN DE LA GOBERNACIÓN, INTERVENTORÍA CONTRATISTA DE OBRA DONDE SE TRATARON TEMAS TÉCNICOS, AMBIENTALES, SST Y OCIALES, REVISIÓN DE AZ SOCIAL.
-SE REALIZÓ CALISTENIA Y UNA ORACIÓN Y SE HABLÓ UN POCO SOBRE EL CUIDADO DEL PEATÓN EN LA VÍA Y EL USO PERSONAL DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO



REUNIÓN


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

S18-2024	S19-2024	Del	20/05/2024	27/5/2024	al	2/06/2024

RESUMEN GRAFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

Avance Financiero Programado	$	2.849.740.661	98,86%
Avance Financiero Ejecutado	$	472.775.009	16,40%
Anticipo	$	458.473.717	15,00%
Facturado	$	274.308.629	8,97%
Potencial de Facturación	$	198.466.380	

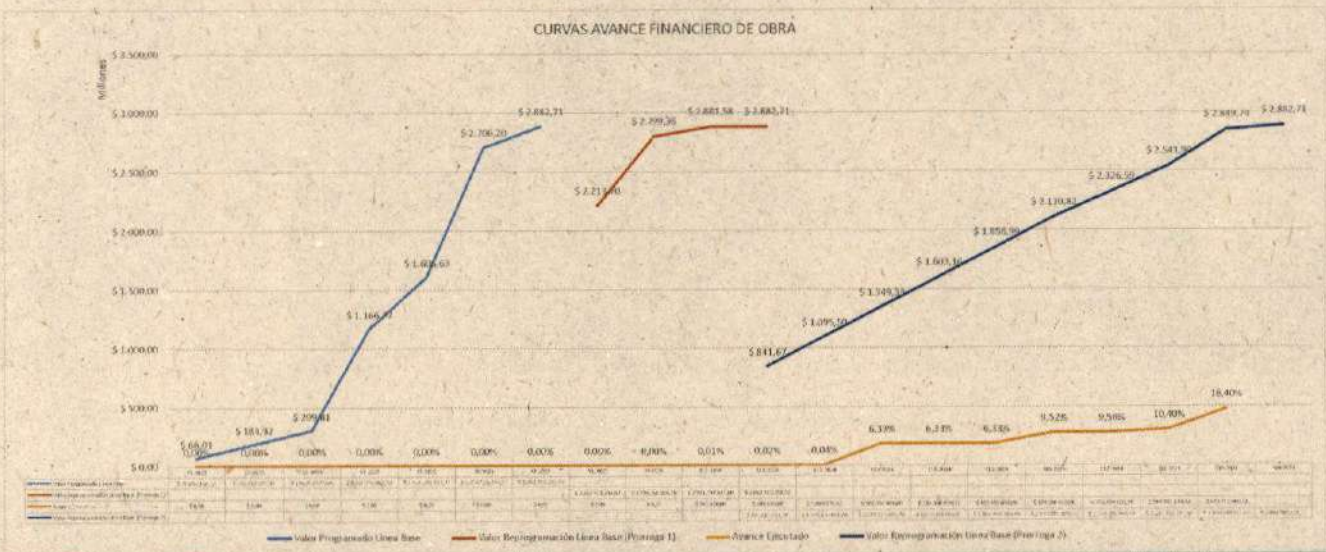

SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATADO	$	3.056.491.448
VALOR ADICIONAL POR MAYORES CANTIDADES EJECUTADAS EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$	-
VALOR DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O MENORES CANTIDADES EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$	-
VALOR POR PROYECCION DE NUEVAS OBRAS (OBRAS EXTRAS)		
VALOR TOTAL PROYECTO	$	3.056.491.448

SEGUIMIENTO CURVA S

				Atraso >= 5%			Atraso < 5%	Adelanto < 5%	Adelanto >= 5%
Semana	Valor Programado Linea Base	Valor Reprogramación Linea Base (Prorroga 1)	Valor Reprogramación Linea Base (Prorroga 2)	% Programado	% Reprogramado (Prorroga 1)	% Reprogramado (Prorroga 2)	Avance Ejecutado	% Ejecutado	Facturado
S1-2023	$ 66.011.139,12			2,29%			$ 0,00	0,00%	$ -
S2-2023	$ 183.317.227,47			6,36%			$ 0,00	0,00%	$ -
S3-2023	$ 299.814.579,06			10,40%			$ 0,00	0,00%	$ -
S4-2023	$ 1.166.769.862,58			40,47%			$ 0,00	0,00%	$ -
S5-2023	$ 1.606.629.797,77			55,73%			$ 0,00	0,00%	$ -
S6-2023	$ 2.706.199.656,50			93,88%			$ 0,00	0,00%	$ -
S7-2023	$ 2.882.712.391,03			100,00%			$ 0,00	0,00%	$ -
S8-2023		$ 2.213.701.839,67			76,79%		$ 0,00	0,00%	$ -
S9-2024		$ 2.799.361.934,00			97,11%		$ 0,00	0,00%	$ -
S10-2024		$ 2.881.584.691,00			99,96%		$ 342.090,00	0,01%	$ -
S11-2024		$ 2.882.712.391,00	$ 841.670.432,20		100,00%	29,20%	$ 684.180,00	0,02%	$ -
S12-2024			$ 1.095.500.641,40			38,00%	$ 1.049.076,00	0,04%	$ -
S13-2024			$ 1.349.330.850,60			46,81%	$ 182.350.038,00	6,33%	$ -
S14-2024			$ 1.603.161.059,80			55,61%	$ 182.350.038,00	6,33%	$ -
S15-2024			$ 1.856.991.269,00			64,42%	$ 182.350.038,00	6,33%	$ -
S16-2024			$ 2.110.821.478,20			73,22%	$ 274.308.912,91	9,52%	$ 274.308.629,00
S17-2024			$ 2.326.586.069,40			80,71%	$ 275.459.628,91	9,56%	$ -
S18-2024			$ 2.541.899.580,60			88,18%	$ 299.741.144,14	10,40%	$ -
S19-2024			$ 2.849.740.661,00			98,86%	$ 472.775.009,31	16,40%	$ -
S20-2024			$ 2.882.712.391,00			100,00%			

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

S18-2024	S19-2024	Del	20/05/2024	27/5/2024	al	2/6/2024

RESUMEN GRAFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

Avance Financiero Programado	$ 428.256.450	80,00%
Avance Financiero Ejecutado	$ 200.856.617	37,52%
Anticipo	$ -	0,00%
Facturado	$ 80.104.286	14,96%
Potencial de Facturación	$ 120.752.331	

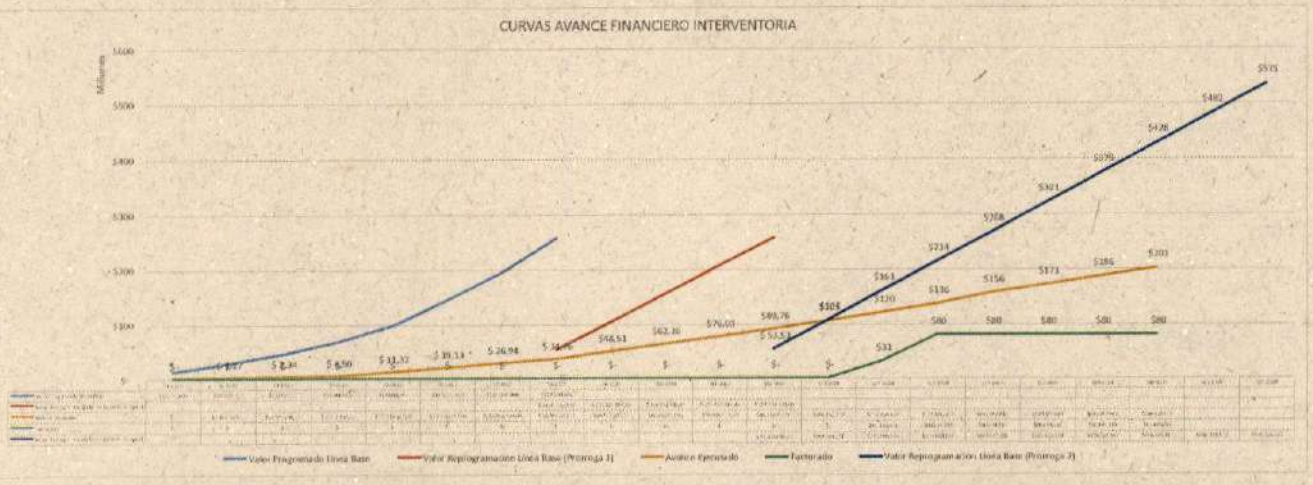

SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 257.054.643
VALOR ADICIONAL POR MAYORES CANTIDADES EJECUTADAS EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$ 278.265.919
VALOR DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O MENORES CANTIDADES EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$ -
VALOR POR PROYECCION DE NUEVAS OBRAS (OBRAS EXTRAS)	$ -
VALOR TOTAL PROYECTO	**$ 535.320.562**

SEGUIMIENTO CURVA S

				Atraso >= 5%	Atraso >= 5%		Atraso < 5%	Adelanto < 5%	Adelanto >= 5%
Semana	Valor Programado Linea Base	Valor Reprogramación Linea Base (Prorroga 1)	Valor Reprogramación Linea Base (Prorroga 2)	% Programado	% Reprogramado (Prorroga 1)	% Reprogramado (Prorroga 2)	Avance Ejecutado	% Ejecutado	Facturado
S1-2023	$ 12.000.000			4,67%			$ -	0,00%	$ -
S2-2023	$ 27.000.000			10,50%			$ 1.167.899,00	0,45%	$ -
S3-2023	$ 45.000.000			17,51%			$ 2.335.798,00	0,91%	$ -
S4-2023	$ 67.000.000			26,06%			$ 3.503.697,00	1,36%	$ -
S5-2023	$ 97.000.000			37,74%			$ 11.316.927,00	4,40%	$ -
S6-2023	$ 144.000.000			56,02%			$ 19.130.157,00	7,44%	$ -
S7-2023	$ 194.000.000			75,47%			$ 26.943.387,00	10,48%	$ -
S8-2023	$ 257.054.643	$ 51.410.928,60		100,00%	20,00%		$ 34.756.617,00	13,52%	$ -
S9-2024		$ 102.821.857,20			40,00%		$ 48.506.617,00	18,87%	$ -
S10-2024		$ 154.232.785,80			60,00%		$ 62.256.617,00	24,22%	$ -
S11-2024		$ 205.643.714,40			80,00%		$ 76.006.617,00	29,57%	$ -
S12-2024		$ 257.054.643,00	$ 53.532.056,20		100,00%	10,00%	$ 89.756.617,00	16,77%	$ -
S13-2024			$ 107.064.112			20,00%	$ 104.756.617	19,57%	$ -
S14-2024			$ 160.596.169			30,00%	$ 119.756.617	22,37%	$ 31.252.918
S15-2024			$ 214.128.225			40,00%	$ 135.856.617	25,38%	$ 80.104.286
S16-2024			$ 267.660.281			50,00%	$ 155.856.617	29,11%	$ 80.104.286
S17-2024			$ 321.192.337			60,00%	$ 170.856.617	31,92%	$ 80.104.286
S18-2024			$ 374.724.393			70,00%	$ 185.856.617	34,72%	$ 80.104.286
S19-2024			$ 428.256.450			80,00%	$ 200.856.617	37,52%	$ 80.104.286
S20-2024			$ 481.788.506			90,00%			
S21-2024			$ 535.320.562			100,00%			

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - EMPLEABILIDAD

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

S18-2024	S19-2024	Del	20/5/2024	al	2/6/2024


	Gobernación	Contratista Interventoría	Contratista Obra	Subcontratistas	Total	Incidencia Total
Ingresos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Profesionales		0	0		**0**	
Tecnólogos		0	0		**0**	
Operativos		0	0		**0**	
Administrativos		0	0		**0**	
Retiros	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Profesionales		0	0		**0**	
Tecnólogos		0	0		**0**	
Operativos		0	0		**0**	
Administrativos		0	0		**0**	
Activos	**0**	**6**	**33**	**0**	**39**	
Profesionales		4	7		**11**	**28,2%**
Tecnólogos		0	2		**2**	**5,1%**
Operativos		0	24		**24**	**61,5%**
Administrativos		2	0		**2**	**5,1%**
Caracterización						
Hombres		4	29		**33**	**84,6%**
Mujeres		2	4		**6**	**15,4%**
Primer Empleo		0	0		**0**	
Discapacitado		0	0		**0**	
Indígenas		0	0		**0**	
LGTBI		0	0		**0**	
Afrodescendiente		0	0		**0**	
Localización		6	33			
De la Subregión		2	29		**31**	**79,5%**
De Antioquia		2	2		**4**	**10,3%**
Fuera de Antioquia		2	2		**4**	**10,3%**

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - CUADRO DE MANDO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

S18-2024	Semana	S19-2024	Del	27/5/2024	al	2/6/2024

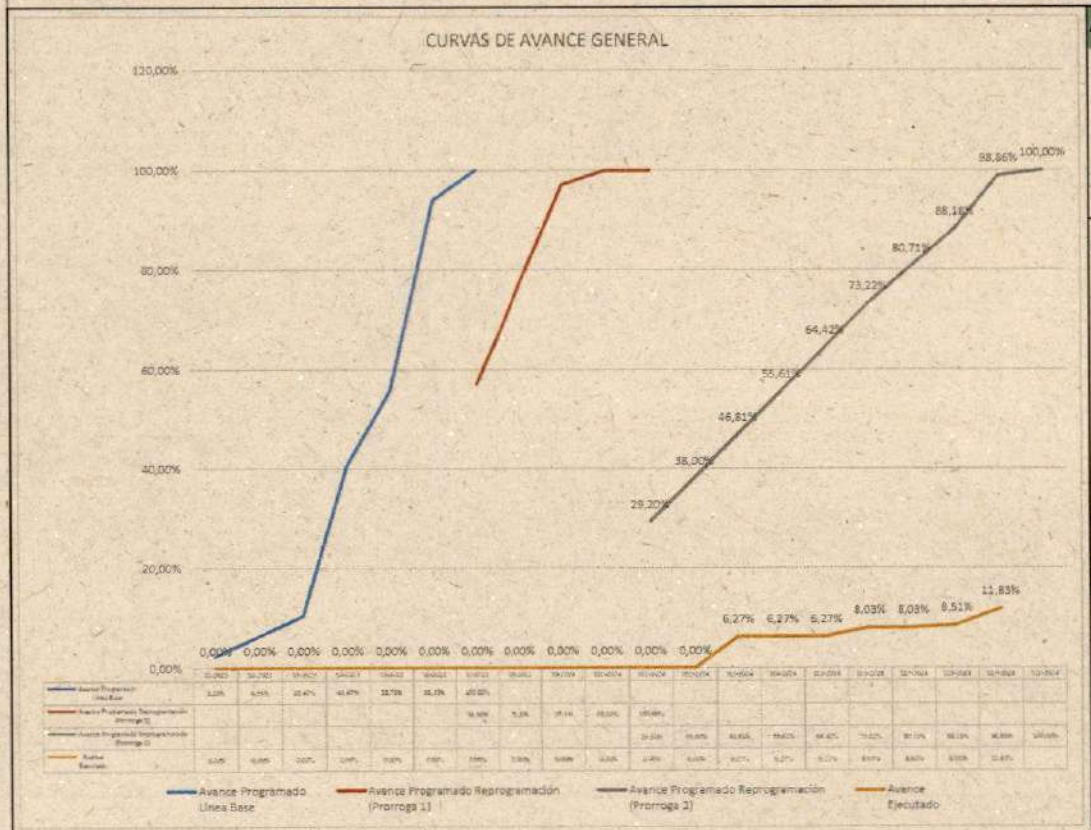

Avance Físico	Semana	Acumulado	
Avance Programado	10,68%	98,86%	-87,03%
Avance Ejecutado	3,32%	11,83%	
Plazo transcurrido	65,31%	128 días	
Fin Proyectado	8/8/2024		

Estructura Pavimento K13+725 - K13+045		Total	Ejecutado	Avance
Carpeta asfáltica	10 cm	1,00 Km	0,000 Km	0%
Base Gran.	20 cm	1,00 Km	0,340 Km	34%

Obras varias	Total	Ejecutado	Avance
Cunetas	103 ml	0,0	0%
Box Coulverts	1 Und	0,5	50%
Box Coulverts	1 Und	0,5	50%
Muros	0	0,0	


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaria de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - CUADRO DE MANDO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

S18-2024 Semana S19-2024 Del 27/5/2024 al 2/6/2024

Avance Financiero Obra

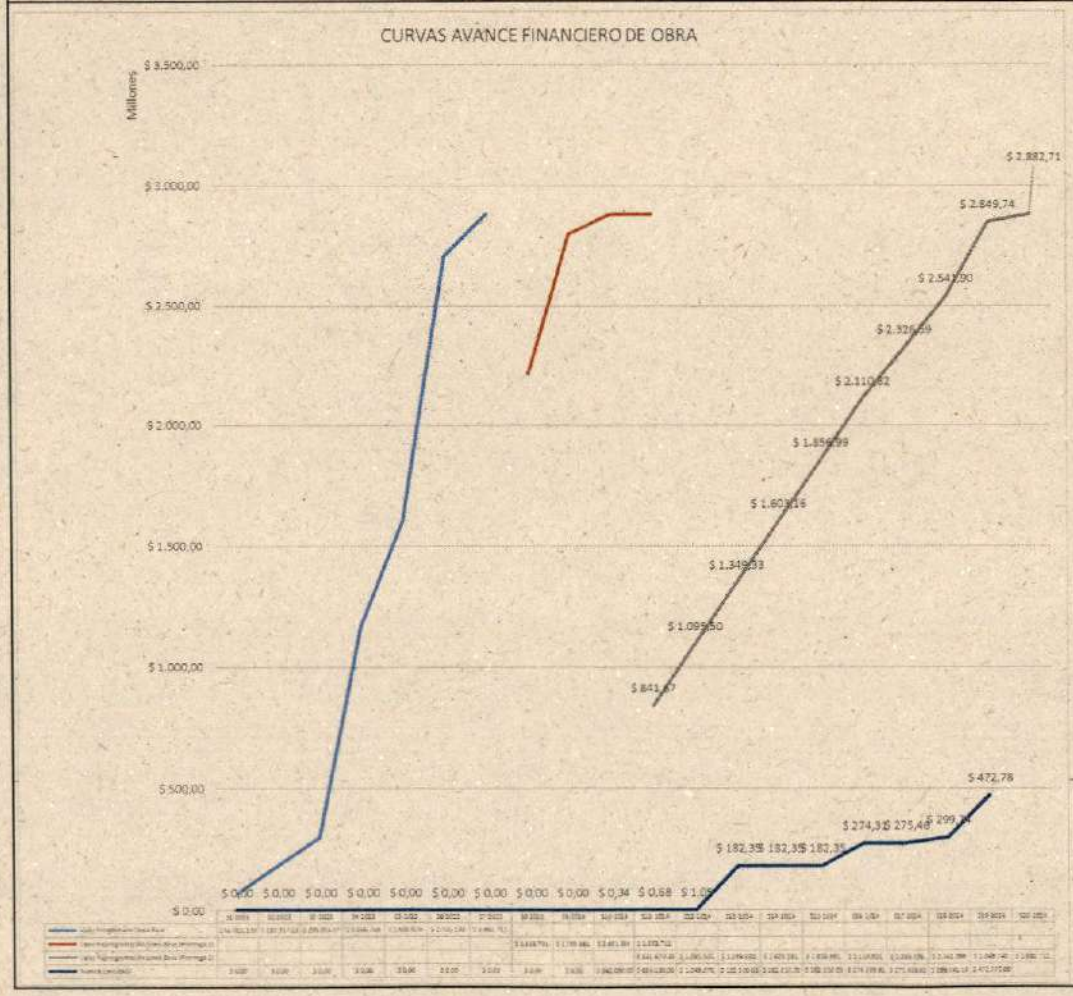


Avance Financ. Program.	$	2.849.740.661		98,86%
Avance Financ. Ejecut.	$	472.775.009		16,40%
Desviación	-$	2.376.965.652		-82,46%
Facturado	$	274.308.629		8,97%
Balance Financiero				Año suscripción
Valor Inicial	**$**	**3.056.491.448,00**	2634,91	2023
Adición 1	$	-	0,00 SMMLV	2024
Adición 2			0,00 SMMLV	
Valor Total	$	3.056.491.448	+ 0 %	
Valor Proyect.	$	3.056.491.448		
Análisis financiero en SMML				
Gran total a adicionar	**$**	**1.528.245.724,00**	1.317,45	50,00%
Gran total adicionado	$	-	0,00 SMMLV	0,00%
Disponible para el 50% V.I.C.	$	1.528.245.724	1.175,57 SMMLV	44,62%

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - CUADRO DE MANDO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

S18-2024	Semana	S19-2024	Del	27/5/2024	al	2/6/2024

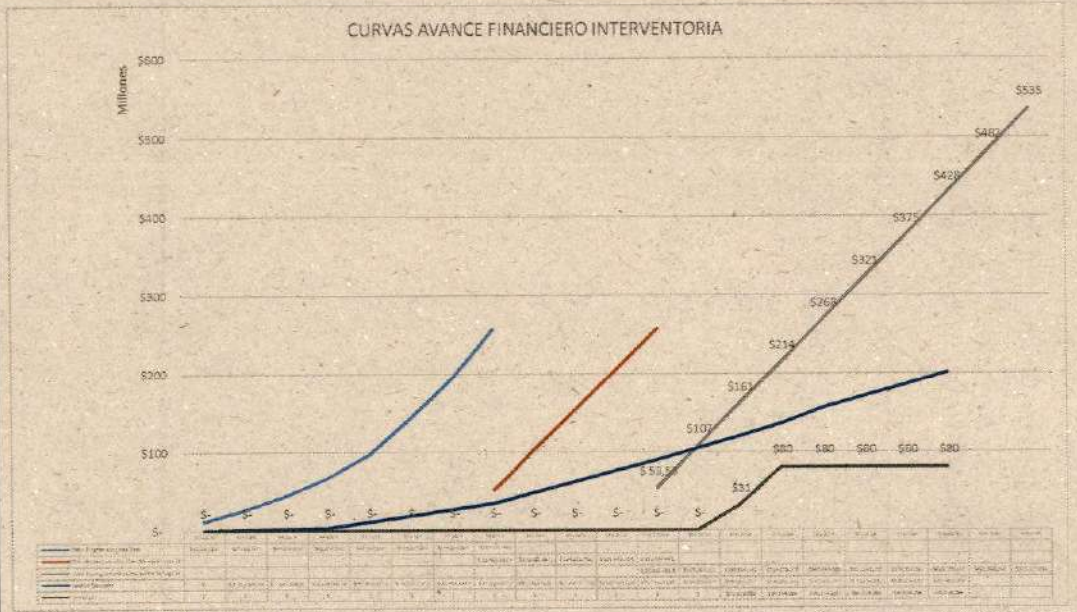



Avance Financiero			
Avance Financ. Program.	$	428.256.450	80,00%
Avance Financ. Ejecut.	$	200.856.617	37,52%
Desviación	-$	227.399.833	-42,48%
Facturado	$	80.104.286	14,96%
Plazo transcurrido	62,93%	129 días	
Fin Proyectado	17/8/2024		

Balance Financiero				Año suscripción
Valor Inicial	$	257.054.643	221,60 SMMLV	2023
Adición	$	278.265.919	214,05 SMMLV	2024
Valor Total	$	535.320.562	+96,59 %	
Valor Proyect.	$	535.320.562		

Análisis financiero en SMML				
Gran total a adicionar	$	-	110,80 SMMLV	50,00%
Gran total adicionado	$	278.265.919	214,05 SMMLV	96,59%
Disponible para el 50% V.I.C.	-$	278.265.919	-214,05 SMMLV	-96,59%



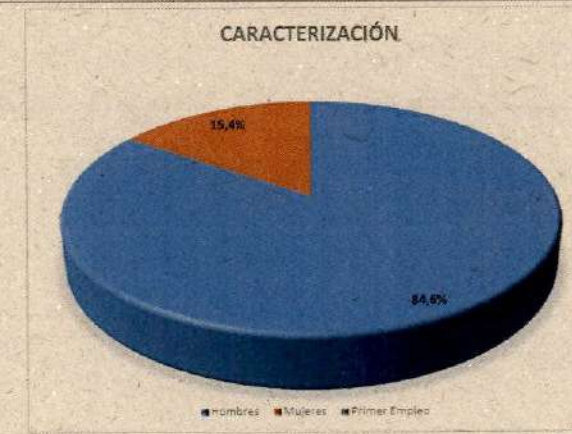

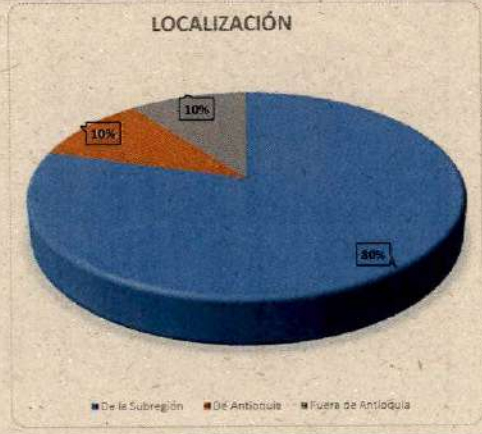

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría de Infraestructura Física	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría De Infraestructura Física Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App **INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO DE OBRA**

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S20-2024 Del 3/6/2024 al 9/6/2024

	Información Contractual
	Seguimiento del Avance Físico de Obra
	Actividades Ejecutadas del Proyecto
	Seguimiento del Avance Financiero de Obra
	Seguimiento a Nuevos Ítems (Obra Extra)
	Seguimiento del Avance Financiero de Interventoría
	Seguimiento Empleabilidad del Proyecto
	Varios
	Cuadro de mando

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - INFORMACIÓN CONTRACTUAL

	OBRA	INTERVENTORIA
S20-2024	4600016558 de 2023	4600016527 de 2023
PROCESO	LIC-15027	CON-15365
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) – COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) – COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA	**CONSORCIO IC-ING 15027** ICPB S.A. 90% INGAP S.A.S. 10 % REPRESENTANTE LEGAL - JORGE IVAN LOPEZ ELEJALDE	**SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.** REPRESENTANTE LEGAL - JAVIER BARRERO MOSSOS
NIT	901.756.732-6	891.101.100-5
SUBREGIÓN	BAJO CAUCA	
MUNICIPIOS IMPACTADOS	CAUCASIA - NECHI	
SUPERVISOR	VANESSA BETANCUR MARTINEZ	

ESTADO	EJECUCION	EJECUCION
VALOR	$3.056.491.448	$257.054.643
PLAZO	2,5 MESES	2 MESES Y 22 DÍAS
FECHA DE INICIO	8/11/2023	8/11/2023
FECHA DE FIN	8/08/2024	17/08/2024

	FECHA	VALOR	%	FECHA	VALOR	%
VALOR INICIAL	8/11/2023	$ 3.056.491.448	100,00%	5/09/2022	$ 257.054.643	48,02%
ADICIÓN 1				19/01/2024	$ 278.265.919	51,98%
VALOR TOTAL	**$**	**3.056.491.448**	**100,00%**	**$**	**535.320.562**	**100,00%**

	FECHA	DIAS	%	FECHA	DIAS	%
PLAZO INICIAL	8/11/2023	48,00	24,62%	8/11/2023	48	23,53%
AMPLIACIÓN 1	22/12/2023	27,00	13,85%	22/12/2023	36	17,65%
AMPLIACIÓN 2	19/01/2024	60,00	30,77%	19/01/2024	60	29,41%
AMPLIACIÓN 3	7/06/2024	60,00	30,77%	7/06/2024	60	29,41%
PLAZO TOTAL	**195 DIAS**		**100,00%**	**204 DIAS**		**100%**

	FECHA INICIO	FECHA FIN	DÍAS	FECHA INICIO	FECHA FIN	DÍAS
SUSPENSIÓN 1	12/2/2024	30/3/2024	48	13/2/2024	30/3/2024	47
SUSPENSIÓN 2	5/4/2024	5/5/2024	31	5/4/2024	5/5/2024	31
TOTAL	**79 DIAS**			**78 DIAS**		

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FISICO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) – COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA


Semana	S20-2024	20/05/2024	Del	3/6/2024	al	9/6/2024

RESUMEN GRAFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

	Semana	Acumulado
Avance Programado	7,32%	29,87%
Avance Ejecutado	2,87%	14,70%
Desviación	4,44%	15,20%

Desviación (días)	0
Fin Proyectado	8/8/2024

CURVAS DE AVANCE GENERAL

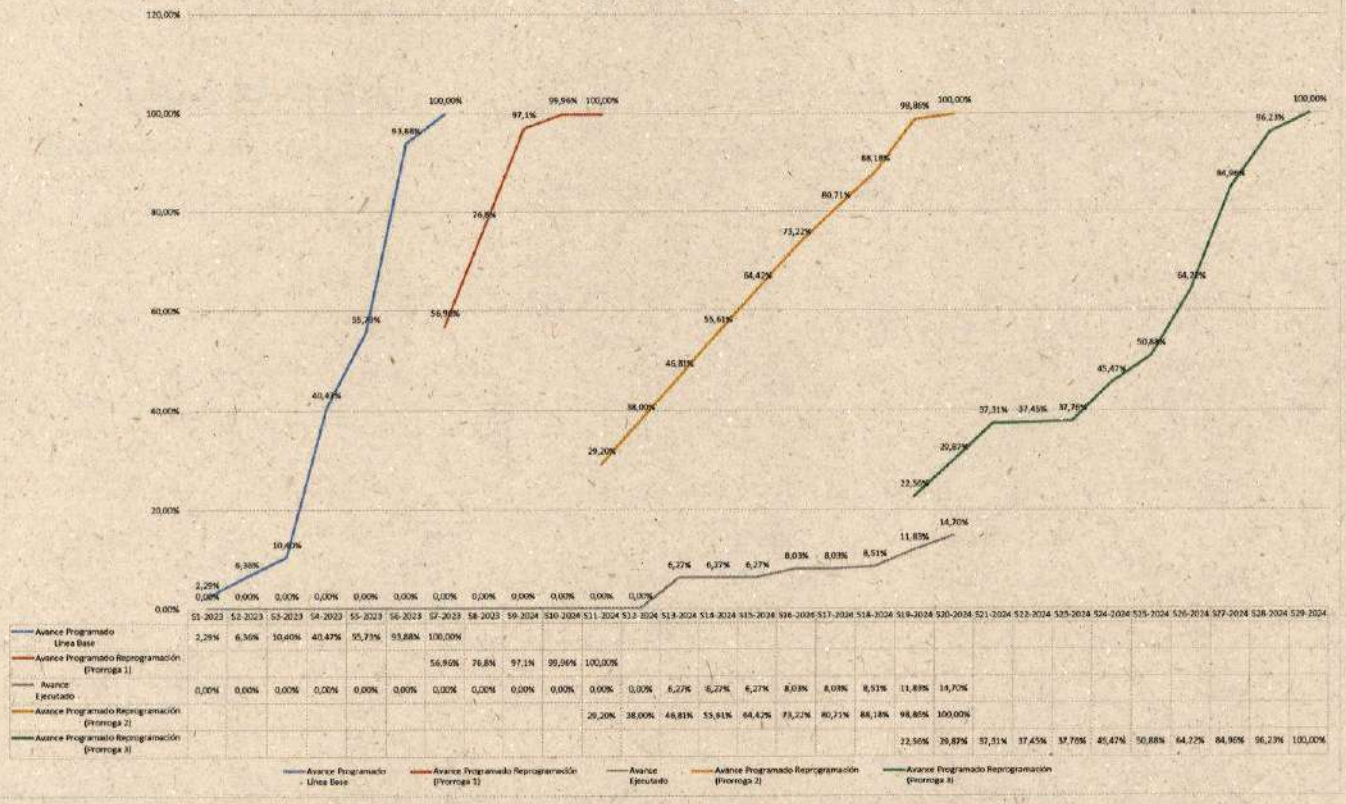

AVANCE ACTIVIDADES LICENCIAS Y PERMISOS

ACTIVIDAD	% ANTERIOR	% ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
Aprovechamiento forestal	N/A	N/A	N/A	
Ocupación de cauce	N/A	N/A	N/A	
PMT	0%	0%	68,97%	68,97%

AVANCE ACTIVIDADES OBRAS

ACTIVIDAD	CANT. EJECUTADA ACUM	% EJECUTADO ANTERIOR	% EJECUTADO ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
PRODUCTO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO			25,07%	0,00%	-25,07%
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN D	390,94	73,21%	73,21%	0,00%	-73,21%
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	2835,77	25,78%	25,78%	0,00%	-25,78%
SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE	886,13	32,18%	32,18%	0,00%	-32,18%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOCELDA	3030,66	42,69%	42,69%	0,00%	-42,69%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSA MDC 19	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTE DE BASE	84513,86	30,68%	30,68%	0,00%	-30,68%
TRANSPORTE DE EXCAVACIÓN	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PRODUCTO 2. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS			0,00%	0,00%	0,00%
CONCRETO CLASE D (21 MPA). CUNETAS.	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FISICO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) – COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana: S20-2024 | 20/05/2024 | Del: 3/6/2024 | al: 9/6/2024

PRODUCTO 3. CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT			28,14%	9,77%	-19,37%
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS	175,50	32,50%	62,68%	100,00%	37,32%
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SELLADORA PARA MUROS SIKA PVC V15	54,00	30,43%	58,70%	0,00%	-58,70%
LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
CONCRETO CLASE F (14 MPA). SOLADOS DE E=0.05 M	4,07	47,60%	81,35%	0,13%	-81,22%
CONCRETO CLASE C (28 MPA). BOX COULVERT - LOSA INFERIOR	13,50	25,00%	46,21%	0,00%	-46,21%
CONCRETO CLASE C (28 MPA). BOX COULVERT - LOSA SUPERIOR Y MUROS LATERALES	12,26	18,30%	18,30%	0,00%	-18,30%
CONCRETO CLASE C (28 MPA). MUROS, DISIPADORES, ALETAS.	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO	4072,00	25,35%	39,29%	0,00%	-39,29%
LLENO MECÁNICO COMPACTADO	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PRODUCTO 4. SEÑALIZACION VIAL			0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN FRIO M2	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN CON PINTURA ACRÍLICA EN FRIO ML	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEÑAL VERTICAL DE 75 CM X 75 CM EN ÁNGULO DE 2"X2"X1/4"	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEÑAL VERTICAL DE 75CMX75CM DOBLE (SP/SR/SI), EN ÁNGULO 2"X2"X1/8"	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEÑAL VERTICAL POSTE DE REFERENCIA SI-04 DOBLE EN ÁNGULO DE 2"X2"X1/8".	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PARAL ESTRUCTURA PARA SEÑALES VERTICALES DE TRANSITO INFORMATIVAS SI-05 Y SI-06, EN H,	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PRODUCTO 5. MANTENIMIENTO MECÁNICO			12,71%	11,75%	-0,96%
INSTALACIÓN Y COMPACTACION DE AFIRMADO	226,20	49,67%	40,67%	79,84%	39,17%
TRANSPORTE DE AFIRMADO	0,00	0,00%	0,00%	80,11%	80,11%

SEGUIMIENTO CURVA S

GENERAL

Atraso >= 5%	Atraso < 5%	Adelanto < 5%			Adelanto >= 5%
Semana	Avance Programado Linea Base	Avance Programado Reprogramación (Prorroga 1)	Avance Programado Reprogramación (Prorroga 2)	Avance Programado Reprogramación (Prorroga 3)	Avance Ejecutado
S1-2023	2,29%				0,00%
S2-2023	6,38%				0,00%
S3-2023	10,40%				0,00%
S4-2023	40,47%				0,00%
S5-2023	55,73%				0,00%
S6-2023	93,88%				0,00%
S7-2023	100,00%	56,96%			0,00%
S8-2023		76,8%			0,00%
S9-2024		97,1%			0,00%
S10-2024		99,96%			0,00%
S11-2024		100,00%	29,26%		0,00%
S12-2024			38,00%		0,00%
S13-2024			46,81%		6,27%
S14-2024			55,61%		6,27%
S15-2024			64,42%		6,27%
S16-2024			73,22%		8,03%
S17-2024			80,71%		8,03%
S18-2024			88,18%		8,51%
S19-2024			98,86%	22,56%	11,63%
S20-2024			100,00%	29,87%	14,70%
S21-2024				37,31%	
S22-2024				37,45%	
S23-2024				37,78%	
S24-2024				45,47%	
S25-2024				50,88%	
S26-2024				64,22%	
S27-2024				84,95%	
S28-2024				96,23%	
S29-2024				100,00%	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S20-2024 Del 3/6/2024 al 9/6/2024

Observaciones Generales

Descripción de las Actividades Ejecutadas esta Semana

PAVIMENTO: A LA FECHA NO SE HA INICIADO ESTA ACTIVIDAD

RIEGO DE EMULSION: A LA FECHA NO SE HA INICIADO ESTA ACTIVIDAD

CONFORMACION DE TERRENO:
- A LA FECHA SE TIENE UNA INTERVENCION DESDE K13+290 HASTA EL K13+725(FIN VÍA), SIN INTERVENCIÓN ESTA SEMANA

INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR:
- A LA FECHA SE TIENE UNA INTERVENCION DE BASE GRANULAR DESDE K13+320 HASTA EL K13+725, SIN INTERVENCIÓN ESTA SEMANA

CUNETAS : A LA FECHA NO SE HA INICIADO ESTA ACTIVIDAD

EXCAVACIÓN PARA BOX.:
*CONTINUAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION EN EL BOX UBICADO EN EL K13+217 MARGEN IZQUIERDA
*CONTINUAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION EN EL BOX UBICADO EN EL K13+370 MARGEN IZQUIERDA

INSTALACIÓN DE ACERO PARA BOX.:
*CONTINUAN ACTIVIDADES DE INSTALACION DE ACERO EN EL BOX UBICADO EN K13+217 EN LOSA INFERIOR, MUROS Y LOSA SUPERIOR MARGEN IZQUIERDA
*CONTINUAN ACTIVIDADES DE INSTALACION DE ACERO EN EL BOX UBICADO EN K13+370 EN LOSA INFERIOR, MUROS Y LOSA SUPERIOR MARGEN IZQUIERDA

CONCRETO PARA BOX.:
*INSTALACIÓN DE CONCRETO EN LOSA INFERIOR DE BOX UBICADO EN LA ABSCISA K13+217
*INSTALACIÓN DE CONCRETO EN LOSA INFERIOR DE BOX UBICADO EN LA ABSCISA K13+370
*SE TOMARON MUESTRAS PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA AL CONCRETO

OTROS:
1. SE DA PRORROGA No.3 AL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA POR TERMINO DE DOS MESES A PARTIR DEL 9 DE JUNIO DEL 2024 HASTA FECHA 8 DE AGOSTO DE 2024
2. SE DEBE ENTREGAR PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON SUSPENSIÓNES Y REINICIOS DE OBRA Y PRORROGA No.3
2. SE SOLICITO LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES POR SEMANAS CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACIÓN CON PRORROGA NO.3 EN EXCEL Y PDF FIRMADO
4. SE INICIAL LA INSTALACION DE MATERIAL GRANULAR PARA LLENO SOBRE LA VIA EXISTENTE

REGISTRO FOTOGRAFICO



SOLADO K13+217 M IZQ



ACERO BOX K13+217 MARGEN IZQ

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S20-2024 Del 3/6/2024 al 9/6/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



INSTALACION DE MATERIAL DE LLENO - K13+264 AL K13+367



INSTALACION DE MATERIAL DE LLENO - K13+264 AL K13+367

REGISTRO FOTOGRAFICO



INSTALACION DE MATERIAL DE LLENO - K12+980 AL K13+060



INSTALACION DE MATERIAL DE LLENO - K13+264 AL K13+367

ACTIVIDADES AREA SST

- SE REALIZAN SEGUIMIENTOS A INGRESO Y RETIRO DE PERSONAL
- SE REALIZAN RECORRIDOS DONDE SE EVIDENCIA EL USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
- SE HACE ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL DE OBRA EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES
- SE REINSTALA SEÑALIZACIÓN DE PMT DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES DIARIAS
- SE HACE ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS TRABAJADORAS DE PARE Y SIGA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES EVITANDO INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO
- SE HACE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN A DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA EN IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL SG-SST.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana: S20-2024 | Del: 3/6/2024 | al: 9/6/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



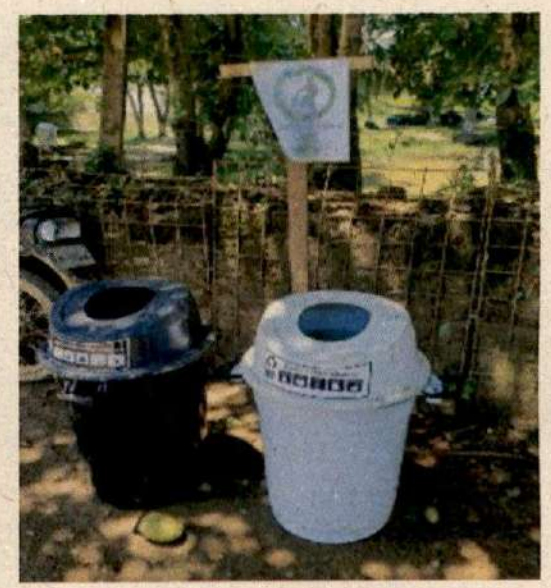



REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES AREA AMBIENTAL

-SE EVIDENCIA PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN OBRA RECIPIENTE DE COLOR BLANCO PARA MANEJO DE RECICLABLES Y RECIPIENTE COLOR NEGRO PARA MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIOS
-SE EVIDENCIA AVISOS INFORMATIVOS RELACIONADOS CON EL USO EFICIENTE DE ENERGÍA EN OFICINA, ES DE RECORDAR, QUE LA OFICINA ADMINISTRATIVA SE CARACTERIZA POR TENER LUZ NATURAL, CON LO CUAL SE MINIMIZA EL CONSUMO DE DICHOS RECURSOS
-SE EVIDENCIA EN CAMPO LA PROTECCIÓN DE MATERIALES CON CUBIERTA PLÁSTICA, ES DE MENCIONAR QUE SE DELIMITAN LOS MISMOS PARA EVITAR POSIBLES ACCIDENTES
-SE EVIDENCIA CHARLAS DIARIAS AL PERSONAL DE OBRA, EN TEMAS AMBIENTALES QUE BUSCAN MINIMIZAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES
-LOS EQUIPOS DE OBRA, LUEGO DE LA JORNADA LABORAL SON PARQUEADOS EN EL CAMPAMENTO DE OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO -

Avisos ahorro de energia



Maquinaria en campamento de obra



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S20-2024 Del 3/6/2024 al 9/6/2024

Capacitaciones ambientales



REGISTRO FOTOGRAFICO

Cubrimiento de materiales



ACTIVIDADES AREA FORESTAL

NO APLICA PARA ESTE PROYECTO

ACTIVIDADES AREA SOCIAL

-SE REALIZO ENTREGA DE VOLANTES INFORMATIVOS A LOS TRANSEÚNTES EXPLICANDO LOS MEDIOS DIRECTOS QUE TIENE LA OBRA PARA LOS PQRS
-SE LE EXPLICO DEL CIERRE DE LA VÍA, RESPETO POR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO PARE Y SIGA.
-SE REALIZÓ REVISIÓN DEL BUZÓN DE SUGERENCIA EN PRESENCIA DE DOS CIUDADANOS DONDE
-SE ENCONTRÓ UN PQRS Y EL OTRO PQRS EN LA PÁGINA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.
-SE REALIZÓ EN HORA DE LA MAÑANA CAPACITACIÓN CON LOS TRABAJADORES SOBRE LOS VALORES Y EL RESPETO ENTRE COMPAÑEROS PROTECCIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO








GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

S18-2024	S20-2024	Del	20/05/2024	3/6/2024	al	9/06/2024

RESUMEN GRAFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

Avance Financiero Programado	$	861.105.306	29,87%
Avance Financiero Ejecutado	$	615.565.953	21,35%
Anticipo	$	458.473.717	15,00%
Facturado	$	274.308.629	8,97%
Potencial de Facturación	$	341.257.324	

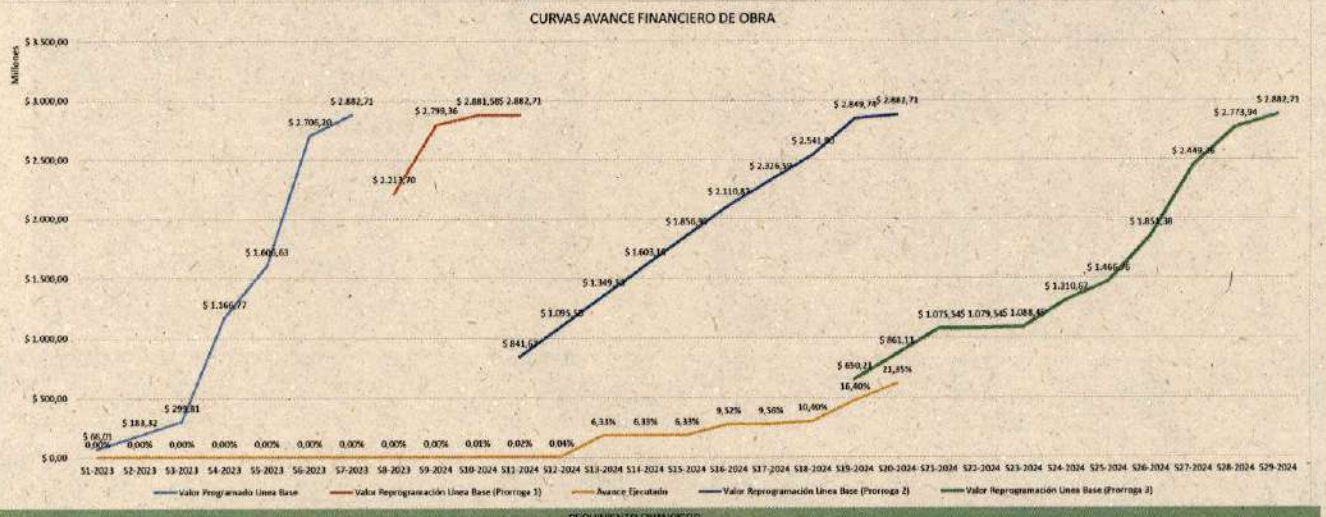

SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATADO	$	3.056.491.448
VALOR ADICIONAL POR MAYORES CANTIDADES EJECUTADAS EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$	-
VALOR DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O MENORES CANTIDADES EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$	-
VALOR POR PROYECCION DE NUEVAS OBRAS (OBRAS EXTRAS)		
VALOR TOTAL PROYECTO	$	3.056.491.448

SEGUIMIENTO CURVAS

					Atraso >= 5%				Atraso < 5%	Adelanto < 5%	Adelanto >= 5%
Semana	Valor Programado Linea Base	Valor Reprogramación Linea Base (Prorroga 1)	Valor Reprogramación Linea Base (Prorroga 2)	Valor Reprogramación Linea Base (Prorroga 3)	% Programado	% Reprogramado (Prorroga 1)	% Reprogramado (Prorroga 2)	% Reprogramado (Prorroga 3)	Avance Ejecutado	% Ejecutado	Facturado
S1-2023	$ 66.011.139,12				2,29%				$ 0,00	0,00%	$ -
S2-2023	$ 183.317.227,47				6,36%				$ 0,00	0,00%	$ -
S3-2023	$ 299.814.579,06				10,40%				$ 0,00	0,00%	$ -
S4-2023	$ 1.160.769.862,58				40,47%				$ 0,00	0,00%	$ -
S5-2023	$ 1.606.629.797,77				55,73%				$ 0,00	0,00%	$ -
S6-2023	$ 2.706.199.656,50				93,86%				$ 0,00	0,00%	$ -
S7-2023	$ 2.882.712.391,03				100,00%				$ 0,00	0,00%	$ -
S8-2023		$ 2.213.701.839,57				76,79%			$ 0,00	0,00%	$ -
S9-2024		$ 2.799.361.934,00				97,11%			$ 0,00	0,00%	$ -
S10-2024		$ 2.881.584.691,00				99,96%			$ 342.090,00	0,01%	$ -
S11-2024		$ 2.882.712.391,00	$ 841.670.432,20			100,00%	29,20%		$ 684.180,00	0,02%	$ -
S12-2024			$ 1.095.500.641,40				38,00%		$ 1.049.076,00	0,04%	$ -
S13-2024			$ 1.349.330.850,60				46,81%		$ 182.350.038,00	6,33%	$ -
S14-2024			$ 1.603.161.059,80				55,61%		$ 182.350.038,00	6,33%	$ -
S15-2024			$ 1.856.991.269,00				64,42%		$ 182.350.038,00	6,33%	$ -
S16-2024			$ 2.110.821.478,20				73,22%		$ 274.308.912,91	9,52%	$ 274.308.629,00
S17-2024			$ 2.326.586.069,40				80,71%		$ 275.459.628,91	9,56%	$ -
S18-2024			$ 2.541.899.580,60				88,18%		$ 299.741.144,14	10,40%	$ -
S19-2024			$ 2.849.740.661,00	$ 650.214.715,86			98,86%	22,50%	$ 472.775.009,31	16,40%	$ -
S20-2024			$ 2.882.712.391,00	$ 861.105.306,33			100,00%	29,87%	$ 615.565.952,69	21,35%	
S21-2024				$ 1.075.543.223,80				37,31%			
S22-2024				$ 1.079.543.136,73				37,45%			
S23-2024				$ 1.088.447.749,56				37,76%			
S24-2024				$ 1.310.668.782,43				45,47%			
S25-2024				$ 1.466.760.908,28				50,88%			
S26-2024				$ 1.851.380.768,12				64,22%			
S27-2024				$ 2.449.263.800,91				84,96%			
S28-2024				$ 2.773.939.387,42				96,23%			
S29-2024				$ 2.882.712.391,00				100,00%			

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHÍ EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

S16-2024	S20-2024	Del	20/05/2024	3/6/2024	al	9/6/2024

RESUMEN GRÁFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

Avance Financiero Programado	$ 234.303.012	43,77%
Avance Financiero Ejecutado	$ 245.856.617	45,93%
Anticipo	$ -	0,00%
Facturado	$ 80.104.286	14,96%
Potencial de Facturación	$ 165.752.331	

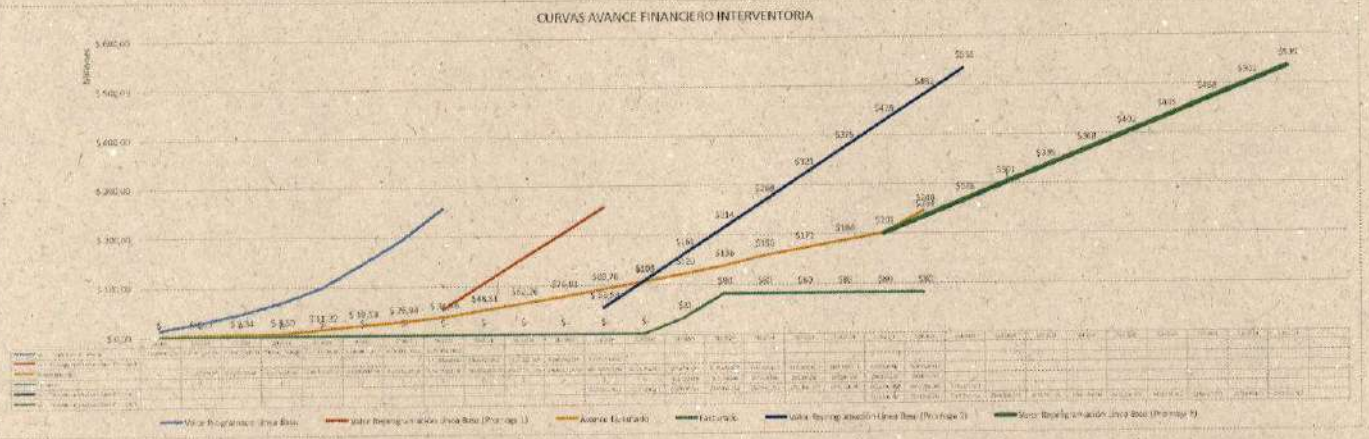

SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 257.054.643
VALOR ADICIONAL POR MAYORES CANTIDADES EJECUTADAS EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$ 278.265.919
VALOR DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O MENORES CANTIDADES EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$ -
VALOR POR PROYECCION DE NUEVAS OBRAS (OBRAS EXTRAS)	$ -
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 535.320.562

SEGUIMIENTO CURVA S

					Atraso >= 5%	Atraso >= 5%			Atraso < 5%	Adelanto < 5%	Adelanto >= 5%
Semana	Valor Programado Línea Base	Valor Reprogramación Línea Base (Prorroga 1)	Valor Reprogramación Línea Base (Prorroga 2)	Valor Reprogramación Línea Base (Prorroga 3)	% Programado	% Reprogramado (Prorroga 1)	% Reprogramado (Prorroga 2)	% Reprogramado (Prorroga 3)	Avance Ejecutado	% Ejecutado	Facturado
S1-2023	$ 12.000.000,00				4,67%				$ -	0,00%	$ -
S2-2023	$ 27.000.000,00				10,50%				$ 1.167.898,00	0,45%	$ -
S3-2023	$ 45.000.000,00				17,51%				$ 2.335.798,00	0,91%	$ -
S4-2023	$ 67.000.000,00				26,06%				$ 3.503.697,00	1,36%	$ -
S5-2023	$ 97.000.000,00				37,74%				$ 11.316.927,00	4,40%	$ -
S6-2023	$ 144.000.000,00				56,02%				$ 19.130.157,00	7,44%	$ -
S7-2023	$ 194.000.000,00				75,47%				$ 26.943.387,00	10,48%	$ -
S8-2023	$ 257.054.643,00	$ 51.410.928,60			100,00%	20,00%			$ 34.756.617,00	13,52%	$ -
S9-2024		$ 102.821.857,20				40,00%			$ 48.506.617,00	18,87%	$ -
S10-2024		$ 154.232.785,80				60,00%			$ 62.256.617,00	24,22%	$ -
S11-2024		$ 205.643.714,40				80,00%			$ 76.006.617,00	29,57%	$ -
S12-2024		$ 257.054.643,00	$ 53.532.056,20			100,00%	10,00%		$ 89.756.617,00	16,77%	$ -
S13-2024			$ 107.064.112				20,00%		$ 104.756.617	19,57%	$ -
S14-2024			$ 160.596.169				30,00%		$ 119.756.617	22,37%	$ 31.252.918
S15-2024			$ 214.128.225				40,00%		$ 135.856.617	25,38%	$ 80.104.286
S16-2024			$ 267.660.281				50,00%		$ 155.856.617	29,11%	$ 80.104.286
S17-2024			$ 321.192.337				60,00%		$ 170.856.617	31,92%	$ 80.104.286
S18-2024			$ 374.724.393				70,00%		$ 185.856.617	34,72%	$ 80.104.286
S19-2024			$ 428.256.450	$ 200.856.617			80,00%	37,52%	$ 200.856.617	37,52%	$ 80.104.286
S20-2024			$ 481.788.506	$ 234.303.012			90,00%	43,77%	$ 245.856.617	45,93%	$ 80.104.286
S21-2024			$ 535.320.562	$ 267.749.406			100,00%	50,02%			
S22-2024				$ 301.195.801				56,26%			
S23-2024				$ 334.642.195				62,51%			
S24-2024				$ 368.088.590				68,76%			
S25-2024				$ 401.534.984				75,01%			
S26-2024				$ 434.981.379				81,26%			
S27-2024				$ 468.427.773				87,50%			
S28-2024				$ 501.874.168				93,75%			
S29-2024				$ 535.320.562				100,00%			

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - EMPLEABILIDAD

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

S18-2024	S20-2024	Del	20/5/2024	al	9/6/2024


	Gobernación	Contratista Interventoría	Contratista Obra	Subcontratistas	Total	Incidencia Total
Ingresos	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	
Profesionales		0	0		**0**	
Tecnólogos		0	0		**0**	
Operativos		0	1		**1**	**100,0%**
Administrativos		0	0		**0**	
Retiros	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	
Profesionales		0	0		**0**	
Tecnólogos		0	0		**0**	
Operativos		0	1		**1**	**100,0%**
Administrativos		0	0		**0**	
Activos	**0**	**6**	**33**	**0**	**39**	
Profesionales		4	7		**11**	**28,2%**
Tecnólogos		0	2		**2**	**5,1%**
Operativos		0	24		**24**	**61,5%**
Administrativos		2	0		**2**	**5,1%**
Caracterización						
Hombres		4	29		**33**	**84,6%**
Mujeres		2	4		**6**	**15,4%**
Primer Empleo		0	0		**0**	
Discapacitado		0	0		**0**	
Indígenas		0	0		**0**	
LGTBI		0	0		**0**	
Afrodescendiente		0	0		**0**	
Localización		6	33			
De la Subregión		2	29		**31**	**79,5%**
De Antioquia		2	2		**4**	**10,3%**
Fuera de Antioquia		2	2		**4**	**10,3%**

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - CUADRO DE MANDO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana: S20-2024 | Del: 3/6/2024 | al: 9/6/2024

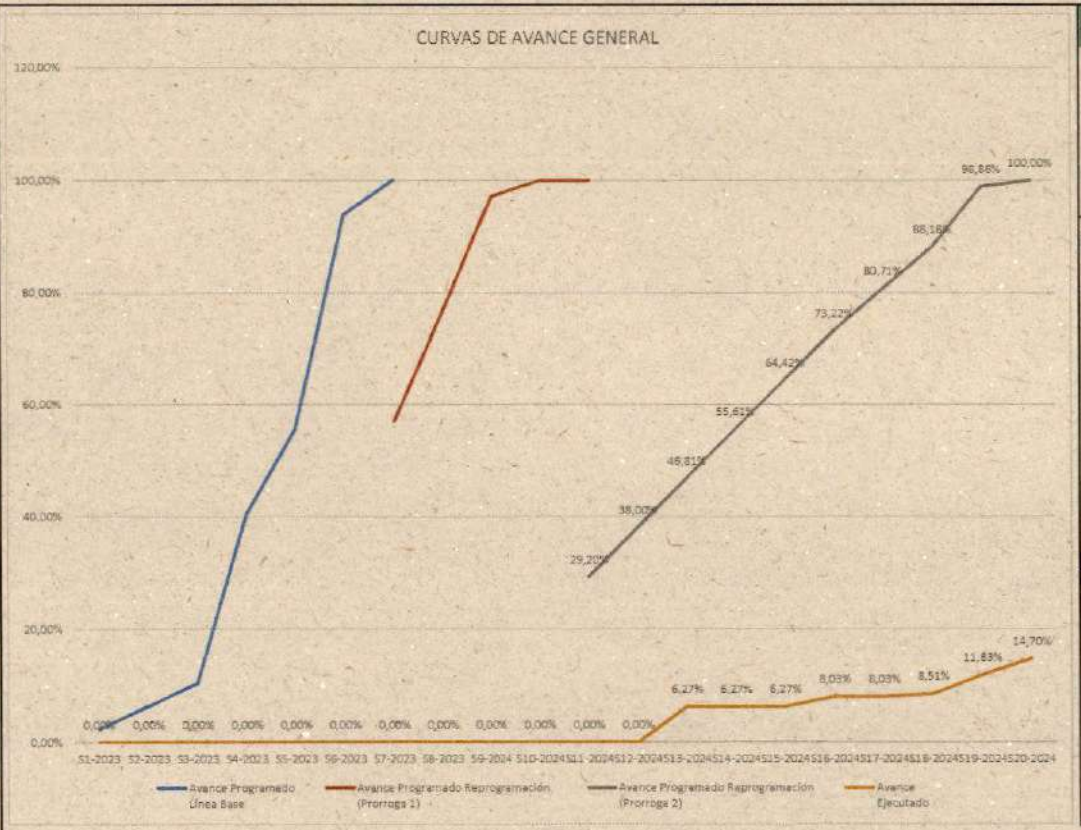

Avance Físico	Semana	Acumulado	
Avance Programado	7,32%	29,87%	-15,17%
Avance Ejecutado	2,67%	14,70%	
Plazo transcurrido	69,23%	135 días	
Fin Proyectado	8/8/2024		

Estructura Pavimento K13+725 - K13+045		Total	Ejecutado	Avance
Carpeta asfáltica	10 cm	1,00 Km	0,000 Km	0%
Base Gran.	20 cm	1,00 Km	0,340 Km	34%


Obras varias	Total	Ejecutado	Avance
Cunetas	103 ml	0,00	0%
Box Coulverts K13+217	1 Und	0,75	75%
Box Coulverts K13+370	1 Und	0,75	75%
Muros	0	0,00	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - CUADRO DE MANDO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S20-2024 Del 3/6/2024 al 9/6/2024

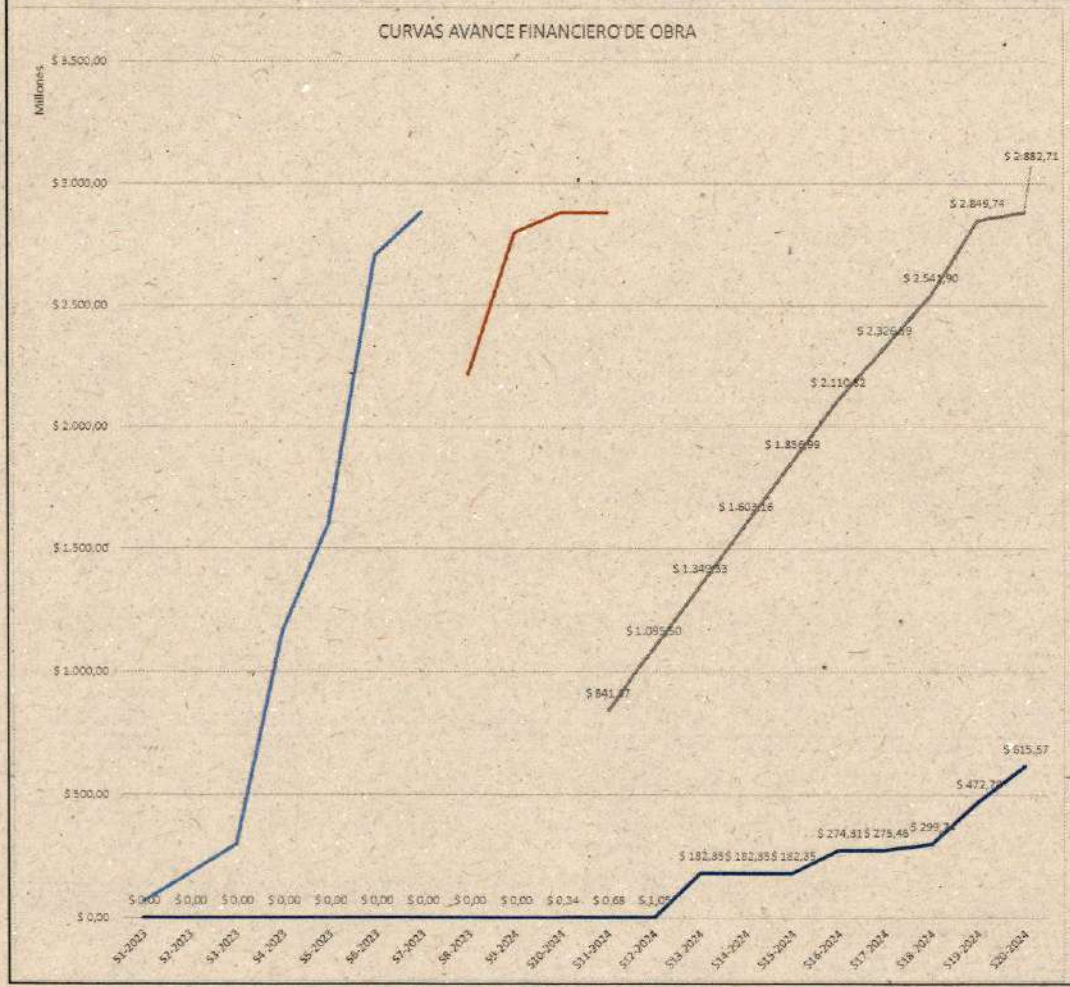

Avance Financiero Obra

Avance Financ. Program.	$	861.105.306	29,87%
Avance Financ. Ejecut.	$	615.565.953	21,35%
Desviación	-$	245.539.354	-8,52%
Facturado	$	274.308.629	8,97%
Balance Financiero			Año suscripción

Valor Inicial	**$**	**3.056.491.448,00**	2351,15	2023
Adición 1	$	-	0,00 SMMLV	2024
Adición 2			0,00 SMMLV	
Valor Total	$	3.056.491.448	+0 %	
Valor Proyect.	$	3.056.491.448		
Análisis financiero en SMML				


Gran total a adicionar	**$**	**1.363.665.415,26**	1.175,57	50,00%
Gran total adicionado	$	-	0,00 SMMLV	0,00%
Disponible para el 50% V.I.G.	$	1.363.665.415	1.048,97 SMMLV	44,62%

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - CUADRO DE MANDO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S20-2024 Del 3/6/2024 al 9/6/2024

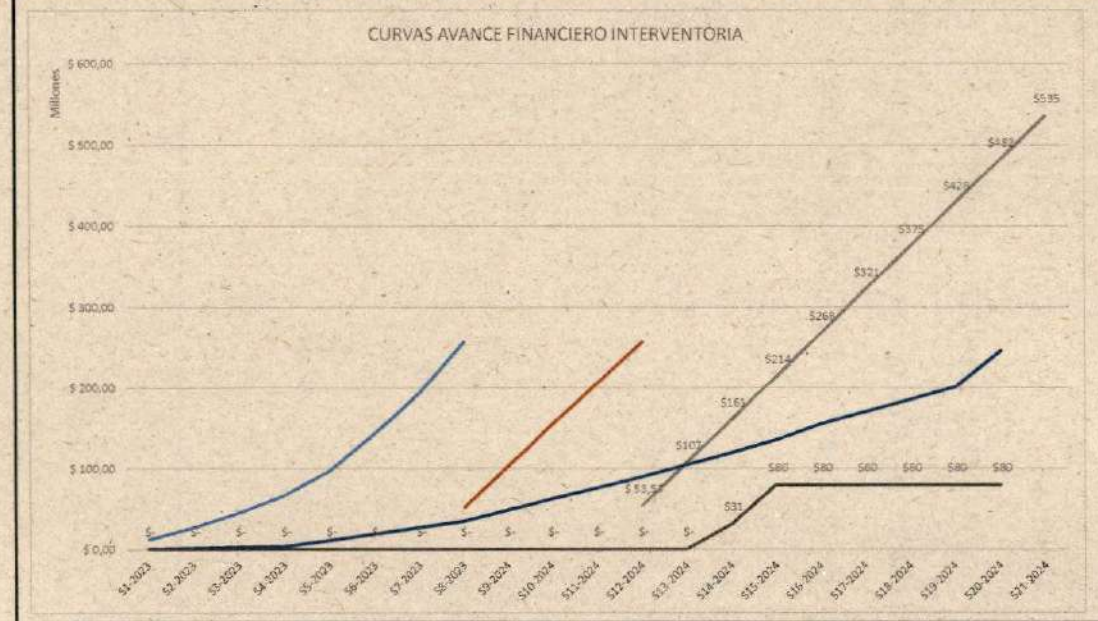



Avance Financiero			
Avance Financ. Program.	$	234.303.012	43,77%
Avance Financ. Ejecut.	$	245.856.617	45,93%
Desviación	$	11.553.606	2,16%
Facturado	$	80.104.286	14,96%
Plazo transcurrido	66,67%	136 días	
Fin Proyectado	17/8/2024		

Balance Financiero				Año suscripción
Valor Inicial	$	257.054.643	221,60 SMMLV	2023
Adición	$	278.265.919	214,05 SMMLV	2024
Valor Total	$	535.320.562	+ 96,59 %	
Valor Proyect.	$	535.320.562		

Análisis financiero en SMML				
Gran total a adicionar	$	-	110,80 SMMLV	50,00%
Gran total adicionado	$	278.265.919	214,05 SMMLV	96,59%
Disponible para el 50% V.I.C.	-$	278.265.919	-214,05 SMMLV	-96,59%



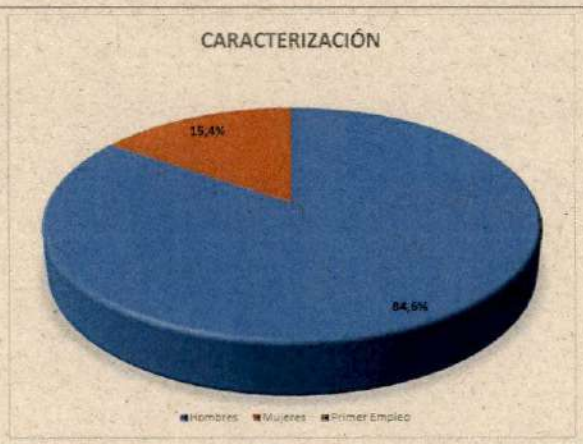

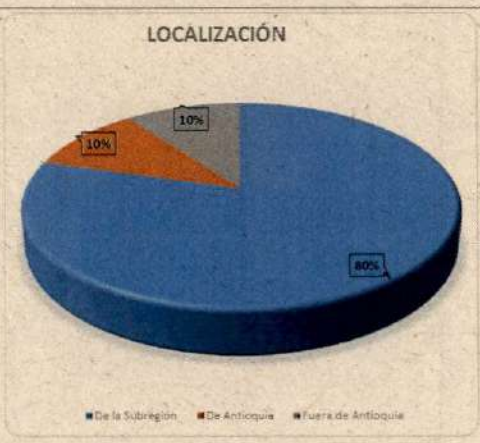

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría de Infraestructura Física	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría De Infraestructura Física Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App **INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO DE OBRA**

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S21-2024 Del 10/6/2024 al 16/6/2024

	Información Contractual
	Seguimiento del Avance Físico de Obra
	Actividades Ejecutadas del Proyecto
	Seguimiento del Avance Financiero de Obra
	Seguimiento a Nuevos Ítems (Obra Extra)
	Seguimiento del Avance Financiero de Interventoría
	Seguimiento Empleabilidad del Proyecto
	Varios
	Cuadro de mando

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App

INFORME SEMANAL - INFORMACIÓN CONTRACTUAL

	OBRA	INTERVENTORIA
S21-2024	4600016558 de 2023	4600016527 de 2023
PROCESO	LIC-15027	CON-15365
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) – COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) – COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA	**CONSORCIO IC-ING 15027** ICPB S.A. 90% INGAP S.A.S. 10 % REPRESENTANTE LEGAL - JORGE IVAN LOPEZ ELEJALDE	**SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.** REPRESENTANTE LEGAL - JAVIER BARRERO MOSSOS
NIT	901.756.732-6	891.101.100-5
SUBREGIÓN	BAJO CAUCA	
MUNICIPIOS IMPACTADOS	CAUCASIA - NECHI	
SUPERVISOR	VANESSA BETANCUR MARTINEZ	

ESTADO	EJECUCION	EJECUCION
VALOR	$3.056.491.448	$257.054.643
PLAZO	2,5 MESES	2 MESES Y 22 DÍAS
FECHA DE INICIO	8/11/2023	8/11/2023
FECHA DE FIN	8/08/2024	17/08/2024

	FECHA	VALOR	%	FECHA	VALOR	%
VALOR INICIAL	8/11/2023	$ 3.056.491.448	100,00%	5/09/2022	$ 257.054.643	48,02%
ADICIÓN 1				19/01/2024	$ 278.265.919	51,98%
VALOR TOTAL	**$**	**3.056.491.448**	**100,00%**	**$**	**535.320.562**	**100,00%**

	FECHA	DIAS	%	FECHA	DIAS	%
PLAZO INICIAL	8/11/2023	48,00	24,62%	8/11/2023	48	23,53%
AMPLIACIÓN 1	22/12/2023	27,00	13,85%	22/12/2023	36	17,65%
AMPLIACIÓN 2	19/01/2024	60,00	30,77%	19/01/2024	60	29,41%
AMPLIACIÓN 3	7/06/2024	60,00	30,77%	7/06/2024	60	29,41%
PLAZO TOTAL	**195 DIAS**		**100,00%**	**204 DIAS**		**100%**

	FECHA INICIO	FECHA FIN	DÍAS	FECHA INICIO	FECHA FIN	DÍAS
SUSPENSIÓN 1	12/2/2024	30/3/2024	48	13/2/2024	30/3/2024	47
SUSPENSIÓN 2	5/4/2024	5/5/2024	31	5/4/2024	5/5/2024	31
TOTAL	**79 DIAS**			**78 DIAS**		

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaria De Infraestructura Física
Subsecretaria de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FISICO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) – COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA


Semana	S21-2024	20/05/2024	Del	16/6/2024	al	16/6/2024

RESUMEN GRAFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

	Semana	Acumulado
Avance Programado	14,75%	37,31%
Avance Ejecutado	5,04%	16,87%
Desvación	9,72%	20,40%

Desviación (días)	0
Fin Proyectado	8/9/2024

CURVAS DE AVANCE GENERAL

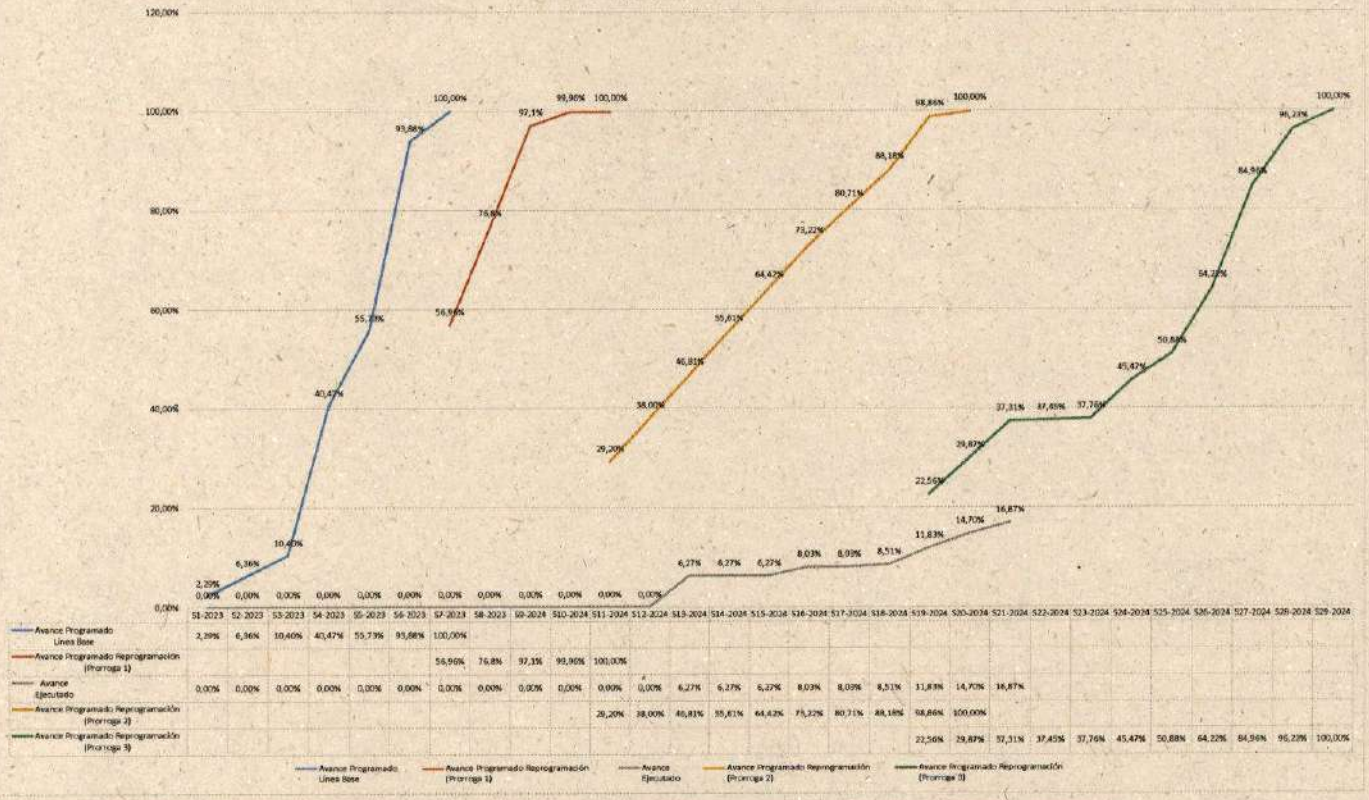

AVANCE ACTIVIDADES LICENCIAS Y PERMISOS

ACTIVIDAD	% ANTERIOR	% ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
Aprovechamiento forestal	N/A	N/A	N/A	
Ocupación de cauce	N/A	N/A	N/A	
PMT	0%	0%	72,41%	72,41%

AVANCE ACTIVIDADES OBRAS

ACTIVIDAD	CANT. EJECUTADA ACUM.	% EJECUTADO ANTERIOR	% EJECUTADO ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
PRODUCTO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO			27,63%	0,27%	-27,36%
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN D	390,94	65,16%	65,16%	0,00%	-65,16%
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	2635,77	30,60%	30,60%	25,00%	-5,60%
SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE	606,13	58,62%	58,62%	0,00%	-58,62%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOCELDA	3030,66	62,77%	62,77%	0,00%	-62,77%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSA MDC 19	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTE DE BASE	64511,86	49,26%	49,26%	0,00%	-49,26%
TRANSPORTE DE EXCAVACIÓN	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PRODUCTO 2. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS			0,00%	0,00%	0,00%
CONCRETO CLASE D (21 MPA). CUNETAS.	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FISICO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) – COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana: S21-2024 | 20/05/2024 | Del: 10/6/2024 | al: 16/6/2024

PRODUCTO 3. CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT			46,66%	10,00%	-36,66%
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS	175,50	90,93%	90,93%	100,00%	9,07%
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SELLADORA PARA MUROS SIKA PVC V15	54,00	90,00%	90,00%	0,00%	-90,00%
LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
CONCRETO CLASE F (14 MPA). SOLADOS DE E=0,05 M	4,70	135,58%	156,58%	0,13%	-156,46%
CONCRETO CLASE C (28 MPA). BOX COULVERT - LOSA INFERIOR	13,50	71,05%	71,05%	0,00%	-71,05%
CONCRETO CLASE C (28 MPA). BOX COULVERT - LOSA SUPERIOR Y MUROS LATERALES	18,78	26,65%	40,78%	0,00%	-40,78%
CONCRETO CLASE C (28 MPA). MUROS, DISIPADORES, ALETAS.	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO	4632,92	65,86%	74,93%	0,00%	-74,93%
LLENO MECÁNICO COMPACTADO	16,80	0,00%	18,67%	0,00%	-18,67%
PRODUCTO 4. SEÑALIZACION VIAL			0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN FRIO M2	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN CON PINTURA ACRÍLICA EN FRIO ML	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEÑAL VERTICAL DE 75 CM X 75 CM EN ÁNGULO DE 2"X2"X1/4"	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEÑAL VERTICAL DE 75CMX75CM DOBLE (SP/SR/SI), EN ÁNGULO 2"X2"X1/8"	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEÑAL VERTICAL POSTE DE REFERENCIA SI-04 DOBLE EN ÁNGULO DE 2"X2"X1/8".	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PARAL ESTRUCTURA PARA SEÑALES VERTICALES DE TRANSITO INFORMATIVAS SI-05 Y SI-06, EN H.	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PRODUCTO 5. MANTENIMIENTO MECÁNICO			4,00%	14,60%	10,60%
INSTALACIÓN Y COMPACTACION DE AFIRMADO	226,20	3,19%	3,19%	100,00%	96,81%
TRANSPORTE DE AFIRMADO	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

SEGUIMIENTO CURVA S

GENERAL

Atraso >= 5%	Atraso < 5%	Adelanto < 5%			Adelanto >= 5%
Semana	Avance Programado Linea Base	Avance Programado Reprogramación (Prorroga 1)	Avance Programado Reprogramación (Prorroga 2)	Avance Programado Reprogramación (Prorroga 3)	Avance Ejecutado
S1-2023	2,29%				0,00%
S2-2023	6,38%				0,00%
S3-2023	10,40%				0,00%
S4-2023	40,47%				0,00%
S5-2023	55,73%				0,00%
S6-2023	93,88%				0,00%
S7-2023	100,00%	56,90%			0,00%
S8-2023		76,8%			0,00%
S9-2024		97,1%			0,00%
S10-2024		99,96%			0,00%
S11-2024		100,00%	29,20%		0,00%
S12-2024			38,00%		0,00%
S13-2024			46,81%		6,27%
S14-2024			55,61%		6,27%
S15-2024			64,42%		6,27%
S16-2024			73,22%		8,03%
S17-2024			80,71%		8,03%
S18-2024			88,18%		8,51%
S19-2024			98,86%	22,56%	11,63%
S20-2024			100,00%	29,87%	14,70%
S21-2024				37,31%	16,87%
S22-2024				37,45%	
S23-2024				37,76%	
S24-2024				45,47%	
S25-2024				50,88%	
S26-2024				64,22%	
S27-2024				84,96%	
S28-2024				96,23%	
S29-2024				100,00%	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S21-2024 Del 10/6/2024 al 16/6/2024

Observaciones Generales

Descripción de las Actividades Ejecutadas esta Semana

PAVIMENTO: A LA FECHA NO SE HA INICIADO ESTA ACTIVIDAD

RIEGO DE EMULSION: A LA FECHA NO SE HA INICIADO ESTA ACTIVIDAD

CONFORMACION DE TERRENO:
- SIN INTERVENCIÓN ESTA SEMANA

INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR:
- A LA FECHA SE TIENE UNA INTERVENCIÓN DE BASE GRANULAR DESDE K13+320 HASTA EL K13+725, SIN INTERVENCIÓN ESTA SEMANA

CUNETAS : A LA FECHA NO SE HA INICIADO ESTA ACTIVIDAD

EXCAVACIÓN PARA BOX.:
*CONTINÚAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EN EL BOX UBICADO EN EL K13+217 MARGEN IZQUIERDA
*CONTINÚAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EN EL BOX UBICADO EN EL K13+370 MARGEN IZQUIERDA

INSTALACIÓN DE ACERO PARA BOX.:
*CONTINÚAN ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACERO EN EL BOX UBICADO EN K13+217 EN ZARPA Y ALETAS MARGEN IZQUIERDA
*CONTINÚAN ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACERO EN EL BOX UBICADO EN K13+370 EN ZARPA Y ALETAS MARGEN IZQUIERDA

CONCRETO PARA BOX.:
*INSTALACIÓN DE CONCRETO EN ZARPA, PAREDES Y LOSA SUPERIOR DE BOX UBICADO EN LA ABSCISA K13+217
*INSTALACIÓN DE CONCRETO EN ZARPA, PAREDES Y LOSA SUPERIOR DE BOX UBICADO EN LA ABSCISA K13+370
*SE TOMARON MUESTRAS PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA AL CONCRETO

OTROS:
1. SE DEBE ENTREGAR PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON SUSPENSIONES Y REINICIOS DE OBRA Y PRORROGA NO.3
2. CONTINUA LA INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR PARA LLENO DE ESTRUCTURA DE LA VÍA.
3. LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LA REGIÓN HACEN QUE LA INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR PRESENTE ATRASO

REGISTRO FOTOGRAFICO



INSTALACION DE MATERIAL DE LLENO PARA ESTRUCTURA LA VÍA K13+217 AL K13+367



TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana: S21-2024 | Del: 10/6/2024 | al: 16/6/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

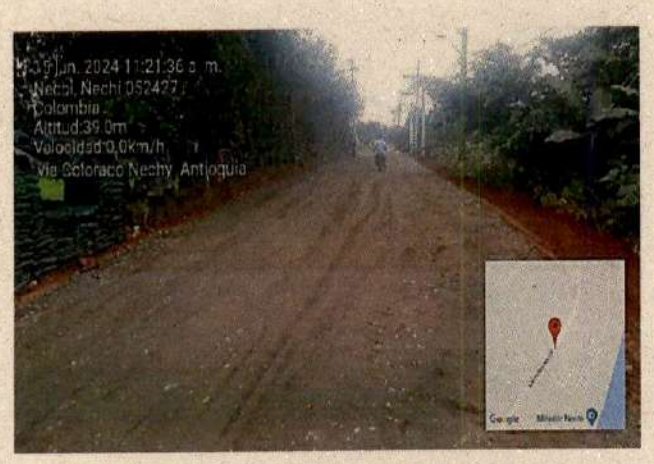

INSTALACION DE MATERIAL DE LLENO - K13+264 AL K13+367



FUNDIDA LOSA SUPERIOR - K13+217

REGISTRO FOTOGRAFICO



INSTALACIÓN DE MATERIAL DE LLENO- K13+217 AL K13+367



TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO

ACTIVIDADES AREA SST

*SE REALIZAN SEGUIMIENTOS A INGRESO Y RETIRO DE PERSONAL, EN LOS RECORRIDOS SE EVIDENCIA LA SEÑALIZACIÓN Y LAS DEMARCACIONES A LAS ZONAS DE MAYOR ACTIVIDAD.
*LOS TRABAJADORES UTILIZAN SUS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, SE REALIZA SEGUIMIENTO A LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA QUE SE ENCUENTRAN EN OBRA.
*SE HACE ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES
*SE CONTINUA CON EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL PARE Y SIGA
*SE REALIZA MESA DE TRABAJO CON SST CONTRATISTA.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S21-2024 Del 10/6/2024 al 16/6/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



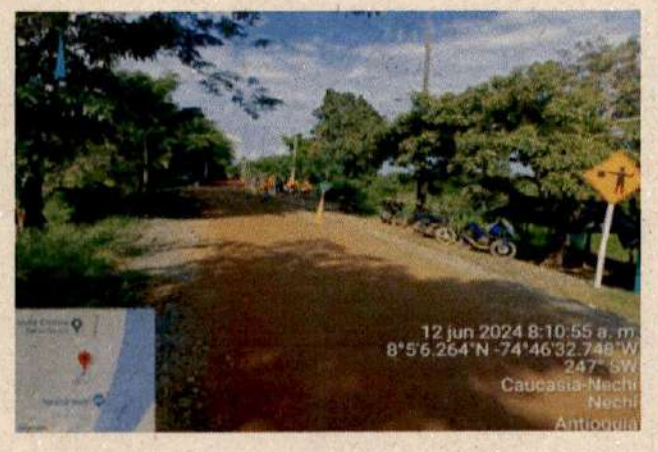





ACTIVIDADES AREA AMBIENTAL

* SE EVIDENCIA PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN OBRA RECIPIENTE DE COLOR BLANCO PARA MANEJO DE RECICLABLES Y RECIPIENTE COLOR NEGRO PARA MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIOS
* SE EVIDENCIA CAPACITACIÓN REALIZADA POR EL PERSONAL DE OBRA
* SE EVIDENCIA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTES DE FUTURASEO DE NECHI ANTIOQUIA
* SE REALIZA COMITÉ AMBIENTAL EN LAS INSTALACIONES DE LA SIF, EN LAS CUALES SE HIZO REVISIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES Y SE ANALIZÓ LA INVERSIÓN AMBIENTAL

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S21-2024 Del 10/6/2024 al 16/6/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO -



Punto Ecológico



Capacitación Ambiental



Recolección de Residuos Solidos



Comité Ambiental SIF

ACTIVIDADES AREA FORESTAL

NO APLICA PARA ESTE PROYECTO

ACTIVIDADES AREA SOCIAL

* CONTRATACIÓN MANO DE OBRA.
* SE REALIZÓ REUNIÓN CON LA VEEDURÍA CIUDADANA CON EL OBJETIVO DE BRINDAR EL AVANCE DE LA OBRA Y DE LAS ACTIVIDADES QUE SE VIENEN REALIZANDO.
* SE REALIZÓ Y SE HIZO SOCIALIZACIÓN A LA SEÑORA YESICA MÁRQUEZ EN SU RESIDENCIA AL ARREGLO DEL DAÑO QUE OCASIONÓ LA MÁQUINA MOTO NIVELADORA A SU VIVIENDA UBICADA EN LA VÍA DE UNA MANGUERA DE AGUA.
* SE REALIZÓ CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO SOBRE EL CUIDADO POR EL BIEN AJENO SEA PRIVADO O PÚBLICO Y SOBRE EL EMPODERAMIENTO DE LA OBRA.
* SE REALIZÓ UNA CHARLA EDUCATIVA

REGISTRO FOTOGRAFICO








GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

S18-2024	S21-2024	Del	20/05/2024	10/6/2024	al	16/06/2024

RESUMEN GRAFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

Avance Financiero Programado	$ 1.075.543.224	37,31%
Avance Financiero Ejecutado	$ 836.409.804	29,01%
Anticipo	$ 458.473.717	15,00%
Facturado	$ 274.308.629	8,97%
Potencial de Facturación	$ 562.101.175	

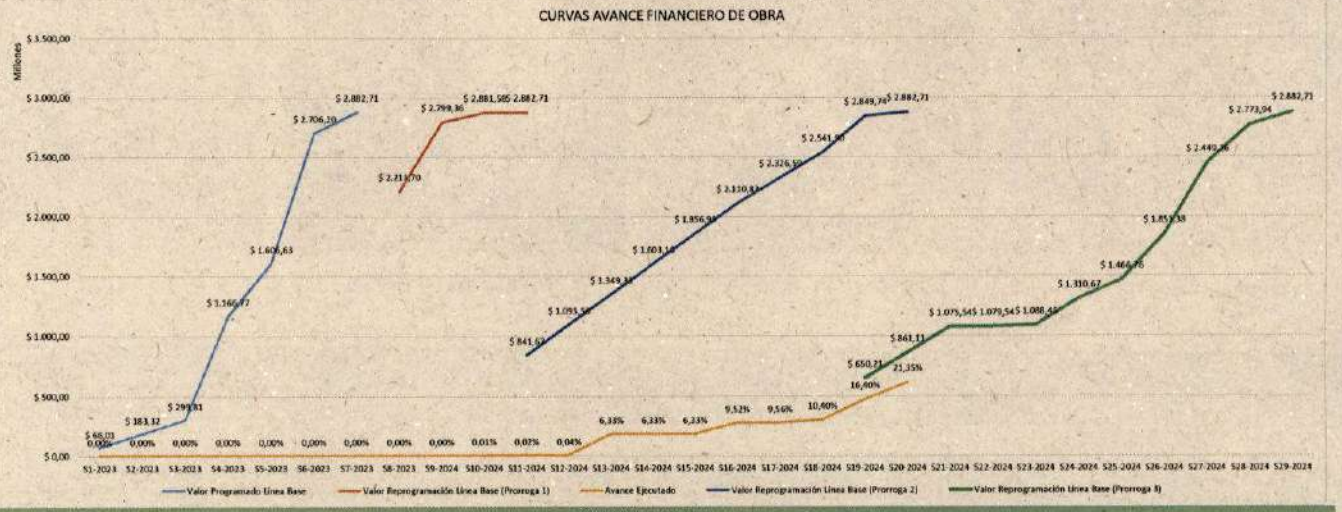

SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 3.056.491.448
VALOR ADICIONAL POR MAYORES CANTIDADES EJECUTADAS EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$ -
VALOR DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O MENORES CANTIDADES EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$ -
VALOR POR PROYECCION DE NUEVAS OBRAS (OBRAS EXTRAS)	
VALOR TOTAL PROYECTO	**$ 3.056.491.448**

SEGUIMIENTO CURVA S

					Atraso >= 5%				Atraso < 5%	Adelanto < 5%	Adelanto >= 5%
Semana	Valor Programado Linea Base	Valor Reprogramación Linea Base (Prorroga 1)	Valor Reprogramación Linea Base (Prorroga 2)	Valor Reprogramación Linea Base (Prorroga 3)	% Programado	% Reprogramado (Prorroga 1)	% Reprogramado (Prorroga 2)	% Reprogramado (Prorroga 3)	Avance Ejecutado	% Ejecutado	Facturado
S1-2023	$ 66.011.139,12				2,29%				$ 0,00	0,00%	$ -
S2-2023	$ 183.317.227,47				6,36%				$ 0,00	0,00%	$ -
S3-2023	$ 299.814.579,00				10,40%				$ 0,00	0,00%	$ -
S4-2023	$ 1.166.769.862,58				40,47%				$ 0,00	0,00%	$ -
S5-2023	$ 1.606.629.787,77				55,73%				$ 0,00	0,00%	$ -
S6-2023	$ 2.706.199.856,50				93,88%				$ 0,00	0,00%	$ -
S7-2023	$ 2.882.712.391,03				100,00%				$ 0,00	0,00%	$ -
S8-2023		$ 2.213.701.839,67				76,79%			$ 0,00	0,00%	$ -
S9-2024		$ 2.799.361.934,00				97,11%			$ 0,00	0,00%	$ -
S10-2024		$ 2.881.584.691,00				99,96%			$ 342.000,00	0,01%	$ -
S11-2024		$ 2.882.712.391,00	$ 841.670.432,20			100,00%	29,20%		$ 664.160,00	0,02%	$ -
S12-2024			$ 1.095.500.641,40				38,00%		$ 1.049.076,00	0,04%	$ -
S13-2024			$ 1.349.330.850,60				46,81%		$ 182.350.038,00	6,33%	$ -
S14-2024			$ 1.603.161.059,80				55,61%		$ 182.350.038,00	6,33%	$ -
S15-2024			$ 1.856.991.269,00				64,42%		$ 182.350.038,00	6,33%	$ -
S16-2024			$ 2.110.821.478,20				73,22%		$ 274.308.912,91	9,52%	$ 274.308.629,00
S17-2024			$ 2.326.586.069,40				80,71%		$ 275.459.626,91	9,56%	$ -
S18-2024			$ 2.541.899.580,60				88,18%		$ 299.741.144,14	10,40%	$ -
S19-2024			$ 2.849.740.661,00	$ 650.214.715,86			98,80%	22,56%	$ 472.775.009,31	16,40%	$ -
S20-2024			$ 2.882.712.391,00	$ 861.105.306,33			100,00%	29,87%	$ 615.565.952,66	21,35%	
S21-2024				$ 1.075.543.223,80				37,31%	$ 836.409.803,83	29,01%	
S22-2024				$ 1.079.543.136,73				37,45%			
S23-2024				$ 1.088.447.749,58				37,76%			
S24-2024				$ 1.310.668.782,43				45,47%			
S25-2024				$ 1.466.780.906,28				50,88%			
S26-2024				$ 1.851.380.768,12				64,22%			
S27-2024				$ 2.449.263.800,91				84,96%			
S28-2024				$ 2.773.939.387,42				96,23%			
S29-2024				$ 2.882.712.391,00				100,00%			


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

S18-2024	S21-2024	Del	29/05/2024	10/6/2024	al	16/6/2024

RESUMEN GRAFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

Avance Financiero Programado	$ 267.749.406	50,02%
Avance Financiero Ejecutado	$ 270.856.617	50,60%
Anticipo	$ -	0,00%
Facturado	$ 80.104.286	14,96%
Potencial de Facturación	$ 190.752.331	

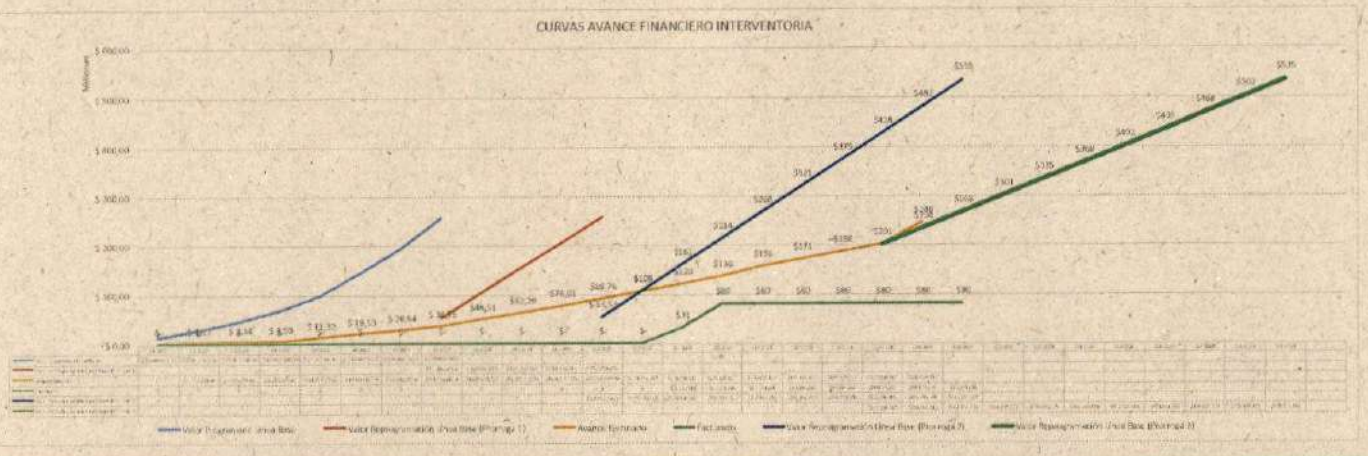

SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 257.054.643
VALOR ADICIONAL POR MAYORES CANTIDADES EJECUTADAS EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$ 278.265.919
VALOR DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O MENORES CANTIDADES EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$ -
VALOR POR PROYECCION DE NUEVAS OBRAS (OBRAS EXTRAS)	$ -
VALOR TOTAL PROYECTO	**$ 535.320.562**

SEGUIMIENTO CURVA S

					Atraso >= 5%	Atraso >= 5%			Atraso < 5%	Adelanto < 5%	Adelanto >= 5%
Semana	Valor Programado Linea Base	Valor Reprogramación Linea Base (Prorroga 1)	Valor Reprogramación Linea Base (Prorroga 2)	Valor Reprogramación Linea Base (Prorroga 3)	% Programado	% Reprogramado (Prorroga 1)	% Reprogramado (Prorroga 2)	% Reprogramado (Prorroga 3)	Avance Ejecutado	% Ejecutado	Facturado
S1-2023	$ 12.000.000,00				4,67%				$ -	0,00%	$ -
S2-2023	$ 27.000.000,00				10,50%				$ 1.167.899,00	0,45%	$ -
S3-2023	$ 45.000.000,00				17,51%				$ 2.335.798,00	0,91%	$ -
S4-2023	$ 67.000.000,00				26,06%				$ 3.503.697,00	1,36%	$ -
S5-2023	$ 97.000.000,00				37,74%				$ 11.316.927,00	4,40%	$ -
S6-2023	$ 144.000.000,00				56,02%				$ 19.130.157,00	7,44%	$ -
S7-2023	$ 194.000.000,00				75,47%				$ 26.943.387,00	10,48%	$ -
S8-2023	$ 257.054.643,00	$ 51.410.928,60			100,00%	20,00%			$ 34.756.617,00	13,52%	$ -
S9-2024		$ 102.821.857,20				40,00%			$ 48.566.617,00	18,87%	$ -
S10-2024		$ 154.232.785,80				60,00%			$ 62.256.617,00	24,22%	$ -
S11-2024		$ 205.643.714,40				80,00%			$ 76.006.617,00	29,57%	$ -
S12-2024		$ 257.054.643,00	$ 53.532.058,20			100,00%	10,00%		$ 89.756.617,00	16,77%	$ -
S13-2024			$ 107.064.112				20,00%		$ 104.756.617	19,57%	$ -
S14-2024			$ 160.596.169				30,00%		$ 119.756.617	22,37%	$ 31.252.918
S15-2024			$ 214.128.225				40,00%		$ 135.856.617	25,38%	$ 80.104.286
S16-2024			$ 267.660.281				50,00%		$ 155.856.617	29,11%	$ 80.104.286
S17-2024			$ 321.192.337				60,00%		$ 170.856.617	31,92%	$ 80.104.286
S18-2024			$ 374.724.393				70,00%		$ 185.856.617	34,72%	$ 80.104.286
S19-2024			$ 428.256.450	$ 260.856.617			80,00%	37,52%	$ 200.856.617	37,52%	$ 80.104.286
S20-2024			$ 481.788.506	$ 234.303.012			90,00%	43,77%	$ 245.856.617	45,93%	$ 80.104.286
S21-2024			$ 535.320.562	$ 267.749.406			100,00%	50,02%	$ 270.856.617	50,60%	$ 80.104.286
S22-2024				$ 301.195.801				56,26%			
S23-2024				$ 334.642.195				62,51%			
S24-2024				$ 368.088.590				68,76%			
S25-2024				$ 401.534.984				75,01%			
S26-2024				$ 434.981.379				81,26%			
S27-2024				$ 468.427.773				87,50%			
S28-2024				$ 501.874.168				93,75%			
S29-2024				$ 535.320.562				100,00%			

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría de Infraestructura Física	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría De Infraestructura Física Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App **INFORME SEMANAL - EMPLEABILIDAD**

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

S18-2024	S21-2024	Del	20/5/2024	al	16/6/2024


	Gobernación	Contratista Interventoría	Contratista Obra	Subcontratistas	Total	Incidencia Total
Ingresos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Profesionales		0	0		**0**	
Tecnólogos		0	0		**0**	
Operativos		0	0		**0**	
Administrativos		0	0		**0**	
Retiros	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Profesionales		0	0		**0**	
Tecnólogos		0	0		**0**	
Operativos		0	0		**0**	
Administrativos		0	0		**0**	
Activos	**0**	**6**	**33**	**0**	**39**	
Profesionales		4	7		**11**	**28,2%**
Tecnólogos		0	2		**2**	**5,1%**
Operativos		0	24		**24**	**61,5%**
Administrativos		2	0		**2**	**5,1%**
Caracterización						
Hombres		4	29		**33**	**84,6%**
Mujeres		2	4		**6**	**15,4%**
Primer Empleo		0	0		**0**	
Discapacitado		0	0		**0**	
Indígenas		0	0		**0**	
LGTBI		0	0		**0**	
Afrodescendiente		0	0		**0**	
Localización		6	33			
De la Subregión		2	29		**31**	**79,5%**
De Antioquia		2	2		**4**	**10,3%**
Fuera de Antioquia		2	2		**4**	**10,3%**

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - CUADRO DE MANDO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana: S21-2024 Del: 10/6/2024 al: 16/6/2024

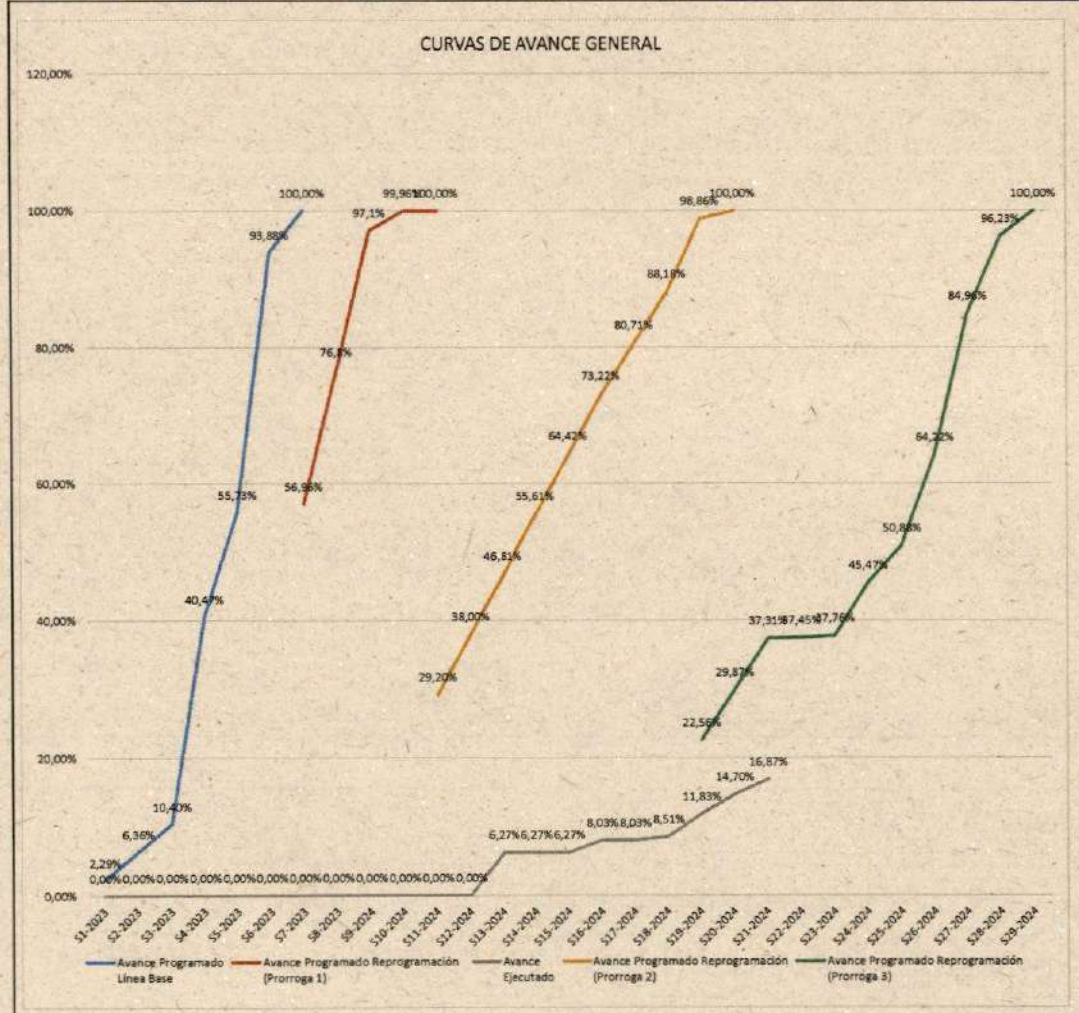

Avance Físico	Semana	Acumulado	
Avance Programado	14,75%	37,31%	-20,44%
Avance Ejecutado	5,04%	16,87%	
Plazo transcurrido	72,82%	142 días	
Fin Proyectado	8/8/2024		

Estructura Pavimento K13+725 - K13+045		Total	Ejecutado	Avance
Carpeta asfáltica	10 cm	0,68 Km	0,000 Km	0,00%
Base Gran.	20 cm	0,68 Km	0,300 Km	11,03%
-Terraplén		0,68 Km	0,150 Km	5,51%
Mantenimiento Mecanico		0,30 Km	0,000 Km	0,00%


Obras varias	Total	Ejecutado	Avance
Cunetas	153 ml	0,00	0%
Box Coulverts K13+217	1 Und	0,95	95%
Box Coulverts K13+370	1 Und	0,95	95%

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - CUADRO DE MANDO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S21-2024 Del 10/6/2024 al 16/6/2024

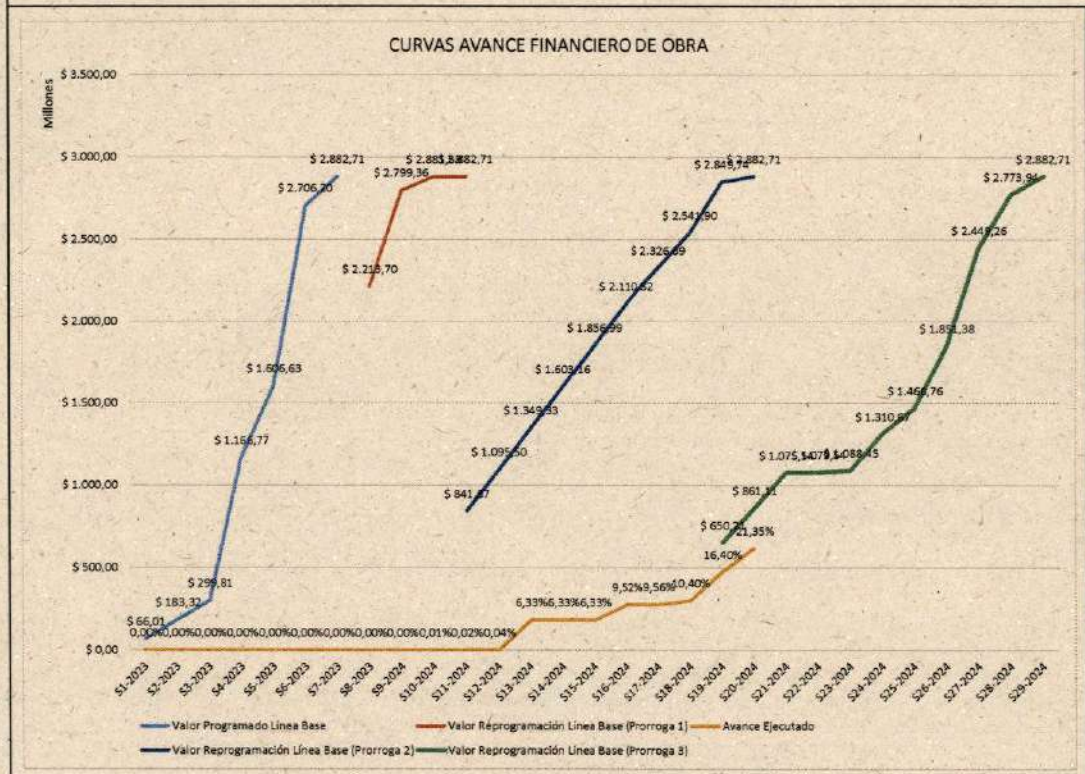

Avance Financiero Obra


Avance Financ. Program.	$	1.075.543.224		37,31%
Avance Financ. Ejecut.	$	836.409.804		29,01%
Desviación	-$	239.133.420		-8,30%
Facturado	$	274.308.629		8,97%
Balance Financiero				Año suscripción
Valor Inicial	$	**3.056.491.448,00**	2634,91	2023
Adición 1	$	-	0,00 SMMLV	2024
Adición 2			0,00 SMMLV	
Valor Total	$	3.056.491.448	+ 0 %	
Valor Proyect.	$	3.056.491.448		
Análisis financiero en SMML				
Gran total a adicionar	$	**1.528.245.724,00**	1.317,45	50,00%
Gran total adicionado	$	-	0,00 SMMLV	0,00%
Disponible para el 50% V.I.C.	$	1.528.245.724	1.175,57 SMMLV	44,62%

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - CUADRO DE MANDO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana: S21-2024 Del: 10/6/2024 al: 16/6/2024

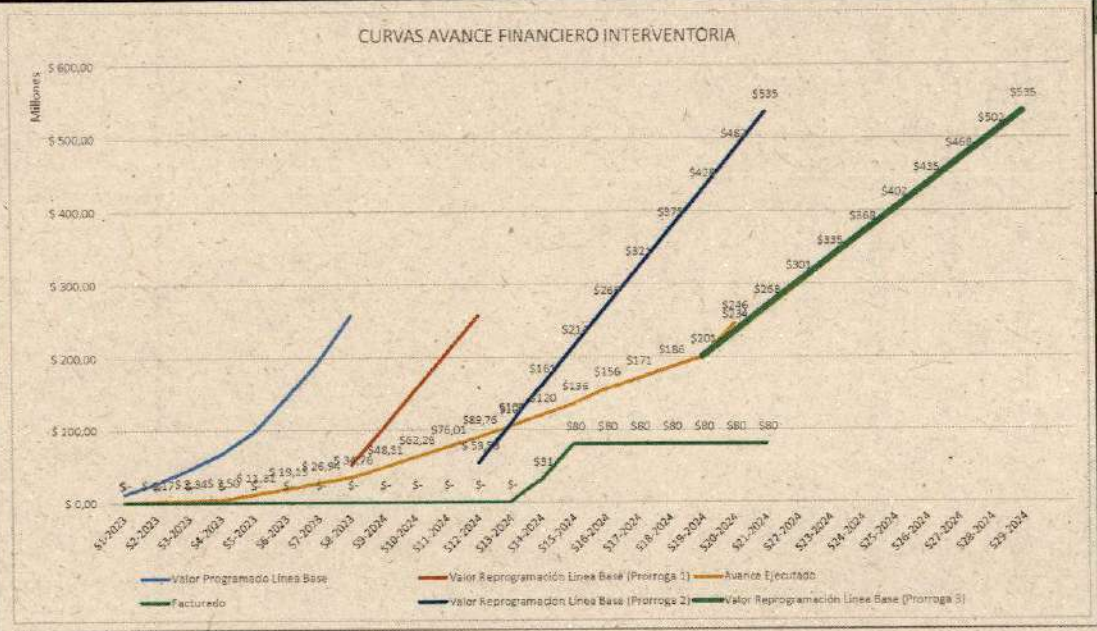



Avance Financiero			
Avance Financ. Program.	$	267.749.406	50,02%
Avance Financ. Ejecut.	$	270.856.617	50,60%
Desviación	$	3.107.211	0,58%
Facturado	$	80.104.286	14,96%


Plazo transcurrido	70,10%	143 días	
Fin Proyectado	17/6/2024		

Balance Financiero				Año suscripción
Valor Inicial	$	257.054.643	221,60 SMMLV	2023
Adición	$	278.265.919	214,05 SMMLV	2024
Valor Total	$	535.320.562	+ 96,59 %	
Valor Proyect.	$	535.320.562		

Análisis financiero en SMML				
Gran total a adicionar	$	-	110,80 SMMLV	50,00%
Gran total adicionado	$	278.265.919	214,05 SMMLV	96,59%
Disponible para el 50% V.I.C.	-$	278.265.919	-214,05 SMMLV	-96,59%

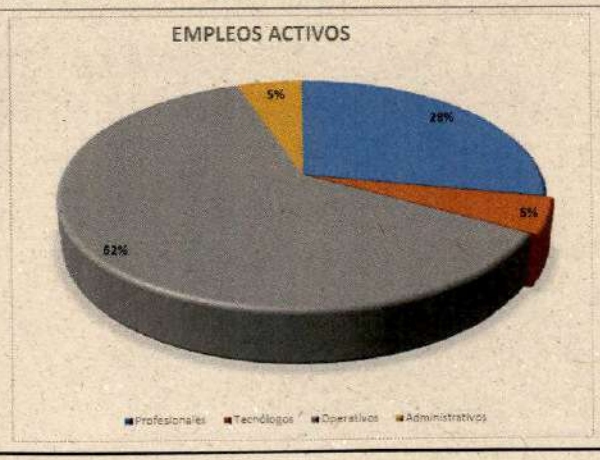

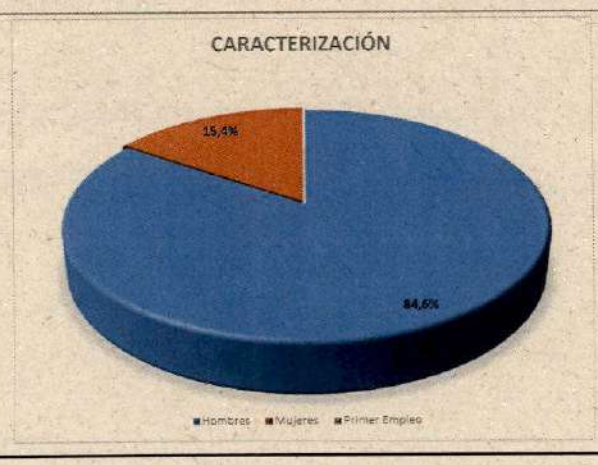

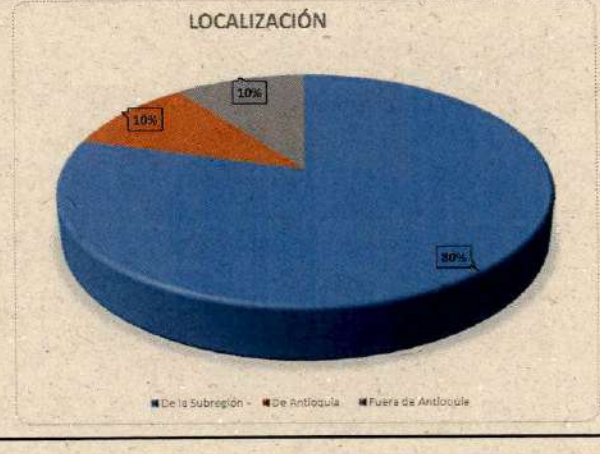

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría de Infraestructura Física	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría De Infraestructura Física Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App **INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO DE OBRA**

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S22-2024 Del 17/6/2024 al 23/6/2024

	Información Contractual
	Seguimiento del Avance Físico de Obra
	Actividades Ejecutadas del Proyecto
	Seguimiento del Avance Financiero de Obra
	Seguimiento a Nuevos Ítems (Obra Extra)
	Seguimiento del Avance Financiero de Interventoría
	Seguimiento Empleabilidad del Proyecto
	Varios
	Cuadro de mando

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App

INFORME SEMANAL - INFORMACIÓN CONTRACTUAL

	OBRA	INTERVENTORIA
S22-2024	4600016558 de 2023	4600016527 de 2023
PROCESO	LIC-15027	CON-15365
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) – COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) – COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA	**CONSORCIO IC-ING 15027** ICPB S.A. 90% INGAP S.A.S. 10 % REPRESENTANTE LEGAL - JORGE IVAN LOPEZ ELEJALDE	**SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.** REPRESENTANTE LEGAL - JAVIER BARRERO MOSSOS
NIT	901.756.732-6	891.101.100-5
SUBREGIÓN	BAJO CAUCA	
MUNICIPIOS IMPACTADOS	CAUCASIA - NECHI	
SUPERVISOR	VANESSA BETANCUR MARTINEZ	

ESTADO	EJECUCION	EJECUCION
VALOR	$3.056.491.448	$257.054.643
PLAZO	2,5 MESES	2 MESES Y 22 DÍAS
FECHA DE INICIO	8/11/2023	8/11/2023
FECHA DE FIN	8/08/2024	17/08/2024

	FECHA	VALOR	%	FECHA	VALOR	%
VALOR INICIAL	8/11/2023	$ 3.056.491.448	100,00%	5/09/2022	$ 257.054.643	48,02%
ADICIÓN 1				19/01/2024	$ 278.265.919	51,98%
VALOR TOTAL	**$**	**3.056.491.448**	**100,00%**	**$**	**535.320.562**	**100,00%**

	FECHA	DIAS	%	FECHA	DIAS	%
PLAZO INICIAL	8/11/2023	48,00	24,62%	8/11/2023	48	23,53%
AMPLIACIÓN 1	22/12/2023	27,00	13,85%	22/12/2023	36	17,65%
AMPLIACIÓN 2	19/01/2024	60,00	30,77%	19/01/2024	60	29,41%
AMPLIACIÓN 3	7/06/2024	60,00	30,77%	7/06/2024	60	29,41%
PLAZO TOTAL	**195 DIAS**		**100,00%**	**204 DIAS**		**100%**

	FECHA INICIO	FECHA FIN	DÍAS	FECHA INICIO	FECHA FIN	DÍAS
SUSPENSIÓN 1	12/2/2024	30/3/2024	48	13/2/2024	30/3/2024	47
SUSPENSIÓN 2	5/4/2024	5/5/2024	31	5/4/2024	5/5/2024	31
TOTAL	**79 DIAS**			**78 DIAS**		

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FISICO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) – COLORADO – NECHI EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA


Semana	S22-2024	2005/2024	Del	17/5/2024	al	23/5/2024

RESUMEN GRAFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

	Semana	Acumulado
Avance Programado	14,89%	37,45%
Avance Ejecutado	14,06%	25,89%
Desviación	0,83%	11,60%

Desviación (días)	0
Fin Proyectado	8/8/2024

CURVAS DE AVANCE GENERAL

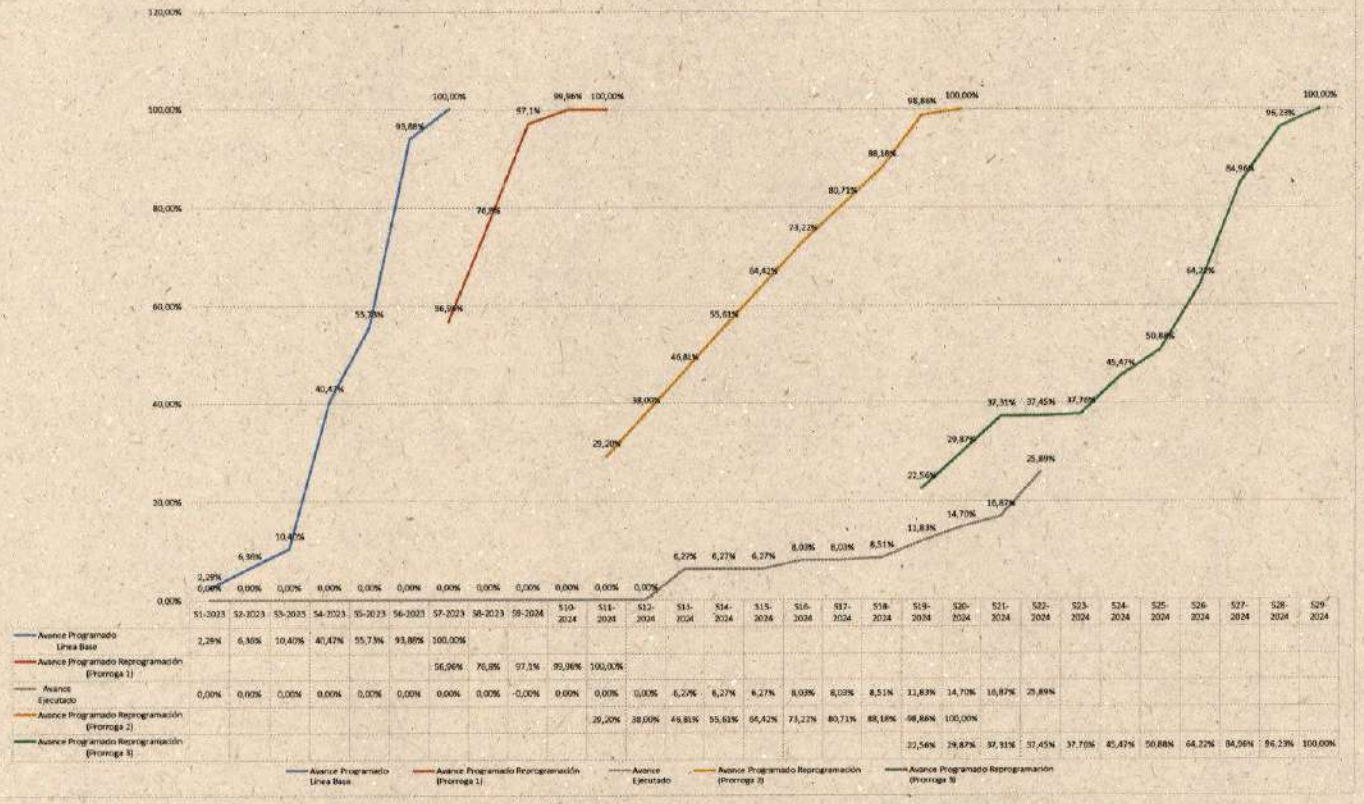

	S1-2023	S2-2023	S3-2023	S4-2023	S5-2023	S6-2023	S7-2023	S8-2023	S9-2024	S10-2024	S11-2024	S12-2024	S13-2024	S14-2024	S15-2024	S16-2024	S17-2024	S18-2024	S19-2024	S20-2024	S21-2024	S22-2024	S23-2024	S24-2024	S25-2024	S26-2024	S27-2024	S28-2024	S29-2024
Avance Programado Línea Base	2,29%	6,86%	10,40%	40,47%	55,73%	93,86%	100,00%																						
Avance Programado Reprogramación (Prorroga 1)							96,96%	76,8%	97,1%	99,96%	100,00%																		
Avance Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,22%	6,27%	6,27%	8,03%	8,03%	8,51%	11,83%	14,70%	16,87%	25,89%							
Avance Programado Reprogramación (Prorroga 2)											29,20%	38,00%	46,81%	55,61%	64,42%	73,22%	80,71%	88,18%	98,86%	100,00%									
Avance Programado Reprogramación (Prorroga 3)																			22,56%	29,87%	37,31%	37,45%	37,70%	45,47%	50,88%	64,22%	84,96%	96,23%	100,00%

AVANCE ACTIVIDADES LICENCIAS Y PERMISOS

ACTIVIDAD	% ANTERIOR	% ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
Aprovechamiento forestal	N/A	N/A	N/A	
Ocupación de cauce	N/A	N/A	N/A	
PMT	0%	0%	72,41%	72,41%

AVANCE ACTIVIDADES OBRAS

ACTIVIDAD	CANT. EJECUTADA ACUM	% EJECUTADO ANTERIOR	% EJECUTADO ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
PRODUCTO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO			36,15%	0,53%	-35,62%
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN D	390,94	65,16%	65,16%	0,00%	-65,16%
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	2835,77	30,60%	30,60%	50,00%	19,40%
SUMINISTRO; COLOCACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE	806,13	58,62%	58,62%	0,00%	-58,62%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOCELDA	3030,66	62,77%	62,77%	0,00%	-62,77%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSA MDC 19	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTE DE BASE	64513,86	49,26%	49,26%	0,00%	-49,26%
TRANSPORTE DE EXCAVACIÓN	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PRODUCTO 2. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS			0,00%	0,00%	0,00%
CONCRETO CLASE D (21 MPA). CUNETAS.	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FISICO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) – COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana: S22-2024 | 20/05/2024 | Del: 17/9/2024 | al: 23/9/2024

PRODUCTO 3. CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT			100,00%	10,23%	-89,77%
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS	175,50	90,93%	90,93%	100,00%	9,07%
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SELLADORA PARA MUROS SIKA PVC V15	54,00	90,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
CONCRETO CLASE F (14 MPA). SOLADOS DE E=0.05 M	4,70	156,58%	100,00%	0,13%	-99,87%
CONCRETO CLASE C (28 MPA). BOX COULVERT - LOSA INFERIOR	13,50	71,05%	100,00%	0,00%	-100,00%
CONCRETO CLASE C (28 MPA). BOX COULVERT - LOSA SUPERIOR Y MUROS LATERALES	30,15	40,78%	100,00%	0,00%	-100,00%
CONCRETO CLASE C (28 MPA). MUROS, DISIPADORES, ALETAS.	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO	4682,92	74,93%	100,00%	0,00%	-100,00%
LLENO MECÁNICO COMPACTADO	29,70	18,67%	100,00%	0,00%	-100,00%
PRODUCTO 4. SEÑALIZACION VIAL			0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN FRIO M2	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN CON PINTURA ACRÍLICA EN FRIO ML	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEÑAL VERTICAL DE 75 CM X 75 CM EN ÁNGULO DE 2"X2"X1/4"	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEÑAL VERTICAL DE 75CMX75CM DOBLE (SP/SR/SI), EN ÁNGULO 2"X2"X1/8"	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEÑAL VERTICAL POSTE DE REFERENCIA SI-04 DOBLE EN ÁNGULO DE 2"X2"X1/8".	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PARAL ESTRUCTURA PARA SEÑALES VERTICALES DE TRANSITO INFORMATIVAS SI-05 Y SI-06, EN H,	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PRODUCTO 5. MANTENIMIENTO MECÁNICO			4,00%	14,69%	10,69%
INSTALACIÓN Y COMPACTACION DE AFIRMADO	226,20	3,19%	3,19%	100,00%	96,81%
TRANSPORTE DE AFIRMADO	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

SEGUIMIENTO CURVA S

GENERAL

Atraso >= 5%	Atraso < 5%	Adelanto < 5%			Adelanto >= 5%
Semana	Avance Programado Línea Base	Avance Programado Reprogramación (Prorroga 1)	Avance Programado Reprogramación (Prorroga 2)	Avance Programado Reprogramación (Prorroga 3)	Avance Ejecutado
S1-2023	2,29%				0,00%
S2-2023	6,36%				0,00%
S3-2023	10,40%				0,00%
S4-2023	40,47%				0,00%
S5-2023	55,73%				0,00%
S6-2023	93,88%				0,00%
S7-2023	100,00%	56,99%			0,00%
S8-2023		76,8%			0,00%
S9-2024		97,1%			0,00%
S10-2024		99,96%			0,00%
S11-2024		100,00%	29,20%		0,00%
S12-2024			38,00%		0,00%
S13-2024			46,81%		6,27%
S14-2024			55,61%		6,27%
S15-2024			64,42%		6,27%
S16-2024			73,22%		8,93%
S17-2024			80,71%		8,93%
S18-2024			88,18%		8,51%
S19-2024			96,66%	22,56%	11,63%
S20-2024			100,00%	29,87%	14,70%
S21-2024				37,31%	16,87%
S22-2024				37,45%	25,89%
S23-2024				37,78%	
S24-2024				45,47%	
S25-2024				50,88%	
S26-2024				64,22%	
S27-2024				84,96%	
S28-2024				96,23%	
S29-2024				100,00%	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S22-2024 Del 17/6/2024 al 23/6/2024

Observaciones Generales

Descripción de las Actividades Ejecutadas esta Semana

PAVIMENTO: A LA FECHA NO SE HA INICIADO ESTA ACTIVIDAD

RIEGO DE EMULSION: A LA FECHA NO SE HA INICIADO ESTA ACTIVIDAD

INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR:
- A LA FECHA SE TIENE UNA INTERVENCIÓN DE BASE GRANULAR DESDE K13+320 HASTA EL K13+520, SIN INTERVENCIÓN ESTA SEMANA

CUNETAS : A LA FECHA NO SE HA INICIADO ESTA ACTIVIDAD

EXCAVACIÓN PARA BOX.:
*FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EN EL BOX UBICADO EN EL K13+217
*FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EN EL BOX UBICADO EN EL K13+370

INSTALACIÓN DE ACERO PARA BOX.:
*FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACERO EN EL BOX UBICADO EN K13+217 EN ZARPA Y ALETAS MARGEN IZQUIERDA
*FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACERO EN EL BOX UBICADO EN K13+370 EN ZARPA Y ALETAS MARGEN IZQUIERDA

CONCRETO PARA BOX.:
*FINALIZACIÓN ACTIVIDADES DE CONCRETO EN ZARPA, PAREDES Y LOSA SUPERIOR DE BOX UBICADO EN LA ABSCISA K13+217
*FINALIZACIÓN ACTIVIDADES DE CONCRETO EN ZARPA, PAREDES Y LOSA SUPERIOR DE BOX UBICADO EN LA ABSCISA K13+370

OTROS:
1. CONTINUA LA INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR PARA LLENO DE ESTRUCTURA DE LA VÍA.
2. LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LA REGIÓN HACEN QUE LA INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR PRESENTE ATRASO, DURANTE TODA LA SEMANA LLOVIO EN LA ZONA

REGISTRO FOTOGRAFICO



INSTALACION DE MATERIAL DE LLENO PARA ESTRUCTURA LA VÍA K13+367 AL K13+540



INSTALACION DE MATERIAL DE LLENO PARA ESTRUCTURA LA VÍA K13+367 AL K13+540


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S22-2024 Del 17/6/2024 al 23/6/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

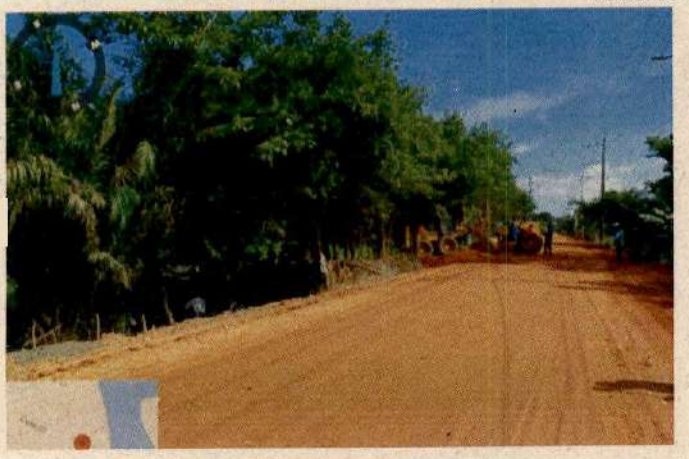


INSTALACION DE MATERIAL DE LLENO - K13+264 AL K13+367




BOX 1,5X1,5 - K13+217

REGISTRO FOTOGRAFICO

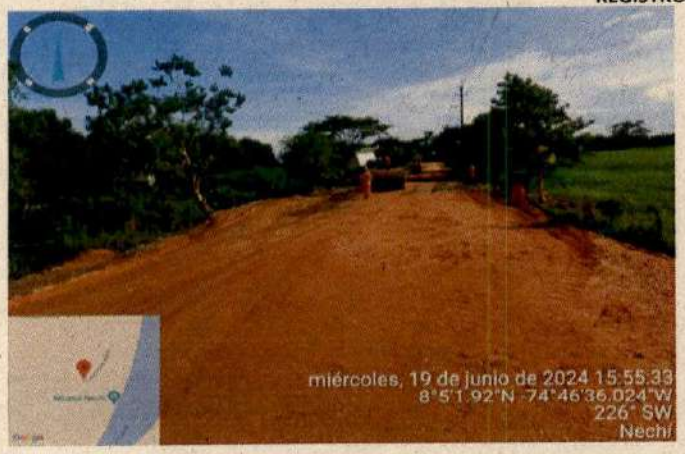

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE LLENO- K13+045 AL K13+217

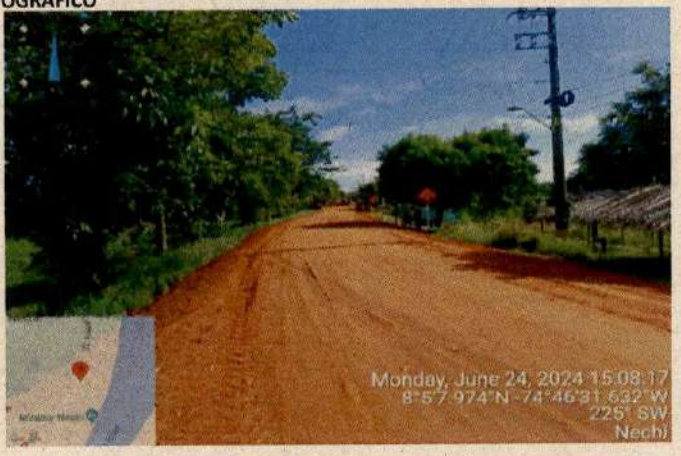

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE LLENO- K13+367 AL K13+540

ACTIVIDADES AREA SST

•SE EVIDENCIA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIONES DE ZONAS, EN OBRA SE CUENTA CON LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA, LOS TRABAJADORES UTILIZAN LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ASIGNADOS POR EL CONTRATISTA,
•SE CONTINUA CON EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL PARE Y SIGA, SE REALIZA MESA DE TRABAJO CON SIFF SST DEL CONTRATANTE.
•SE REALIZAN SEGUIMIENTOS A RETIROS DE PERSONAL EFECTUADOS DURANTE LA SEMANA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO ACTIVIDADES


OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S22-2024 Del 17/6/2024 al 23/6/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO





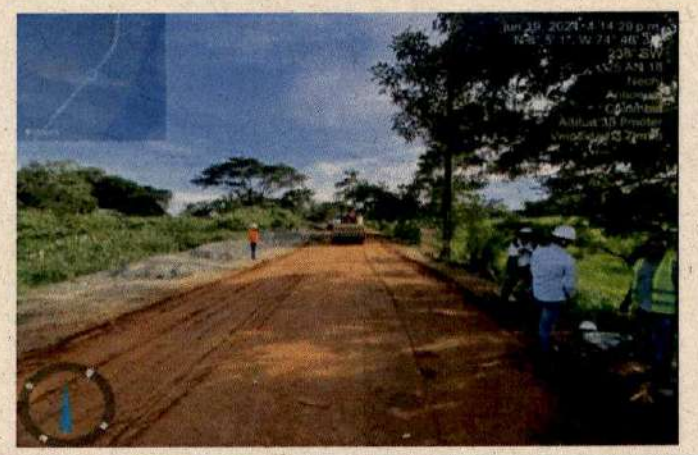

ACTIVIDADES AREA AMBIENTAL

-SE EVIDENCIA JORNADA DE ORDEN Y ASEO EN OFICINA ADMINISTRATIVA
-SE EVIDENCIAN CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO EN PARTE EXTERIOR DE OFICINA ADMINISTRATIVA
-EL CONTRATISTA CONTINÚA HACIENDO USO DE LOS ACOPIOS TEMPORALES, EN LOS CUALES ALMACENA EL CEMENTO Y HIERRO SOBRE ESTIBAS, CON LO ANTERIOR, SE BUSCA EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON EL SUELO
-SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA, TALES COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BOX CULVERT, EN DICHOS ACOMPAÑAMIENTOS, SE INSPECCIONA EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN OBRA, EL BUEN MANEJO DE LA CONCRETADORA ENTRE OTRAS,
-SE PARTICIPÓ EN COMITÉS DE OBRAS SEMANALES, EN LOS CUALES SE EXPRESAN LAS FALENCIAS AMBIENTALES Y ADEMÁS SE ESPECIFICAN LOS TEMAS QUE, DE ACUERDO CON LAS INSPECCIONES REALIZADAS, SE LES ESTÁ DANDO UN MANEJO ADECUADO.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S22-2024 Del 17/6/2024 al 23/6/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO -



Aseo oficina administrativa



Fachada exterior oficina administrativa

REGISTRO FOTOGRAFICO -



Acopio de Cemento



Construcción de Box Culvert

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría de Infraestructura Física	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría De Infraestructura Física Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App **INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO ACTIVIDADES**

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana	S22-2024	Del	17/6/2024	al	23/6/2024

ACTIVIDADES AREA FORESTAL


NO APLICA PARA ESTE PROYECTO

ACTIVIDADES AREA SOCIAL

-SE REALIZÓ VISITA TÉCNICA CON EL COORDINADOR DE OBRA YAMITH TUIRAN Y EL TÉCNICO DE LA EMPRESA DE AGUA, AGUASCOL PARA EL TRASLADO DEL REGISTRO DE CONTROL DE AGUA Y ADECUACIÓN DE ESTA MISMA.
-CAPACITACIÓN FÍSICA DE CALISTENIA Y BUEN TRATO ENTRE EMPLEADOS:
-SE REALIZÓ CAPACITACIÓN FÍSICA DE CALISTENIA Y CAPACITACIÓN SOBRE EL BUEN TRATO Y AMBIENTE LABORAL A LOS EMPLEADOS DEL CONSORCIO IC ING 15027.
-EN LA ACTIVIDAD SE TRANSMITIERON LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESTREZAS ACERCA DEL PROCESO DE TRABAJO, UNA COMPRENSIÓN ACERCA DE LA MANERA HABITUAL EN LA QUE HAN CONSTRUIDO RELACIONES INTERPERSONALES SIGNIFICATIVAS Y CONOZCAN LAS HABILIDADES CENTRALES REQUERIDAS PARA FAVORECER LA CONSTRUCCIÓN DE INTERACCIONES SANAS, DE CRECIMIENTO Y AUTODESCUBRIMIENTO. LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS Y EL BUEN AMBIENTE LABORAL EN EL TRABAJO.
-SOCIALIZACIÓN A HABITANTES SOBRE AVANCES DE LA OBRA PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE - COLORADO – NECHÍ:
-SE SOCIALIZÓ A UN GRUPO DE HABITANTES DEL MUNICIPIO DE NECHÍ ANTIOQUIA SOBRE LOS AVANCES MÁS RECIENTES EN SU ORDEN CRONOLÓGICO DE LA OBRA Y CONTRATACIÓN DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA.

REGISTRO FOTOGRAFICO



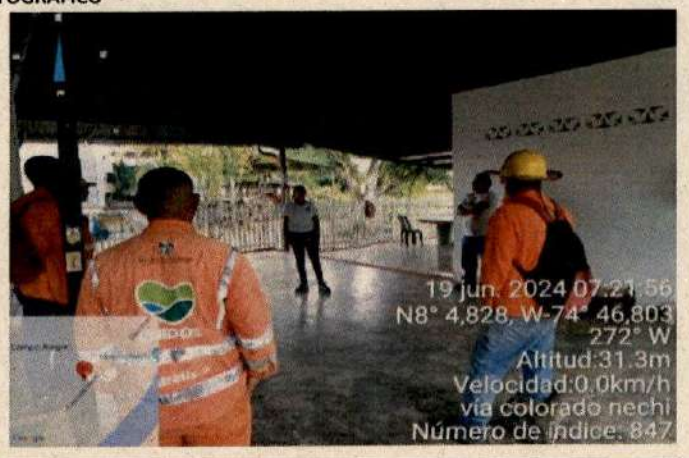

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría de Infraestructura Física	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría De Infraestructura Física Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App **INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO ACTIVIDADES**

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S22-2024 Del 17/6/2024 al 23/6/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO






GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

S18-2024	S22-2024	Del	20/05/2024	17/6/2024	al	23/06/2024

RESUMEN GRAFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

Avance Financiero Programado	$	1.079.543.137	37,45%
Avance Financiero Ejecutado	$	1.070.563.458	37,14%
Anticipo	$	458.473.717	15,00%
Facturado	$	274.308.629	8,97%
Potencial de Facturación	$	796.244.829	

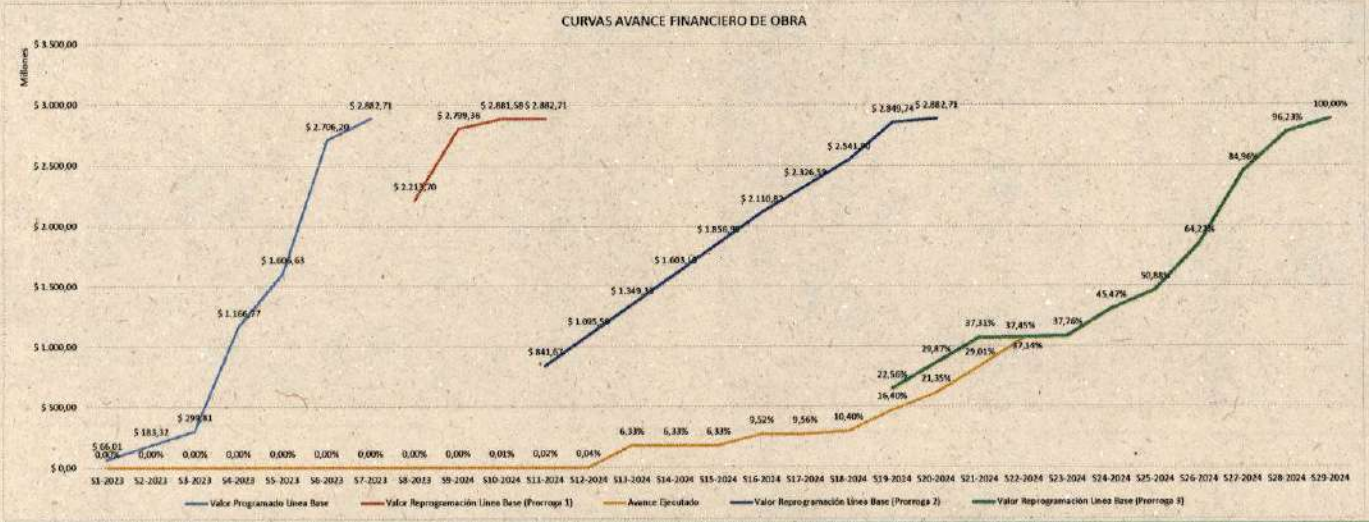

SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATADO	$	3.056.491.448
VALOR ADICIONAL POR MAYORES CANTIDADES EJECUTADAS EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$	-
VALOR DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O MENORES CANTIDADES EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$	-
VALOR POR PROYECCION DE NUEVAS OBRAS (OBRAS EXTRAS)		
VALOR TOTAL PROYECTO	**$**	**3.056.491.448**

SEGUIMIENTO CURVA S

					Atraso >= 5%				Atraso < 5%	Adelanto < 5%	Adelanto >= 5%
Semana	Valor Programado Linea Base	Valor Reprogramación Linea Base (Prorroga 1)	Valor Reprogramación Linea Base (Prorroga 2)	Valor Reprogramación Linea Base (Prorroga 3)	% Programado	% Reprogramado (Prorroga 1)	% Reprogramado (Prorroga 2)	% Reprogramado (Prorroga 3)	Avance Ejecutado	% Ejecutado	Facturado
S1-2023	$ 66.011.139,12				2,29%				$ 0,00	0,00%	$ -
S2-2023	$ 183.317.227,47				6,36%				$ 0,00	0,00%	$ -
S3-2023	$ 299.814.579,06				10,40%				$ 0,00	0,00%	$ -
S4-2023	$ 1.166.769.862,58				40,47%				$ 0,00	0,00%	$ -
S5-2023	$ 1.606.629.797,77				55,73%				$ 0,00	0,00%	$ -
S6-2023	$ 2.706.199.656,50				93,86%				$ 0,00	0,00%	$ -
S7-2023	$ 2.882.712.391,03				100,00%				$ 0,00	0,00%	$ -
S8-2023		$ 2.213.701.839,67				76,79%			$ 0,00	0,00%	$ -
S9-2024		$ 2.799.361.934,00				97,11%			$ 0,00	0,00%	$ -
S10-2024		$ 2.881.584.691,00				99,96%			$ 342.000,00	0,01%	$ -
S11-2024		$ 2.882.712.391,00	$ 841.670.432,20			100,00%	29,20%		$ 684.180,00	0,02%	$ -
S12-2024			$ 1.095.500.641,40				38,00%		$ 1.049.076,00	0,04%	$ -
S13-2024			$ 1.349.330.850,60				46,81%		$ 182.350.038,00	6,33%	$ -
S14-2024			$ 1.603.161.059,80				55,61%		$ 182.350.038,00	6,33%	$ -
S15-2024			$ 1.856.991.269,00				64,42%		$ 182.350.038,00	6,33%	$ -
S16-2024			$ 2.110.821.478,20				73,22%		$ 274.308.912,91	9,52%	$ 274.308.629,00
S17-2024			$ 2.326.586.069,40				80,71%		$ 275.459.628,91	9,56%	$ -
S18-2024			$ 2.541.899.580,00				88,18%		$ 299.741.144,14	10,40%	$ -
S19-2024			$ 2.849.740.661,00	$ 650.214.715,86			98,86%	22,56%	$ 472.775.009,31	16,40%	$ -
S20-2024			$ 2.882.712.391,00	$ 861.105.306,33			100,00%	29,87%	$ 615.565.952,66	21,35%	$ -
S21-2024				$ 1.075.543.223,80				37,31%	$ 836.409.803,83	29,01%	$ -
S22-2024				$ 1.079.543.136,73				37,45%	$ 1.070.563.458,08	37,14%	$ -
S23-2024				$ 1.088.447.749,58				37,76%			
S24-2024				$ 1.310.668.782,43				45,47%			
S25-2024				$ 1.466.760.908,28				50,88%			
S26-2024				$ 1.851.380.788,12				64,22%			
S27-2024				$ 2.449.263.800,91				84,96%			
S28-2024				$ 2.773.939.387,42				96,23%			
S29-2024				$ 2.882.712.391,00				100,00%			

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA


OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

S18-2024	S22-2024	Del	20/05/2024	17/6/2024	al	23/6/2024

RESUMEN GRAFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

Avance Financiero Programado	$ 301.195.801	56,29%
Avance Financiero Ejecutado	$ 295.856.617	55,27%
Anticipo	$ -	0,00%
Facturado	$ 80.104.286	14,96%
Potencial de Facturación	$ 215.752.331	

CURVAS AVANCE FINANCIERO INTERVENTORIA

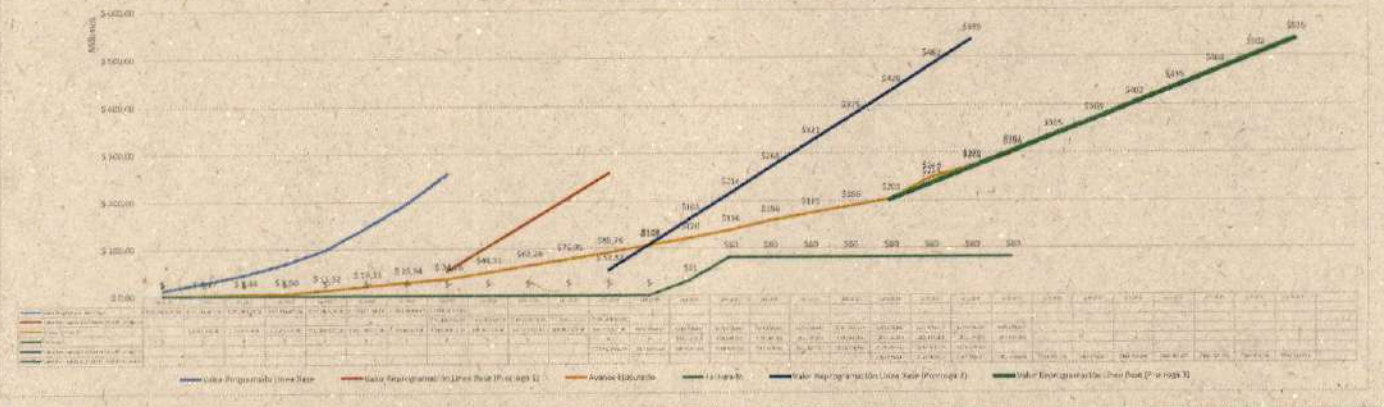

SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 257.054.643
VALOR ADICIONAL POR MAYORES CANTIDADES EJECUTADAS EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$ 278.265.919
VALOR DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O MENORES CANTIDADES EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$ -
VALOR POR PROYECCION DE NUEVAS OBRAS (OBRAS EXTRAS)	$ -
VALOR TOTAL PROYECTO	**$ 535.320.562**

SEGUIMIENTO CURVA S

					Atraso >= 5%	Atraso >= 5%			Atraso < 5%	Adelanto < 5%	Adelanto >= 5%
Semana	Valor Programado Linea Base	Valor Reprogramación Linea Base (Prorroga 1)	Valor Reprogramación Linea Base (Prorroga 2)	Valor Reprogramación Linea Base (Prorroga 3)	% Programado	% Reprogramado (Prorroga 1)	% Reprogramado (Prorroga 2)	% Reprogramado (Prorroga 3)	Avance Ejecutado	% Ejecutado	Facturado
S1-2023	$ 12.000.000,00				4,67%				$ -	0,00%	$ -
S2-2023	$ 27.000.000,00				10,50%				$ 1.167.899,00	0,45%	$ -
S3-2023	$ 45.000.000,00				17,51%				$ 2.335.798,00	0,91%	$ -
S4-2023	$ 67.000.000,00				26,06%				$ 3.503.697,00	1,36%	$ -
S5-2023	$ 97.000.000,00				37,74%				$ 11.318.927,00	4,40%	$ -
S6-2023	$ 144.000.000,00				56,02%				$ 19.130.157,00	7,44%	$ -
S7-2023	$ 194.000.000,00				75,47%				$ 26.943.387,00	10,48%	$ -
S8-2023	$ 257.054.643,00	$ 51.410.928,60			100,00%	20,00%			$ 34.756.617,00	13,52%	$ -
S9-2024		$ 102.821.857,20				40,00%			$ 48.506.617,00	18,87%	$ -
S10-2024		$ 154.232.785,80				60,00%			$ 62.256.617,00	24,22%	$ -
S11-2024		$ 205.643.714,40				80,00%			$ 76.006.617,00	29,57%	$ -
S12-2024		$ 257.054.643,00	$ 53.532.050,20			100,00%	10,00%		$ 89.756.617,00	16,77%	$ -
S13-2024			$ 107.064.112				20,00%		$ 104.756.617	19,57%	$ -
S14-2024			$ 160.596.169				30,00%		$ 119.756.617	22,37%	$ 31.252.918
S15-2024			$ 214.128.225				40,00%		$ 135.856.617	25,36%	$ 80.104.286
S16-2024			$ 267.660.281				50,00%		$ 155.856.617	29,11%	$ 80.104.286
S17-2024			$ 321.192.337				60,00%		$ 170.856.617	31,92%	$ 80.104.286
S18-2024			$ 374.724.393				70,00%		$ 185.856.617	34,72%	$ 80.104.286
S19-2024			$ 428.256.450	$ 200.856.617			80,00%	37,52%	$ 200.856.617	37,52%	$ 80.104.286
S20-2024			$ 481.788.506	$ 234.303.012			90,00%	43,77%	$ 245.856.617	45,92%	$ 80.104.286
S21-2024			$ 535.320.562	$ 267.749.406			100,00%	50,02%	$ 270.856.617	50,60%	$ 80.104.286
S22-2024				$ 301.195.801				56,26%	$ 295.856.617	55,27%	$ 80.104.286
S23-2024				$ 334.642.195				62,51%			
S24-2024				$ 368.088.590				68,76%			
S25-2024				$ 401.534.984				75,01%			
S26-2024				$ 434.981.379				81,26%			
S27-2024				$ 468.427.773				87,50%			
S28-2024				$ 501.874.168				93,75%			
S29-2024				$ 535.320.562				100,00%			

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría de Infraestructura Física	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría De Infraestructura Física Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App **INFORME SEMANAL - EMPLEABILIDAD**

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

S18-2024	S22-2024	Del	20/5/2024	al	23/6/2024


	Gobernación	Contratista Interventoría	Contratista Obra	Subcontratistas	Total	Incidencia Total
Ingresos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Profesionales		0	0		**0**	
Tecnólogos		0	0		**0**	
Operativos		0	0		**0**	
Administrativos		0	0		**0**	
Retiros	**0**	**0**	**14**	**0**	**14**	
Profesionales		0	0		**0**	
Tecnólogos		0	0		**0**	
Operativos		0	14		**14**	**100,0%**
Administrativos		0	0		**0**	
Activos	**0**	**6**	**26**	**0**	**32**	
Profesionales		4	7		**11**	**34,4%**
Tecnólogos		0	2		**2**	**6,3%**
Operativos		0	17		**17**	**53,1%**
Administrativos		2	0		**2**	**6,3%**
Caracterización						
Hombres		4	22		**26**	**81,3%**
Mujeres		2	4		**6**	**18,8%**
Primer Empleo		0	0		**0**	
Discapacitado		0	0		**0**	
Indígenas		0	0		**0**	
LGTBI		0	0		**0**	
Afrodescendiente		0	0		**0**	
Localización		6	26			
De la Subregión		2	22		**24**	**75,0%**
De Antioquia		2	2		**4**	**12,5%**
Fuera de Antioquia		2	2		**4**	**12,5%**

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaria De Infraestructura Física
Subsecretaria de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - CUADRO DE MANDO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana: S22-2024 Del: 17/6/2024 al: 23/6/2024

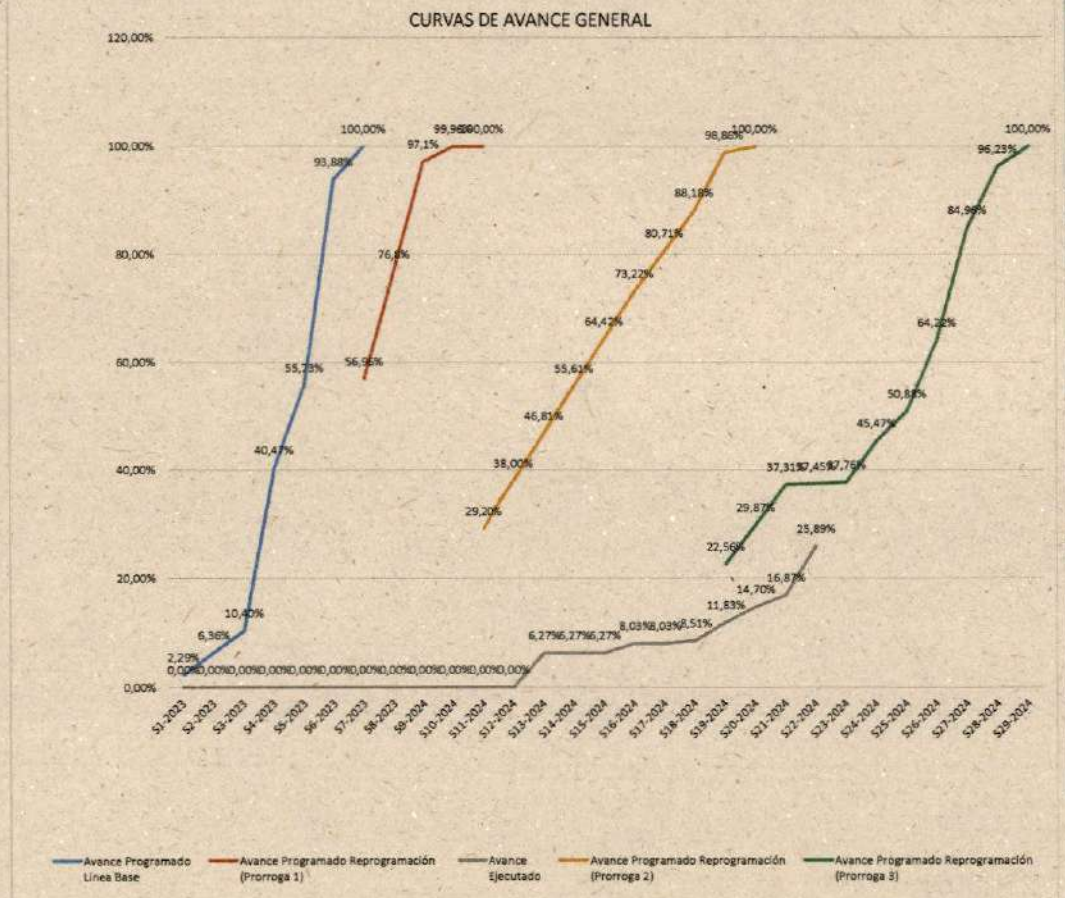

Avance Fisico	Semana	Acumulado	
Avance Programado	14,89%	37,45%	-11,56%
Avance Ejecutado	14,06%	25,89%	
Plazo transcurrido	76,41%	149 dias	
Fin Proyectado	8/6/2024		

Estructura Pavimento K13+725 - K13+045		Total	Ejecutado	Avance
Carpeta asfáltica	10 cm	0,68 Km	0,000 Km	0,00%
Base Gran.	20 cm	0,68 Km	0,300 Km	11,03%
Terraplén		0,68 Km	0,458 Km	16,84%
Mantenimiento Mecanico		0,30 Km	0,000 Km	0,00%

Obras varias	Total	Ejecutado	Avance
Cunetas	153 ml	0,00	0%
Box Coulverts K13+217	1 Und	1,00	100%
Box Coulverts K13+370	1 Und	1,00	100%


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaria De Infraestructura Fisica
Subsecretaria de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - CUADRO DE MANDO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana: S22-2024 Del: 17/6/2024 al: 23/6/2024

Avance Financiero Obra

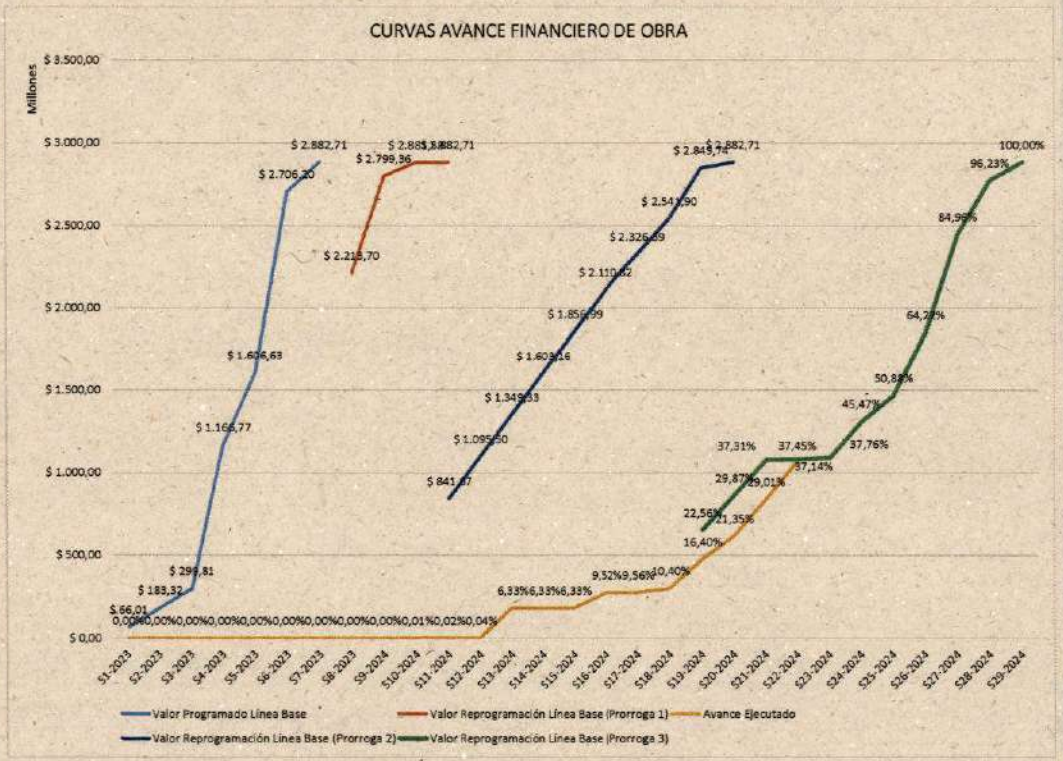

Avance Financ. Program.	$	1.079.543.137	37,45%
Avance Financ. Ejecut.	$	1.070.553.458	37,14%
Desviación	-$	8.989.679	-0,31%
Facturado	$	274.308.629	8,97%
Balance Financiero			Año suscripción

Valor Inicial	$	**3.056.491.448,00**	2634,91	2023
Adición 1	$	-	0,00 SMMLV	2024
Adición 2			0,00 SMMLV	
Valor Total	$	3.056.491.448	+ 0 %	
Valor Proyect.	$	3.056.491.448		
Análisis financiero en SMML				


Gran total a adicionar	$	**1.528.245.724,00**	1.317,45	50,00%
Gran total adicionado	$	-	0,00 SMMLV	0,00%
Disponible para el 50% V.I.C.	$	1.528.245.724	1.175,57 SMMLV	44,62%

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - CUADRO DE MANDO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA


Semana: S22-2024 | Del: 17/6/2024 | al: 23/6/2024

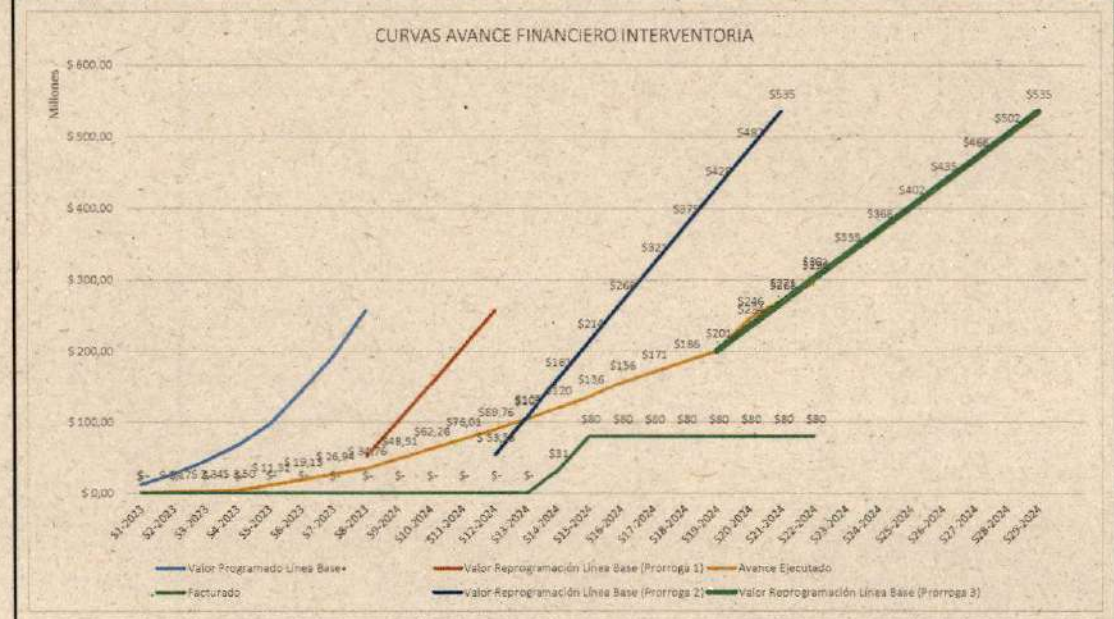



Avance Financiero			
Avance Financ. Program.	$	301.195.801	56,26%
Avance Financ. Ejecut.	$	295.856.617	55,27%
Desviación	-$	5.339.184	-1,00%
Facturado	$	80.104.286	14,96%
Plazo transcurrido	73,53%	150 días	
Fin Proyectado	17/8/2024		

Balance Financiero				Año suscripción
Valor Inicial	$	257.054.643	221,60 SMMLV	2023
Adición	$	278.265.919	214,05 SMMLV	2024
Valor Total	$	535.320.562	+ 96,59 %	
Valor Proyect.	$	535.320.562		

Análisis financiero en SMML				
Gran total a adicionar	$	-	110,80 SMMLV	50,00%
Gran total adicionado	$	278.265.919	214,05 SMMLV	96,59%
Disponible para el 50% V.I.C.	-$	278.265.919	-214,05 SMMLV	-96,59%

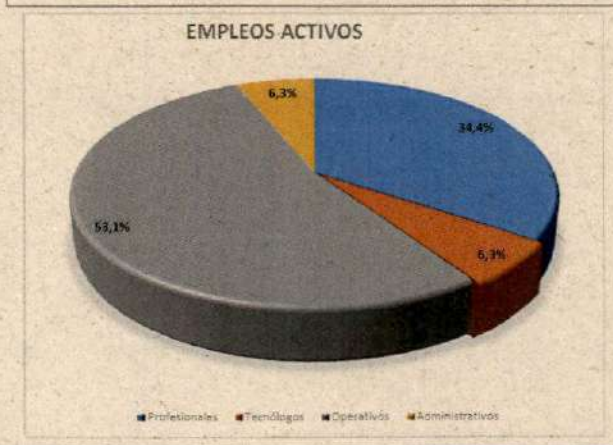

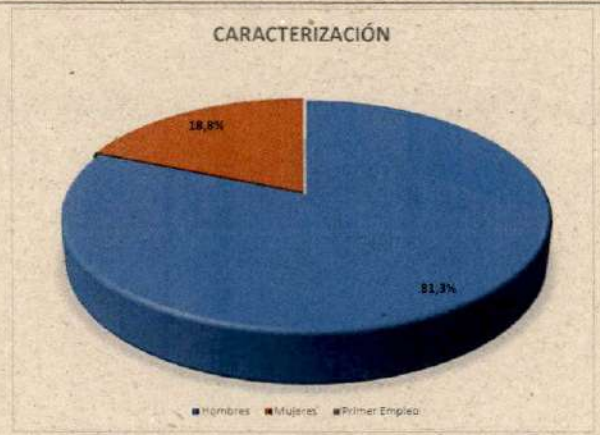

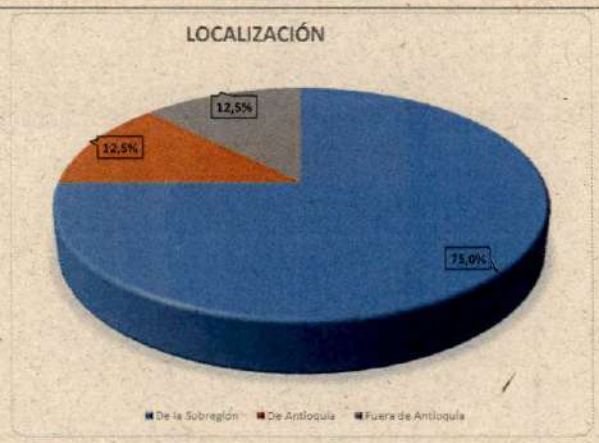

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría de Infraestructura Física	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría De Infraestructura Física Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App **INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO DE OBRA**

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S23-2024 Del 24/6/2024 al 30/6/2024

	Información Contractual
	Seguimiento del Avance Físico de Obra
	Actividades Ejecutadas del Proyecto
	Seguimiento del Avance Financiero de Obra
	Seguimiento a Nuevos Ítems (Obra Extra)
	Seguimiento del Avance Financiero de Interventoría
	Seguimiento Empleabilidad del Proyecto
	Varios
	Cuadro de mando

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App

INFORME SEMANAL - INFORMACIÓN CONTRACTUAL

	OBRA	INTERVENTORIA
S23-2024	4600016558 de 2023	4600016527 de 2023
PROCESO	LIC-15027	CON-15365
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) – COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) – COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA	**CONSORCIO IC-ING 15027** ICPB S.A. 90% INGAP S.A.S. 10 % REPRESENTANTE LEGAL - JORGE IVAN LOPEZ ELEJALDE	**SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.** REPRESENTANTE LEGAL - JAVIER BARRERO MOSSOS
NIT	901.756.732-6	891.101.100-5
SUBREGIÓN	BAJO CAUCA	
MUNICIPIOS IMPACTADOS	CAUCASIA - NECHI	
SUPERVISOR	VANESSA BETANCUR MARTINEZ	

ESTADO	EJECUCION	EJECUCION
VALOR	$3.056.491.448	$257.054.643
PLAZO	2,5 MESES	2 MESES Y 22 DÍAS
FECHA DE INICIO	8/11/2023	8/11/2023
FECHA DE FIN	8/08/2024	17/08/2024

	FECHA	VALOR	%	FECHA	VALOR	%
VALOR INICIAL	8/11/2023	$ 3.056.491.448	100,00%	5/09/2022	$ 257.054.643	48,02%
ADICIÓN 1				19/01/2024	$ 278.265.919	51,98%
VALOR TOTAL	**$**	**3.056.491.448**	**100,00%**	**$**	**535.320.562**	**100,00%**

	FECHA	DIAS	%	FECHA	DIAS	%
PLAZO INICIAL	8/11/2023	48,00	24,62%	8/11/2023	48	23,53%
AMPLIACIÓN 1	22/12/2023	27,00	13,85%	22/12/2023	36	17,65%
AMPLIACIÓN 2	19/01/2024	60,00	30,77%	19/01/2024	60	29,41%
AMPLIACIÓN 3	7/06/2024	60,00	30,77%	7/06/2024	60	29,41%
PLAZO TOTAL	**195 DIAS**		**100,00%**	**204 DIAS**		**100%**

	FECHA INICIO	FECHA FIN	DÍAS	FECHA INICIO	FECHA FIN	DÍAS
SUSPENSIÓN 1	12/2/2024	30/3/2024	48	13/2/2024	30/3/2024	47
SUSPENSIÓN 2	5/4/2024	5/5/2024	31	5/4/2024	5/5/2024	31
TOTAL	**79 DIAS**			**78 DIAS**		

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FISICO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) – COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA


Semana	S23-2024	20/05/2024	Del	24/9/2024	al	30/9/2024

RESUMEN GRAFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

	Semana	Acumulado
Avance Programado	0,31%	37,76%
Avance Ejecutado	7,06%	32,95%
Desviación	6,75%	4,80%

Desviación (días)	0
Fin Proyectado	6/6/2024

CURVAS DE AVANCE GENERAL

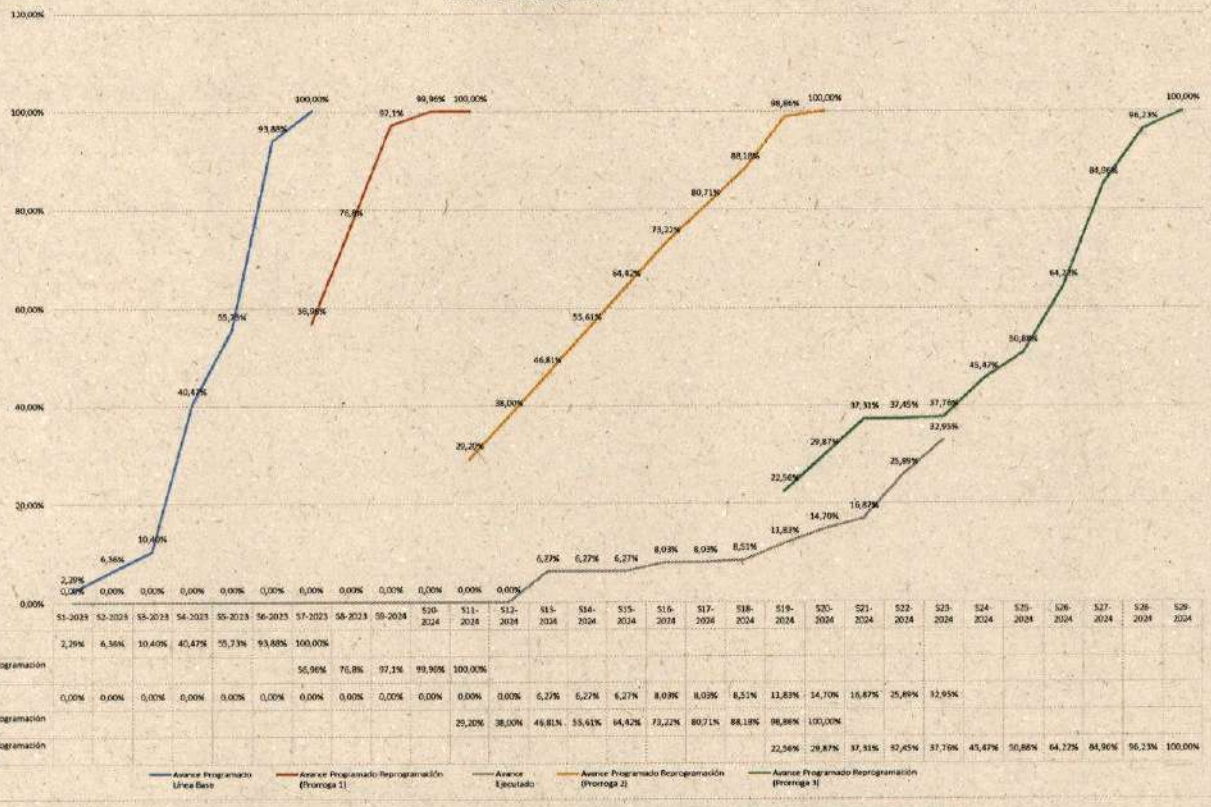

	S1-2023	S2-2023	S3-2023	S4-2023	S5-2023	S6-2023	S7-2023	S8-2023	S9-2024	S10-2024	S11-2024	S12-2024	S13-2024	S14-2024	S15-2024	S16-2024	S17-2024	S18-2024	S19-2024	S20-2024	S21-2024	S22-2024	S23-2024	S24-2024	S25-2024	S26-2024	S27-2024	S28-2024	S29-2024
Avance Programado Línea Base	2,29%	6,56%	10,40%	40,47%	55,73%	93,88%	100,00%																						
Avance Programado Reprogramación (Prorroga 1)							56,96%	76,8%	97,1%	99,90%	100,00%																		
Avance Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,27%	6,27%	6,27%	8,03%	8,03%	8,51%	11,83%	14,70%	16,87%	25,89%	32,95%						
Avance Programado Reprogramación (Prorroga 2)											29,20%	38,00%	46,81%	55,61%	64,42%	73,22%	80,71%	88,18%	98,86%	100,00%									
Avance Programado Reprogramación (Prorroga 3)																			22,56%	29,87%	37,31%	37,45%	37,76%	45,47%	50,88%	64,22%	84,96%	96,23%	100,00%

AVANCE ACTIVIDADES LICENCIAS Y PERMISOS

ACTIVIDAD	% ANTERIOR	% ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
Aprovechamiento forestal	N/A	N/A	N/A	
Ocupación de cauce	N/A	N/A	N/A	
PMT	0%	0%	72,41%	72,41%

AVANCE ACTIVIDADES OBRAS

ACTIVIDAD	CANT. EJECUTADA ACUM	% EJECUTADO ANTERIOR	% EJECUTADO ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
PRODUCTO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO			46,98%	1,17%	-45,82%
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN D	990,94	65,10%	65,16%	50,00%	-15,16%
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	2835,77	30,60%	30,60%	75,00%	44,40%
SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE	558,13	53,98%	53,98%	0,00%	-53,98%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOCELDA	3030,66	62,77%	62,77%	0,00%	-62,77%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSA MDC 19	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTE DE BASE	68979,68	49,20%	52,67%	0,00%	-52,67%
TRANSPORTE DE EXCAVACIÓN	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PRODUCTO 2. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS			0,00%	0,00%	0,00%
CONCRETO CLASE D (21 MPA). CUNETAS.	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FISICO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) – COLORADO - NECHÍ, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana: S23-2024 | 20/05/2024 | Del: 24/6/2024 | al: 30/6/2024

PRODUCTO 3. CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT			100,00%	10,46%	-89,54%
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS	175,50	90,93%	90,93%	100,00%	9,07%
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SELLADORA PARA MUROS SIKA PVC V15	54,00	90,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
CONCRETO CLASE F (14 MPA). SOLADOS DE E=0.05 M	4,70	156,58%	100,00%	0,13%	-99,87%
CONCRETO CLASE C (28 MPA). BOX COULVERT - LOSA INFERIOR	13,50	71,05%	100,00%	0,00%	-100,00%
CONCRETO CLASE C (28 MPA). BOX COULVERT - LOSA SUPERIOR Y MUROS LATERALES	30,15	65,54%	100,00%	0,00%	-100,00%
CONCRETO CLASE C (28 MPA). MUROS, DISIPADORES, ALETAS.	9,86	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO	5114,00	78,97%	100,00%	0,00%	-100,00%
LLENO MECÁNICO COMPACTADO	29,70	33,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
PRODUCTO 4. SEÑALIZACION VIAL			0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN FRIO M2	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN CON PINTURA ACRÍLICA EN FRIO ML	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEÑAL VERTICAL DE 75 CM X 75 CM EN ÁNGULO DE 2"X2"X1/4"	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEÑAL VERTICAL DE 75CMX75CM DOBLE (SP/SR/SI), EN ÁNGULO 2"X2"X1/8"	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEÑAL VERTICAL POSTE DE REFERENCIA SI-04 DOBLE EN ÁNGULO DE 2"X2"X1/8".	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PARAL ESTRUCTURA PARA SEÑALES VERTICALES DE TRANSITO INFORMATIVAS SI-05 Y SI-06, EN H,	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PRODUCTO 5. MANTENIMIENTO MECÁNICO			4,00%	14,69%	10,69%
INSTALACIÓN Y COMPACTACION DE AFIRMADO	226,20	3,19%	3,19%	100,00%	96,81%
TRANSPORTE DE AFIRMADO	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

SEGUIMIENTO CURVA S

GENERAL

Atraso >= 5%	Atraso < 5%	Adelanto < 5%			Adelanto >= 5%
Semana	Avance Programado Línea Base	Avance Programado Reprogramación (Prorroga 1)	Avance Programado Reprogramación (Prorroga 2)	Avance Programado Reprogramación (Prorroga 3)	Avance Ejecutado
S1-2023	2,29%				0,00%
S2-2023	6,36%				0,00%
S3-2023	10,40%				0,00%
S4-2023	40,47%				0,00%
S5-2023	55,73%				0,00%
S6-2023	93,86%				0,00%
S7-2023	100,00%	56,06%			0,00%
S8-2023		76,8%			0,00%
S9-2024		97,1%			0,00%
S10-2024		99,96%			0,00%
S11-2024		100,00%	29,20%		0,00%
S12-2024			38,60%		0,00%
S13-2024			46,81%		6,27%
S14-2024			55,61%		6,27%
S15-2024			64,42%		6,27%
S16-2024			73,22%		8,03%
S17-2024			80,71%		8,03%
S18-2024			88,18%		8,51%
S19-2024			98,86%	22,56%	11,83%
S20-2024			100,00%	29,87%	14,76%
S21-2024				37,31%	16,87%
S22-2024				37,45%	25,89%
S23-2024				37,76%	32,95%
S24-2024				45,47%	
S25-2024				50,88%	
S26-2024				64,22%	
S27-2024				84,96%	
S28-2024				96,23%	
S29-2024				100,00%	
