
CONTRATO DE OBRA 1647-2023
PROGRAMACIÓN DE OBRA
PROYECTO CALI

Id	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1		**Proyecto Cali**	**66.1 días**	**jue 14/09/23**	**vie 15/12/23**	**$ 751,712,626.70**
2		Aprobación Balance	1 día	jue 14/09/23	jue 14/09/23	$ 0.00
3		Inicio	0 días	mar 19/09/23	mar 19/09/23	$ 0.00
4		**Actividades de Obra**	**62.1 días**	**mié 20/09/23**	**vie 15/12/23**	**$ 751,712,626.70**
5	**1**	**PRELIMINARES**	**60.1 días**	**mié 20/09/23**	**mié 13/12/23**	**$ 57,028,291.11**
6	1.06	DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN	0.1 días	jue 21/09/23	jue 21/09/23	$ 0.00
7	1.17	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	10 días	lun 25/09/23	vie 6/10/23	$ 10,535,481.83
8	1.37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	1 día	mié 20/09/23	jue 21/09/23	$ 12,292,100.45
9	1.38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	0.1 días	jue 21/09/23	jue 21/09/23	$ 0.00
10	1.39	DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	0.1 días	jue 21/09/23	jue 21/09/23	$ 0.00
11	1.4	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM)	0.1 días	vie 27/10/23	vie 27/10/23	$ 0.00
12	1.41	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRET	0.1 días	vie 27/10/23	vie 27/10/23	$ 0.00
13	1.57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	0.1 días	mié 20/09/23	mié 20/09/23	$ 0.00
14	1.66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	1 día	jue 21/09/23	vie 22/09/23	$ 878,007.18
15	1.67	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	5 días	mié 6/12/23	mié 13/12/23	$ 3,148,311.65
16	1.74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=5M MOVIL	30 días	jue 21/09/23	jue 2/11/23	$ 30,174,390.00
17	**2**	**CARPINTERÍA EN MADERA**	**32.9 días**	**mié 18/10/23**	**lun 4/12/23**	**$ 34,875,697.71**
18	2.09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8	2 días	mar 14/11/23	jue 16/11/23	$ 6,813,431.84
19	2.10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	2 días	jue 16/11/23	lun 20/11/23	$ 5,730,748.22
20	2.18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	1 día	lun 20/11/23	mar 21/11/23	$ 3,331,995.97
21	2.19	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFIC	1 día	vie 1/12/23	lun 4/12/23	$ 1,332,091.46
22	2.21	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 80KG	4 días	lun 27/11/23	vie 1/12/23	$ 5,460,706.92
23	2.22	MANTENIMIENTO DE MUEBLE	3 días	mié 18/10/23	lun 23/10/23	$ 12,206,723.30
24	**3**	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**43.1 días**	**jue 5/10/23**	**mar 5/12/23**	**$ 217,620,910.45**
25	3.02	BARANDA TUBO REDONDO	7 días	jue 5/10/23	lun 16/10/23	$ 27,023,622.30
26	3.08	VENTANA EN LÁMINA PERSIANA FIJA CAL	12 días	lun 16/10/23	mié 1/11/23	$ 93,715,391.75
27	3.09	VENTANA EN LÁMINA CAL. 20 BATIENTE	5 días	mié 1/11/23	mié 8/11/23	$ 80,919,527.13
28	3.13	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	4 días	mié 8/11/23	mar 14/11/23	$ 5,818,641.20
29	3.15	PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.	4 días	mar 21/11/23	lun 27/11/23	$ 8,952,775.30
30	3.19	REJILLA DE PISO 30CM	0.1 días	mar 5/12/23	mar 5/12/23	$ 0.00
31	3.2	ESPEJO BISELADO 5MM	1 día	lun 4/12/23	mar 5/12/23	$ 1,190,952.77
32	**4**	**CIELORRASOS**	**6 días**	**mar 10/10/23**	**mié 18/10/23**	**$ 13,703,851.26**
33	4.02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX(	6 días	mar 10/10/23	mié 18/10/23	$ 13,703,851.26
34	**6**	**CUBIERTAS**	**43.1 días**	**lun 9/10/23**	**jue 7/12/23**	**$ 5,194,907.19**
35	6.12	AFINADOS CUBIERTAS PLANAS E=0,03M	0.1 días	lun 9/10/23	lun 9/10/23	$ 0.00
36	6.21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL	3 días	lun 4/12/23	jue 7/12/23	$ 5,194,907.19
37	**7**	**ENCHAPE MUROS**	**10.1 días**	**vie 22/09/23**	**vie 6/10/23**	**$ 5,557,855.79**
38	7.03	RESANE	10 días	vie 22/09/23	vie 6/10/23	$ 5,557,855.79
39	7.04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	0.1 días	vie 6/10/23	vie 6/10/23	$ 0.00
40	**10**	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**15 días**	**jue 12/10/23**	**jue 2/11/23**	**$ 31,687,230.21**



CONTRATO DE OBRA 1647-2023
PROGRAMACIÓN DE OBRA
PROYECTO CALI

Id	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
41	10.02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	15 días	jue 12/10/23	jue 2/11/23	$ 31,687,230.21
42	**11**	**IMPERMEABILIZACIÓN**	**12 días**	**vie 27/10/23**	**mar 14/11/23**	**$ 34,576,108.38**
43	11.06	IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ED-9	12 días	vie 27/10/23	mar 14/11/23	$ 34,576,108.38
44	**12**	**MAMPOSTERÍA**	**14 días**	**lun 9/10/23**	**vie 27/10/23**	**$ 5,261,727.48**
45	12.01	ALFAGÍA EN CONCRETO 15CM	14 días	lun 9/10/23	vie 27/10/23	$ 5,261,727.48
46	**13**	**PINTURAS**	**15 días**	**vie 6/10/23**	**vie 27/10/23**	**$ 38,133,827.50**
47	13.1	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	15 días	vie 6/10/23	vie 27/10/23	$ 38,133,827.50
48	**14**	**PISOS**	**18.2 días**	**jue 21/09/23**	**mar 17/10/23**	**$ 7,252,379.55**
49	14.10	PISO GRANITO MARMOL	0.1 días	jue 21/09/23	jue 21/09/23	$ 0.00
50	14.15	ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZA	0.1 días	jue 21/09/23	jue 21/09/23	$ 0.00
51	14.19	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA E=10	18 días	jue 21/09/23	mar 17/10/23	$ 7,252,379.55
52	**15**	**RED ELÉCTRICA**	**0.1 días**	**vie 6/10/23**	**vie 6/10/23**	**$ 0.00**
53	15.46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCT	0.1 días	vie 6/10/23	vie 6/10/23	$ 0.00
54	**16**	**RED HIDRÁULICA**	**10.2 días**	**lun 25/09/23**	**lun 9/10/23**	**$ 19,598,571.68**
55	16.22	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	0.1 días	jue 5/10/23	jue 5/10/23	$ 0.00
56	16.25	MOTOBOMBA 2,0 HP	2 días	lun 25/09/23	mié 27/09/23	$ 1,150,152.36
57	16.29	PRUEBA HIDROSTÁTICA	0.1 días	mié 27/09/23	mié 27/09/23	$ 0.00
58	16.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN GRANITO MARMOL NEGRO SAN GABRIEL D=1,25M	4 días	mié 27/09/23	mar 3/10/23	$ 8,376,231.33
59	16.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	1 día	jue 5/10/23	vie 6/10/23	$ 9,519,926.48
60	16.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	1 día	vie 6/10/23	lun 9/10/23	$ 552,261.51
61	**17**	**RED SANITARIA**	**56 días**	**jue 21/09/23**	**vie 8/12/23**	**$ 11,395,631.28**
62	17.19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LL	1 día	jue 7/12/23	vie 8/12/23	$ 1,813,062.40
63	17.20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	2 días	jue 21/09/23	lun 25/09/23	$ 2,194,309.71
64	17.27	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	1 día	mar 3/10/23	mié 4/10/23	$ 840,744.01
65	17.28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	1 día	mié 4/10/23	jue 5/10/23	$ 6,547,515.16
66	**19**	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**7.8 días**	**mar 5/12/23**	**vie 15/12/23**	**$ 19,339,313.88**
67	19.01	ASEO GENERAL DE OBRA	2 días	mié 13/12/23	vie 15/12/23	$ 1,703,695.18
68	19.03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	0.5 días	mar 5/12/23	mar 5/12/23	$ 2,121,303.80
69	19.04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	0.5 días	mar 5/12/23	mié 6/12/23	$ 2,485,683.60
70	19.05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	0.5 días	mié 6/12/23	mié 6/12/23	$ 10,316,533.22
71	19.07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	0.5 días	mié 6/12/23	jue 7/12/23	$ 2,712,098.08
72	**20**	**NO PREVISTOS**	**47.6 días**	**vie 6/10/23**	**mié 13/12/23**	**$ 250,486,323.23**
73	NP-01	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE CUBIERTA TIPO MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALIUMINIO 3MM	14 días	mar 14/11/23	lun 4/12/23	$ 112,713,933.72
74	NP-02	CERRAMIENTO EN MALLA ZARANDA DE 2X2 0.90X30MTS- PALOMAS	3 días	vie 8/12/23	mié 13/12/23	$ 6,686,756.46
75	NP-03	ACABADO DE PISOS EN GRAVILLA LAVADA INCLUYE DILATACIONES	20 días	mar 17/10/23	mar 14/11/23	$ 130,282,801.95
76	NP-04	TOMACORRIENTE DOBLE DE INCRUSTAR DE 15A 110V	0.2 días	vie 6/10/23	vie 6/10/23	$ 802,831.10
77		**FIN**	**0 días**	**vie 15/12/23**	**vie 15/12/23**	**$ 0.00**

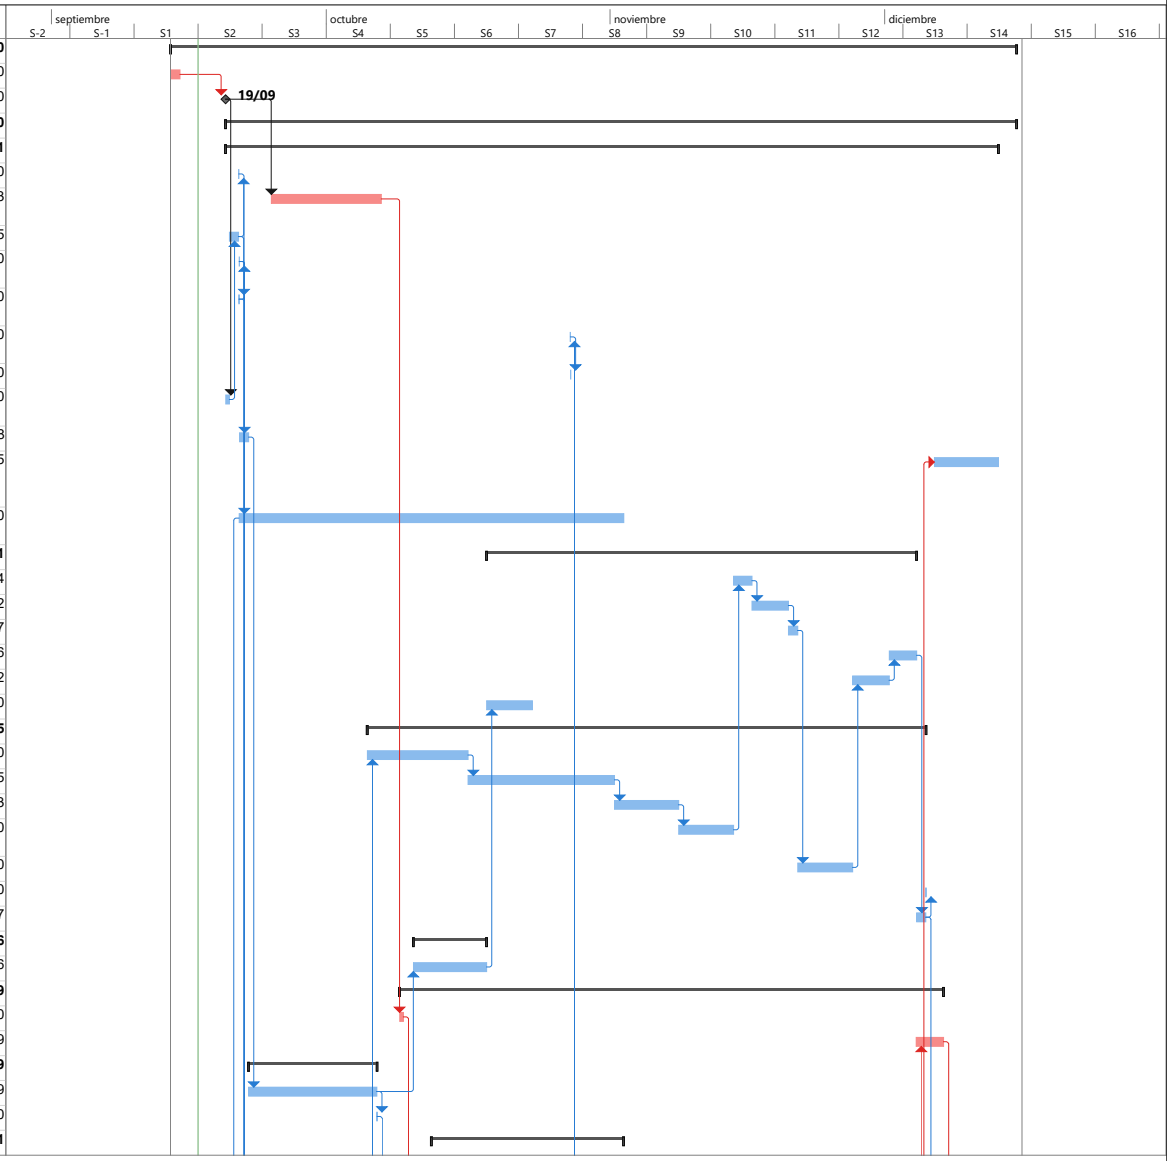
