

CONTRATO DE OBRA 164-2023
PROGRAMACIÓN DE OBRA
PROYECTO SEVILLA

Id	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1		**Proyecto Sevilla**	**67 días**	**jue 14/09/23**	**vie 15/12/23**	**$ 247,127,614.77**
2		Aprobación Balance	0 días	jue 14/09/23	jue 14/09/23	$ 0.00
3		Inicio	0 días	lun 18/09/23	lun 18/09/23	$ 0.00
4		**Actividades de Obra**	**64 días**	**mar 19/09/23**	**vie 15/12/23**	**$ 247,127,614.77**
5	**1**	**PRELIMINARES**	**64 días**	**mar 19/09/23**	**vie 15/12/23**	**$ 23,747,495.46**
6	1,02	DESMONTE DE CANALETA PLÁSTICA Y METÁLICA DE RED DE VOZ Y DATOS	1 día	vie 22/09/23	vie 22/09/23	$ 41,601.22
7	1,03	DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y D	1 día	vie 22/09/23	vie 22/09/23	$ 37,117.72
8	1,05	DESMONTE DE ALFOMBRA	1 día	lun 25/09/23	lun 25/09/23	$ 0.00
9	1,06	DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN	1 día	jue 21/09/23	jue 21/09/23	$ 67,230.12
10	1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	2 días	mié 4/10/23	jue 5/10/23	$ 836,707.53
11	1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	15 días	lun 16/10/23	vie 3/11/23	$ 3,628,639.81
12	1,14	DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE	2 días	lun 13/11/23	mar 14/11/23	$ 125,118.54
13	1,16	DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	1 día	mié 11/10/23	mié 11/10/23	$ 0.00
14	1,33	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	1 día	mié 20/09/23	mié 20/09/23	$ 165,402.21
15	1,34	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	1 día	mié 20/09/23	mié 20/09/23	$ 0.00
16	1,36	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	1 día	lun 6/11/23	lun 6/11/23	$ 471,130.44
17	1,37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	6 días	mar 26/09/23	mar 3/10/23	$ 4,110,896.52
18	1,38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	1 día	mié 4/10/23	mié 4/10/23	$ 0.00
19	1,42	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO (E=8-13CM)	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23	$ 41,104.06
20	1,43	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6	3 días	mié 4/10/23	vie 6/10/23	$ 4,759,284.78
21	1,46	DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CI	1 día	jue 21/09/23	jue 21/09/23	$ 77,920.98
22	1,47	REGATA SOBRE MURO+RESANE	1 día	lun 16/10/23	mar 17/10/23	$ 24,953.41
23	1,50	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	2 días	mié 4/10/23	jue 5/10/23	$ 1,438,411.42
24	1,51	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	1 día	mar 17/10/23	mié 18/10/23	$ 60,405.13
25	1,54	INSTALACIÓN DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	1 día	vie 3/11/23	vie 3/11/23	$ 0.00
26	1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	1 día	vie 24/11/23	vie 24/11/23	$ 908,706.69
27	1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA	3 días	mar 19/09/23	jue 21/09/23	$ 560,540.52
28	1,60	DESCAPOTE MANUAL E=20CM	1 día	mié 4/10/23	mié 4/10/23	$ 0.00
29	1,63	LLENO EN ARENA	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23	$ 938,950.77
30	1.67	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	1 día	vie 15/12/23	vie 15/12/23	$ 1,049,461.39
31	1,73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	1 día	mar 19/09/23	mar 19/09/23	$ 1,051,091.48
32	1,74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M MOVIL	20 días	lun 16/10/23	vie 10/11/23	$ 3,352,820.72
33	**2**	**CARPINTERÍA EN MADERA**	**5 días**	**vie 20/10/23**	**vie 27/10/23**	**$ 4,138,390.46**
34	2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8C	1 día	vie 20/10/23	lun 23/10/23	$ 1,135,572.31
35	2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	1 día	lun 23/10/23	mar 24/10/23	$ 955,124.86
36	2,13	PUERTA EN MADERA 51CM-75CM	1 día	mar 24/10/23	mié 25/10/23	$ 573,629.66

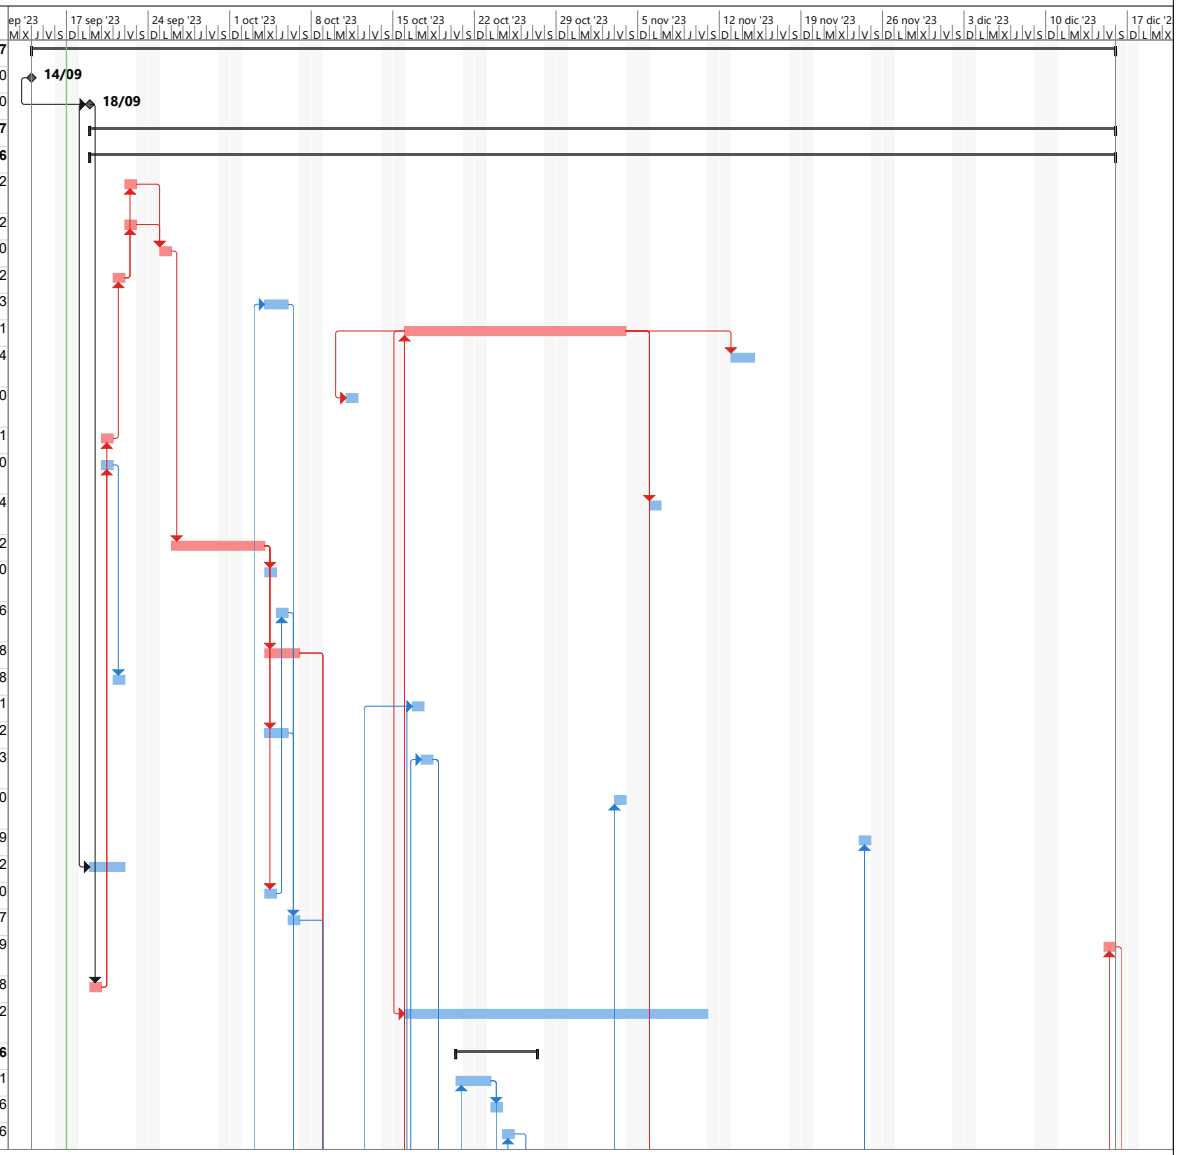

CONTRATO DE OBRA 164-2023
PROGRAMACIÓN DE OBRA
PROYECTO SEVILLA

Id	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
37	2,14	PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	1 día	mié 25/10/23	jue 26/10/23	$ 686,165.91
38	2,15	MARCO PUERTA EN MADERA 51CM-75CM	1 día	lun 23/10/23	mar 24/10/23	$ 227,348.28
39	2,16	MARCO PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	1 día	mar 24/10/23	mié 25/10/23	$ 227,348.28
40	2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	1 día	jue 26/10/23	vie 27/10/23	$ 333,201.16
41	**3**	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**3 días**	**mié 18/10/23**	**lun 23/10/23**	**$ 1,255,867.94**
42	3,05	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	1 día	mié 18/10/23	jue 19/10/23	$ 1,127,244.83
43	3,08	VENTANA EN LÁMINA PERSIANA FIJA CAL. :	1 día	vie 20/10/23	lun 23/10/23	$ 0.00
44	3,20	ESPEJO BISELADO 5MM	1 día	jue 19/10/23	vie 20/10/23	$ 128,623.11
45	**4**	**CIELORRASOS**	**35 días**	**vie 6/10/23**	**jue 23/11/23**	**$ 31,523,619.55**
46	4,02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60	35 días	vie 6/10/23	jue 23/11/23	$ 31,523,619.55
47	**5**	**CONCRETOS Y MORTEROS**	**8 días**	**vie 13/10/23**	**mar 24/10/23**	**$ 5,414,880.15**
48	5,02	PAÑETE MUROS 1:3	8 días	vie 13/10/23	mar 24/10/23	$ 5,414,880.15
49	**6**	**CUBIERTAS**	**23 días**	**lun 6/11/23**	**mié 6/12/23**	**$ 62,132,978.84**
50	6,16	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	12 días	mar 21/11/23	mié 6/12/23	$ 22,801,373.86
51	6,20	CANAL EN LÁMINA CAL 22	2 días	vie 17/11/23	lun 20/11/23	$ 3,665,757.78
52	6,22	TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	9 días	lun 6/11/23	jue 16/11/23	$ 35,665,847.20
53	**7**	**ENCHAPE MUROS**	**2 días**	**mié 25/10/23**	**jue 26/10/23**	**$ 1,743,279.69**
54	7,05	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	2 días	mié 25/10/23	jue 26/10/23	$ 1,743,279.69
55	**8**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**3 días**	**mar 10/10/23**	**jue 12/10/23**	**$ 2,597,550.68**
56	8,01	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	2 días	mar 10/10/23	mié 11/10/23	$ 2,004,195.91
57	8,02	VIGUETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	1 día	jue 12/10/23	jue 12/10/23	$ 593,354.77
58	**10**	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**26 días**	**mié 25/10/23**	**mié 29/11/23**	**$ 6,323,910.62**
59	10,02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	4 días	vie 24/11/23	mié 29/11/23	$ 2,939,201.21
60	10,04	PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA [2 MANOS]	2 días	mié 25/10/23	jue 26/10/23	$ 3,384,709.41
61	**12**	**MAMPOSTERÍA**	**2 días**	**vie 6/10/23**	**lun 9/10/23**	**$ 2,598,045.22**
62	12,09	MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO	2 días	vie 6/10/23	lun 9/10/23	$ 2,598,045.22
63	**13**	**PINTURAS**	**3 días**	**mié 25/10/23**	**vie 27/10/23**	**$ 3,660,984.67**
64	13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	3 días	mié 25/10/23	vie 27/10/23	$ 3,660,984.67
65	**14**	**PISOS**	**34 días**	**lun 9/10/23**	**jue 23/11/23**	**$ 64,021,665.32**
66	14,06	PISO CERÁMICO DURO PISO	15 días	mié 25/10/23	mar 14/11/23	$ 37,683,385.04
67	14,07	PISO EN ADOQUÍN CONCRETO 6CM PEATO	10 días	lun 9/10/23	vie 20/10/23	$ 9,665,176.79
68	14,12	POYO COCINA 55X10CM	1 día	mié 25/10/23	mié 25/10/23	$ 191,532.34
69	14,13	ALISTADO DE PISO 2CM	12 días	lun 9/10/23	mar 24/10/23	$ 9,498,509.99
70	14,16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	7 días	mié 15/11/23	jue 23/11/23	$ 6,983,061.16
71	**15**	**RED ELÉCTRICA**	**28.9 días**	**mar 17/10/23**	**vie 24/11/23**	**$ 2,198,995.18**
72	15,06	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4	1 día	mar 17/10/23	mié 18/10/23	$ 225,930.86
73	15,12	LUMINARIA LED REDONDA 18W PARA TECHO MODULAR	1 día	vie 24/11/23	vie 24/11/23	$ 125,242.07
74	15,28	SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC	1 día	mié 18/10/23	jue 19/10/23	$ 726,308.22
75	15,30	CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR	1 día	jue 19/10/23	vie 20/10/23	$ 741,622.18
76	15,32	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC	1 día	jue 19/10/23	vie 20/10/23	$ 165,150.05

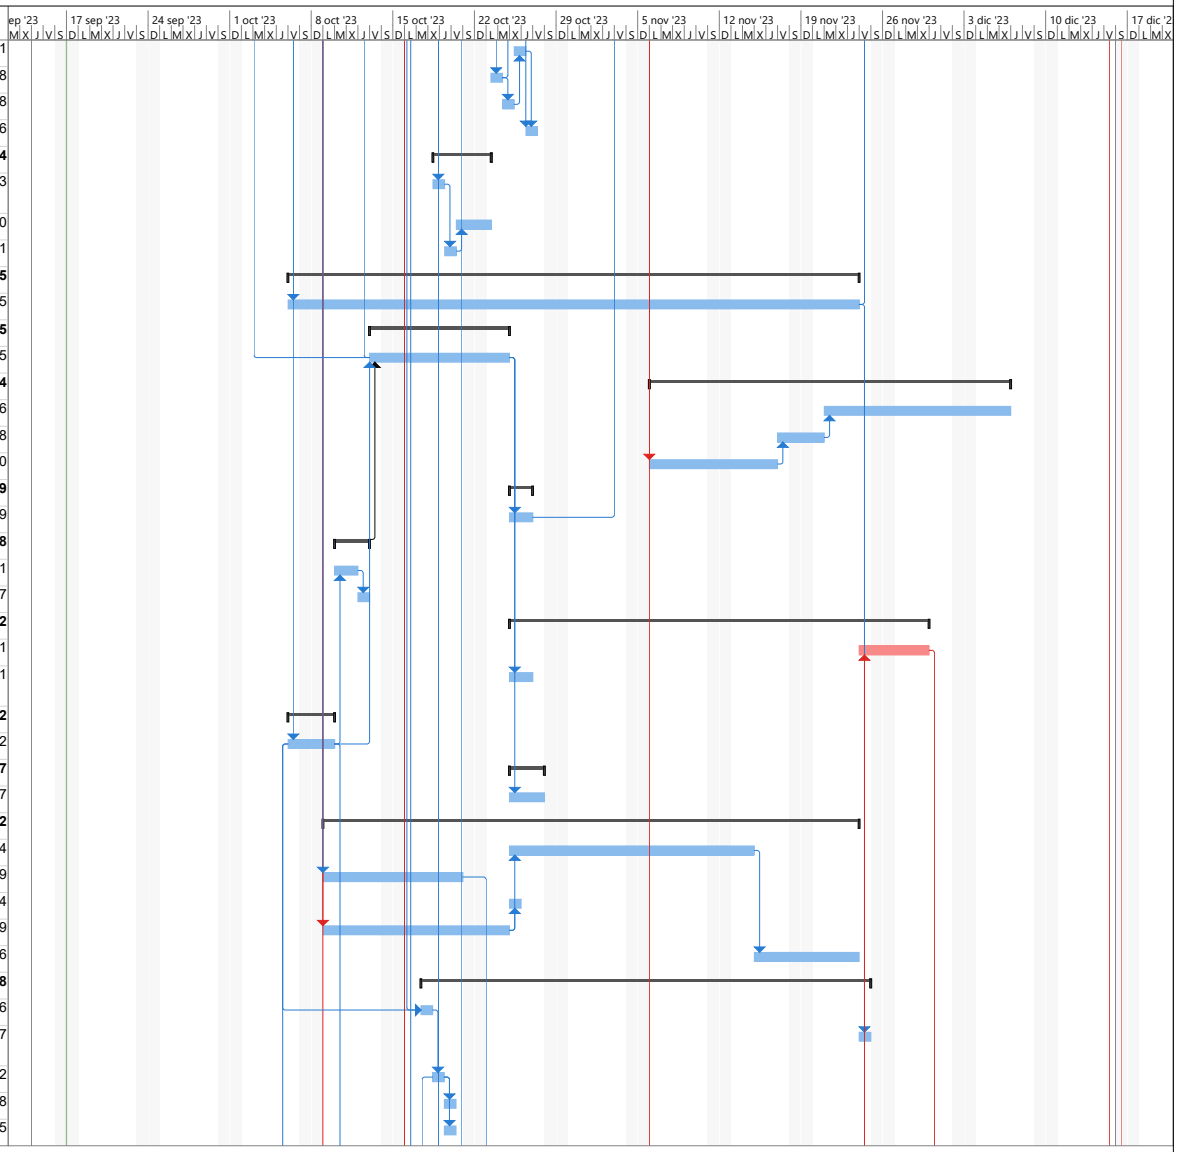

CONTRATO DE OBRA 164-2023
PROGRAMACIÓN DE OBRA
PROYECTO SEVILLA

Id	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
77	15,46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRI	1 día	jue 19/10/23	vie 20/10/23	$ 214,741.80
78	**16**	**RED HIDRÁULICA**	**8 días**	**mié 11/10/23**	**lun 23/10/23**	**$ 2,734,189.05**
79	16,07	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO	1 día	mié 11/10/23	jue 12/10/23	$ 43,285.33
80	16,11	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS	1 día	jue 12/10/23	vie 13/10/23	$ 42,942.76
81	16,12	TAPA REGISTRO 20X20CM	1 día	vie 13/10/23	lun 16/10/23	$ 80,447.63
82	16,15	CAMBIO KIT REPUESTO FLUXÓMETRO	1 día	vie 13/10/23	lun 16/10/23	$ 0.00
83	16,18	JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO	1 día	lun 16/10/23	mar 17/10/23	$ 96,347.40
84	16,21	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	1 día	mar 17/10/23	mié 18/10/23	$ 1,096,577.44
85	16,24	MESON EN ACERO INOXIDABLE	1 día	vie 20/10/23	lun 23/10/23	$ 0.00
86	16,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	1 día	mié 18/10/23	jue 19/10/23	$ 1,098,455.86
87	16,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	1 día	jue 19/10/23	vie 20/10/23	$ 276,132.63
88	**17**	**RED SANITARIA**	**3.2 días**	**lun 16/10/23**	**jue 19/10/23**	**$ 2,712,100.01**
89	17,12	SALIDA SANITARIA INODORO 4"	1 día	lun 16/10/23	lun 16/10/23	$ 151,047.20
90	17,14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	1 día	mar 17/10/23	mar 17/10/23	$ 103,146.67
91	17,16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	1 día	mar 17/10/23	mar 17/10/23	$ 64,616.62
92	17,27	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	1 día	mié 18/10/23	jue 19/10/23	$ 840,744.56
93	17,29	ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR, INCLEYE LLAVE DE PUSH Y DESAGUE.	1 día	mié 18/10/23	jue 19/10/23	$ 1,552,544.96
94	**18**	**URBANISMO**	**1 día**	**lun 23/10/23**	**lun 23/10/23**	**$ 278,180.94**
95	18,03	RAMPA EN CONCRETO ESTRIADO E=14CM	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	$ 278,180.94
96	**19**	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**11 días**	**jue 30/11/23**	**jue 14/12/23**	**$ 3,783,809.61**
97	19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	4 días	lun 11/12/23	jue 14/12/23	$ 567,898.86
98	19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	4 días	jue 30/11/23	mar 5/12/23	$ 1,917,881.86
99	19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	1 día	mié 6/12/23	mié 6/12/23	$ 0.00
100	19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	1 día	mié 6/12/23	mié 6/12/23	$ 397,712.08
101	19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	1 día	jue 7/12/23	jue 7/12/23	$ 222,291.17
102	19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	1 día	vie 8/12/23	vie 8/12/23	$ 678,025.64
103	**20**	**NO PREVISTOS**	**34 días**	**lun 9/10/23**	**jue 23/11/23**	**$ 26,261,671.38**
104	NP-01	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	3 días	lun 6/11/23	mié 8/11/23	$ 885,861.35
105	NP-02	BARRA DE SEGURIDAD 40CM	1 día	jue 19/10/23	vie 20/10/23	$ 345,542.85
106	NP-03	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	5 días	vie 17/11/23	jue 23/11/23	$ 2,455,796.14
107	NP-04	IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA E=1,	6 días	jue 9/11/23	jue 16/11/23	$ 15,316,125.04
108	NP-05	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	2 días	mar 10/10/23	mié 11/10/23	$ 2,529,277.36
109	NP-06	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO	1 día	mié 18/10/23	jue 19/10/23	$ 360,660.58
110	NP-07	TUBERÍA PVCP 1/2"	1 día	lun 9/10/23	mar 10/10/23	$ 419,884.15
111	NP-08	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	1 día	mar 10/10/23	mié 11/10/23	$ 203,461.04
112	NP-09	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	5 días	lun 9/10/23	vie 13/10/23	$ 3,565,834.17
113	NP-10	GRANITO LAVADO	1 día	mar 24/10/23	mar 24/10/23	$ 179,228.70
114		FIN	0 días	vie 15/12/23	vie 15/12/23	$ 0.00

