CONSTANCIA DE RECIBIDO
FECHA:
HORA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

RAC - 022
Alcaldia Municipal
La Calera
10 JUL 2024
FECHA:
HORA: 11:56 RADICADO: 6942
NOMBRE:

1500-5501-2024

La Calera,

Señor
ÁLVARO CORRAL
Vereda Salitre Alto
Teléfono: 3138009426
E-mail: anaisabel@corralmaldonado.com
Ciudad

Referencia: Convenio Interadministrativo 515 - 2023. Cronograma de Actividades Planta de tratamiento de agua potable Acueducto Veredal ASOLAGOS. Su carta de julio 04 de 2024

Cordial saludo señor Corral,

De conformidad con los acuerdos de nuestra reunión de mayo 16 de 2024 realizada en el predio de su propiedad, me permito presentar a usted el cronograma de actividades planteado para dar continuidad con la entrega del sistema de tratamiento de agua potable (PTAP), el cual mejorará el suministro de agua a sus suscriptores, aportando un valor importante a la prestación eficiente de los servicios públicos, en desarrollo del convenio de la referencia.

Como es de su conocimiento, se plantean cuatro momentos que se describen a continuación:

- Preparación de materiales y fundición de placa para ubicación de PTAP, ingreso por única vez para realizar esta actividad.
- Instalación de PTAP, ingreso por única vez.
- Las actividades de operación y mantenimiento de carácter común a la operación del acueducto.
- Instalación punto de agua en su predio.

Para efectos de instalación de la planta, se plantean dos fechas de ingreso al predio suyo, con este objeto, tal como se acordó. Se adjunta cronograma de actividades en la presente comunicación.

Con el cronograma y el calendario del proyecto, se busca presentar la planeación de las actividades que se desean realizar en las próximas semanas; es de vital importancia su participación y conocimiento de lo que se va a desarrollar.

Respecto al oficio de la referencia, debo mencionar, de conformidad con lo acordado en nuestra reunión de mayo 16 de 2024 y firmado por las partes en el acta adjunta, que dice lo siguiente: "…. *Se aclara que la **única** compensación que se hará a los señores Corral, es la instalación del punto de agua para la casa de la familia Corral*…" (subrayado y negrilla fuera de texto), (entrega de $2,000.000.00 y acuerdos con la CAR), no podrán atenderse, pues los acuerdos a los que llegamos en mayo de 2024, ya fueron socializados con la comunidad y fueron aceptados por la misma.

La administración municipal y ESPUCAL velarán por que no haya daño ambiental en su predio y para que, al final de la obra, las condiciones originales queden en igualdad o superioridad de condiciones a las originales.

Atentamente,

DPC

DIEGO PERALTA CORREDOR
Secretario de Obras Públicas

Elaboró: Ingeniero José María Pinzón Aguilar – Asesor SOP
Revisó: Ingeniero Diego Peralta Corredor – Secretario de Obras Públicas

Copia: Secretaria de Planeación.

Cronograma de Proyecto PTAP ASOLAGOS

Proyecto: Planta de Tratamiento Agua Potable Acueducto Veredal Los Lagos ASOLAGOS

Fecha de inicio: 13/07/24

Días planeados de trabajo: 22

Fecha de fin: 27/07/24

Si se completó

N°	Descripción de la etapa	Duración de la etapa (días)	Tarea dependiente	Comienzo	Fin	Responsable	Estatus	Fecha de finalización	Días que efectivamente llevó la etapa
1	**Certificado de Disponibilidad del servicio de Acueducto a la familia Corral**	1	No Aplica	28/06/24	28/06/24	Alcaldía La Calera	Completado	27/06/24	0
2	**Socialización de Actividades, cronograma y**	5	1	13/07/24	05/07/24	ASOLAGOS	En progreso		


	observaciones familia Corral.								
3	Inicio de obra (Materiales, fundido de placa Primer ingreso.)	1	2	13/07/24	06/07/24	ASOLAGOS	No comenzado		
4	Fraguado de Placa (supervisión alistamiento)	14	3	13/07/24	19/07/24	ASOLAGOS	No comenzado		
5	Instalación de planta de tratamiento (segundo Ingreso)	1	4	27/07/24	20/07/24	Alcaldía La Calera	No comenzado		

Resumen de Actividades.


Calendario de proyecto

Fecha de reporte	28/06/2024
Días planeados	22
Días transcurridos	0
Días faltantes	22


Días por etapa ordenado por # de etapa

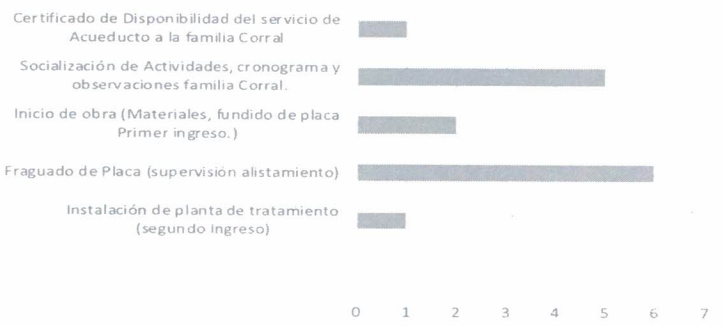

Días totales de proyecto



% Etapas según Estatus

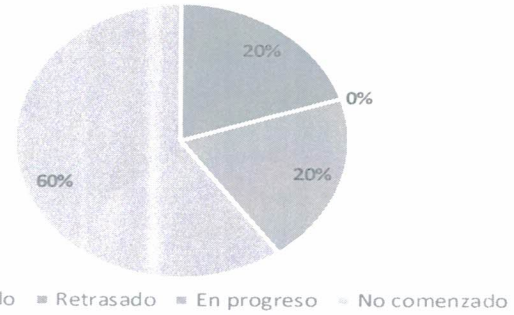

Días de retraso vs días ganados

Total días de retraso	0
Total días ganados	1

16 Mayo 2024

Objetivo → reunion ingreso PTAP vereda el salitre

Se reunieron la secretaria de obras publicas, especial, secretaria de medio ambiente y los señores Corrales para visitar los puntos de intervención donde se realizara la instalación de la PTAP del acueducto Asologos, se revisa el punto de la bocatoma, punto implantación de la PTAP, se informa por parte de los señores Corrales el requerimiento de un punto de agua y y se expresa que es necesario que el contratista tenga las polizas de responsabilidad vigentes, y que no se hagan afectaciones a las especies arboreas que se plantarón recientemente y son de importancia.

Se explica como se instalaria la planta, es un unico ingreso para la instalación y se requerira solo el ingreso del furgonero, para el correcto mantenimiento de la planta, y un unico ingreso para fundir la plancha

Se acuerda que la unica compensación que se hara a los señores Corrales, es la instalación del punto de agua para la casa de la familia Corral cuartas.

De parte de la secretaria de ambiente se expresa que un profesional a cargo se acercara para la depuración de especies arboreas que se suministraran y la cantidad de las mismas.

María Paula Gonzalez
Contratista apoyo SDP.
CC. 1040034482

José Pinzón A.
Secretario Obras Publicas

Johann Esteven vereda
especial esp

Alvaro Corral
CC 79155776

Alejandra Garcia
Secretaria de Medio Ambien
y Desarrollo rural

Powered by CamScanner
