
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**REALIZAR LA CARACTERIZACION DE VIAS REGIONALES ENLOS MUNICIPIOS ACCIONADOS EN LA ST-302 DE 2017 LA GUAJIRA, EN CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGIA DEFINIDA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, PARA LA VIGENCIA 2023**	**1 día**	**jue 5/10/23**	**jue 5/10/23**
2		**Etapa 1: Socialización comunidad Wayuú y plan de trabajo.**	**23.5 días**	**jue 5/10/23**	**jue 2/11/23**
3		Cronograma de actividades para el desarrollo de la consultoría	14 días	jue 5/10/23	sáb 21/10/23
4		Metodología y flujo de trabajo	14 días	jue 5/10/23	sáb 21/10/23
5		Propuesta de logística, personal y equipos a utilizar	14 días	jue 5/10/23	sáb 21/10/23
6		Propuesta de calidad, revisión y procesamiento de la información	14 días	jue 5/10/23	sáb 21/10/23
7		Propuesta de seguimiento a la ejecución del contra	14 días	jue 5/10/23	sáb 21/10/23
8		Análisis de accesibilidad en cada municipio	14 días	jue 5/10/23	sáb 21/10/23
9		Socialización Riohacha (1)	1 día	mié 18/10/23	mié 18/10/23
10		Socialización Riohacha (2)	1 día	jue 19/10/23	jue 19/10/23
11		Socialización Uribia Norte Estrema	1 día	sáb 21/10/23	lun 23/10/23
12		Socialización Uribia Media	1 día	mar 24/10/23	mié 25/10/23
13		Socialización Manaure (1)	1 día	vie 27/10/23	sáb 28/10/23
14		Socialización Manaure (2)	1 día	sáb 28/10/23	lun 30/10/23
15		Socialización Maicao (1)	1 día	mar 31/10/23	mié 1/11/23
16		Socialización Maicao (2)	1 día	mié 1/11/23	jue 2/11/23
17		**Etapa 2: Entrega 1000 Kilómetros inventariados.**	**35.92 día**	**jue 19/10/23**	**vie 1/12/23**
18		Concertación y Aprobación de vías a Caracterizar	7 días	jue 19/10/23	vie 27/10/23
19		**Riohacha**	**17.5 días**	**jue 19/10/23**	**jue 9/11/23**
20		Preprocesamiento de Información	4.2 días	jue 19/10/23	mar 24/10/23
21		Toma de Información en Campo	11.15 día	vie 20/10/23	jue 2/11/23
22		Procesamiento de Datos SIG	9 días	lun 30/10/23	jue 9/11/23
23		**Uribia**	**29.22 día**	**mar 24/10/23**	**mié 29/11/23**
24		Preprocesamiento de Información	6.12 días	mar 24/10/23	mié 1/11/23
25		Toma de Información en Campo	16.2 días	vie 3/11/23	jue 23/11/23
26		Procesamiento de Datos SIG	13.77 día	lun 13/11/23	mié 29/11/23
27		**Manaure**	**25.1 días**	**mié 1/11/23**	**vie 1/12/23**
28		Preprocesamiento de Información	1 día	mié 1/11/23	jue 2/11/23
29		Toma de Información en Campo	2 días	vie 24/11/23	lun 27/11/23
30		Procesamiento de Datos SIG	2 días	mié 29/11/23	vie 1/12/23
31		**Etapa 3: Entrega final.**	**35.93 día**	**jue 2/11/23**	**vie 15/12/23**
32		**Manaure**	**26.83 día**	**jue 2/11/23**	**mar 5/12/23**
33		Preprocesamiento de Información	1.5 días	jue 2/11/23	vie 3/11/23
34		Toma de Información en Campo	3.8 días	mar 28/11/23	sáb 2/12/23
35		Procesamiento de Datos SIG	3.5 días	jue 30/11/23	mar 5/12/23
36		**Maicao**	**34.43 día**	**vie 3/11/23**	**vie 15/12/23**
37		Preprocesamiento de Información	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23
38		Toma de Información en Campo	7.9 días	lun 4/12/23	jue 14/12/23
39		Procesamiento de Datos SIG	6.7 días	jue 7/12/23	vie 15/12/23

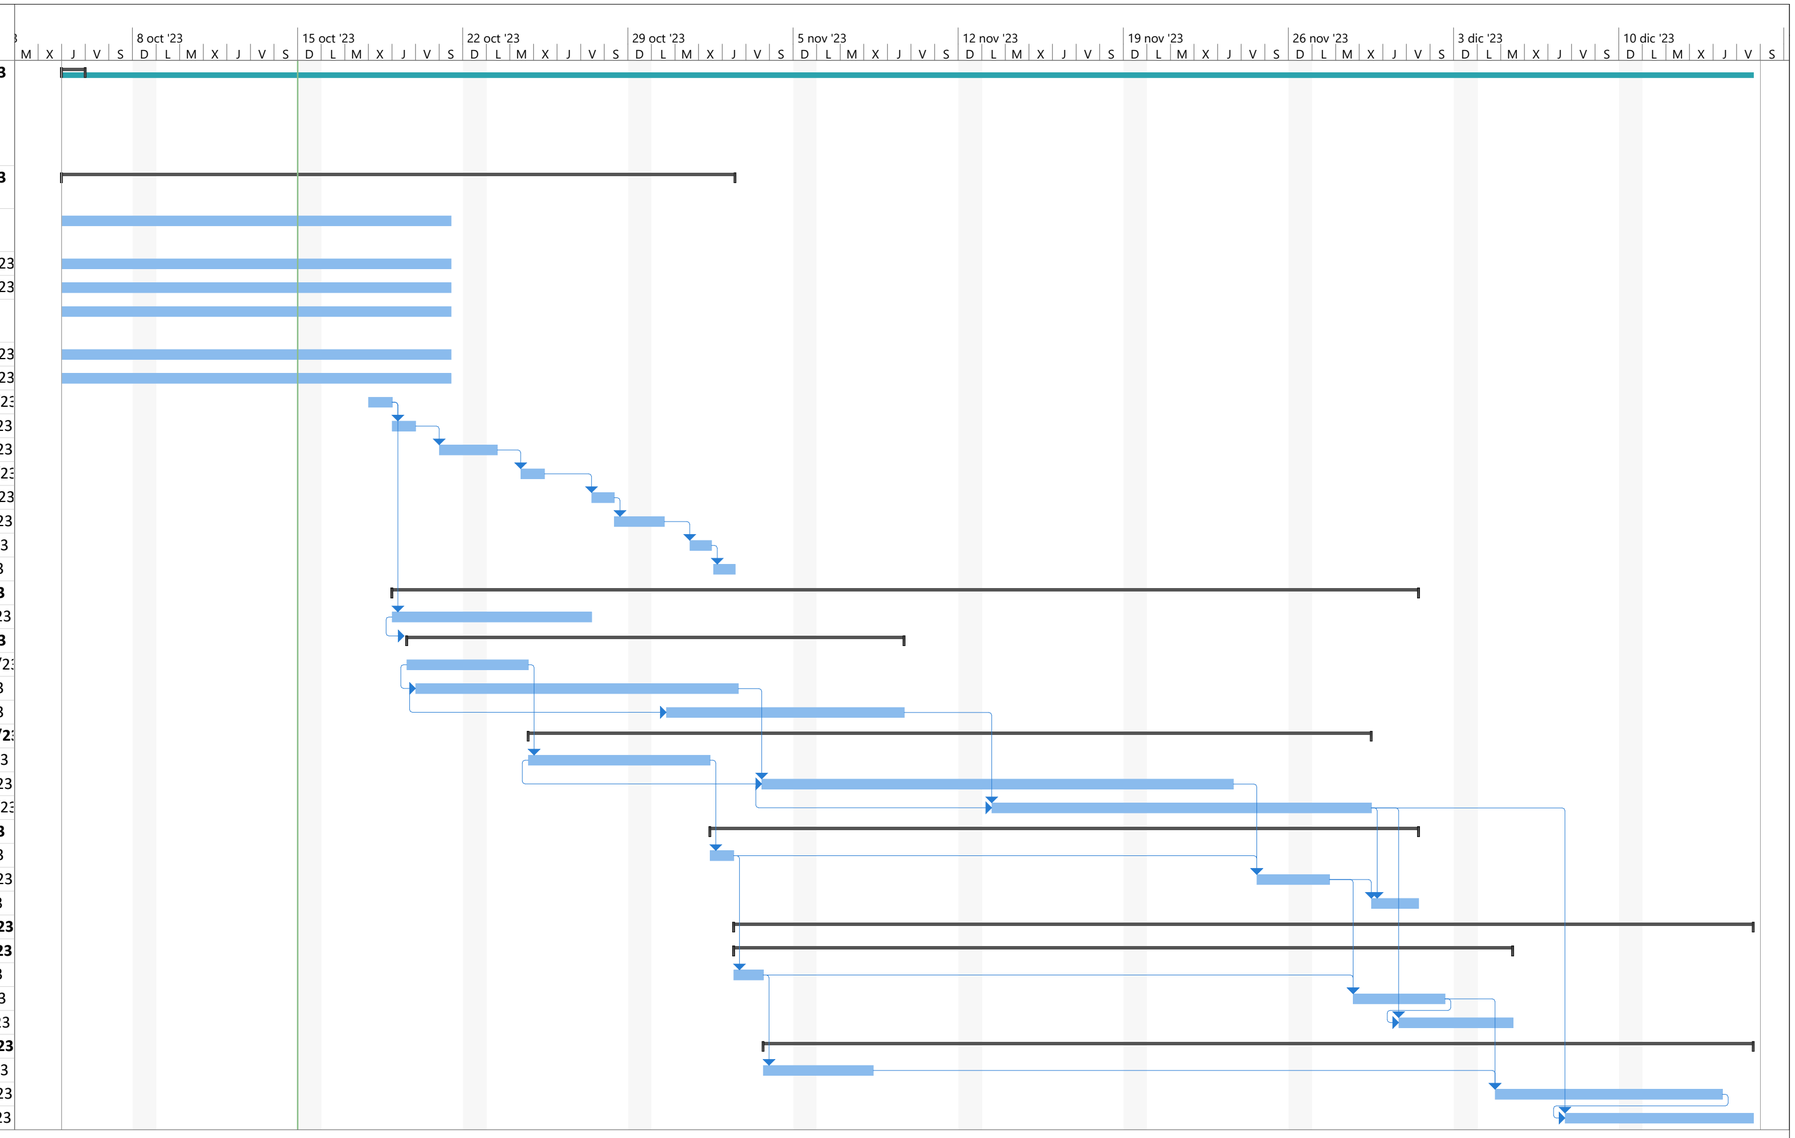

Proyecto: Cronograma Consulto
Fecha: dom 15/10/23

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Progreso manual
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso	
