Interior

Al contestar cite Radicado 2024-3-003122-029256 Id: 417974
Folios: 2 Fecha: 02-10-2024 17:21:25
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

PARA: Subdirección de Gestión Contractual

DE: Subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana

ASUNTO: Solicitud de prórroga N°2 al Convenio 1620-2023 Municipio de Coloso – Sucre.

Cordial saludo,

De conformidad a la necesidad de realizar la Segunda prórroga al convenio 1620-2023, suscrito entre La Nación – Ministerio del Interior – FONSECON y el municipio de Coloso - Sucre, motivada principalmente por el tiempo requerido para la finalización de la construcción de la obra física, la obtención de las certificaciones de conexión definitiva a servicios públicos y la recopilación de la documentación para el recibo del proyecto Infraestructura para la convivencia categoría 1B, remito a su despacho la documentación pertinente para el respectivo trámite.

Para lo anterior, se ha designado a los siguientes funcionarios de la Dirección, Subdirección u Oficina (Según corresponda) quienes participarán en el trámite solicitado:

1. Jenny Paola Lavao (Supervisora del convenio)
2. Daniel Felipe Suarez (Apoyo a la supervisión)
3. Angie Vannessa Venegas (Apoyo del grupo jurídico)

Se anexan los siguientes documentos:

1. Oficio de solicitud por parte del municipio.
2. Cedula de alcalde.
3. Acta de posesión del alcalde.
4. Certificado de acuerdo de facultades del alcalde.
5. Medidas correctivas del alcalde.
6. Certificado de antecedentes de la contraloría.

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

Al contestar cite Radicado 2024-3-003122-029256 Id: 417974
Folios: 2 Fecha: 02-10-2024 17:21:25
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

7. Certificado de antecedentes de policía Nacional.
8. Certificado de antecedentes de procuraduría.
9. Informe de interventoría.
10. Certificados de soporte contratistas de obra e interventoría.
11. Cronograma del convenio
12. Anexo 17

Atentamente;

JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisor del Convenio 1620-2023

Elaboró: Daniel Felipe Suarez – Contratista/Apoyo a la supervisión SIN.
Revisó: Angie Vannessa Vanegas – Contratista/Apoyo jurídico SIN.
Revisó: Jenny Paola Lavao – Supervisora del convenio/Líder grupo supervisión SIN.

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	04
	FORMATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	PÁGINA	1 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

Solicitud (1)	Adición		Aclaración	
	Prórroga	X	Terminación Anticipa	
	Cesión		Modificaciones	
	Suspensión		Liberación de Saldos	

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DE SU EJECUCION

Funcionamiento : (2) X Inversión: (3)	No de Rubro: (4) **A-03-03-01-032** Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-FONSECON.	No de CDP: (5) **CDP** 53723 – 27 junio de 2023 **CDP** 13824 – 16 enero de 2024	
		No. RP: (6) **RP** 75723 – 28 junio de 2023 **RP** 5824 - 16 enero de 2024	
	Proyecto de Inversión: (7) **N/A**		

Número de Contrato y/o Convenio No. (8)
1620 DE 2023 DEL 28 JUNIO DE 2023

Objeto del Contrato: (9)
"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSO-SUCRE"

Valor Inicial del Contrato (10):
$2.383.023.552 M/L

Valor Honorarios (Mensual o Como se Haya Pactado): (11)
Mediante cuatro (4) desembolsos previo cumplimiento de los requisitos pactados en el convenio.

"(…) ***CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS: EL MINISTERIO – FONSECON.*** *desembolsará los recursos al MUNICIPIO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y la presentación de cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) por parte del representante legal de la siguiente forma: 1. UN PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de MIL SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($1.072.360.598), contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza. 2.UN SEGUNDO DESEMBOLSO equivalente a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651), contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.3. UN TERCER DESEMBOLSO equivalente a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS. OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651), contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. 4. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO equivalente a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($436.887.652), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de*

interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado. (…)".		
Valor Iva (Cuando Aplique): (12) **N/A**		
Valor Facturas (Cuando Aplique): (13) **N/A**		
Fecha de Inicio: (14) **19/07/2023**	Plazo inicial de ejecución: (15) **18/06/2024**	Fecha de terminación: (16) **18/10/2024**
Nombre del Contratista y/o Representante Legal: (17) **MUNICIPIO DE COLOSO – SUCRE /** **RL/ DAGER MANRIQUE PATERNINA ALQUERQUE**		
Cedula y/o Nit: (18) NIT**: 892.280.053 - 7 / CC. 92.601.345**		Teléfono: (19) **(5) 294 99 37 - Código Postal 707030**
Dirección: (20) **CALLE 13 NO. 4 – 62 PLAZA PRINCIPAL – COLOSÓ (SUCRE)**		Correo Electrónico: (21) **planeacion@coloso-sucre.gov.co**
Nombre del Supervisor y/o Interventor: (22**)** **ING. JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA - SUPERVISORA DEL CONVENIO**		
Dependencia: (23) **SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA**		Teléfono y Extensión: (24) **PBX: +571 2427400 extensión: 2800**
Nombre del Director, Subdirector o Jefe de Oficina (Según Corresponda): (25) **SERGIO SAN JUAN SANTIAGO**		
Dependencia: (26) **SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA**		Teléfono y Extensión: (27) **PBX: +571 2427400 extensión: 2800**
Porcentaje de avance de ejecución contractual: (28) 54.5 % de ejecución según informe de Interventoría N°27		

MODIFICACIONES AL CONTRATO YA REALIZADAS *(indicar en caso de haberse suscrito)* (28)		
Adición Valor: **N/A**	Cesión: **N/A**	Prórroga plazo: **N/A**
Suspensión **N/A**	Terminación Anticipada: **N/A**	Modificaciones: **N/A**
Liberación de Saldos: **N/A**		

JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD: (29) (*Exponer las razones que justifican la adición, modificación y/o prórroga, explicando cuál es el beneficio para la entidad o para el adecuado desarrollo del contrato o convenio)*

Por medio del Oficio enviado mediante correo electrónico el 30 de septiembre de 2024, el municipio de Coloso – Sucre presentó al Ministerio del Interior la siguiente solicitud:

"(…)Teniendo en cuenta el concepto emito por la interventoría, INTERVINCO S.A.S con CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CM – 004 – 2023: ***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO:ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE"*** *con el municipio, quien plantea que a la fecha el proyecto de la referencia a presentando unas series de inconvenientes que han llevado a afectar el cronograma inicial de las actividades propuestas del proyecto, las cuales son:*

1. *Condiciones Climáticas*

2. *Mal estado de la vía – acceso principal*
3. *Disponibilidad de materiales*

Siendo factores determinantes para los atrasos y/o avances del proyecto, que manifiesta la interventoría a través del oficio de fecha 27 de septiembre de 2024, donde plasma todas las justificaciones técnicas para solicitar una ampliación de los contratos de obra e interventoría, consideraciones que han sido verificada por esta supervisión y por consiguiente solicita de manera respetuosa que el convenio 1620- 2023 de igual manera surta la prórroga N°2 con la finalidad de llevar a cabalidad el 100% de la obra teniendo en cuenta que el avance que se indica a la fecha no es favorable para alcanzar lo propuesto inicialmente.

Condiciones iniciales de los contratos:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP – OP – 007 – 2023 – LICITACIÓN PÚBLICA	
FECHA	*26 DE OCTUBRE DE 2023*
CONTRATANTE	*ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO – SUCRE.*
CONTRATISTA	*CONSORCIO RECREACIONAL JA*
OBJETO	*"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVOPROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSODEL DEPARTAMENTO DE SUCRE"*
VALOR INICIAL DELCONTRATO	*DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE ($2.144.708.697).*
SUPERVISOR	*Shirley Ester Quiñonez Paternina* *Secretaria de Planeación, Infraestructura y medio ambiente.*
PLAZO	*El plazo de ejecución del contrato resultante de la licitaciónpública, será de hasta Ocho (08) meses, contados a partir delcumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución.*
FECHA ACTA DE INICIO	*03 DE NOVIEMBRE DE 2023*

CONTRATO INTERVENTORIA	
OBJETO.	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERAY AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.*
DETALLE DELPROCESO No.	*CM – 004 – 2023*
CONTRATISTA	*INTERVINCO S.A.S.*
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DELCONTRATO	*09 DE OCTUBRE DE 2023*
FECHA ACTA DE INICIO.	*18 DE MARZO DE 2024*

TIEMPO DE EJECUCION	*OCHO 08 MESES*

VALOR TOTAL	*DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOSTREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($238.238.000) IVA INCLUIDO.*
FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO	*DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE 2024*

Teniendo en cuenta las consideraciones iniciales y las situaciones que se describirán a continuación, se hace necesario ampliar los contratos y solicitar la ampliación al ***CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO.1620 DE 2023****,; siendo consecuente solicitar un plazo superior al inicialmente programado, para la terminación de las obras con las normas y especificaciones técnicas establecidas para la construcción del proyecto Infraestructura para la Convivencia 1B.*

La anterior solicitud se realiza teniendo en cuenta que:

1. *Que el día 28 de junio de 2023, El MINISTERIO y el MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1620 de 2023, por un valor inicial de $2.383.023.552 COP, cuyo objeto es:* ***"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSO-SUCRE"****.*

2. *Que, el plazo de ejecución del contrato inicialmente se estableció hasta el 18 de junio de 2024. Según la información que reposa en la plataforma SECOP II y la ejecución del contrato inició el 19 de julio de 2023.*

3. *Que el 28 de agosto de 2023, se publicó los documentos soporte, estudios previos, como también el proyecto de pliego de condiciones, los anexos requeridos y los riesgos de la LICITACIÓN PUBLICA ALCALDÍA COLOSO No. LP-007-OP-2023; que tiene como objeto****; "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE".***

4. *Que el cierre del proceso se realizó El 22 de septiembre de 2023.*

5. *Que el 11 de octubre del 2023, se reunió el comité evaluador para realizar el Informe Final De Evaluación.*

6. *Que el 13 de octubre del 2023, se realizó la Audiencia del proceso de LICITACIÓN PUBLICA No. LP-007-OP-2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO - SUCRE.*

7. *Que el 17 de octubre del 2023 se suscribe la resolución de adjudicación No. 1319 del contrato de Estudios, Diseños y Obra LP-007-OP-2023 con objeto* ***"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE". Con el CONSORCIO RECREACIONAL JA.***

8. *Que el 26 de octubre del 2023 se firmó el contrato de licitación pública LP-007-OP-2023 correspondiente al proyecto infraestructura para la convivencia 1B del municipio de Coloso - Sucre.*

9. *Que el día 03 de noviembre de 2023 se suscribió el acta de inicio.*

10. *Que el tiempo de ejecución proyectado para la ejecución de los Estudios y Diseños del proyecto según cronograma del*


convenio interadministrativo 1620 de 2023 fue de 2 meses aproximadamente.

11. *Debido a las observaciones realizadas por parte de la supervisión del Ministerio del Interior, respecto a los requisitos técnicos mínimos para el recibo de los Estudios y Diseños del proyecto Infraestructura para la convivencia ciudadana categoría 1B, se tuvieron que rediseñar algunos componentes de la consultoría con el objetivo de dar cumplimiento a cabalidad de las especificaciones técnicas del proyecto generando la necesidad de un poco de tiempo adicional para el cumplimiento del proyecto y por endela entrega de los Estudios y Diseños.*

12. *Que el 08 de marzo de 2024, se realizó la entrega formal de los Estudios y Diseños del proyecto Infraestructura para la convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre en las instalaciones del Ministerio del Interior en la ciudad de Bogotá. Lo anterior, representando un retraso de 2 meses de ejecución por situaciones ajenas al contratista.*

13. *Que el 18 de marzo de 2024, se avala el inicio de obra del proyecto infraestructura para la convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre, teniendo en cuenta que, para la fecha la administración municipal dio cumplimiento a las obligaciones especificas requeridas para iniciar actividades de obra.*

14. *Que, durante el tercer trimestre del año 2024 se han presentado condiciones climáticas adversas en el municipio de Coloso - Sucre; afectando la ejecución de la obra de manera directa, lo anterior, debido al incremento de las precipitaciones en el sector y a los alrededores; todo esto ocasionando la disminución del rendimiento en la ejecución de las actividades de manera desfavorable, puesto que, produce trabajo a medio turno por el estado del tiempo. (Lo precitado se puede verificar en los informes semanales de interventoría, el registro fotográfico y el IDEAM).*

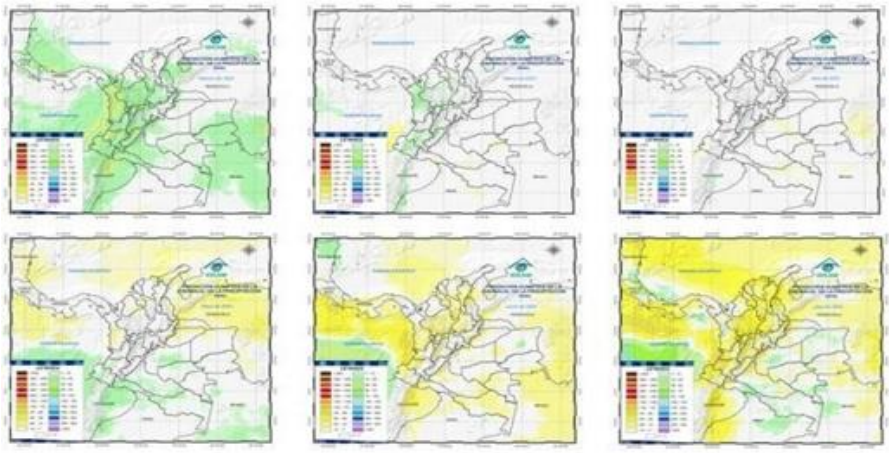

15. *Vale la pena mencionar que, el mal estado de las vías de acceso tanto al municipio comoa la zona de ejecución del proyecto, sobre todo en los días con fuertes precipitaciones,ha ocasionado retrasos en la llegada del suministro de obra, toda vez que, el ingreso pone en riesgo la seguridad vial de los ciudadanos y de los trabajadores.*

16. *Por otra parte, se ha dificultado la adquisición de materiales como relleno en material seleccionado para el mejoramiento de suelo en el área de intervención, visto que, las canteras o fuentes que proveen este material no han despachado, ya que, también se han visto afectados por el mal tiempo en la zona, imposibilitando la entrada de volquetas a los sectores de suministro ocasionando retrasos en la ejecución de la obra.*

17. *Que de acuerdo con lo avalado por la interventoría el porcentaje de avance de ejecución del Contrato de Estudios, Diseños y Obra*

LP-007-OP-2023, se encuentra en un 54.5% aproximadamente de acuerdo con el informe semanal de interventoría N°27. Quedando pendiente actividades como cubiertas, ornamentación, acabados de obra, urbanismo, instalaciones eléctricas, la dotación que haya lugar y las certificaciones exigidas por parte del municipio y el Ministerio del Interior.

18. *El estado actual del proyecto ha sido el resultado de los inconvenientes precitados durante el segundo trimestre del año 2024, generando retrasos significativos en las actividades de obra pendientes por ejecutar.*

19. *El contratista de Estudios, Diseños y Obra aporta a la administración municipal de Coloso – Sucre un plan de contingencia para la finalización de la obra de la referencia al 100% de ejecución, en el mismo informa la finalización de la obra física entre la última semana del mes de noviembre y primera del mes de diciembre de 2024.*

20. *De acuerdo con las actividades que se vienen ejecutando con relación al contrato de obra No. LP-007-OP-2023 y a los diferentes requisitos requeridos para la culminación de la misma como: I) la finalización de las actividades pendientes de obra, II) la llegada del suministro y dotación del proyecto, III) la consecución de las conexiones definitivas de acueducto, alcantarillado energía y IV) el tiempo requerido para el recibo y entrega de la obra al interventor y supervisor del municipio de Coloso – Sucre, se evidencia que se generó una variación en el cronograma para la finalización de la obra correspondiente al proyecto infraestructura para la convivencia 1B y el cumplimiento a cabalidad de los objeto contractual de acuerdo a las situaciones presentadas duranta la ejecución de los Estudios, Diseños y Obra del proyecto.*

Concepto de la Interventoría:

El contratista de Interventoría de Estudios, Diseños y Obra informa que, teniendo en cuenta las justificaciones técnicas, jurídicas y financieras suministradas y soportadas por parte del contratista, las cuales, soportan la solicitud de adición en tiempo que permita el cumplimiento del objeto contractual, la interventoría del Proyecto Infraestructura para la Convivencia de Coloso – Sucre considera necesaria y avala la solicitud de prórroga para lograr la ejecución del cien por ciento de las obligaciones suscritas y el cumplimiento de la funcionalidad del proyecto derivado del convenio interadministrativo 1620 de 2023 suscrito con el ministerio de interior, lo que permita la correcta inversión de los recursos públicos destinados para la construcción del proyecto de infraestructura para la convivencia categoría 1B del municipio de coloso – sucre.

Teniendo en cuenta que, a la fecha se presentó una solicitud de prorroga o ampliación de plazo hasta el 10 de diciembre de 2024, al contrato de obra 007 de 2023, a cargo del contratista CONSORCIO RECREACIONAL JA.

La presente supervisión evaluando las situaciones presentadas una vez suscrita el acta de inicio para desarrollar los estudios y diseños correspondientes al proyecto, los cuales tenía una proyección de 2 meses, y que pese al esfuerzos del contratista, se presentó hasta el 08 de marzo de 2024 el resultado de la consultoría, lo que permitió dar inicio a la etapa dos del proyecto referente a la ejecución de obra donde se han realizados avances significativos soportados en el informe N.º. 27 de interventoría, el cual, reporta un avance del 54.5 % de avance, esto debido a la disponibilidad de materiales, el estado de las vías y las condiciones climáticas que han afectado el desarrollo de lo proyectado en el cronograma de obras, la presente considera técnicamente viable la solicitud realizada por los contratistas.

Así las cosas, como supervisora por parte del ente territorial, que se hace necesario elevar la solicitud de ampliación en tiempo al convenio interadministrativo 1620 de 2023 para conservar el equilibrio contractual y se pueda dar cumplimiento a satisfacción del Proyecto infraestructura para la Convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre. Motivo por el cual, se solicita respetuosamente al Ministerio del Interior la ampliación de este por un término de 2 meses, es decir, hasta el 18 de diciembre de 2024. Tiempo necesario para realizar la entrega de la obra a la supervisión del Ministerio del Interior.

Dicho lo anterior, se deja a consideración al Ministerio del Interior, el presente concepto para su evaluación, quedando así, a espera de las instrucciones, respecto de la presente solicitud.}

Viabilidad jurídica:

La presente PRÓRROGA N2 del Convenio interadministrativo No.1620 de 2021, no transgrede lo expresado por la jurisprudencia, en el sentido que:

-No implica la modificación de las obligaciones convenidas entre las entidades estatales.
-El término de la prórroga no cambia los elementos esenciales del convenio.
-La misma se hará dentro del término de ejecución, respetando las condiciones de solemnidad.

En este sentido, se considera jurídicamente viable la prórroga No.2 del convenio por el término de DOS (2) meses, pues esto permite la consecución de los fines esenciales del Estado, que de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Política son: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Así mismo, se cumple con el objetivo del proyecto por el cual el Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON, firmó el convenio motivo de la presente solicitud, el cual es Generar un espacio público deportivo y de encuentro familiar para los habitantes del Municipio de Ibagué-Tolima, por medio de la construcción de diferentes escenarios deportivos unidos en el proyecto **INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B**, incrementando así los lugares para la actividad lúdica en la localidad.

En consecuencia, ante lo expuesto por el municipio en la previa solicitud donde se manifiesta que el municipio requiere de un tiempo adicional para culminar las actividades restantes de ejecución de obra civil, expedir la certificación RETIE y RETILAP, así como la conexión eléctrica definitiva del proyecto, esta subdirección solicita acomedidamente se tenga en consideración la prórroga N2 al convenio con el fin de darle feliz término al proyecto en base a lo anteriormente manifestado.

INFORMACION DE LA SOLICITUD		
Adición: (30) **N/A**	CDP: (31) **N/A**	Valor del contrato: (32) **N/A**
Cesión: (33) **N/A**	Fecha de Inicio: (34) **N/A**	Valor a Ceder: (35) **N/A**
Prórroga: (36) **2 MESES / HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024**	Fecha de Terminación Final: (37) **18/12/2024**	
Suspensión: (38) **N/A**	Fecha de la suspensión: (39) **N/A**	Fecha de la reactivación: (40) **N/A**
Terminación Anticipada: (41) **N/A**	Saldo por Liberar: (42) **N/A**	
Modificaciones: (43) **CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del Convenio será hasta el 18 de octubre de 2024.	Modificaciones Realizadas: (44) **CLÁUSULA CUARTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del Convenio será hasta el 18 de diciembre de 2024.	
Liberación de Saldos: (45) **N/A**	Valor Total: (46) **N/A**	

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO:			
Valor Total del Contrato (47) **$2.383.023.552 M/L**	Valor Pagado por el Ministerio (48) **$1.072.360.598 M/L**	Saldo Por Pagar al Contratista por el Ministerio (49) **$ 1.310.662.954 M/L**	Valor Por Ejecutar (50) **$ 1.310.662.954 M/L**

CUMPLIMIENTO – PAGOS SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Valor Pagado Salud (51) **N/A**	Valor Pagado Aporte Pensión (52) **N/A**	Valor Pagado Aporte ARL (53) **N/A**	Concepto de Cumplimiento (54) **N/A**
Base de liquidación (55) **N/A**		Total pagado (56) **N/A**	
Numero de planilla y fecha: (57) **N/A**			

CONCEPTO, OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (58)

Teniendo en cuenta que el convenio interadministrativo de cofinanciación 1620 de 2023 se encuentra vigente a la fecha y con un avance de obra del 54,5% según informe de interventoría N°27, en mi calidad de supervisora del Convenio Interadministrativo 1620 de 2023, y de acuerdo con los informes y validaciones de la supervisión del municipio e interventoría de obra, considero técnicamente viable la prórroga del convenio. Los motivos expuestos por la supervisión del municipio de Coloso – Sucre, mediante solicitud de prórroga remitida el 30 de septiembre del 2024, son considerados procedentes y proporcionales al tiempo solicitado. Las razones presentadas que han afectado las líneas base del convenio interadministrativo 1620 de 2023 incluyen:

1. Condiciones Climáticas: Factores meteorológicos adversos que han dificultado el progreso de la obra.
2. Mal Estado de la Vía – Acceso Principal: La deteriorada condición de la vía principal ha obstaculizado el transporte y la logística.
3. Disponibilidad de Materiales: Problemas en la cadena de suministro han retrasado la llegada de materiales necesarios para la construcción.
4. Disponibilidad de mano de obra especializada en el municipio.

Para finalizar la obra, según el cronograma aportado por la administración municipal, se requiere completar los siguientes procesos:

I) Ejecución de obra. (1.5 meses aprox.)
II) Recibo y aprobación de la obra por parte de la interventoría y municipio. (0.5 meses aprox.)
III) Entrega y recibo de obra Ministerio de Interior. (0.5 meses aprox.)

En vista de lo anterior, se solicita ampliar el término del convenio hasta el 18 de diciembre de 2024. Este plazo adicional permitirá completar la obra al 100%, obtener certificación RETIE, RETILAP es fundamental para asegurar que las instalaciones eléctricas y de iluminación del parque cumplan con los requisitos de seguridad y eficiencia establecidos por la normativa nacional. Estas certificaciones son un paso crítico para validar que los sistemas eléctricos e iluminación han sido instalados correctamente y que no representan riesgos para los usuarios, garantizando así un entorno seguro y confiable para la comunidad.

Por otra parte, la conexión a servicios públicos definitivos (acueducto, alcantarillado, eléctrico), en especial la conexión eléctrica definitiva asegura el suministro de energía continua y segura a todas las instalaciones del parque, incluyendo las luminarias, sistemas de seguridad y otros equipos esenciales. Sin esta conexión, el parque no podría operar adecuadamente, lo que limitaría su funcionalidad y el aprovechamiento pleno de las instalaciones por parte de la comunidad. La conexión eléctrica definitiva es, por tanto, una de las últimas etapas necesarias para la puesta en marcha del proyecto y su correcto funcionamiento, para que el contratista pueda realizar la entrega a interventoría, el municipio recibirle a satisfacción a los contratos derivados y programar visita de recibo y entrega a entera satisfacción al Ministerio del Interior para su puesta en funcionamiento.

Razón por la cual, se solicita ampliar el término del mismo para la finalización de la obra, cumpliendo así a

cabalidad el objeto contractual del convenio interadministrativo 1620 de 2023. Visto que, prima para las partes la terminación del convenio preponderando el garantizar la pronta entrega de la obra y el disfrute de la comunidad. En ese orden de ideas, el plazo estimado y solicitado por parte del municipio como ente ejecutor para la finalización de la obra es del 18 de diciembre de 2024. Es un plazo adecuado y necesario para garantizar la funcionalidad y entrega del proyecto con todos sus servicios públicos definitivos para el feliz término del Convenio Interadministrativo 1620 de 2023.

De acuerdo a la Segunda prórroga del convenio interadministrativo 1620 - 2023, se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones contractuales en la presente modificación:

- **GARANTÍA ÚNICA:** El Municipio, deberá presentar dentro de los términos legales la modificación de la garantía única de cumplimiento de conformidad a los nuevos tiempos del convenio definidos en el marco de la presente solicitud.

- **VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del convenio, y sus cláusulas anteriores no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece.

- **PERFECCIONAMIENTO:** La presente modificación al convenio se entenderá perfeccionada con la firma de las partes, y además el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: 1. Presentar al ministerio la ampliación de la garantía, la cual deberá ser debidamente aprobada y cargada en la plataforma del SECOP.

Sin Erogación Adicional: Esta modificación no genera costos adicionales para el Ministerio del Interior – FONSECON.

Conforme a la información suministrada en mi calidad de Supervisor X Interventor___ solicito la aprobación de la modificación al Convenio, teniendo en cuenta que se cumplen y suministran los requisitos y soportes necesarios para ello, además atiende uno de los principios pilares de la contratación estatal como lo es la "Eficacia "entendida desde el punto de vista del cumplimiento de propósitos públicos.

FIRMA RESPONSABLES (59)

ING. JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
SUPERVISORA DEL CONVENIO

Elaboró: Daniel F. Suárez E. – Apoyo al Supervisor SIN

Revisó: Angie Vannessa Vanegas / Apoyo grupo jurídico SIN
Aprobó: Jenny Paola Lavao Pastrana – Supervisor Convenio SIN

Ciudad y Fecha: (59)
Bogotá, 25 de septiembre de 2024

Coloso, Sucre, 30 de septiembre de 2024

Señores:
MIN -FONSECON

REF. *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y A D MI NI S T RA T I V O S ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE".*

ASUNTO: Solicitud de prórroga N°2 Convenio No 1620 - 2023 Coloso – Sucre.

Teniendo en cuenta el concepto emito por la interventoría, INTERVINCO S.A.S con CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CM – 004 – 2023: ***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE"*** con el municipio, quien plantea que a la fecha el proyecto de la referencia a presentando unas series de inconvenientes que han llevado a afectar el cronograma inicial de las actividades propuestas del proyecto, las cuales son:

- Condiciones Climáticas
- Mal estado de la vía – acceso principal
- Disponibilidad de materiales

Siendo factores determinantes para los atrasos y/o avances del proyecto, que manifiesta la interventoría a través del oficio de fecha 27 de septiembre de 2024, donde plasma todas las justificaciones técnicas para solicitar una ampliación de los contratos de obra e interventoría, consideraciones que han sido verificada por esta supervisión y por consiguiente solicita de manera respetuosa que el convenio 1620- 2023 de igual manera surta la prórroga N°2 con la finalidad de llevar a cabalidad el 100% de la obra teniendo en cuenta que el avance que se indica a la fecha no es favorable para alcanzar lo propuesto inicialmente.

Condiciones iniciales de los contratos:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP – OP – 007 – 2023 – LICITACIÓN PÚBLICA	
FECHA	26 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO – SUCRE.
CONTRATISTA	CONSORCIO RECREACIONAL JA
OBJETO	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE ($2.144.708.697).
SUPERVISOR	Shirley Ester Quiñonez Paternina Secretaria de Planeación, Infraestructura y medio ambiente.
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato resultante de la licitación pública, será de hasta Ocho (08) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución.
FECHA ACTA DE INICIO	03 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATO INTERVENTORIA	
OBJETO.	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERAY AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
DETALLE DEL PROCESO No.	CM – 004 – 2023
CONTRATISTA	INTERVINCO S.A.S.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO.	18 DE MARZO DE 2024

TIEMPO DE EJECUCION	OCHO 08 MESES
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($238.238.000) IVA INCLUIDO.
FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO	DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE 2024

Teniendo en cuenta las consideraciones iniciales y las situaciones que se describirán a continuación, se hace necesario ampliar los contratos y solicitar la ampliación al **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO.1620 DE 2023**,; siendoconsecuente solicitar un plazo superior al inicialmente programado, para la terminación de las obras con las normas y especificaciones técnicas establecidas para la construcción del proyecto Infraestructura para la Convivencia 1B.

La anterior solicitud se realiza teniendo en cuenta que:

1. Que el día 28 de junio de 2023, El MINISTERIO y el MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1620 de 2023, por un valor inicial de $2.383.023.552 COP, cuyo objeto es: ***"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSO-SUCRE"***.

2. Que, el plazo de ejecución del contrato inicialmente se estableció hasta el 18 de junio de 2024. Según la información que reposa en la plataforma SECOP II y la ejecución del contrato inició el 19 de julio de 2023.

3. Que el 28 de agosto de 2023, se publicó los documentos soporte, estudios previos, como también el proyecto de pliego de condiciones, los anexos requeridos y los riesgos de la LICITACIÓN PUBLICA ALCALDÍA COLOSO No. LP-007-OP-2023; que tiene como objeto**; *"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE".***

4. Que el cierre del proceso se realizó El 22 de septiembre de 2023.

5. Que el 11 de octubre del 2023, se reunió el comité evaluador para realizar el Informe Final De Evaluación.

6. Que el 13 de octubre del 2023, se realizó la Audiencia del proceso de LICITACIÓN PUBLICA No. LP-007-OP-2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO - SUCRE.

7. Que el 17 de octubre del 2023 se suscribe la resolución de adjudicación No. 1319 del contrato de Estudios, Diseños y Obra LP-007-OP-2023 con objeto **"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE". Con el CONSORCIO RECREACIONAL JA.**

8. Que el 26 de octubre del 2023 se firmó el contrato de licitación pública LP-007-OP-2023 correspondiente al proyecto infraestructura para la convivencia 1B del municipio de Coloso - Sucre.

9. Que el día 03 de noviembre de 2023 se suscribió el acta de inicio.


10. Que el tiempo de ejecución proyectado para la ejecución de los Estudios y Diseños del proyecto según cronograma del convenio interadministrativo 1620 de 2023 fue de 2 meses aproximadamente.

11. Debido a las observaciones realizadas por parte de la supervisión del Ministerio del Interior, respecto a los requisitos técnicos mínimos para el recibo de los Estudios y Diseños del proyecto Infraestructura para la convivencia ciudadana categoría 1B, se tuvieron que rediseñar algunos componentes de la consultoría con el objetivo de dar cumplimiento a cabalidad de las especificaciones técnicas del proyecto generando la necesidad de un poco de tiempo adicional para el cumplimiento del proyecto y por ende la entrega de los Estudios y Diseños.

12. Que el 08 de marzo de 2024, se realizó la entrega formal de los Estudios y Diseños del proyecto Infraestructura para la convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre en las instalaciones del Ministerio del Interior en la ciudad de Bogotá. Lo anterior, representando un retraso de 2 meses de ejecución por situaciones ajenas al contratista.

13. Que el 18 de marzo de 2024, se avala el inicio de obra del proyecto infraestructura para la convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre, teniendo en cuenta que, para la fecha la administración municipal dio cumplimiento a las obligaciones especificas requeridas para iniciar actividades de obra.

14. Que, durante el tercer trimestre del año 2024 se han presentado condiciones climáticas adversas en el municipio de Coloso - Sucre; afectando la ejecución de la obra de manera directa, lo anterior, debido al incremento de las precipitaciones en el sector y a los alrededores; todo esto ocasionando la disminución del rendimiento en la ejecución de las actividades de manera desfavorable, puesto que, produce trabajo a medio turno por el estado del tiempo. (Lo precitado se puede verificar en los informes semanales de interventoría, el registro fotográfico y el IDEAM).

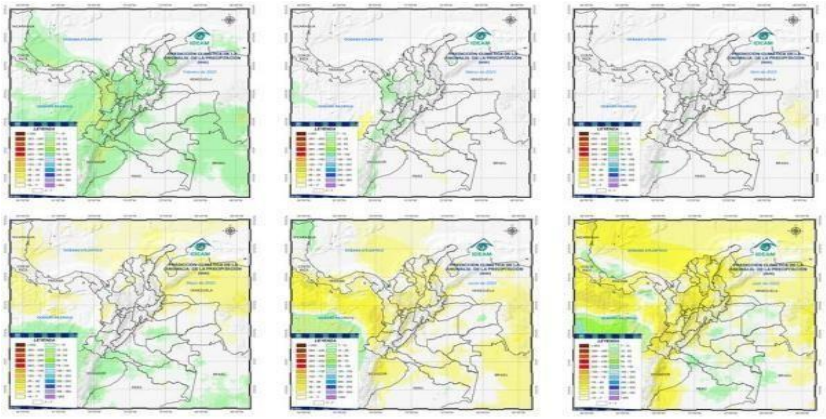

15. Vale la pena mencionar que, el mal estado de las vías de acceso tanto al municipio como a la zona de ejecución del proyecto, sobre todo en los días con fuertes precipitaciones, ha ocasionado retrasos en la llegada del suministro de obra, toda vez que, el ingreso pone en riesgo la seguridad vial de los ciudadanos y de los trabajadores.

16. Por otra parte, se ha dificultado la adquisición de materiales como relleno en material seleccionado para el mejoramiento de suelo en el área de intervención, visto que, las canteras o fuentes que proveen este material no han despachado, ya que, también se han visto afectados por el mal tiempo en la zona, imposibilitando la entrada de volquetas a los sectores de suministro ocasionando retrasos en la ejecución de la obra.

17. Que de acuerdo con lo avalado por la interventoría el porcentaje de avance de ejecución del Contrato de Estudios, Diseños y Obra LP-007-OP-2023, se encuentra en un 54.5% aproximadamente de acuerdo con el informe semanal de interventoría N°27. Quedando pendiente actividades como cubiertas, ornamentación, acabados de obra, urbanismo, instalaciones eléctricas, la dotación que haya lugar y las certificaciones exigidas por parte del municipio y el Ministerio del Interior.

18. El estado actual del proyecto ha sido el resultado de los inconvenientes precitados durante el segundo trimestre del año 2024, generando retrasos significativos en las actividades de obra pendientes por ejecutar.

19. El contratista de Estudios, Diseños y Obra aporta a la administración municipal de Coloso – Sucre un plan de contingencia para la finalización de la obra de la referencia al 100% de ejecución, en el mismo informa la finalización de la obra física entre la última semana del mes de noviembre y primera del mes de diciembre de 2024.

20. De acuerdo con las actividades que se vienen ejecutando con relación al contrato de obra No. LP-007-OP-2023 y a los diferentes requisitos requeridos para la culminación de la misma como: I) la finalización de las actividades pendientes de obra, II) la llegada del suministro y dotación del proyecto, III) la consecución de las conexiones definitivas de acueducto, alcantarillado energía y IV) el tiempo requerido para el recibo y entrega de la obra al interventor y supervisor del municipio de Coloso – Sucre, se evidencia que se generó una variación en el cronograma para la finalización de la obra correspondiente al proyecto infraestructura para la convivencia 1B y el cumplimiento a cabalidad de los objeto contractual de acuerdo a las situaciones presentadas duranta la ejecución de los Estudios, Diseños y Obra del proyecto.

Concepto de la Interventoría:

El contratista de Interventoría de Estudios, Diseños y Obra informa que, teniendo en cuenta las justificaciones técnicas, jurídicas y financieras suministradas y soportadas por parte del contratista, las cuales, soportan la solicitud de adición en tiempo que permita el cumplimiento del objeto contractual, la interventoría del Proyecto Infraestructura para la Convivencia de Coloso – Sucre considera necesaria y avala la solicitud de prórroga para lograr la ejecución del cien por ciento de las obligaciones suscritas y el cumplimiento de la funcionalidad del proyecto derivado del convenio interadministrativo 1620 de 2023 suscrito con el ministerio de interior, lo que permita la correcta inversión de los recursos

públicos destinados para la construcción del proyecto de infraestructura para la convivencia categoría 1B del municipio de coloso – sucre.

Teniendo en cuenta que, a la fecha se presentó una solicitud de prorroga o ampliación de plazo hasta el 10 de diciembre de 2024, al contrato de obra 007 de 2023, a cargo del contratista CONSORCIO RECREACIONAL JA.


La presente supervisión evaluando las situaciones presentadas una vez suscrita el acta de inicio para desarrollar los estudios y diseños correspondientes al proyecto, los cuales tenía una proyección de 2 meses, y que pese al esfuerzos del contratista, se presentó hastael 08 de marzo de 2024 el resultado de la consultoría, lo que permitió dar inicio a la etapa dos del proyecto referente a la ejecución de obra donde se han realizados avances significativos soportados en el informe N.º. 27 de interventoría, el cual, reporta un avance del 54.5 % de avance, esto debido a la disponibilidad de materiales, el estado de las vías y las condiciones climáticas que han afectado el desarrollo de lo proyectado en el cronograma de obras, la presente considera técnicamente viable la solicitud realizada por los contratistas.

Así las cosas, como supervisora por parte del ente territorial, que se hace necesario elevar la solicitud de ampliación en tiempo al convenio interadministrativo 1620 de 2023 para conservar el equilibrio contractual y se pueda dar cumplimiento a satisfacción del Proyecto infraestructura para la Convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre. Motivo por el cual, se solicita respetuosamente al Ministerio del Interior la ampliación de este por un término de 2 meses, es decir, hasta el 18 de diciembre de 2024. Tiempo necesario pararealizar la entrega de la obra a la supervisión del Ministerio del Interior.

Dicho lo anterior, se deja a consideración al Ministerio del Interior, el presente concepto para su evaluación, quedando así, a espera de las instrucciones, respecto de la presente solicitud.

Sin otro particular, agradecemos su atención y quedamos atentos a su pronunciamiento.

SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA
Secretaria de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente
Municipio de Colosó, Departamento de Sucre

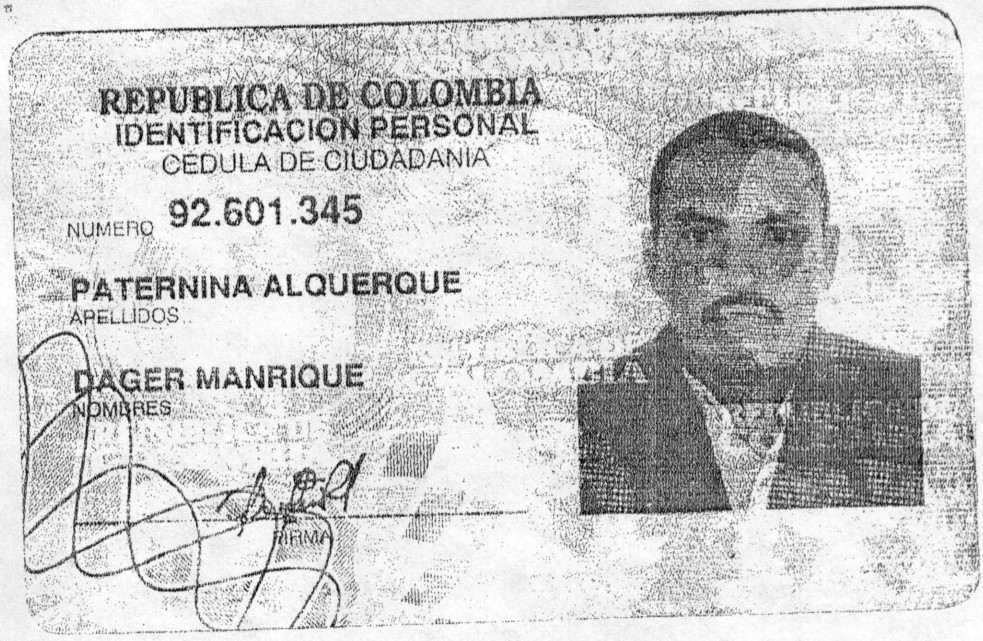

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 92.601.345

PATERNINA ALQUERQUE
APELLIDOS

DAGER MANRIQUE
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 21-SEP-1975

COLOSO
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

23-NOV-1993 COLOSO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-2803000-62146941-M-0092601345-20060411 02468 06100B 02 174811350

REPUBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE COLOSÓ (SUCRE)

ACTA DE POSESIÓN No. 002 DEL SEÑOR DAGER MANRIQUE PATERNINA ALQUERQUE COMO ALCALDE DEL MUNICIPIO DE COLOSÓ – SUCRE

En el Municipio de Colosó, Departamento de Sucre, República de Colombia, siendo las dos y treinta de la tarde (02:30 pm) del día veintinueve (29) de Diciembre del año Dos Mil Veintitrés (2023), a solicitud de parte interesada, el suscrito Notario Único del Círculo de Colosó –Sucre, Doctor **JOHN JAIRO CAPELLA ARROYO** se traslada hasta el Corregimiento BAJO DON JUAN jurisdicción de Colosó-Sucre, una vez allí declara en audiencia pública y procede a dar inicio a la diligencia de posesión del Doctor **DAGER MANRIQUE PATERNINA ALQUERQUE**, como Alcalde del Municipio de Colosó (Sucre), para el periodo constitucional 2024-2027, cargo para el cual ha sido elegido por votación popular de conformidad con lo señalado en el Artículo 94 de la Ley 136 de 1994, Artículo 122 de la Constitución Política de Colombia y demás disposiciones vigentes. Acto seguido el señor Notario procedió a identificarlo con la cedula de ciudadanía número 92.601.345. expedida Colosó – Sucre, domiciliado y residente en el municipio de Sincelejo (Sucre), además, el señor Notario le solicita al señor Alcalde Electo la documentación requerida para darle debida posesión, la cual es presentada por el interesado para que sea tenida como prueba y se incorpore al protocolo de esta acta de posesión.

Posesionado presentó los documentos de Ley así:----------

1) Copia autenticada de la credencial (E-27) de fecha 30 de Octubre de 2023 expedida por la comisión Escrutadora Municipal de Colosó (Sucre) que lo acredita como Alcalde Electo de este municipio por el "Partido Político "La Fuerza de la Paz" para el periodo Constitucional y Legal que va del 1° de Enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2027.

2) Fotocopia autenticada de su cedula de ciudadanía.

3.) Copia del certificado de antecedentes disciplinarios No. 236874708 de fecha 13 de Diciembre de 2023 que indica que NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES APLICABLES AL CARGO DE ALCALDE.

4) Copia del certificado de antecedentes fiscales No. 92601345231213111548 de fecha 13 de Diciembre de 2023 que señala QUE NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

5) Copia del certificado de antecedentes penales y Requerimientos Judiciales de fecha 13 de Diciembre de 2023 que señala que NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES.

6) Declaración jurada rendida ante el Notario Único de Colosó – Sucre, de fecha 18 de diciembre de 2023 en donde manifiesta el interesado que no tiene inhabilidades e incompatibilidades para ejercer el cargo de Alcalde del municipio de Colosó.

7) Formulario SIGEP-Declaración jurada de bienes y rentas y actividad económica y privada del señor DAGER MANRIQUE PATERNINA ALQUERQUE.

8) Copia de la certificación expedida por la ESAP, de fecha 15 de Diciembre de 2023 donde consta que el Alcalde a posesionarse asistió a la inducción para Alcaldes y Gobernadores Electos Periodo 2024 – 2027.

República de Colombia
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
PC072258711
1GKY35OSDX 03-11-22 PC072258711
THOMAS GREG & SONS
Powered by CamScanner

9) Copia de la libreta militar de Segunda Clase del señor DAGER MANRIQUE PATERNINA ALQUERQUE, correspondiente al No. 92601345.
10.) Formato único hoja de vida Función Pública para personas naturales con anexos (RUT, diploma de bachiller, Diploma de Administrador Público, Tarjeta Profesional y certificación del Jefe de Talento Humano y Desarrollo Organizacional del municipio de Colosó – Sucre).
11.) Declaración jurada ante Notario de fecha 18 de Diciembre de 2023, en donde el Alcalde Electo señor DAGER MANRIQUE PATERNINA ALQUERQUE, manifiesta no tener vigente ningún proceso judicial ni policivo por alimentos. Declara igualmente sobre sus bienes, los de su cónyuge e hijos no emancipados.
12.) Certificado de fecha 13 de Diciembre de 2023 de ausencia de medidas correctivas (RNMC) de la Policía Nacional .
13.) Constancia de afiliación al sistema de Seguridad Social, empresa SALUD TOTAL.
14) Certificado del MINTIC de fecha 15 de Diciembre de 2023 en donde consta que NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM) .
15) Certificado Médico de aptitud física y mental de fecha 20 de Diciembre de 2023

Cumplidos como están los requisitos el señor Notario procede entonces a tomarle el juramento de rigor, según el ritual del artículo 94 de la Ley 136 del 2 de Junio de 1994. Acto seguido el señor Notario pide al posesionado Doctor **DAGER MANRIQUE PATERNINA ALQUERQUE**, que proceda a ponerse de pie a fin de juramentarlo así : ***"¿JURA USTED ANTE DIOS Y ANTE SU PUEBLO DE COLOSÓ CUMPLIR Y HACER CUMPLIR FIELMENTE LA CONSTITUCION, LAS LEYES DE COLOMBIA,LOS DECRETOS, LAS ORDENANZAS Y LOS ACUERDOS MUNICIPALES ?"*** . MANIFESTÓ EN VOZ CLARA Y PERCEPTIBLE, ***"SI JURO" , SI ASI FUERE, QUE DIOS Y SU PUEBLO OS LO PREMIEN Y SI NO, DIOS Y SU PUEBLO OS DEMANDEN"***. En consecuencia de todo lo anterior, yo JOHN JAIRO CAPELLA ARROYO, Notario Único del Circulo de Colosó – Sucre en representación y bajo la autorización del Estado Colombiano, declaro legal y formalmente posesionado al Doctor **DAGER MANRIQUE PATERNINA ALQUERQUE**, identificado con la cedula de ciudadanía número 92.601.345 expedida Colosó – Sucre, como Alcalde Electo del Municipio de Colosó - Sucre , para el periodo Constitucional y Legal comprendido entre el 1° de Enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2027.----------

El compareciente hace constar que:
1) Verificó cuidadosamente sus nombres y apellidos, estado civil, los números de los documentos de identidad y demás actos, aprobando este documento sin reserva alguna.
2) Las declaraciones consignadas en este documento corresponden a la verdad y en consecuencia el Compareciente asume la responsabilidad de lo manifestado, en caso de utilizarse este documento.
3) El compareciente manifiesta que conoce la Ley y sabe que la Notaría Única de Colosó-Sucre, responde únicamente de la regularidad formal de los documentos que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones de los otorgantes, ni de la autenticidad de los documentos que forman parte de este acta; y 4) El Notario no asume ninguna responsabilidad por errores o inexactitudes.

En igual sentido se informa al compareciente que esta posesión surte y tendrá efectos legales y fiscales, rige y tiene vigencia **a partir de las 0:00 horas del Primero (1°) del mes de Enero del año Dos Mil Veinticuatro (2024) y el posesionado ejercerá su cargo de Alcalde Municipal a partir de esta fecha .**

Powered by CamScanner

No siendo otro el objetivo de la presente diligencia, se termina el acta respectiva y para mayor constancia se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron en Colosó – Sucre el veintinueve (29) del mes de Diciembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).-

DAGER MANRIQUE PATERNINA ALQUERQUE
EL POSESIONADO

JOHN JAIRO CAPELLA ARROYO
NOTARIO ÚNICO DE COLOSÓ- SUCRE

NOTARIA UNICA DEL
CIRCULO RICAURTE - COLOSÓ
COPIA PARCIAL DE PROTOCOLO
La presente copia autentica y parcial es igual al original de la Acta pública No 602 del 29 de 12 de 2023
Que he tenido a la vista, la cual expido y autorizo en Dos
(02) folios útiles, con destino a: Alcalde
Posesionado - Pc0722587117
Pc0722587112
En constancia se firma en Colosó, el día 29/12/23
JOHN JAIRO CAPELLA ARROYO
Notario

29 DIC. 2023

NOTARIA UNICA DEL
CIRCULO RICAURTE - COLOSÓ
AUTENTICACION COPIA DE ORIGINAL
el suscrito notario única del circuito, CERTIFICA, que la presente fotocopia coincide con el original que he tenido a la vista.
En constancia se firma en Colosó Sucre, el día 29 DIC. 2023
Notario

República de Colombia
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
PC0722587112
7S3JKXTWFY 03-11-22 PC0722587112
THOMAS GREG & SONS
Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE COLOSO-SUCRE

CERTIFICA

QUE, el Acuerdo N° 001 del día 23 de Marzo de 2021 **"POR MEDIO DEL CUAL SE AGREGA UN ARTICULO AL ACUERDO N° 0010 DE 2017, QUE REGLAMENTA LAS AUTORIZACIONES DEL ALCALDE DE COLOSO-SUCRE PARA CONTRATAR Y SE SEÑALA LOS CASOS EN QUE REQUIERE AUTORIZACION PREVIA",** fue sancionado en fecha 06 de Abril de 2021 y hasta la fecha se encuentra vigente.

Para constancia se firma el presente en el recinto del Honorable concejo del municipio de coloso, departamento de sucre, a solicitud de parte interesada, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre del año 2024.

Yuli Paola Buelvas L.

YULI PAOLA BUELVAS LEON
Secretaria General del Concejo

Escaneado con CamScanner

ACUERDO No. 001 DE 2021

(23 de Marzo de 2021)

"POR MEDIO DEL CUAL SE AGREGA UN ARTICULO AL ACUERDO No. 0010 de 2017 QUE REGLAMENTA LAS AUTORIZACIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL DE COLOSO-SUCRE PARA CONTRATAR Y SE SEÑALA LOS CASOS EN QUE REQUIERE AUTORIZACION PREVIA"

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE COLOSO

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por los numerales 3 del artículo 313 de la Constitución Política, y 3 del artículo 32 la Ley 136 de 1994, y

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad a lo establecido en el numeral 3° del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, corresponde a los Concejos Municipales, "**ARTÍCULO 313.** Corresponde a los concejos: (…) 3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo.".

2. Que de igual manera, es facultad de los Concejos Municipales, según el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 136 de 1994. "**ARTÍCULO 32.** Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la Ley, son atribuciones de los concejos las siguientes: (…) 3. Reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que requiere autorización previa del Concejo.".

3. Que el Concejo de Coloso, mediante Acuerdo Municipal N° 010 de 2017, modificó el acuerdo que reglamenta las autorizaciones del Alcalde Municipal para Contratar y Suscribir convenios.

4. Que la reglamentación, requiere de una modificación mediante la incorporación de un artículo que deje claro la facultad general con la que cuenta el alcalde para suscribir convenios que comprenda la ejecución de recursos público.

5. Que el Concejo Municipal Aprobó Acuerdo No. 001 del 28 de Febrero de 2021, en el siguiente sentido:

> *"**ARTICULO PRIMERO**: Facúltese al alcalde municipal de coloso por seis (6) meses a partir de la fecha de aprobación del acuerdo 001 de 2021, para celebrar toda clase de contratos y convenios con entidades del orden nacional y departamental, así como organismo de cooperación internacional cuyo objeto sea la entrega de recursos para mejorar la infraestructura local o la construcción de obras públicas y donde el municipio aporta un inmueble de su propiedad sin renunciar a su titularidad, así como de cualquier otro tipo de bienes o servicios."*

6. Que el Alcalde Municipal de Coloso dentro del término respectivo presento objeciones al proyecto de acuerdo, presentando una propuesta de aprobación del acuerdo en el siguiente sentido:

Escaneado con CamScanner

*"**ARTÍCULO PRIMERO:** Incorpórese el ARTICULOS 4-1 al acuerdo No. 0010 de 2017:*

***ARTICULO 4-1:** El Alcalde Municipal de Coloso cuenta con Autorización para celebrar toda clase de contratos y convenios con entidades del orden nacional y departamental, así como organismo de cooperación internacional cuyo objeto sea la entrega de recursos para mejorar la infraestructura local o la construcción de obras públicas y donde el municipio aporta un inmueble de su propiedad sin renunciar a su titularidad, así como de cualquier otro tipo de bienes o servicios, sin necesidad de acuerdo de autorización previo, con base en sus facultades constitucionales y legales en materia contractual."*

7. Que en plenaria del 23 de Marzo de 2021, la plenaria del Concejo Municipal de Coloso, acogió las objeciones presentadas por la el Alcalde Municipal.

En virtud de lo anterior,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Incorpórese el ARTICULOS 4-1 al acuerdo No. 0010 de 2017:

ARTICULO 4-1: El Alcalde Municipal de Coloso cuenta con Autorización para celebrar toda clase de contratos y convenios con entidades del orden nacional y departamental, así como organismo de cooperación internacional cuyo objeto sea la entrega de recursos para mejorar la infraestructura local o la construcción de obras públicas y donde el municipio aporta un inmueble de su propiedad sin renunciar a su titularidad, así como de cualquier otro tipo de bienes o servicios, sin necesidad de acuerdo de autorización previo, con base en sus facultades constitucionales y legales en materia contractual.

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo Municipal rige a partir del día de su publicación.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el salón del Honorable Concejo Municipal de Colosó-Sucre, a los Veintitrés (23) días del mes de Marzo de 2021.

Esther T.

ESTHER JUTITH TOVAR CONTRERAS
Presidente del concejo

BENITO MIGUEL SALAZAR ALQUERQUE
Primer vicepresidente

EDRAN JOSE NARVAEZ GARCIA
Segundo vicepresidente

Kevin R.M.

KEVIN RAFAEL RODRIGUEZ MENDEZ
Secretario

Escaneado con CamScanner

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
MUNICIPIO DE COLOSÓ
NIT.892. 280.053 - 7

SECRETARIA DE GOBIERNO Y DEL INTERIOR

CONSTANCIA SECRETARIAL
SECRETARIA DE GOBIERNO Y DEL INTERIOR:

Hoy 25 de marzo de 2021, se recibió oficio de la secretaria de Concejo Municipal de Coloso-Sucre, mediante el cual se remite el **ACUERDO No. 001 DE 2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE AGREGA UN ARTICULO AL ACUERDO No. 0010 de 2017 QUE REGLAMENTA LAS AUTORIZACIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL DE COLOSO-SUCRE PARA CONTRATAR Y SE SEÑALA LOS CASOS EN QUE REQUIERE AUTORIZACION PREVIA"**

Pasa al despacho para sanción.

FRANKLIN JOSE JARABA LORA
Secretario de Gobierno y del Interior

Escaneado con CamScanner

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 25 de septiembre de 2024, a las 12:21:05, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	92601345
Código de Verificación	926013452409251221O5

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 255041165

PIB
12:23:22


Bogotá DC, 25 de septiembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DAGER MANRIQUE PATERNINA ALQUERQUE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 92601345:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 25/09/2024 03:27:36 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **92601345 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **102462032** .
La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda Imprimir

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:29:52 PM horas del 25/09/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **92601345**

Apellidos y Nombres: **PATERNINA ALQUERQUE DAGER MANRIQUE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 92601345 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 01/10/2024 02:29 PM

Código Verificación: **PX7B6N2JC3**

Válida hasta: **30/12/2024**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

Colosó, 26/09/2024

Shirley Esther Quiñonez
Secretaria de Planeación, Infraestructura y medio ambiente.
Alcaldía municipal de Colosó

Jorge Luis Puche Ortega
R/L de Interventoría

Asunto: Solicitud de prórroga N°3 del Contrato LP – OP – 007 – 2023 cuyo objeto es: *"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE"*.

Teniendo en cuenta que los contratos LP – OP – 007 – 2023 de Estudios, Diseños y Obra del CONSORCIO RECREACIONAL JA, cuyo objeto es: ***"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE"*** y el contrato CM – 004 – 2023 de interventoría de INTERVINCO S.A.S, cuyo objeto es ***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE"*** ambos con plazo de ejecución hasta el 03 de octubre de 2024, derivados del Convenio interadministrativo de cofinanciación No. 1620 de 2023 cuyo plazo de ejecución contractual es del 18 de octubre de 2024.

Después de realizar una evaluación exhaustiva de los avances y de las condiciones actuales, hemos determinado que se hace necesario realizar solicitud de prórroga N°3 del contrato de Estudios, Diseños y Obra. Lo anterior, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y la finalización exitosa de las actividades de obra del proyecto.

Así las cosas, por medio del presente certificado me permito plasmar las justificaciones técnicas, jurídicas y financieras que soportan la solicitud de adición de TIEMPO para la obediencia del objeto contractual, teniendo en cuenta que la adición es necesaria para lograr el cumplimiento del cien por ciento de las obligaciones suscritas y el cumplimiento de la funcionalidad en su totalidad del proyecto derivado del convenio interadministrativo suscrito con el Ministerio del Interior, garantizando la correcta

inversión de los recursos públicos destinados para la construcción del proyecto Infraestructura para la convivencia categoría 1B del municipio de Colosó - Sucre.

Tenemos la siguiente información inicial del contrato:


CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP – OP – 007 – 2023 – LICITACIÓN PÚBLICA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO – SUCRE.
CONTRATISTA	CONSORCIO RECREACIONAL JA
OBJETO	**“**ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE”
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE ($2.144.708.697).
SUPERVISOR	SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE.
PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA SERÁ DE HASTA OCHO (08) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN.
PLAZO ACTUAL	03/10/2024
FECHA ACTA DE INICIO	03 DE NOVIEMBRE DE 2023

Teniendo lo anteriormente descrito y que el contrato de obra se encuentra en 54.43% de ejecución de obra según el informe de interventoría N°27 del 16/09/2024 al 22/09/2024, se hace necesario solicitar la ampliación en tiempo del Contrato No. LP –

OP – 007 – 2023 al inicialmente programada para el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual del proyecto Centro de Convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre.

La anterior solicitud se realiza teniendo en cuenta que:

1. Durante el tercer trimestre del año 2024, el municipio de Colosó - Sucre ha experimentado condiciones climáticas desfavorables. Según las proyecciones del IDEAM y lo experimentado en la región se ha atravesado por una temporada de lluvias los últimos meses. Esto, disminuyendo el rendimiento del proyecto y, en consecuencia, afectando negativamente la ejecución de diversas actividades. (Lo precitado se puede verificar en los informes semanales de interventoría, el registro fotográfico y el IDEAM). En donde se evidencia lluvias intensas impidiendo el avance de las actividades de construcción como el armado y soldadura de la estructura de las cubiertas de los 3 edificios del proyecto, entre otras.

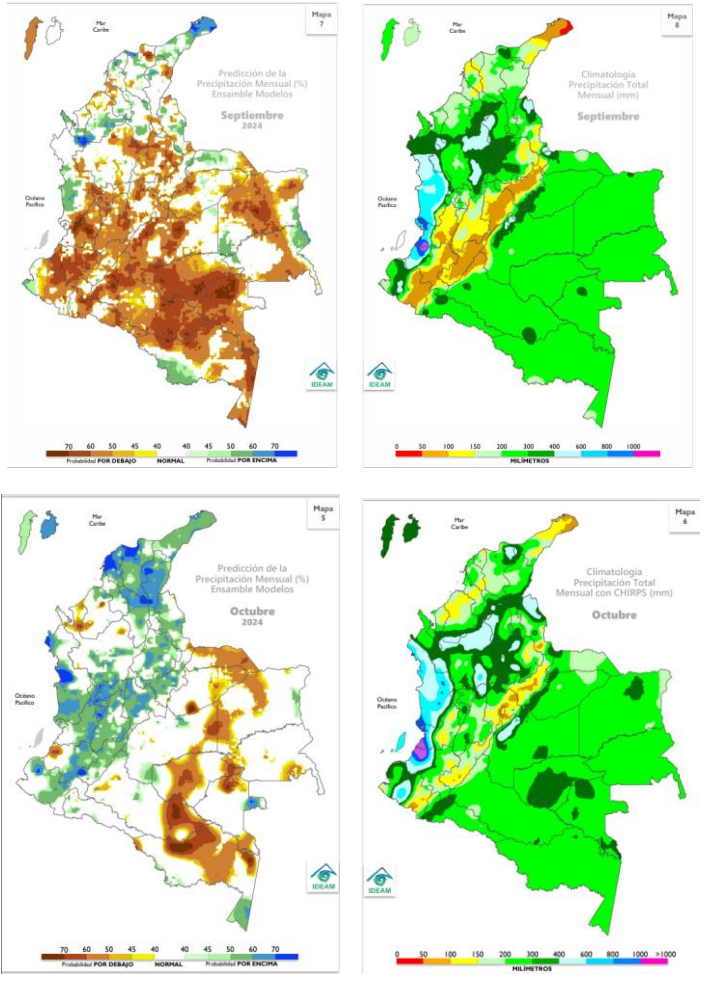

2. Es importante destacar que el deterioro de las vías de acceso al municipio y a la zona del proyecto, especialmente durante días de fuertes lluvias, ha causado demoras en la entrega de materiales y retrasando las fechas programadas en el plan de adquisiciones para el desarrollo de la obra. A su vez, esta situación compromete la seguridad vial tanto de los ciudadanos como de los trabajadores involucrados.

3. Además, hemos enfrentado dificultades significativas para conseguir materiales esenciales y mano de obra especializada en el municipio, los que se requieren para la construcción de la cubierta de los edificios, las rejillas para los cárcamos, los postes metálicos, entre otros elementos. Tanto estos como demás suministros requieren un tiempo hábil para su obtención, lo que agrava aún más la situación. La escasez de proveedores y los retrasos en la cadena de suministro están impactando el avance del proyecto y dificultando nuestra capacidad para cumplir con los plazos establecidos, situación la cual, se empeoro por el paro camionero vivido durante algunas semanas del mes de septiembre de 2024.

4. El contratista de Estudios, Diseños y Obra aporta a la administración municipal de Colosó – Sucre, un plan de contingencia para la finalización de la obra de la referencia al 100% de ejecución, en el mismo informa la finalización de la obra física para finales del mes de noviembre de 2024, toda vez que, ya se cuenta con el suministro con un grado de mayor dificulta en adquisición en la obra del Centro de Convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre.

5. De acuerdo con las actividades que se vienen ejecutando con relación al contrato de obra No. LP-007-OP-2023 y debido a los diferentes requisitos requeridos para la culminación de la obra como: **I)** la finalización de las actividades pendientes de obra, **II)** la llegada del suministro y dotación del proyecto, **III)** la consecución de las conexiones definitivas de energía, gas y manejo de aguas lluvias y **IV)** el tiempo requerido para la expedición de la certificación RETIE y conexión definitiva de energía, además del recibo y entrega de la obra al interventor y supervisor del municipio de Coloso – Sucre, se evidencia la variación en el cronograma para la finalización de la obra correspondiente al proyecto infraestructura para la convivencia 1B, así como en el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales establecidas.

Teniendo en cuenta lo anterior y los acontecimientos descritos es posible inferir y demostrar que por motivos ajenos a nuestra voluntad no ha sido posible el cumplimiento satisfactorio del plazo del contrato ni mucho menos el cronograma inicialmente aprobado para la ejecución del contrato de estudios y diseños y obra con objeto: "***ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE***

INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE", sin embargo, es importante recalcar que el CONSORCIO RECREACIONAL JA, ha actuado en todo momento bajo el principio de la buena fe y que habiendo superado las circunstancias previamente descritas se compromete al estricto cumplimiento del nuevo cronograma de ejecución. Vale la pena mencionar que, debido a los retrasos mencionados no se contó con el tiempo requerido para la ejecución de la obra según la viabilidad elaborada para el proyecto, motivo por el cual, se solicita respetuosamente se otorgue el excedente faltante según el cronograma de viabilidad para la finalización del proyecto infraestructura para la convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre.

Debido a lo anterior y siendo conservadores frente al principio de planeación, comedidamente me permito acudir a ustedes se disponga una prórroga en el plazo de ejecución del contrato LP-007-OP-2023, **hasta el 10 de diciembre del 2024**, y 2 meses más al convenio hasta el 18 de diciembre de 2024 tiempo en el cual, el CONSORCIO RECREACIONAL JA se compromete a finalizar la ejecución del 100% de la obra junto a la consecución de la documentación requerida para la entrega de la obra al municipio de Coloso – Sucre.

Cordialmente,

_____

JUAN JAVIER ALANDETE PIÑERES
Rep. Legal de CONSORCIO RECREACIONAL JA

ANEXOS

10 DE SEPTIEMBRE DE 2024





10 DE SEPTIEMBRE DE 2024





11 de septiembre de 2024





11 DE SEPTIEMBRE DE 2024



12 DE SEPTIEMBRE DE 2024





12 DE SEPTIEMBRE DE 2024





SERGIO ANTONIO GUEVARA PATERNINA
Nit 92.545.388 - 6
Tecnico en construccion de estructuras soldadas
No responsable de Iva - No declarante de Renta

Sincelejo, 25 de septiembre de 2024

SEÑORES

CONSORCIO RECREACIONAL JA

NIT: 9 0 1 7 6 6 8 7 0

Bolívar Monpos CL 18 4 41

Reciba un saludo de paz, bienestar y éxito en sus actividades

ASUNTO:

comunicado por el retraso de materiales requeridos en obra.

•Cordialmente me permito informarles sobre los inconvenientes q hemos tenido debido a la consecución de las barras cuadradas de 5/8 en HD para la fabricación de las rejillas de los CARCAMOS, dado a q es un material q no se comercializa en la región fue necesario hacer un pedido directo a la empresa fabricante en la ciudad de Cali y en esos tiempos de fabricación, de despacho y entrega en obra tuvimos un atraso de 60 días para poder iniciar la fabricación en obra de los CARCAMOS.

•Así mismo me permito informarles q durante los trabajos en altura de la fabricación de la estructura y cubierta del salón comunal no hemos extendido 20 días más sobre el tiempo q teníamos programado en la ejecución del armado. Esto se debe a q dentro del proceso de armado hemos experimentado poca velocidad de ejecución debido al nivel de dificultad q conlleva la fabricación de la estructura, la cercha curva y todos sus componentes curvos en un ambiente de fuertes brisas y lluvia casi constante.

• Es de anotar q actualmente los procesos de armado, fabricación e instalación están activos y en proceso para su entrega. ¡Contamos con todos los suministros requeridos y necesarios en obra!

Agradecemos toda su comprensión y paciencia en este proceso y les ofrecemos disculpas por todo el atraso causado por los motivos arriba descritos. Estaremos prestos a mejorar y agilizar las entregas en el menor tiempo posible.

Atentamente



SERGIO GUEVARA PATERNINA

VIVERO VIDAVERDE

Sembramos vida para la paz.

==========

CONSORCIO RECREACIONAL JA

NIT: 901766870
BOLIVAR MOMPOS CL 18441

Colosó 23 de septiembre del 2024

Señores:
_____

ASUNTO: Comunicado por el retraso en la Instalación de Duranta y Césped Kikuyo.

Por medio de la presente, queremos informarle que hemos enfrentado inconvenientes en la instalación de las plantas de duranta y el césped Kikuyo para el proyecto **"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE"**. Las variaciones climáticas desfavorables, específicamente las lluvias intensas de las últimas semanas han impedido el acceso adecuado al sitio de obra y la correcta preparación del terreno.

Para asegurar que la instalación se realice de manera óptima y garantizando la salud de las plantas, consideramos importante posponer la actividad hasta que las condiciones mejoren. Estimamos que en 15 días hábiles podremos reanudar la instalación.

Recomendaciones:

1. Sugerimos seguir de cerca las condiciones meteorológicas y, en caso de que las lluvias cesen en el tiempo estimado, comenzar a preparar el terreno para la instalación.


2. Asegúrese de que el terreno esté adecuadamente drenado y libre de charcos para evitar problemas en el enraizamiento de las plantas.

3. Una vez que se realice la instalación, recomendamos establecer un sistema de riego adecuado, considerando que el césped Kikuyo requiere un equilibrio en la humedad.

4. Si las condiciones continúan inestables, considere proteger temporalmente las áreas donde se instalarán las plantas hasta que podamos proceder.

Agradecemos su comprensión ante esta situación y estamos a su disposición para cualquier consulta adicional. Quedamos atentos a coordinar la reprogramación de la instalación una vez que las condiciones lo permitan.

Atentamente,



ONALDIS MARMOLEJO ALVAREZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.005.486.349
DIRECCION: VIVERO VIDA VERDE COLOSÓ SUCRE.

PROGRAMACION ACTUALIZADA DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 3B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA N° LP-OP-007-2020

INTERVENTORIA: INTERVINCO SAS

CONTRATISTA: CONSORCIO RECREACIONAL JA

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	VR UNIT	VR. PARCIAL	Fecha Inicio	Fecha fin	Dia
1	**Area Aseos Peliculares**							
1.1	Localización, Trazado y replanteo manual (alineamiento a cinta metrica, colas de rata/cuerda, nivel de manguera, plomada, estacas, puntillas, pintura, mojones de concreto)	m2	1.200,00	$ 1.972,00	$ 2.366.280,00	06/05/2019	25/05/2019	19
1.2	Excavación manual en capa vegetal hyrcion c.30cm. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros	m3	1.200,00	$ 12.707,00	$ 15.248.400,00	06/05/2019	30/05/2019	24
1.3	Excavación manual en material comun. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros y compactación de la misma	m3	96,00	$ 20.588,00	$ 1.976.448,00	30/05/2019	13/06/2019	14
1.4	Relleno manual en material seleccionado tipo AR2, compactado al 95% del Proctor modificado, compactado en capas altura máx 0,30m. Incluye materiales, humedecimiento, compactación	m3	928,11	$ 110.691,33	$ 99.830.296,00	01/06/2019	13/08/2019	63
2	**Area Polideportivo Multifuncional**							
2.1	**Movimiento de tierra**							
2.1.1	Excavación manual en material comun. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros y	m3	69,67	$ 97.019,00	$ 1.956.214,00	06/05/2019	19/05/2019	13
2.1.2	Relleno manual en material seleccionado tipo AR2, compactado al 95% del Proctor modificado, compactado en capas altura máx 0,30m. Incluye materiales, humedecimiento, compactación	m3	12,00	$ 110.691,33	$ 1.328.529,00	17/05/2019	19/05/2019	3
2.2	**Aseos, Cuartos y Pisos**							
2.2.1	Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi, incluye cama de material de relleno de 20cm e	m3	8,00	$ 859.550,00	$ 6.876.400,00	20/05/2019	23/05/2019	4
2.2.2	Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi, incluye cama de material de relleno de 20cm e	m2	262,00	$ 53.650,00	$ 14.056.300,00	23/05/2019	30/05/2019	8
2.2.3	Suelo de 30 MPa en alta cuantia, incluye curado, formaleta y malla	m2	314,00	$ 9.833,00	$ 3.088.162,00	24/05/2019	29/05/2019	6
2.2.4	Concreto F'c 3000 psi para zapata y pedestal, incluye vibrado de hierro y todo lo necesario para la	m3	8,16	$ 731.453,00	$ 5.971.645,00	02/06/2019	7/06/2019	6
2.2.5	Suelo de 30 MPa en alta cuantia, incluye curado, formaleta y malla. Incluye refuerzo	m2	1.310,00	$ 9.833,00	$ 12.882.730,00	02/06/2019	11/06/2019	10
2.2.6	Concreto F'c 3000 psi para viga y viga de cimentación, incluye vibrado de hierro y todo lo	m3	13,71	$ 774.048,00	$ 10.668.242,00	10/06/2019	20/06/2019	11
2.2.7	Suministro de dos hiladas de bloque # 10, relleno en concreto 3000psi y dovela en varilla #4 con	m	113,20	$ 80.967,00	$ 9.164.084,00	21/06/2019	27/06/2019	7
2.2.8	Pared de ventana en bloque #10 y pegapaz liso en concreto 3.000 psi F'c 3000psi, incluye malla	m2	33,60	$ 100.763,00	$ 3.385.637,00	28/06/2019	1/08/2019	4
2.2.9	Pared de ventana en concreto de 3000 psi F'c, incluye vibrado de hierro y todo lo necesario para	m3	1.260,00	$ 5.427,00	$ 6.838.020,00	1/08/2019	4/08/2019	3
2.2.10	Concreto F'c 3000 psi para zapata y pedestal, incluye vibrado de hierro y todo lo necesario para la	m3	8,01	$ 1.000.000,00	$ 8.010.000,00	5/08/2019	11/08/2019	6
2.2.11	Suelo de 30 MPa en alta cuantia, incluye curado, formaleta y malla. Incluye refuerzo	m2	412,00	$ 9.833,00	$ 4.051.796,00	12/08/2019	14/08/2019	2
2.2.12	Concreto F'c 3000 psi para viga y viga de cimentación, incluye vibrado de hierro y todo lo necesario para la	m3	8,81	$ 1.000.000,00	$ 8.810.000,00	26/08/2019	2/09/2019	7
2.2.13	Suministro en concreto sección 40x80 cm x 15 m/ columnetas estribadas F'c=3000 psi, acabado a la vista, formaleta lateral rico agitomaster + 30mm tipo Formaletex 3" de THELMA INC. con bordes	ml	27,00	$ 297.903,00	$ 8.043.381,00	29/08/2019	27/09/2019	29
2.3	**Muros en concreto de la cancha y aseos**							
2.3.1	Muro en bloque de concreto de 10, incluye mortero de pega, refuerzo y todo lo necesario para la	m2	79,68	$ 62.390,00	$ 4.971.715,20	28/05/2019	30/05/2019	2
2.3.2	Columnas en concreto 3000psi, seccion 30x30cm, incluye formaleta, acero de refuerzo longitudinal	m	37,50	$ 95.371,00	$ 3.576.413,00	5/07/2019	13/07/2019	8
2.3.3	Viga de confinamiento en concreto 3000psi, seccion 15x30cm, incluye formaleta, acero de refuerzo longitudinal 3/8 y transversal 4@20cm, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	m	39,00	$ 104.130,00	$ 4.060.170,00	13/07/2019	19/07/2019	6
2.3.4	Pañete impermeabilizado con hidrolite	m2	167,04	$ 41.748,00	$ 6.973.763,52	20/07/2019	23/07/2019	3
2.3.5	Pintura 100% acrilica para exteriores, doble mano, de acabado mate. Alta resistencia a la intemperie y al deterioro de hongos. Asistencia permanente para aplicación de pinturas, colores, tono y tiempos. Con alta retención del color y trasladabilidad. Aplicado en tres capas sobre muros, filos, columnas, vigas, dinteles, etc. Incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	m2	140,40	$ 18.023,00	$ 2.530.369,20	24/07/2019	26/07/2019	2
2.4	**Estructura metalica para Cubierta**							
2.4.1	Estructura metálica para Cubierta para cubierta, incluye suministro, fabricación, instalación anclajes y soporte de cubierta. Incluye soldadura, elementos de seguridad industrial, andamios, pintura anticorrosiva y de acabado en fondo gris y acabado en aluminio, retiro de sobrantes, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	Kg	5.884,80	$ 33.963,00	$ 199.854.welve.874,00	19/08/2019	7/07/2020	
2.4.2	Placa colaborante Tipo 2 Cal 22 y 0,91 mm incluye pintura de fondo	m2	267,00	$ 456.765,00	$ 121.773.552,00	30/07/2019	19/07/2020	
3	**Baños de Hombres**							
3.1	**Movimiento de tierra**							
3.1.1	Excavación manual en material comun. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros y	m3	23,57	$ 97.019,00	$ 877.384,00	06/05/2019	19/05/2019	13
3.1.2	Relleno manual en material seleccionado tipo AR2, compactado al 95% del Proctor modificado, compactado en capas altura máx 0,30m. Incluye materiales, humedecimiento, compactación	m3	8,00	$ 110.691,33	$ 885.386,00	17/05/2019	19/05/2019	3
3.2	**Aseos, Cuartos y Pisos**							
3.2.1	Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi F'c, incluye cama de material de relleno de 20cm e	m3	4,00	$ 488.884,00	$ 1.997.536,00	20/05/2019	21/05/2019	2
3.2.2	Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi F'c, incluye cama de material de relleno de 20cm e	m2	94,00	$ 53.650,00	$ 5.046.078,00	23/05/2019	29/05/2019	6
3.2.3	Piso en baldosa de gres de interior alto-grupo BIIa/B. cm, gotero. Incluye mortero 1:5	m2	94,00	$ 66.847,00	$ 6.283.737,00	27/05/2019	30/05/2019	3
3.2.4	Sardinel/bordillo en baldosa gres de interior alto-grupo BIIa/B. cm, gotero 1 h=9 cm. Incluye mortero de pega	m	75,00	$ 38.405,00	$ 2.880.375,00	7/06/2019	11/06/2019	4
3.2.5	Suelo de 30 MPa en alta cuantia, incluye curado, formaleta y malla. Incluye refuerzo	m2	112,00	$ 9.833,00	$ 1.101.334,00	03/06/2019	7/06/2019	4
3.2.6	Concreto F'c 3000 psi para zapata y pedestal, incluye vibrado de hierro y todo lo necesario para la	m3	5,72	$ 731.453,00	$ 4.181.761,60	10/06/2019	14/06/2019	4
3.2.7	Suelo de 30 MPa en alta cuantia, incluye curado, formaleta y malla. Incluye refuerzo	m2	470,00	$ 9.833,00	$ 4.276.999,00	21/06/2019	28/06/2019	7
3.2.8	Concreto F'c 3000 psi para viga y viga de cimentación, incluye vibrado de hierro y todo lo necesario para	m3	9,64	$ 774.048,00	$ 7.764.021,00	26/06/2019	1/07/2019	5
3.2.9	Pañete impermeabilizado con hidrolite	m2	47,04	$ 41.748,00	$ 868.788,00	1/08/2019	2/08/2019	1
3.2.10	Suelo de 30 MPa en alta cuantia, incluye curado, formaleta y malla. Incluye refuerzo	m2	167,00	$ 9.833,00	$ 3.276.178,00	30/06/2019	7/08/2019	7
3.2.11	Concreto F'c 3000 psi para zapata y pedestal, incluye vibrado de hierro y todo lo necesario para la	m3	7,72	$ 1.000.000,00	$ 2.680.112,00	5/08/2019	13/08/2019	8
3.2.12	Suelo de 30 MPa en alta cuantia, incluye curado, formaleta y malla. Incluye refuerzo	m2	481,00	$ 9.833,00	$ 4.729.567,00	12/08/2019	19/08/2019	7
3.2.13	Concreto F'c 3000 psi para viga y viga de cimentación, incluye vibrado de hierro y todo lo necesario para la	m3	9,64	$ 1.000.147,00	$ 9.720.923,00	16/08/2019	23/08/2019	7
3.3	**Muros**							
3.3.1	Muro en bloque de cerramiento 06, acabado en la vista pulso-arena-arte bloque interno de pegue	m2	114,00	$ 62.390,00	$ 7.114.260,00	27/06/2019	27/06/2019	1
3.3.2	Columnas en concreto 3000psi, seccion 30x30cm, incluye formaleta, acero de refuerzo longitudinal 3/8 y transversal 4@20cm, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	m	23,00	$ 95.371,00	$ 2.175.409,00	28/06/2019	30/06/2019	2
3.3.3	Viga de confinamiento en bloque #10 pulpa a la vista, incluye fleno f'c=3.000 psi, malla #3 cada 15 cm, varilla #4@ corrugada#3 estribos cada 20 cm, gotero. Incluye refuerzo en viga de confinación. Incluye grafiti hasta una altura de 2.50 m	m	161,00	$ 38.916,00	$ 2.821.911,00	1/07/2019	6/07/2019	5
3.3.4	Muro en bloque de cerramiento 06, acabado en la vista pulso-arena-arte bloque interno de pegue	m2	24,67	$ 108.319,00	$ 2.669.964,00	5/07/2019	9/07/2019	5
3.3.5	Columnas en concreto 3000psi, seccion 30x30cm, incluye formaleta, acero de refuerzo longitudinal 3/8 y transversal 4@20cm, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	m	39,00	$ 95.371,00	$ 720.894,00	6/07/2019	11/07/2019	27.00
3.3.6	Anclaje Acero/concreto/mampostería (varilla roscada) 1/2 pulg de diámetro x 20cm de largo	un	144,00	$ 44.744,00	$ 6.536.784,00	15/07/2019	22/07/2019	7
3.3.7	Muro en bloque de cerramiento 06, acabado en la vista pulso-arena-arte bloque interno de pegue, incluye en	m2	39,00	$ 62.390,00	$ 2.432.610,00	19/07/2019	23/07/2019	4
3.3.8	Pintura vinilo acrilica plastico doble Tipo 1, aplicado en tres capas sobre muros, techo, filos,	m2	39,00	$ 25.300,00	$ 912.750,00	26/07/2019	27/07/2019	1
3.3.9	Enchape de muro en prefabricado 30 x 15 x 5 cm (pared blanca) incluye mortero pega	m2	95,00	$ 77.963,00	$ 7.406.174,00	29/07/2019	2/08/2019	4
3.3.10	Mesón en concreto con fondo De +80 cm a +8 cm Fc 3000 psi, con acabado superior y filetillos en pared y borde y pulido a +3 cm. Incluye suministro e instalación de 1 lavamanos de acero inoxidable con grifería de cromo tipo mezclador, sifón, llaves y elementos de instalaciones, en bronce según diseño.	m2	7,65	$ 256.425,00	$ 1.912.395,00	5/08/2019	11/07/2020	
3.4	**Cubierta**							
3.4.1	Estructura metálica para Cubierta Termoacustica 3mm. Incluye suministro, fabricación, sistema de anclajes y soporte de cubierta. Incluye soldadura, elementos de seguridad industrial, andamios, pintura anticorrosiva y de acabado en fondo gris y acabado en aluminio, retiro de sobrantes, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	Kg	1.964,20	$ 18.862,00	$ 37.047.930,00	27/06/2019	27/06/2019	
3.4.2	Canal recto en PVC sostenido tipo amarre/ojo 20mm. Incluye elementos de fijación y todo lo necesario para la correcta instalación	m2	100,00	$ 81.479,00	$ 8.631.894,00	28/06/2019	8/07/2020	
3.4.3	Cubierta en lamina termoacustica PVC in.3mm. Incluye accesorios de anclaje, soldadura en puntos segun especificaciones del fabricante y todo lo necesario para su correcta instalación y	m2	120,70	$ 90.972,00	$ 11.000.605,00	15/07/2019	19/07/2019	
4	**Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias, Aguas Lluvias y Red**							
4.1.1	Tubería PVC RDE 21, 3/4" diámetro 1/2"	ml	2,00	$ 7.700,00	$ 15.400,00	30/05/2019	30/05/2019	1
4.1.2	Tubería PVC, PRESION, RDE 26, 3/4 PSI diámetro 1/2"	ml	60,00	$ 8.973,00	$ 538.380,00	7/06/2019	8/06/2019	2
4.1.3	Tubería PVC, PRESION, RDE 21, 3/4 PSI diámetro 1"	ml	30,00	$ 11.550,00	$ 346.500,00	7/06/2019	8/06/2019	2
4.1.4	Tubería PVC, PRESION, RDE 21, 3/4 PSI diámetro 1 1/2"	ml	3,00	$ 16.170,00	$ 48.510,00	7/06/2019	8/06/2019	2
4.1.5	Tubería PVC, PRESION, RDE 21, 3/4 PSI diámetro 2"	ml	3,00	$ 24.255,00	$ 72.765,00	7/06/2019	8/06/2019	2
4.1.6	Tubo PVC, 3/4" diámetro 1/2"	un	40,00	$ 7.854,00	$ 314.160,00	10/06/2019	11/06/2019	2
4.1.7	Tubo PVC, 3/4" diámetro 1"	un	20,00	$ 11.550,00	$ 231.000,00	10/06/2019	11/06/2019	2
4.1.8	Tubo PVC, 3/4" diámetro 1 1/2"	un	20,00	$ 16.170,00	$ 323.400,00	10/06/2019	11/06/2019	2
4.1.9	Tubo PVC, 3/4" diámetro 2"	un	20,00	$ 24.255,00	$ 485.100,00	10/06/2019	11/06/2019	2
4.1.10	Tee PVC roscado diámetro 1/2"	un	2,00	$ 10.659,00	$ 21.318,00	30/05/2019	30/05/2019	1
4.1.11	Tee PVC roscado diámetro 1"	un	2,00	$ 16.809,00	$ 33.618,00	7/06/2019	8/06/2019	2
4.1.12	Tee roscada PVC diámetro 1 1/2"	un	2,00	$ 24.255,00	$ 48.510,00	7/06/2019	8/06/2019	2
4.1.13	Tee roscada PVC diámetro 2"	un	2,00	$ 34.650,00	$ 69.300,00	7/06/2019	8/06/2019	2
4.1.14	Tee roscada PVC diámetro 3"	un	1,00	$ 111.375,00	$ 111.375,00	10/07/2019	10/07/2019	1
4.1.15	Tee roscada PVC diámetro 4"	un	1,00	$ 157.500,00	$ 157.500,00	10/07/2019	10/07/2019	1
4.1.16	Reducción Bushing de 3" roscada a 1/2"	un	2,00	$ 10.815,00	$ 21.630,00	10/07/2019	11/07/2019	2
4.1.17	Reducción Bushing de 3" roscada a 3/4"	un	2,00	$ 10.815,00	$ 21.630,00	10/07/2019	11/07/2019	2
4.1.18	Reducción Bushing de 3" roscada a 1"	un	2,00	$ 10.815,00	$ 21.630,00	10/07/2019	11/07/2019	2
4.1.19	Reducción Bushing de 3" roscada a 1 1/2"	un	2,00	$ 10.815,00	$ 21.630,00	10/07/2019	11/07/2019	2
4.1.20	Reducción Bushing de 3" roscada a 2"	un	2,00	$ 10.815,00	$ 21.630,00	10/07/2019	11/07/2019	2
4.1.21	Tapon macho roscado 3"	un	2,00	$ 10.815,00	$ 21.630,00	10/07/2019	11/07/2019	2
4.1.22	Tapon macho roscado 1/2"	un	5,00	$ 10.659,00	$ 53.295,00	10/07/2019	11/07/2019	2
4.1.23	Tapon macho roscado 1"	un	5,00	$ 16.809,00	$ 84.045,00	10/07/2019	11/07/2019	2
4.1.24	SUMINISTRO DE PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR CADA BOMBA CHIANTITOM, 3.7kW/5.0HP DPM Presión 2500mca 054 PM Potencia: 1.10HP Rodete	un	2,00	$ 1.988.674,00	$ 3.976.148,00	26/07/2019	27/07/2019	2
4.1.25	Suministro e instalación de medidor electromagnetico de 26mm (1/2") incluye caja de pvc, tornillos y codigo de barras para lectura con equipos, diseño de incorporación, codo o tendido codos de cobre, llave de corte universal, universal, niquelado cobre, filtro utilizado de gasa, incluye y accesorios necesarios para su adecuado funcionamiento. Todo lo necesario para un 1/2"	un	1,00	$ 160.199,00	$ 160.199,00	30/07/2019	31/07/2019	1
4.1.26	SISTEMA REBALDO CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR CADA BOMBA CHIANTITOM, 3.7kW/5.0HP DPM Presión 2500mca 054 PM Potencia: 1.10HP Rodete	un	1,00	$ 1.988.674,00	$ 1.988.674,00	5/08/2019	2/08/2019	
4.1.27	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida baño o red (ml)	ml	2,00	$ 29.400,00	$ 58.800,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.28	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida lavamanos	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.29	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.30	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.31	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.32	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.33	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.34	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.35	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.36	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.37	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.38	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.39	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.40	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.41	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.42	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.43	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.44	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.45	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.46	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.47	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.48	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.49	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.50	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.51	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.52	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.53	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.54	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.55	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.56	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.57	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.58	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.59	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.60	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.61	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.62	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.63	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.64	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.65	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.66	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.67	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.68	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.69	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.70	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.71	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.72	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.73	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.74	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.75	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.76	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.77	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.78	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.79	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.80	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.81	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.82	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.83	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.84	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.85	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.86	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.87	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.88	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.89	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.90	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.91	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.92	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.93	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.94	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.95	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.96	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.97	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/06/2019	06/06/2019	2
4.1.98	Tubería PVC, SANITARIA, con accesorios para 4" salida	ml	4,00	$ 29.400,00	$ 117.600,00	05/

PROGRAMACION ACTUALIZADA DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDADANÍA CATEGORIA 3B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2020

INTERVENTORIA: INTERVINCO SAS

CONTRATISTA: CONSORCIO RECREACIONAL JA

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	VR UNIT	VR. PARCIAL	Fecha Inicio	Fecha fin	Dia calendario
						13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.01	Concreto ciclopeo 1:2:3	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.02	Concreto 2500 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.03	Concreto 3000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.04	Concreto 4000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.05	Concreto de limpieza f'c= 2000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.06	Concreto de limpieza f'c= 3000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.07	Concreto de limpieza f'c= 4000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.08	Concreto de limpieza f'c= 5000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.09	Concreto de limpieza f'c= 6000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.10	Concreto de limpieza f'c= 7000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.11	Concreto de limpieza f'c= 8000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.12	Concreto de limpieza f'c= 9000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.13	Concreto de limpieza f'c= 10000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.14	Concreto de limpieza f'c= 11000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.15	Concreto de limpieza f'c= 12000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.16	Concreto de limpieza f'c= 13000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.17	Concreto de limpieza f'c= 14000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.18	Concreto de limpieza f'c= 15000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.19	Concreto de limpieza f'c= 16000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.20	Concreto de limpieza f'c= 17000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.21	Concreto de limpieza f'c= 18000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.22	Concreto de limpieza f'c= 19000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.23	Concreto de limpieza f'c= 20000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.24	Concreto de limpieza f'c= 21000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.25	Concreto de limpieza f'c= 22000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.26	Concreto de limpieza f'c= 23000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.27	Concreto de limpieza f'c= 24000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.28	Concreto de limpieza f'c= 25000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.29	Concreto de limpieza f'c= 26000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.30	Concreto de limpieza f'c= 27000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.31	Concreto de limpieza f'c= 28000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.32	Concreto de limpieza f'c= 29000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.33	Concreto de limpieza f'c= 30000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.34	Concreto de limpieza f'c= 31000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.35	Concreto de limpieza f'c= 32000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.36	Concreto de limpieza f'c= 33000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.37	Concreto de limpieza f'c= 34000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.38	Concreto de limpieza f'c= 35000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.39	Concreto de limpieza f'c= 36000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.40	Concreto de limpieza f'c= 37000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.41	Concreto de limpieza f'c= 38000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.42	Concreto de limpieza f'c= 39000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.43	Concreto de limpieza f'c= 40000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.44	Concreto de limpieza f'c= 41000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.45	Concreto de limpieza f'c= 42000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.46	Concreto de limpieza f'c= 43000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.47	Concreto de limpieza f'c= 44000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.48	Concreto de limpieza f'c= 45000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.49	Concreto de limpieza f'c= 46000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.50	Concreto de limpieza f'c= 47000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.51	Concreto de limpieza f'c= 48000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.52	Concreto de limpieza f'c= 49000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.53	Concreto de limpieza f'c= 50000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.54	Concreto de limpieza f'c= 51000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.55	Concreto de limpieza f'c= 52000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.56	Concreto de limpieza f'c= 53000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.57	Concreto de limpieza f'c= 54000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.58	Concreto de limpieza f'c= 55000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.59	Concreto de limpieza f'c= 56000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.60	Concreto de limpieza f'c= 57000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.61	Concreto de limpieza f'c= 58000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.62	Concreto de limpieza f'c= 59000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.63	Concreto de limpieza f'c= 60000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.64	Concreto de limpieza f'c= 61000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.65	Concreto de limpieza f'c= 62000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.66	Concreto de limpieza f'c= 63000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.67	Concreto de limpieza f'c= 64000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.68	Concreto de limpieza f'c= 65000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.69	Concreto de limpieza f'c= 66000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.70	Concreto de limpieza f'c= 67000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.71	Concreto de limpieza f'c= 68000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.72	Concreto de limpieza f'c= 69000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.73	Concreto de limpieza f'c= 70000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.74	Concreto de limpieza f'c= 71000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.75	Concreto de limpieza f'c= 72000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.76	Concreto de limpieza f'c= 73000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.77	Concreto de limpieza f'c= 74000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.78	Concreto de limpieza f'c= 75000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.79	Concreto de limpieza f'c= 76000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.80	Concreto de limpieza f'c= 77000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.81	Concreto de limpieza f'c= 78000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.82	Concreto de limpieza f'c= 79000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.83	Concreto de limpieza f'c= 80000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.84	Concreto de limpieza f'c= 81000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.85	Concreto de limpieza f'c= 82000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.86	Concreto de limpieza f'c= 83000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.87	Concreto de limpieza f'c= 84000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.88	Concreto de limpieza f'c= 85000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.89	Concreto de limpieza f'c= 86000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.90	Concreto de limpieza f'c= 87000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.91	Concreto de limpieza f'c= 88000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.92	Concreto de limpieza f'c= 89000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.93	Concreto de limpieza f'c= 90000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.94	Concreto de limpieza f'c= 91000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.95	Concreto de limpieza f'c= 92000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.96	Concreto de limpieza f'c= 93000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.97	Concreto de limpieza f'c= 94000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.98	Concreto de limpieza f'c= 95000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.99	Concreto de limpieza f'c= 96000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.100	Concreto de limpieza f'c= 97000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.101	Concreto de limpieza f'c= 98000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.102	Concreto de limpieza f'c= 99000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.103	Concreto de limpieza f'c= 100000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.104	Concreto de limpieza f'c= 101000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.105	Concreto de limpieza f'c= 102000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.106	Concreto de limpieza f'c= 103000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.107	Concreto de limpieza f'c= 104000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.108	Concreto de limpieza f'c= 105000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.109	Concreto de limpieza f'c= 106000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.110	Concreto de limpieza f'c= 107000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.111	Concreto de limpieza f'c= 108000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.112	Concreto de limpieza f'c= 109000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.113	Concreto de limpieza f'c= 110000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.114	Concreto de limpieza f'c= 111000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.115	Concreto de limpieza f'c= 112000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.116	Concreto de limpieza f'c= 113000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.117	Concreto de limpieza f'c= 114000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.118	Concreto de limpieza f'c= 115000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.119	Concreto de limpieza f'c= 116000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.120	Concreto de limpieza f'c= 117000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.121	Concreto de limpieza f'c= 118000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.122	Concreto de limpieza f'c= 119000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.123	Concreto de limpieza f'c= 120000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.124	Concreto de limpieza f'c= 121000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.125	Concreto de limpieza f'c= 122000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.126	Concreto de limpieza f'c= 123000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.127	Concreto de limpieza f'c= 124000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.128	Concreto de limpieza f'c= 125000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.129	Concreto de limpieza f'c= 126000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.130	Concreto de limpieza f'c= 127000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.131	Concreto de limpieza f'c= 128000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.132	Concreto de limpieza f'c= 129000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.133	Concreto de limpieza f'c= 130000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.134	Concreto de limpieza f'c= 131000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.135	Concreto de limpieza f'c= 132000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.136	Concreto de limpieza f'c= 133000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.137	Concreto de limpieza f'c= 134000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.138	Concreto de limpieza f'c= 135000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.139	Concreto de limpieza f'c= 136000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.140	Concreto de limpieza f'c= 137000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.141	Concreto de limpieza f'c= 138000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.142	Concreto de limpieza f'c= 139000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.143	Concreto de limpieza f'c= 140000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.144	Concreto de limpieza f'c= 141000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.145	Concreto de limpieza f'c= 142000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.146	Concreto de limpieza f'c= 143000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.147	Concreto de limpieza f'c= 144000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.148	Concreto de limpieza f'c= 145000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.149	Concreto de limpieza f'c= 146000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.150	Concreto de limpieza f'c= 147000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.151	Concreto de limpieza f'c= 148000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.152	Concreto de limpieza f'c= 149000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.03.153	Concreto de limpieza f'c= 150000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04	**Concreto de limpieza para Cubierta**							
2.04.01	Concreto ciclopeo 1:2:3	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.02	Concreto 2500 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.03	Concreto 3000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.04	Concreto 4000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.05	Concreto de limpieza f'c= 2000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.06	Concreto de limpieza f'c= 3000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.07	Concreto de limpieza f'c= 4000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.08	Concreto de limpieza f'c= 5000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.09	Concreto de limpieza f'c= 6000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.10	Concreto de limpieza f'c= 7000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.11	Concreto de limpieza f'c= 8000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.12	Concreto de limpieza f'c= 9000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.13	Concreto de limpieza f'c= 10000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.14	Concreto de limpieza f'c= 11000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.15	Concreto de limpieza f'c= 12000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.16	Concreto de limpieza f'c= 13000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.17	Concreto de limpieza f'c= 14000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.18	Concreto de limpieza f'c= 15000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.19	Concreto de limpieza f'c= 16000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.20	Concreto de limpieza f'c= 17000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.21	Concreto de limpieza f'c= 18000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.22	Concreto de limpieza f'c= 19000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.23	Concreto de limpieza f'c= 20000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.24	Concreto de limpieza f'c= 21000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.25	Concreto de limpieza f'c= 22000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.26	Concreto de limpieza f'c= 23000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.27	Concreto de limpieza f'c= 24000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.28	Concreto de limpieza f'c= 25000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.29	Concreto de limpieza f'c= 26000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.30	Concreto de limpieza f'c= 27000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.31	Concreto de limpieza f'c= 28000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.32	Concreto de limpieza f'c= 29000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.33	Concreto de limpieza f'c= 30000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.34	Concreto de limpieza f'c= 31000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.35	Concreto de limpieza f'c= 32000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.36	Concreto de limpieza f'c= 33000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.37	Concreto de limpieza f'c= 34000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.38	Concreto de limpieza f'c= 35000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.39	Concreto de limpieza f'c= 36000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.40	Concreto de limpieza f'c= 37000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.41	Concreto de limpieza f'c= 38000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.42	Concreto de limpieza f'c= 39000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.43	Concreto de limpieza f'c= 40000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.44	Concreto de limpieza f'c= 41000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.45	Concreto de limpieza f'c= 42000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.46	Concreto de limpieza f'c= 43000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.47	Concreto de limpieza f'c= 44000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020	12/08/2020	91
2.04.48	Concreto de limpieza f'c= 45000 psi	m3	0,00	$ 0,00	$ 0,00	13/05/2020

PROGRAMACION ACTUALIZADA DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CRA 24 ENTRE LA CRA 23 Y LA CRA 25 DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA N° LP-OP-007-2023

INTERVENTORIA: INTERVINCO SAS

CONTRATISTA: CONSORCIO RECREACIONAL JA

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	VR UNIT	VR. PARCIAL	Fecha Inicio	Fecha fin	Dias calendario
1	**PRELIMINARES**							
1.1	Localización y replanteo en terreno plano con equipo topográfico	M2	3800,00	$ 3.500,00	$ 13.300.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
1.1.1	Suministro e instalación de tablón prefabricado de 1.80 Mts x 0.30 Mts. Incluye suministro de	UN	612,00	$ 350.000,00	$ 214.200.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
1.1.2	Suministro e instalación de piloto en caucho RPE90 y gratificado, no. 2 UN. Incluye adhesivo,	M2	3800,00	$ 42.000,00	$ 159.600.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
1.1.3	Suministro e instalación de Cerramiento en Malla eslabonada No 10, incluye postes de concreto y	UN	4,00	$ 1.500,00	$ 6.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
1.2	**DEMOLICIONES**							
1.2.1	Demolición de 1.80mt por 30cm Viga de cimentación para la base de escalas. Incluye formaleta,	M	9,00	$ 1.500,00	$ 13.500,00	01/04/2023	15/04/2023	15
1.2.2	Demolición de 1.80mt por 30cm Viga Pórticos T de TABLEMAC, con bordes acabados	M	9,00	$ 1.500,00	$ 13.500,00	01/04/2023	15/04/2023	15
1.2.3	Demolición de concreto de 3000psi, sección 30x45cm, incluye formaleta, acero de refuerzo	M	9,00	$ 10.000,00	$ 90.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
1.2.4	Muro en bloque de concreto # 29, acabado a la vista pañeteado incluye mortero de pega,	M2	13,00	$ 42.000,00	$ 546.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
1.2.5	Demolición de concreto de 3000psi, sección 30x45cm, incluye formaleta, acero de refuerzo	M	9,00	$ 10.000,00	$ 90.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
1.2.6	Viga de confinamiento en concreto 3000psi, sección 30x45cm, incluye formaleta, acero de refuerzo	M	9,00	$ 12.000,00	$ 108.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
1.2.7	Demolición de concreto de 3000psi, sección 30x45cm, incluye formaleta, acero de refuerzo	M	9,00	$ 10.000,00	$ 90.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
1.2.8	Viga de confinamiento en concreto 3000psi, sección 30x45cm, incluye formaleta, acero de refuerzo	M	9,00	$ 12.000,00	$ 108.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
1.2.9	Demolición de concreto de 3000psi, sección 30x45cm, incluye formaleta, acero de refuerzo	M	9,00	$ 10.000,00	$ 90.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
1.2.10	Viga de confinamiento en concreto 3000psi, sección 30x45cm, incluye formaleta, acero de refuerzo	M	9,00	$ 12.000,00	$ 108.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
1.2.11	Demolición de concreto de 3000psi, sección 30x45cm, incluye formaleta, acero de refuerzo	M	9,00	$ 10.000,00	$ 90.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
1.2.12	Viga de confinamiento en concreto 3000psi, sección 30x45cm, incluye formaleta, acero de refuerzo	M	9,00	$ 12.000,00	$ 108.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
1.2.13	Demolición de concreto de 3000psi, sección 30x45cm, incluye formaleta, acero de refuerzo	M	9,00	$ 10.000,00	$ 90.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
1.2.14	Viga de confinamiento en concreto 3000psi, sección 30x45cm, incluye formaleta, acero de refuerzo	M	9,00	$ 12.000,00	$ 108.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
1.2.15	Demolición de concreto de 3000psi, sección 30x45cm, incluye formaleta, acero de refuerzo	M	9,00	$ 10.000,00	$ 90.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
1.2.16	Viga de confinamiento en concreto 3000psi, sección 30x45cm, incluye formaleta, acero de refuerzo	M	9,00	$ 12.000,00	$ 108.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
1.2.17	Demolición de concreto de 3000psi, sección 30x45cm, incluye formaleta, acero de refuerzo	M	9,00	$ 10.000,00	$ 90.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
1.2.18	Viga de confinamiento en concreto 3000psi, sección 30x45cm, incluye formaleta, acero de refuerzo	M	9,00	$ 12.000,00	$ 108.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
1.3	**Reacondicionamiento Aguas Arriba**							
1.3.1	Suministro e instalación de Sobrelleno de agua con pedraplol en costado aguas arriba, posteriormente	KM	1,00	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
1.3.2	Suministro e instalación de Colchoneta Multiple Reno tipo RENO COD 168836. Incluye elementos	KM	1,00	$ 42.000.000,00	$ 42.000.000,00	15/04/2023	30/04/2023	15
1.3.3	Suministro e instalación de Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	KM	1,00	$ 42.000.000,00	$ 42.000.000,00	15/04/2023	30/04/2023	15
1.3.4	Suministro e instalación de Tierra Prensa Geotextil tipo RENO COD 168387. Incluye elementos	KM	1,00	$ 84.000.000,00	$ 84.000.000,00	15/04/2023	30/04/2023	15
2	**CIMENTACIONES**							
2.1	**Excavaciones**							
2.1.1	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	71,00	$ 37.000,00	$ 2.629.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.2	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	71,00	$ 37.000,00	$ 2.629.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.3	Viga de cimentación en concreto de 3000psi, incluye formaleta y refuerzo, incluye la conformación de la	M3	14,00	$ 490.000,00	$ 7.000.000,00	15/04/2023	30/04/2023	15
2.1.4	Relleno manual en material seleccionado, compactado en capas alternadas 0.30m. Incluye	M3	13,00	$ 112.000,00	$ 1.456.000,00	15/04/2023	30/04/2023	15
2.1.5	Relleno manual en material seleccionado, compactado en capas alternadas 0.30m. Incluye	M3	13,00	$ 112.000,00	$ 1.456.000,00	15/04/2023	30/04/2023	15
2.1.6	Pilote en gravedad alto con tubería perforada concreto alto de 180mm de diámetro, agregado en capa	M	18,00	$ 232.279,00	$ 4.181.022,00	16/04/2023	30/04/2023	15
2.1.7	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	67,67	$ 62.000,00	$ 4.195.540,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.8	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.9	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.10	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.11	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.12	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.13	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.14	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.15	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.16	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.17	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.18	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.19	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.20	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.21	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.22	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.23	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.24	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.25	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.26	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.27	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.28	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.29	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.30	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.31	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.32	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.33	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.34	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.35	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.36	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.37	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.38	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.39	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.40	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.41	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.42	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.43	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.44	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.45	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.46	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.47	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.48	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.49	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.50	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.51	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.52	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.53	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.54	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.55	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.56	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.57	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.58	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.59	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.60	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.61	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.62	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.63	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.64	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.65	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.66	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.67	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.68	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.69	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.70	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.71	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.72	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.73	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.74	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.75	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.76	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.77	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.78	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.79	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.80	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.81	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.82	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.83	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.84	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.85	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.86	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.87	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.88	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.89	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.90	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.91	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.92	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.93	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.94	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.95	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.96	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.97	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.98	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.99	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.100	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.101	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.102	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.103	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.104	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.105	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.106	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.107	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.108	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.109	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.110	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.111	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.112	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.113	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.114	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.115	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.116	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.117	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.118	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.119	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.120	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.121	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.122	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.123	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de escombros y	M3	174,00	$ 62.000,00	$ 10.788.000,00	01/04/2023	15/04/2023	15
2.1.124	Suministro e instalación de Muro Gavion Caja Reno tipo RENO COD 168100. Incluye elementos de anclaje y	M3	33,37	$ 1.500.721,00	$ 50.085.988,00	08/04/2023	19/04/2023	15
2.1.125	Excavación manual en material común, incluye cargue a mano, disposición de

INTERVINCO S.A.S.
Interventorías, Ingeniería y Construcciones

Nit: 901.013.868 - 0

Colosó, 27/09/2024

Señores:

Alcaldía Municipal de Colosó – Sucre
Shirley Ester Quiñonez Paternina
Secretaría de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente

Juan Javier Alandete Piñeres
Rep. Legal de CONSORCIO RECREACIONAL JA

Asunto: Respuesta a Solicitud de Prórroga N°3 del Contrato LP – OP – 007 – 2023.

A la atención del Consorcio Recreacional JA, luego de revisar la solicitud de prórroga N°3 del contrato LP – OP – 007 – 2023, referente al "Estudio, Diseño y Construcción del Nuevo Proyecto de Infraestructura para la Convivencia Categoría 1B del Municipio de Colosó, Departamento de Sucre", la Interventoría, a cargo de INTERVINCO S.A.S, emite el siguiente pronunciamiento:

1. Se reconoce la existencia de condiciones climáticas adversas que han impactado negativamente en el avance de las actividades de construcción, así como el deterioro de las vías de acceso que han complicado la entrega de materiales esenciales para el proyecto. Estas circunstancias han sido documentadas en informes semanales de interventoría, registros fotográficos y datos proporcionados por el IDEAM.

2. La evaluación del estado actual del proyecto indica que las demoras acumuladas y las dificultades en la obtención de suministros han generado variaciones significativas en el cronograma de ejecución. La propuesta de prórroga hasta el 10 de diciembre de 2024 se considera razonable y necesaria para garantizar la correcta finalización de las obras conforme a las normas y especificaciones técnicas.

3. En función de los motivos expuestos y las evidencias presentadas, la Interventoría avala la solicitud de prórroga N°3 y en virtud de lo expuesto, se disponga una prorroga en el plazo de ejecución del contrato LP-007-OP-2023, hasta el 10 de diciembre del 2024 y, dos (02) meses más al convenio hasta el 18 de diciembre de 2024. En este sentido, se dirige la solicitud a la Entidad Contratante, Municipio de Colosó - Sucre, para evaluar la viabilidad de la ampliación del plazo del contrato. Quedamos a la espera de las instrucciones correspondientes respecto a esta solicitud.

Agradecemos la atención prestada y quedamos a disposición para cualquier aclaración adicional.

Atentamente,

JORGE LUIS PUCHE ORTEGA
R/L DE INTERVENTORIA
INTERVINCO S.A.S.

INTERVINCO S.A.S.
Interventorías, Ingeniería y Construcciones

	Formato	Dirección de Infraestructura
MININTERIOR	**FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B**	FECHA
		22/09/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: 27 Del: 16/09/2024 Al: 22/09/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 188 días


Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	65,93%	Obra Física Ejecutada (%) 0,30%	54,43%
Valor de la Obra	$ -	$ 1.305.511.126,10	Valor de la Obra $ 5.940.441,95	$ 1.077.881.110,98

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	65,93%	54,13%	-11,50%
Durante el periodo	0,00%	0,3%	
Acumulado actual	65,93%	54,43%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



ÁREA POLIVALENTE MULTIPROPÓSITO

ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA



ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA



ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA



ÁREA POLIVALENTE MULTIPROPÓSITO

CÁRCAMO EN CONCRETO 45*30



MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		22/09/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL 1A	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: 27 Del: 16/09/2024 Al: 22/09/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 188 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

CÁRCAMO EN CONCRETO 45*30



URBANISMO

CÁRCAMO EN CONCRETO 45*30



URBANISMO

RAMPAS EN CONCRETO



SUMINISTRO DE COLUMPIO MÚLTIPLE 9 USUARIOS



ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	21	21	24	22	23	21	24	23	24	24	24	21	22	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		700
Lluvias moderadas									2	1			1																			4
Lluvias intensas						3	3				3																					9
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.


NOTA:

Se han presentado retrasos significativos debido a precipitaciones extraordinariamente altas. Según los datos proporcionados en el estado general del tiempo, y soportados con el Boletín Climatológico, el volumen de precipitaciones durante las últimas semanas representan un porcentaje por encima de lo normal o muy por encima de lo normal, manejando un intervalo entre 120% - 160% o incluso >160%. Adjunto a esta nota, se encuentran los reportes meteorológicos detallados, así como evidencias de actividades afectadas por las lluvias.


OBSERVACIONES:


EL PRESENTE CONTRATO TUVO ACTA DE INICIO CON FECHA DE 18 DE MARZO DE 2024, EN DÓNDE SE HAN PRESENTADO CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS, EN EL PRESENTE MES LAS CONDICIONES DE LLUVIAS HAN SIDO MODERADAS E INTENSAS, COMO SE DETALLA EN LA TABLA ANTERIOR.

BOLETÍN CLIMATOLÓGICO



La categoría por encima de lo normal se espera en zonas de menor extensión ubicadas en La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Nariño, Casanare, Vichada, Guainía y Amazonas, con probabilidades entre el 45% y 60%.





MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		22/09/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: 27 Del: 16/09/2024 Al: 22/09/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 188 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

FOTOS ACTIVIDADES AFECTADAS POR LAS LLUVIAS



FOTOS ACTIVIDADES AFECTADAS POR LAS LLUVIAS



FOTOS ACTIVIDADES AFECTADAS POR LAS LLUVIAS



DESCRIPCION OBRAS EJECUTADAS

COMPONENTE 2: Área Polivalente Multipropósito, de acuerdo al seguimiento de las actividades programas en el cronograma de actividades se supervisa el desarrollo de las actividades y su avance. Para la semana 27 correspondiente se realizó la ejecución y en algunos la proyección de las siguientes actividades: Cárcamo en concreto sección 45x30 cm e.=15 cm (medidas exteriores) f'c=3000 psi, acabado a la vista, formaleta tablero liso aglomerado e.=19mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye la rejilla metálica según diseño; Pintura 100% acrílica para exteriores, diluible con agua, de acabado mate. Alta resistencia a la intemperie y al ataque de hongos . Excelente cubrimiento y óptima adherencia, acabado terso, hidro-repelente, con alta retención del color y lavabilidad. Aplicado en tres capas sobre muros, filos, esquineros y dilataciones. Incluye preparación de superficie; Estructura metálica para Cubierta paja sintética. Incluye suministro, fabricación, sistema de anclaje a vigas de coronación, montaje, soldadura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado en Esmalte sintético alquídico a base de aceite, tres (3) capas aplicadas con pistola, con preparación de superficie y diluyente; Palma sintética e=7 mm de 1.0 x 0.6 m. Incluye elementos de fijación.

COMPONENTE 3: Edificio de Servicios, durante el transcurso de la presente semana y lo plasmado en el cronograma de obras se proyecta la ejecución de las actividades correspondientes a: Piso en baldosa de grano de mármol vibroprensado 30x30 cm, grano #1. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo; Guardaescoba en baldosa grano de mármol vibroprensado L.=30 cm, grano 1 h.=6 cm. Incluye mortero de pega; Estuco Acrílico monocomponente, presentación plástica, producto listo para usar, aplicado en tres capas con llana metálica sobre muros, techos, filos, esquineros y dilataciones. Incluye preparación de superficie y lijado para acabado final; Pintura Vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres capas sobre muros ,techo, filos, esquineros y dilataciones. Incluye preparación de superficie; Enchape de muro en cerámica de 30.1 x 75.3 cm plano blanco. Incluye Incluye win esquinero en aluminio, embouille, aparejado según diseño. Pegado con mezcla lista de fabrica; Mesón en concreto con faldón Ds.=60 cm e.=8 cm f'c=3000 psi, con acabado superior y faldón en granito fundido y pulido e.=2 cm. Incluye soportes en ladrillo estructural, refuerzos de placa en malla electrosoldada 15x15, 5mm y elementos de dilataciones en bronce según diseño; Estructura metálica para Cubierta Termoacustica 2mm. Incluye suministro, fabricación, sistema de anclaje a vigas de coronación, montaje, soldadura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado en Esmalte sintético alquídico a base de aceite, tres (3) capas aplicadas con pistola, con preparación de superficie y diluyente; Cielo raso en PVC acabado tipo amaderado e=10mm. Incluye elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento; Cubierta en lamina termoacustica PVC e=2mm. Incluye accesorios de anclaje, sellante en juntas según especificaciones del fabricante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento; Valvula de Bola o de Corte a2 diametro 1/2"x1/2"; Valvula de Bola o de Corte a2 diametro 3/4"x3/4"; Valvula de Bola o de Corte a2 diametro 1"x1"; Valvula de Bola o de Corte a2 diametro 1 1/4"x1 1/4"; Cheque diametro 1/2"x1/2"; Cheque diametro 1 1/4"x1 1/4"; Manometro diametro 1 1/4"; Caja de acceso a valvulas; Valvula de pie de 1 1/4"; Flotador de 1/2"; SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR CADA BOMBA CaudalTOTAL: 1.79 LPS-28.37 GPM Presión: 20.00 mca-28.6 PSI Potencia: 1.00HP Bomba centrifuga con variador de velocidad INCLUYE: Válvulas, manómetros y accesorios en general; Tanque hidroneumatico alta presion 150 litros. Vertical, membrana; Suministro, transporte e instalación de medidor electromagnetico de 16mm (1/2") incluye caja de andén, tee partida o collar de derivación según como se requiera, válvula de incorporación, codos o medios codos de cobre, llave de corte universal, universal, machos cobre, filtro,válvula de paso, cheque y accesorios necesarios para su adecuada instalación. Todos los accesorios serán en 1/2"; SISTEMA RESPALDO CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR CADA BOMBA CaudalTOTAL: 1.79 LPS-28.37 GPM Presión: 20.00 mca-28.6 PSI Potencia: 1.00HP Bomba centrifuga con variador de velocidad INCLUYE: Válvulas, manómetros y accesorios en general; Sifon180° 2"; SIFON-REJILLA de piso 2"; VALVULA MINIVENT 2" DURMAN CON CAJILLA; Construcción de cajas de inspección de 60 x 60cm, en concreto de 21Mpa. con impermeabiIizante integral,y tapa en concreto, la tapa con su respectivo herraje. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios apara su correcta construcción y funcionamiento; Suministro e instalación de sanitario Taza Báltica plus de entrada superior con válvula push de empotrar. Incluye acoples, conexión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento; Suministro e instalación de orinal Gotta de entrada superior con válvula push de empotrar. Incluye acoples, conexión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento; Suministro e instalación de lavamanos porcelánico de empotrar, con orificios para grifería Aquajet. Incluye sifón tipo botella, acoples, conexión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento; Suministro e instalación de Dispensador Jabon 1.2 Lt en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje y todo lo necesario para su correcto funcionamiento; Suministro e instalación de Dispensador de Toallas en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje y todo lo necesario para su correcto funcionamiento; Suministro e instalación de Dispensa Papel Higienico en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje y todo lo necesario para su correcto funcionamiento; Suministro e instalación de Espejo para baño de discapacitados cristal 4mm biselado, medidas 80x60cm (medidos en alzado), incluye soporte y estructura metálica cal.20 con acabado electrostático, elementos complementarios para función pivotante, empaques, anclajes, relacionados y complementarios. Incluye accesorios de anclaje y todo lo necesario para su correcto funcionamiento; Suministro e instalación de espejo Cristal biselado 4mm, medidas 80x60cm. Incluye accesorios de anclaje y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

COMPONENTE 4: Edificio Complementario, Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 27 se proyectan las siguientes actividades: Estructura metálica para Cubierta Termoacustica 2mm. Incluye suministro, fabricación, sistema de anclaje a vigas de coronación, montaje, soldadura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado en Esmalte sintético alquídico a base de aceite, tres (3) capas aplicadas con pistola, con preparación de superficie y diluyente; Cubierta en lamina termoacustica PVC e=2mm. Incluye accesorios de anclaje, sellante en juntas según especificaciones del fabricante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento; Cielo raso en PVC acabado tipo amaderado e=10mm. Incluye elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento; Piso en baldosa de grano de mármol vibroprensado 30x30 cm, grano #1. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo; Guardaescoba en baldosa grano de mármol vibroprensado L.=30 cm, grano 1 h.=6 cm. Incluye mortero de pega.

MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		22/09/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto	
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023		
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023	
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00		
Plazo Inicial:	18/03/2024		
Plazo Actualizado:	seis (06) meses		
Fecha de Iniciación:	18/03/2024		
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024		

Semana Número: 27 Del: 16/09/2024 Al: 22/09/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 188 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

COMPONENTES 5: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 27 se proyectan las siguientes actividades: Suministro e instalación de bebedero de agua con pedestal en concreto a la vista, poceta en acero inoxidable y frigería con sistema push Tipo PM103. Med 0,97 X 0,35 X 0,35 m. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento; Suministro e instalación de Gimnasio Elíptica. Ejercita los músculos de las piernas y la cadera. Med. L 1,40 x A 0,70 x H 1,85 m. Incluye todo lo necesaro para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.); Suministro e instalación de Gimnasio Caminador Aéreo. Desarrolla y fortalece los músculos de las extremidades inferiores y de la cintura. Med. L 0,45 x A 1,20 x H 1,30 m. Incluye todo lo necesaro para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.); Suministro e instalación de Gimnasio Timones. Mejora el desarrollo muscular de los miembros superiores. Med. L 0,85 x A 0,40 x H 1,88 m. Incluye todo lo necesaro para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.); Suministro e instalación de Gimnasio Columpio. Desarrollo, fortalecimiento y movilidad de las pierna. Med. L 2,0 x A 0,62 x H 1,65 m. Incluye todo lo necesaro para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.).

COMPONENTES: Para el seguimiento del componente 6, en la semana 27, se proyectan las siguientes actividades: Recubrimiento tru-flex antideslizante sintético 100% acrílico para espacios deportivos y recreativos. Sistema de 3 capas una base de cuarzo y dos capaz de tru-flex de color; Demarcación de pista de trote en pintura 100% acrílica antideslizante, e=0.10 m.

COMPONENTES: Para el componente 7 y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, corresponde la ejecución de las siguientes actividades: Suministro e instalación de piso en caucho EPDM granulado, e= 2 cm. Incluye adhesivo, compactación, nivelación, variación de colores y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento; Suministro e instalación de Cerramiento en Baranda M-81. Incluye todos los accesorios y demás para su correcto funcionamiento; Suministro e instalación de bebedero de agua con pedestal en concreto a la vista, poceta en acero inoxidable y frigería con sistema push Tipo PM103. Med 0,97 X 0,35 X 0,35 m. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento; Suministro e instalación de Columpio Múltiple 9 usuarios tipo IDRD CIO 106849. Incluye elementos de anclaje y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento; Suministro e instalación de Balsa 4 muelles tipo IDRD CIO 101020. Incluye elementos de anclaje y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

COMPONENTE 8: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 27 se proyectaron las actividades que corresponden a: Pradización en pasto/césped Kikuyo, capa vegetal de cobertura ya enraizada en zonas verdes. Incluye tierra negra e= 10 cm, elemento vegetal y plantación; Jardinera de duranta, 10 plantas por cada metro cuadrado. Incluye tierra negra e= 10 cm, elemento vegetal y plantación; Suministro e instalación de Caneca en Acero Inoxidable 75Lts Barcelona Tipo M-121. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento; Suministro e instalación de banca con espaldar prefabricada en concreto Tipo M-30. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento; Suministro e instalación de banca sin espaldar prefabricada en concreto Tipo M-31. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento; Suministro e instalación de Cicloparqueadero Tipo 1 M-100 IDRD. Elaborado en tuberia redonda estructural de 1 1/2" con capacidad para 3 bicicletas, acabado en pintura en polvo secoTGIC horneable con aplicación electrostatica; Señal salida 25 X 50 (SUM + INST); Señal servicios 33X30 (SUM + INST); Señal tribunas 30X1,20 (SUM + INST); Señal Ruta de Evacuación (SUM + INST); Señal Salida Emerg sin Iluminación (SUM + INST); Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST); Señal Prohibido Fumar (SUM + INST); Señal conmemorativa de entrega (SUM + INST); Rejilla tipo cupula tragante 2"; Canoa metalica para aguas lluvia de 20*10 cm; Cárcamo en concreto sección 45x30 cm e.=15 cm (medidas exteriores) f'c=3000 psi, acabado a la vista, formaleta tablero liso aglomerado e.=19mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Construcción carcamo de 45 cm.

COMPONENTE 9: Para el componente en mención y de acuerdo a lo plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 27 se necesitan proyectar las tareas que plasmaré a continuación: Alimentador para Tablero TN en 3N°6 + 1N°10 THHN-incluye terminales; Tablero Bifasico de 24 circuitos con espacio para totalizador; Breaker industrial trifasico de 30A a 100A. 25 Ka; Breaker Monopolar Enchufable 20 A; Breaker Bipolar Enchufable 2*20 A; Luminaria Tipo Epsilon led 40W. Incluye : Cable encauchetado, cable de cobre desnudo 8,fotocelda, conector tipo gel, terminal y tuberia pvc para llegar desde registro hasta lampara; Poste métalico certificado de 4 mts; Luminaria de emergencia; Luminaria tipo tortuga; Luminaria Panel Led RD 12W/6500 K; Luminaria Led Hermetica 36W/6500 K; Canalización en 1 pvc Ø 1"; Varilla Cooperwell de 5/8"*2.4 mts.


**En el análisis continuo de los informes semanales de interventoría, se observa una proyección recurrente de diversas actividades, particularmente aquellas relacionadas con suministros. Esta repetición se debe a que dichas actividades requieren que otras tareas previas estén completas al 100% antes de proceder con su instalación.
Adicionalmente, a partir de la semana correspondiente al periodo 26, se iniciará el seguimiento conforme a la programación ajustada con la prórroga número 2. Este seguimiento tiene como objetivo ajustar los porcentajes de ejecución a la realidad del avance de la obra. Para el informe de la semana anterior se contaba con un avance de la nueva programación del 65,93% contra un ejecutado del 55,13%. Durante la presente semana se siguió ejecutando actividades y lograr el avance requerido, ademas se realizó seguimiento de las actividades mencionadas por componente.**

Nota: Es crucial que el contratista del proyecto priorice el avance del plan de contingencia, el cual no ha progresado como se esperaba. Se recomienda realizar una revisión exhaustiva del estado actual del plan, identificar los obstáculos que han limitado su desarrollo y establecer un cronograma claro para su implementación. Al abordar estas acciones de manera inmediata, se podrá mejorar la preparación ante contingencias y asegurar la continuidad del proyecto.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	INTERVENTOR Nombre **JORGE LUIS PUCHE ORTEGA** CC 1001627
	SUPERVISOR MUNICIPAL Nombre **SHIRLEY E. QUIÑONEZ PATERNINA** CC

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO No 1620 DE 2023

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE."

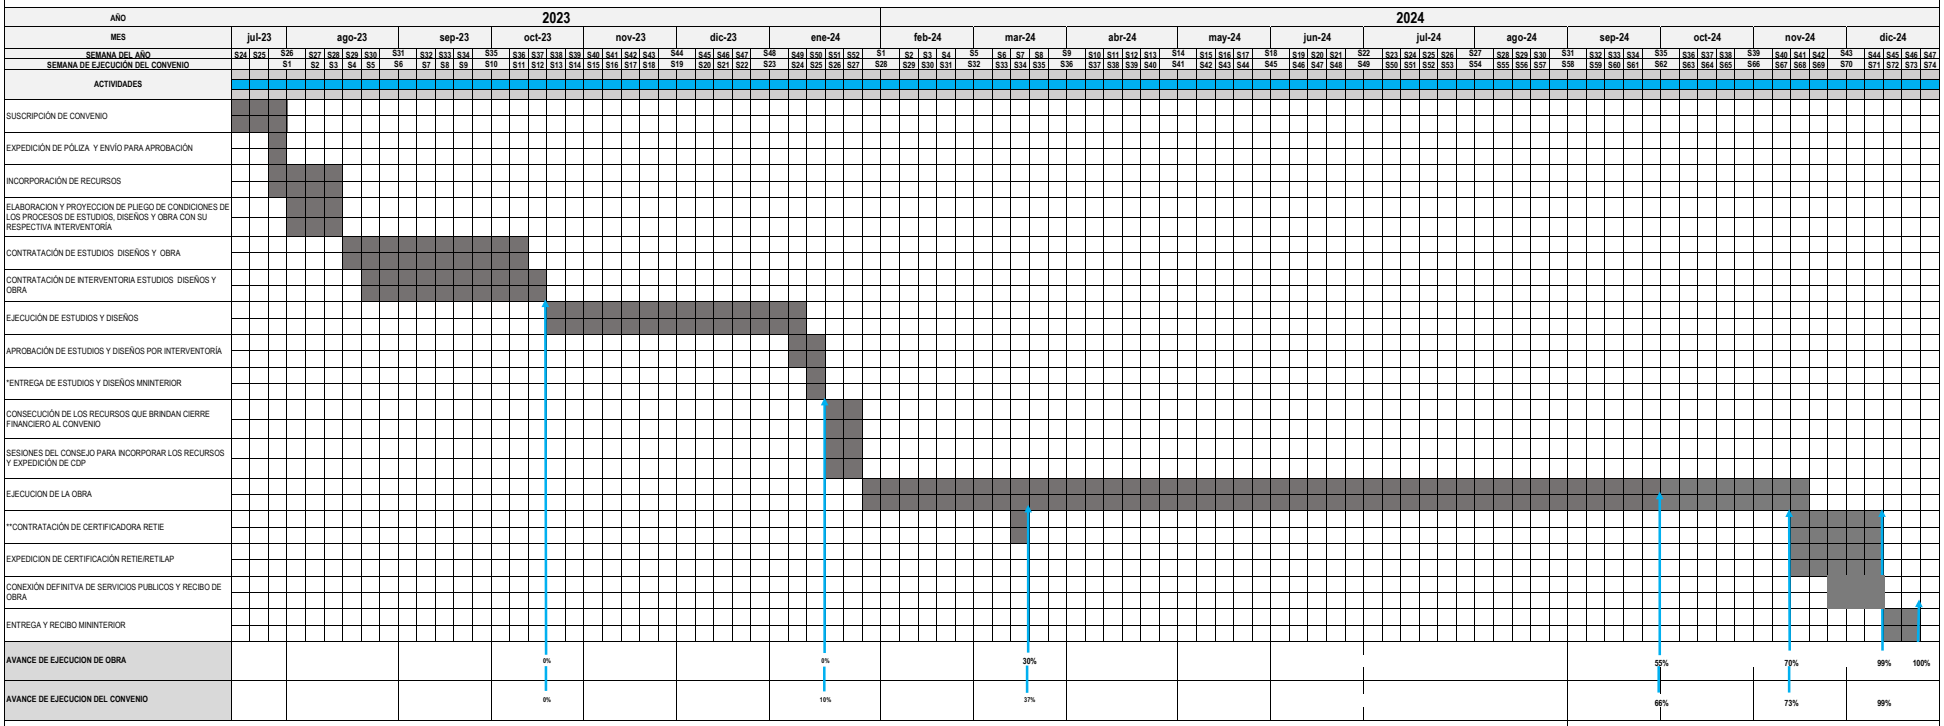

SHIRLEY QUIÑONEZ PATERNINA
Secretaria de Planeacion, Infraestructura y Medio Ambiente
Supervisor por el Municipio de Colosó, Sucre

DAGER PATERNINA ALQUERQUE
ALCALDE
Representante Legal
MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE

ING. JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
SUPERVISOR CONVENIO
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

PRIMERA PRÓRROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1620 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON Y EL MUNICIPIO DE COLOSÓ - SUCRE - OTROSÍ No. 01.

Entre los suscritos, en adelante **LAS PARTES**, por una parte, **YAMEL RUIZ ORJUELA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.878.674, en su calidad de Secretario General del Ministerio del Interior, nombrado mediante Decreto 851 del 29 de mayo de 2023 y posesionado el 01 de junio de 2023, con efectos a partir de la misma fecha, quien actúa en representación de la **NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR-**, con **NIT 830.114.475-6**, facultado para contratar según las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, y la Resolución No. 0150 de 2021, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO**, y por la otra, **DAGER MANRIQUE PATERNINA ALQUERQUE,** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 92.601.345; en calidad de Alcalde, actuando en representación del municipio de **COLOSÓ – SUCRE**, en adelante **EL MUNICIPIO**, con NIT 892.280.053-7; posesionado el 29 de diciembre de 2023 en la Notaria Única del Circulo de Colosó (Sucre), y facultado para suscribir el presente documento, (en adelante LAS PARTES**). LAS PARTES** acreditan con la suscripción del presente documento que no se encuentran incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales vigentes; hemos acordado celebrar la primera prórroga del Convenio 1620 de 2023, previas las siguientes:


CONSIDERACIONES

1.- Que el 28 de junio de 2023, **EL MINISTERIO** y **EL MUNICIPIO,** suscribieron el Convenio No. 1620 de 2023, por valor de **DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.383.023.552)**, cuyo objeto es: ***"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE."*** El cual, inició el 19 de julio de 2023.

2.- Que el plazo inicial de ejecución del Convenio se pactó hasta el 18 de junio de 2024.

3- Que **EL MUNICIPIO**, mediante oficio de fecha 31 de mayo de 2024, solicitó a la supervisión por parte del **MINISTERIO** la primera prórroga al convenio teniendo en cuenta que:

> *"(…) 1. Que el 08 de marzo de 2024, se realizó la entrega formal de los Estudios y Diseños del proyecto Infraestructura para la convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre en las instalaciones del Ministerio del Interior en la ciudad de Bogotá. Lo anterior, representando un retraso de 2 meses de ejecución por situaciones ajenas al contratista.*
> *2. Que el 18 de marzo de 2024, se avala el inicio de obra del proyecto infraestructura para la convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre, teniendo en cuenta que, para la fecha la administración municipal dio cumplimiento a las obligaciones específicas requeridas para iniciar actividades de obra.*
> *3. Que, durante el segundo trimestre del año 2024 se han presentado condiciones climáticas adversas en el municipio de Coloso - Sucre; afectando la ejecución de la obra de manera directa, lo anterior, debido al incremento de las precipitaciones en el sector y a los alrededores; todo esto ocasionando la disminución del rendimiento en la ejecución de las actividades de manera desfavorable, puesto que, produce trabajo a medio turno por el estado del tiempo. (Lo precitado se puede verificar en los informes semanales de interventoría, el registro fotográfico y el IDEAM).*

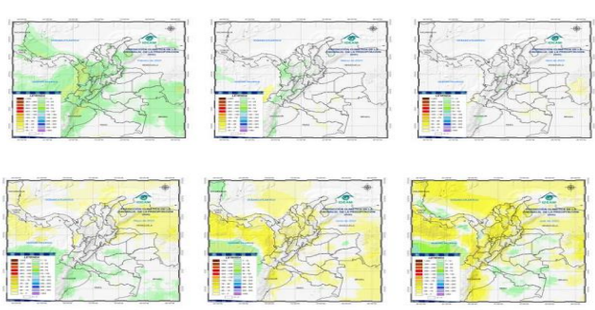

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B 8-46
Conmutador (1) 242 74 00 ♦**Línea gratuita** 018000910403
Sitio Webwww.mininterior.gov.co♦**Servicio al Ciudadano** servicioalciudadano@miniterior.gov.co
Código postal 111711 ♦ Bogotá D.C., Colombia

4. *Vale la pena mencionar que, el mal estado de las vías de acceso tanto al municipio como a la zona de ejecución del proyecto, sobre todo en los días con fuertes precipitaciones, ha ocasionado retrasos en la llegada del suministro de obra, toda vez que, el ingreso pone en riesgo la seguridad vial de los ciudadanos y de los trabajadores.*
5. *Por otra parte, se ha dificultado la adquisición de materiales como relleno en material seleccionado para el mejoramiento de suelo en el área de intervención, visto que, las canteras o fuentes que proveen este material no han despachado, ya que, también se han visto afectados por el mal tiempo en la zona, imposibilitando la entrada de volquetas a los sectores de suministro ocasionando retrasos en la ejecución de la obra.*
6. *Que de acuerdo con lo avalado por la interventoría el porcentaje de avance de ejecución del Contrato de Estudios, Diseños y Obra LP-007-OP-2023, se encuentra en un 34,65% aproximadamente de acuerdo con el informe semanal de interventoría N°11. Quedando pendiente actividades como cubiertas, ornamentación, acabados de obra, urbanismo, instalaciones eléctricas, la dotación que haya lugar y las certificaciones exigidas por parte del municipio y el Ministerio del Interior.*
7. *El estado actual del proyecto, ha sido el resultado de los inconvenientes precitados durante el primer trimestre del año 2024, generando retrasos significativos en las actividades de obra pendientes por ejecutar.*
8. *El contratista de Estudios, Diseños y Obra aporta a la administración municipal de Coloso – Sucre un plan de contingencia para la finalización de la obra de la referencia al 100% de ejecución, en el mismo informa la finalización de la obra física para finales del mes de septiembre de 2024.*
9. *De acuerdo con las actividades que se vienen ejecutando con relación al contrato de obra No. LP-007-OP-2023 y a los diferentes requisitos requeridos para la culminación de la misma como: I) la finalización de las actividades pendientes de obra, II) la llegada del suministro y dotación del proyecto, III) la consecución de las conexiones definitivas de acueducto, alcantarillado energía y IV) el tiempo requerido para el recibo y entrega de la obra al interventor y supervisor del municipio de Coloso – Sucre, se evidencia que se generó una variación en el cronograma para la finalización de la obra correspondiente al proyecto infraestructura para la convivencia 1B y el cumplimiento a cabalidad de los objeto contractual de acuerdo a las situaciones presentadas duranta la ejecución de los Estudios, Diseños y Obra del proyecto*

   El contratista de Interventoría de Estudios, Diseños y Obra informa que, teniendo en cuenta las justificaciones técnicas, jurídicas y financieras suministradas y soportadas por parte del contratista, las cuales, soportan la solicitud de adición en tiempo que permita el cumplimiento del objeto contractual, la interventoría del Proyecto Infraestructura para la Convivencia de Coloso – Sucre considera necesaria y avala la solicitud de prórroga para lograr la ejecución del cien por ciento de las obligaciones suscritas y el cumplimiento de la funcionalidad del proyecto derivado del convenio interadministrativo 1620 de 2023 suscrito con el ministerio de interior, lo que permita la correcta inversión de los recursos públicos destinados para la construcción del proyecto de infraestructura para la convivencia categoría 1B del municipio de coloso – sucre.

   Teniendo en cuenta que, a la fecha se presentó una solicitud de prorroga o ampliación de plazo hasta el 30 de septiembre de 2024, al contrato de obra 007 de 2023, a cargo del contratista CONSORCIO RECREACIONAL JA.

   La presente supervisión evaluando las situaciones presentadas una vez suscrita el acta de inicio para desarrollar los estudios y diseños correspondientes al proyecto, lo cual tenía una proyección de 2 meses, y que pese al esfuerzos del contratista, se presentó hasta el 08 de marzo de 2024 el resultado de la consultoría, lo que permitió dar inicio a la etapa dos del proyecto referente a la ejecución de obra donde se han realizados avances significativos soportados en el informe N.º. 11 de interventoría, el cual, reporta un avance del 34.65 % de avance, esto debido a la disponibilidad de materiales, el estado de las vías y las condiciones climáticas que han afectado el desarrollo de lo proyectado en el cronograma de obras, la presente considera técnicamente viable la solicitud realizada por los contratistas.

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B 8-46
Conmutador (1) 242 74 00 ♦**Línea gratuita** 018000910403
Sitio Webwww.mininterior.gov.co♦**Servicio al Ciudadano** servicioalciudadano@miniterior.gov.co
Código postal 111711 ♦ Bogotá D.C., Colombia

Así las cosas, como supervisora por parte del ente territorial, que se hace necesario elevar la solicitud de ampliación en tiempo del convenio interadministrativo 1620 de 2023 para conservar el equilibrio contractual y se pueda dar cumplimiento a satisfacción del Proyecto infraestructura para la Convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre. Motivo por el cual, se solicita respetuosamente al Ministerio del Interior la ampliación del mismo por un término de 4 meses, es decir, hasta el 18 de octubre de 2024. Tiempo necesario para realizar el recibo de la obra para el mes de septiembre de 2024 y realizar entrega a la supervisión del Ministerio del Interior para el mes de octubre de la presente vigencia. (…)"

4.- Que mediante memorando **No. 2024-3-003122-018747 Id: 347085** del 11 de junio de 2024, radicado de conformidad con la Resolución No. 0363 del 19 de marzo de 2020, por correo electrónico en la Subdirección de Gestión Contractual, el supervisor del Convenio solicitó realizar la primera prórroga, teniendo en cuenta que:

"(…) Teniendo en cuenta que el convenio interadministrativo de cofinanciación 1620 de 2023 se encuentra vigente a la fecha y con un avance de obra del 34,65% según informe de interventoría N°11, en mi calidad de supervisora del Convenio Interadministrativo 1620 de 2023, y de acuerdo con los informes y validaciones de la supervisión del municipio e interventoría de obra, considero técnicamente viable la prórroga del convenio. Los motivos expuestos por la supervisión del municipio de Coloso – Sucre, mediante solicitud de prórroga remitida el 07 de junio del 2024, son considerados procedentes y proporcionales al tiempo de prórroga solicitado Las razones presentadas que han afectado las líneas base del convenio interadministrativo 1620 de 2023 incluyen:

1. Condiciones Climáticas: Factores meteorológicos adversos que han dificultado el progreso de la obra.
2. Mal Estado de la Vía – Acceso Principal: La deteriorada condición de la vía principal ha obstaculizado el transporte y la logística.
3. Disponibilidad de Materiales: Problemas en la cadena de suministro han retrasado la llegada de materiales necesarios para la construcción.

Para finalizar la obra, según el cronograma aportado por la administración municipal, se requiere completar los siguientes procesos:

I) Ejecución de obra. (2.5 meses aprox.)
II) Recibo y aprobación de la obra por parte de la interventoría. (0.5 meses aprox.)
III) Recibo y aprobación de la obra por parte del municipio. (0.5 meses aprox.)
IV) Entrega y recibo de obra Ministerio de Interior. (0.5 meses aprox.)

En vista de lo anterior, se solicita ampliar el término del convenio hasta el 18 de octubre de 2024. Este plazo adicional permitirá completar la obra al 100% y garantizar la entrega con todos sus servicios públicos definitivos, asegurando el cumplimiento cabal del objeto contractual.

Razón por la cual, se solicita ampliar el término del mismo para la finalización de la obra, cumpliendo así a cabalidad el objeto contractual del convenio interadministrativo 1620 de 2023. Visto que, prima para las partes la terminación del convenio preponderando el garantizar la pronta entrega de la obra y el disfrute de la comunidad. En ese orden de ideas, el plazo estimado y solicitado por parte del municipio como ente ejecutor para la finalización de la obra es del 18 de octubre de 2024. Es un plazo adecuado y necesario para garantizar la funcionalidad y entrega del proyecto con todos sus servicios públicos definitivos para el feliz término del Convenio Interadministrativo 1620 de 2023. (…)"

5.- Que con fundamento en la obligación número veintisiete de la Cláusula segunda del Convenio, **EL MUNICIPIO** presentó a la supervisión por parte del **MINISTERIO** solicitud de primera prórroga del convenio 1620 de 2023.

6.- Que según informe de interventoría No. 11, con corte al 02 de junio de 2024, la obra presenta un avance del 34.65%.

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B 8-46
Conmutador (1) 242 74 00 ♦**Línea gratuita** 018000910403
Sitio Webwww.mininterior.gov.co♦**Servicio al Ciudadano** servicioalciudadano@miniterior.gov.co
Código postal 111711 ♦ Bogotá D.C., Colombia

7.- Que en virtud de que los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, de manera oportuna para asegurar el cumplimiento de los fines estatales, de acuerdo a los argumentos expuestos por **EL MUNICIPIO**, y teniendo en cuenta que el Convenio está vigente, se suscribe la primera prórroga siendo las causas señaladas por el supervisor del convenio por parte de **EL MINISTERIO** relacionadas con la conveniencia de realizar esta , que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA- MODIFICAR - PRÓRROGA. Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo No. **1620 de 2023**, hasta el 18 de octubre de 2024, razón por la cual se modificará la cláusula cuarta del anexo contractual del Convenio, la cual quedará así:

*"**CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN**: El plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo de cofinanciación será hasta el 18 de octubre de 2024."*

CLAUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hace parte integral de la presente modificación electrónica, el presente anexo de condiciones, la solicitud presentada por el Supervisor del Convenio identificada con el radicado **No. 2024-3-003122-018747 Id: 347085** del 11 de junio de 2024, y los documentos soporte aportados con la solicitud.

CLÁUSULA TERCERA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. En lo demás continúan vigentes, en sus partes, las cláusulas y estipulaciones del Convenio.

CLÁUSULA CUARTA. GARANTÍA ÚNICA. **EL MUNICIPIO** deberá ampliar las vigencias de la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, de conformidad con la presente prórroga, de acuerdo con las coberturas y vigencias establecidas en la Cláusula octava del mismo.

CLÁUSULA QUINTA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente documento se perfecciona con la firma de las partes en la plataforma dispuesta por Colombia Compra Eficiente para el efecto.

Aprobó: *Dr. Pedro Jovanny Tenjo Sánchez – Subdirector De Gestión Contractual (E)*
Proyectó: *Jorge Luis Corrales Ordosgoitia – Abogado Contratista S.G.C. J.L.C.O.*

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B 8-46
Conmutador (1) 242 74 00 ♦**Línea gratuita** 018000910403
Sitio Webwww.mininterior.gov.co♦**Servicio al Ciudadano** servicioalciudadano@miniterior.gov.co
Código postal 111711 ♦ Bogotá D.C., Colombia

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401608632

PÓLIZA No: 540 - 47 - 994000026544 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA** COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	25	06	2024

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	25	06	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **MUNICIPIO DE COLOSO** IDENTIFICACIÓN: NIT **892.280.053-7**

DIRECCIÓN: CALLE 13 N° 4 - 62 PLAZA PRINCIPAL CIUDAD: COLOSÓ, SUCRE TELÉFONO: 6052949937

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.114.475-6**

BENEFICIARIO: **LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.114.475-6**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	14/07/2023	18/05/2025	476,604,710.40

BENEFICIARIOS
NIT 830114475 - LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1620 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE.

TEXTO ACLARATORIO

SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS SEGUN PRIMERA PRÓRROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1620 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON Y EL MUNICIPIO DE COLOSÓ - SUCRE - OTROSÍ No. 01. PRORROGANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 18 DE OCTUBRE DE 2024. LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***476,604,710.40	$ ********1,286,732	$*****5,000.00	$ ******245,429	$ ********1,537,161

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
SANDRA PATRICIA BARRERA MORALES	8852	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÈN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000540160863

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDC20790807FE7F58

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
