
Proyecto Colosó - FASE 2.mpp

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Pred | Nombres de los recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Proyecto Colosó | 46 días | lun 3/02/25 | mié 2/04/25 | | |
| 2 | | Capítulo 1 | 11 días | lun 3/02/25 | sáb 15/02/25 | | |
| 3 | | Actividad 1.01 | 3 días | lun 3/02/25 | mié 5/02/25 | | Agua potable |
| 4 | | Actividad 1.02 | 3 días | lun 3/02/25 | mié 5/02/25 | | |
| 5 | | Actividad 1.03 | 1 día | jue 6/02/25 | jue 6/02/25 | 4 | |
| 6 | | Actividad 1.04 | 2 días | jue 6/02/25 | vie 7/02/25 | 4 | |
| 7 | | Actividad 1.05 | 3 días | sáb 8/02/25 | mié 12/02/25 | 6 | |
| 8 | | Actividad 1.06 | 1 día | sáb 8/02/25 | lun 10/02/25 | 6 | |
| 9 | | Actividad 1.07 | 2 días | mié 12/02/25 | vie 14/02/25 | 7 | |
| 10 | | Actividad 1.08 | 1 día | vie 14/02/25 | sáb 15/02/25 | 9 | |
| 11 | | Actividad 1.09 | 3 días | lun 3/02/25 | mié 5/02/25 | | Gas |
| 12 | | Actividad 1.10 | 1 día | lun 3/02/25 | lun 3/02/25 | | |
| 13 | | Actividad 1.11 | 2 días | jue 6/02/25 | vie 7/02/25 | 11 | |
| 14 | | Actividad 1.12 | 0.5 días | mar 11/02/25 | mar 11/02/25 | 76 | |
| 15 | | Actividad 1.13 | 1 día | mar 11/02/25 | mié 12/02/25 | 76 | |
| 16 | | Actividad 1.14 | 1 día | lun 3/02/25 | lun 3/02/25 | | |
| 17 | | Actividad 1.15 | 1 día | sáb 8/02/25 | lun 10/02/25 | 13 | |
| 18 | | Actividad 1.16 | 0.5 días | sáb 8/02/25 | sáb 8/02/25 | 13 | |
| 19 | | Capítulo 2 | 38 días | lun 3/02/25 | vie 21/03/25 | | INSTALACIONES E |
| 20 | | Actividad 2.01 | 1 día | lun 3/02/25 | lun 3/02/25 | | Eléctricas |
| 21 | | Actividad 2.02 | 2 días | lun 3/02/25 | mar 4/02/25 | | |
| 22 | | Actividad 2.03 | 2 días | lun 3/02/25 | mar 4/02/25 | | |
| 23 | | Actividad 2.04 | 2 días | lun 3/02/25 | mar 4/02/25 | | |
| 24 | | Actividad 2.05 | 5 días | mié 5/02/25 | mar 11/02/25 | 23 | |
| 25 | | Actividad 2.06 | 5 días | mié 5/02/25 | mar 11/02/25 | 23 | |
| 26 | | Actividad 2.07 | 1 día | mar 11/02/25 | mié 12/02/25 | 24,25 | |
| 27 | | Actividad 2.08 | 1 día | mar 11/02/25 | mié 12/02/25 | 24,25 | |
| 28 | | Actividad 2.09 | 1 día | mié 12/02/25 | jue 13/02/25 | 26,2 | |
| 29 | | Actividad 2.10 | 2 días | mar 11/02/25 | jue 13/02/25 | 76 | |
| 30 | | Actividad 2.11 | 0.5 días | mar 11/02/25 | mar 11/02/25 | 76 | |
| 31 | | Actividad 2.12 | 0.5 días | mar 11/02/25 | mar 11/02/25 | 76 | |
| 32 | | Actividad 2.13 | 0.5 días | mar 11/02/25 | mar 11/02/25 | 76 | |
| 33 | | Actividad 2.14 | 0.5 días | mar 11/02/25 | mar 11/02/25 | 76 | |
| 34 | | Actividad 2.15 | 1 día | mar 11/02/25 | mié 12/02/25 | 76 | |
| 35 | | Actividad 2.16 | 0.5 días | jue 13/02/25 | jue 13/02/25 | 28 | |
| 36 | | Actividad 2.17 | 3 días | vie 14/02/25 | mar 18/02/25 | 35 | |
| 37 | | Actividad 2.18 | 30 días | lun 3/02/25 | mié 12/03/25 | | |
| 38 | | Actividad 2.19 | 15 días | mar 18/02/25 | sáb 8/03/25 | 36 | |
| 39 | | Actividad 2.20 | 0.5 días | mar 18/02/25 | mar 18/02/25 | 36 | |
| 40 | | Actividad 2.21 | 1 día | vie 21/03/25 | vie 21/03/25 | 77 | |
| 41 | | Actividad 2.22 | 0.5 días | mar 18/02/25 | mar 18/02/25 | 36 | |
| 42 | | Actividad 2.23 | 4 días | mar 18/02/25 | sáb 22/02/25 | 36 | |
| 43 | | Actividad 2.24 | 2 días | mar 18/02/25 | jue 20/02/25 | 36 | |
| 44 | | Actividad 2.25 | 10 días | lun 24/02/25 | vie 7/03/25 | 42 | |
| 45 | | Actividad 2.26 | 0.5 días | vie 7/03/25 | vie 7/03/25 | 44 | |
| 46 | | Actividad 2.27 | 8 días | vie 7/03/25 | mar 18/03/25 | 44 | |
| 47 | | Actividad 2.28 | 4 días | sáb 8/03/25 | jue 13/03/25 | 45 | |
| 48 | | Actividad 2.29 | 1 día | lun 3/03/25 | lun 3/03/25 | 51 | |
| 49 | | Actividad 2.30 | 0.3 días | lun 3/03/25 | lun 3/03/25 | 51 | |
| 50 | | Actividad 2.31 | 2 días | lun 3/03/25 | mié 5/03/25 | 49 | |
| 51 | | Actividad 2.32 | 20 días | mié 5/02/25 | sáb 1/03/25 | 23 | |
| 52 | | Actividad 2.33 | 0.5 días | mié 19/02/25 | mié 19/02/25 | 41 | |
| 53 | | Actividad 2.34 | 6 días | lun 3/03/25 | lun 10/03/25 | 51 | |
| 54 | | Actividad 2.35 | 5 días | lun 10/03/25 | sáb 15/03/25 | 53 | |
| 55 | | Actividad 2.36 | 0.5 días | lun 17/03/25 | lun 17/03/25 | 54 | |
| 56 | | Actividad 2.37 | 1 día | lun 17/03/25 | lun 17/03/25 | 54 | |
| 57 | | Actividad 2.38 | 0.5 días | lun 17/03/25 | lun 17/03/25 | 54 | |
| 58 | | Actividad 2.39 | 0.5 días | lun 17/03/25 | lun 17/03/25 | 54 | Voz y datos |
| 59 | | Actividad 2.40 | 0.5 días | lun 17/03/25 | lun 17/03/25 | 58 | |
| 60 | | Actividad 2.41 | 2 días | mar 18/03/25 | mié 19/03/25 | 59 | |
| 61 | | Actividad 2.42 | 0.5 días | jue 20/03/25 | jue 20/03/25 | 60 | |
| 62 | | Actividad 2.43 | 0.3 días | mar 11/02/25 | mar 11/02/25 | 76 | |
| 63 | | Actividad 2.44 | 0.3 días | mar 11/02/25 | mar 11/02/25 | 76 | |
| 64 | | Actividad 2.45 | 0.5 días | mar 11/02/25 | mar 11/02/25 | 76 | |
| 65 | | Actividad 2.46 | 20 días | mar 11/02/25 | vie 7/03/25 | 76 | |
| 66 | | Actividad 2.47 | 1 día | mar 11/02/25 | mié 12/02/25 | 76 | |
| 67 | | Actividad 2.48 | 1 día | mar 11/02/25 | mié 12/02/25 | 76 | |
| 68 | | Actividad 2.49 | 3 días | mié 5/02/25 | vie 7/02/25 | 23 | |
| 69 | | Actividad 2.50 | 0.3 días | mié 5/02/25 | mié 5/02/25 | 23 | |
| 70 | | Actividad 2.51 | 0.5 días | mié 5/02/25 | mié 5/02/25 | 23 | |
| 71 | | Actividad 2.52 | 0.3 días | mié 5/02/25 | mié 5/02/25 | 23 | |
| 72 | | Actividad 2.53 | 1 día | sáb 8/03/25 | lun 10/03/25 | 65 | |
| 73 | | Actividad 2.54 | 3 días | sáb 8/03/25 | mié 12/03/25 | 65 | |
| 74 | | Capítulo 3 | 7 días | lun 3/02/25 | mar 11/02/25 | | PAÑETES Y PINTU |
| 75 | | Actividad 3.01 | 5 días | lun 3/02/25 | vie 7/02/25 | | |
| 76 | | Actividad 3.02 | 2 días | sáb 8/02/25 | mar 11/02/25 | 75 | |
| 77 | | Capítulo 4 | 18 días | mié 26/02/25 | jue 20/03/25 | | PISOS |
| 78 | | Actividad 4.01 | 3 días | mié 26/02/25 | sáb 1/03/25 | 82 | |
| 79 | | Actividad 4.02 | 7 días | lun 3/03/25 | mar 11/03/25 | 78 | |
| 80 | | Actividad 4.03 | 8 días | mar 11/03/25 | jue 20/03/25 | 79 | |
| 81 | | Capítulo 5 | 12 días | mar 11/02/25 | mié 26/02/25 | | CUBIERTA |
| 82 | | Actividad 5.01 | 12 días | mar 11/02/25 | mié 26/02/25 | 24 | |
| 83 | | Capítulo 6 | 8 días | sáb 22/03/25 | mié 2/04/25 | | VARIOS |
| 84 | | Actividad 6.01 | 8 días | sáb 22/03/25 | mié 2/04/25 | 2,19 | |

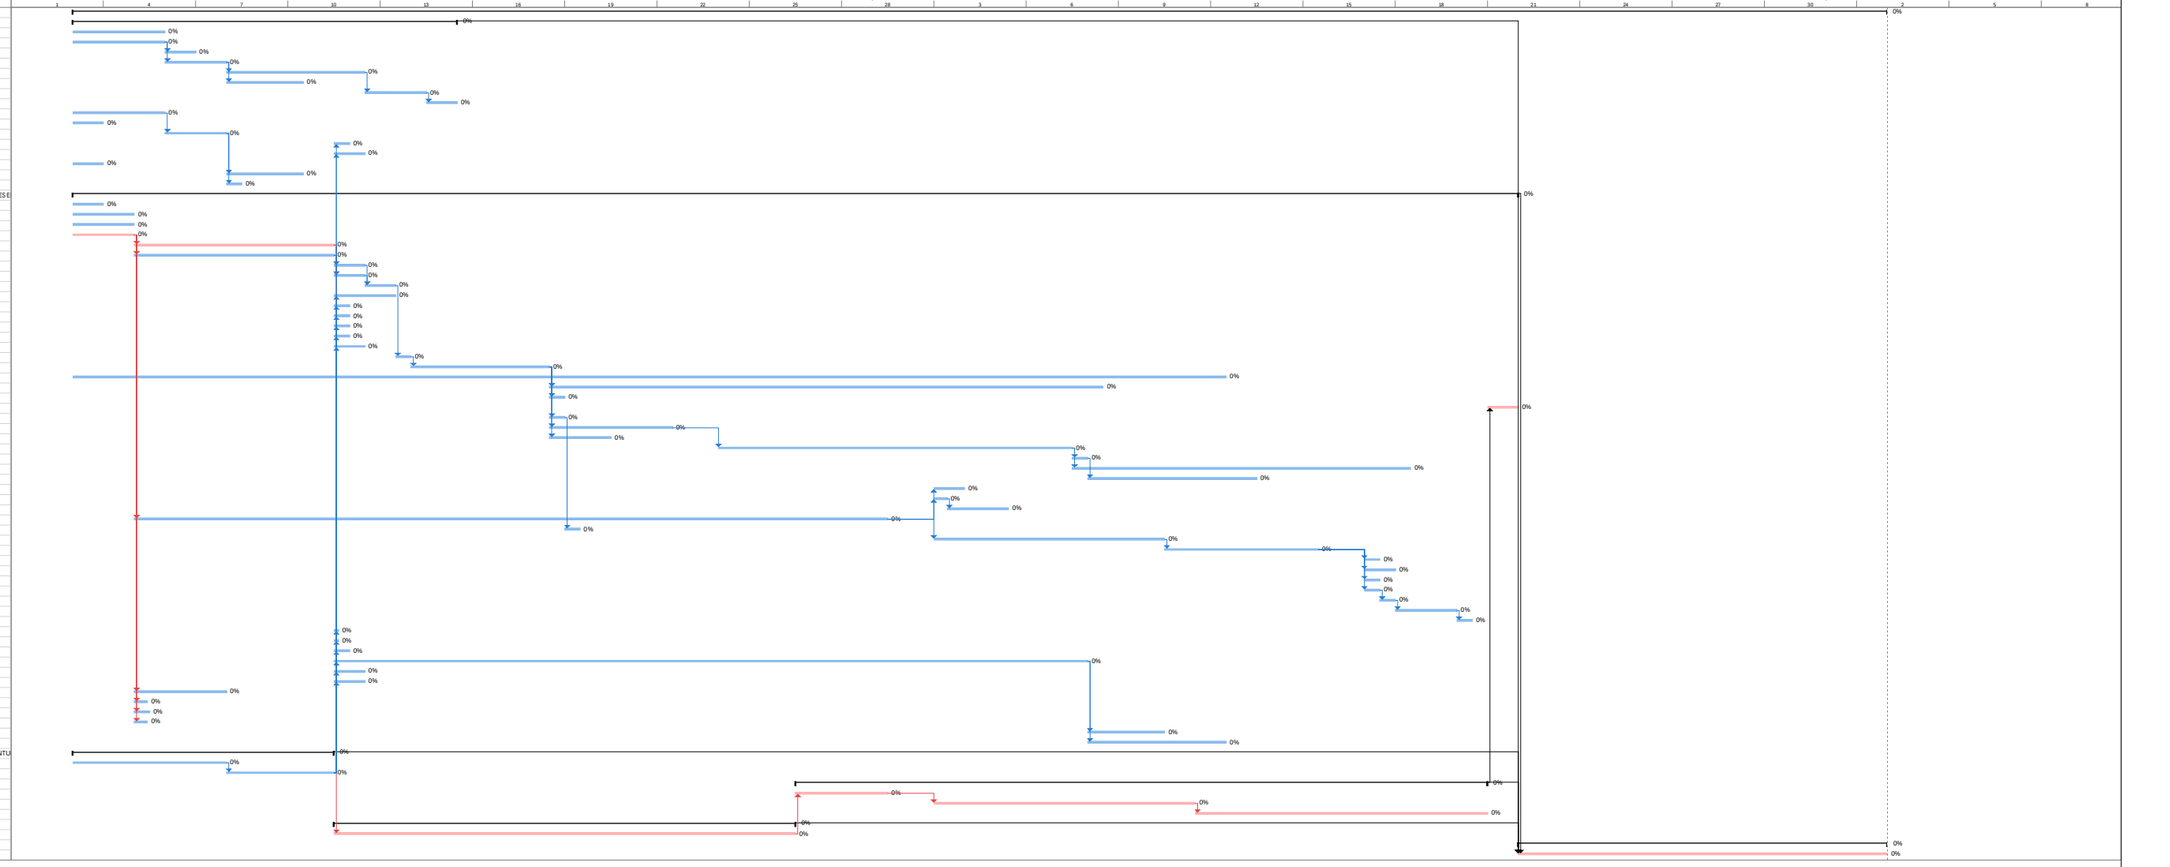


Tareas críticas · Progreso de tarea crítica · División · Tarea manual · solo fin · Línea base · Hito de línea base · Progreso del resumen · Resumen manual · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo
División crítica · Tarea · Progreso de tarea · solo el comienzo · solo duración · División de la línea base · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Fecha límite
